



FORMULÁRIO DE MEDIÇÕES

RELATÓRIO PARCIAL (SITUAÇÃO: APROVADA PELO CONSÓRCIO)

Enviado por ANTONIO CARLOS MARTINS BRANDAO em 19/08/2024 - 20:51

Registro: 19/08/2024			1ª MEDIÇÃO									
Obra: CTP 0191/2024 - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE ACESSIBILIDADE			Período de 22/07/2024 a 19/08/2024									
Local: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA												
OBSERVAÇÕES												
Enviada por ANTONIO CARLOS MARTINS BRANDAO (FORNECEDOR) em 19/08/2024 às 20:51												
							QUANTIDADE MEDIDA			VALOR MEDIDO		
ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	NESTA MEDIÇÃO	ACUMULADA	VALOR PREVISTO (BDI)	NESTA MEDIÇÃO (BDI)	ACUMULADA (BDI)	SALDO (BDI)
01	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO											
01.01	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA - para obras que exigem a utilização de grande quantidade de equipamentos e são executadas em centros urbanos ou próximos de centros urbanos. Obs.: Não se aplica aos serviços deTapa Buracos.											
01.01.01	OBRAS ATÉ O VALOR DE R\$ 1.000.000,00 - MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA PAVIMENTAÇÃO, EXCLUSIVE PARA TAPA-BURACOS	%	0.5	R\$ 25,00	R\$ 31,62	R\$ 15,81	0.5	0.5	R\$ 15,81	R\$ 644,11	R\$ 644,11	R\$ -628,30
02	INSTALAÇÕES DA OBRA											
02.01	ESCRITORIOS											
02.01.04	DEPOSITO E FERRAMENTARIA	m²	12	R\$ 278,61	R\$ 353,69	R\$ 4.244,28	12	12	R\$ 4.244,28	R\$ 4.244,28	R\$ 4.244,28	R\$ 0,00
02.05	BANHEIRO QUIMICO											
02.05.01	BANHEIRO QUIMICO 110 cm x 120 cm x 230 cm COM MANUTENÇÃO	mês	5	R\$ 628,10	R\$ 797,37	R\$ 3.986,85	1	1	R\$ 3.986,85	R\$ 797,37	R\$ 797,37	R\$ 3.189,48
02.06	SINALIZAÇÃO/SEGURANÇA											
02.06.01	PLACA DE OBRA EM LONA IMPRESSAO DIGITAL P. SUDECAP	m²	4.5	R\$ 239,48	R\$ 304,03	R\$ 1.368,14	4.5	4.5	R\$ 1.368,14	R\$ 1.368,14	R\$ 1.368,14	R\$ 0,00



02.06.05	CONE EM PVC H = 75 cm	un	20	R\$ 33,50	R\$ 42,54	R\$ 850,80	20	20	R\$ 850,80	R\$ 850,80	R\$ 850,80	R\$ 0,00
02.07	TAPUME / ISOLAMENTOS											
02.07.01	TELA-TAPUME DE POLIPROPILENO H = 1,20 M, INCL. BASE	m	500	R\$ 6,95	R\$ 8,81	R\$ 4.405,00	500	500	R\$ 4.405,00	R\$ 4.405,00	R\$ 4.405,00	R\$ 0,00
04	TRABALHOS EM TERRA											
04.01	ESCAVAÇÃO MECANICA INCLUSIVE TRANSPORTE ATE 50 m											
04.01.01	CAPINA MANUAL DE TERRENO	m²	4863.9	R\$ 2,57	R\$ 3,27	R\$ 15.904,95	4863.9	4863.9	R\$ 15.904,95	R\$ 15.904,95	R\$ 15.904,95	R\$ 0,00
04.04	CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO											
04.04.02	MECANICA	m³	4639.83	R\$ 2,11	R\$ 2,68	R\$ 12.434,74	4639.83	4639.83	R\$ 12.434,74	R\$ 12.434,74	R\$ 12.434,74	R\$ 0,00
04.05	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA											
04.05.04	DMT > 5 KM	m³ x km	4639.83	R\$ 1,53	R\$ 1,93	R\$ 8.954,87	4639.83	4639.83	R\$ 8.954,87	R\$ 8.954,87	R\$ 8.954,87	R\$ 0,00
04.06	ATERRO E REATERRO COMPACTADO											
04.06.02	COM PLACA VIBRATORIA	m³	1003.86	R\$ 16,89	R\$ 21,45	R\$ 21.532,80	1003.86	1003.86	R\$ 21.532,80	R\$ 21.532,80	R\$ 21.532,80	R\$ 0,00
04.09	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO											
04.09.02	COM PLACA VIBRATORIA	m²	4863.9	R\$ 3,52	R\$ 4,46	R\$ 21.692,99	4863.9	4863.9	R\$ 21.692,99	R\$ 21.692,99	R\$ 21.692,99	R\$ 0,00
07	OBRAS CIVIS (PONTES, PASSARELAS, CORTINAS E GABIÕES)											
07.01	ESCAVAÇÕES											
07.01.02	ESCAVACAO MANUAL H > 3,0 M	m³	2.26	R\$ 58,66	R\$ 74,47	R\$ 168,30	2.26	2.26	R\$ 168,30	R\$ 168,30	R\$ 168,30	R\$ 0,00
08	ESTRUTURA METÁLICA											
08.01	FORNECIMENTO, FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFS LAMINADOS, INCLUSIVE PINTURA PRIMER	kg	700	R\$ 19,53	R\$ 24,77	R\$ 17.339,00	700	700	R\$ 17.339,00	R\$ 17.339,00	R\$ 17.339,00	R\$ 0,00
09	URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES											
09.01	MEIO FIO PADRÃO SUDECAP											
09.01.02	MEIO FIO EM CONCRETO PRE-MOLDADO FCK>=20MPA, PADRÃO SUDECAP TIPO B, 40 X 15/12 (H X L1/L2), COMPRIMENTO 80CM	m	1980	R\$ 35,45	R\$ 45,01	R\$ 89.119,80	425	425	R\$ 89.119,80	R\$ 19.129,25	R\$ 19.129,25	R\$ 69.990,55
15	ADMINISTRAÇÃO LOCAL											



15.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - % BASEADA ACÓRDÃO 2.622/2013 DO TCU SOBRE SOMA DOS ITENS 1 A 14	%	7.55	R\$ 329,17	R\$ 416,25	R\$ 3.142,69	6.55	6.55	R\$ 3.142,69	R\$ 8.480,06	R\$ 8.480,06	R\$ -5.337,37
						TOTAL:				R\$ 137.946,67	R\$ 137.946,67	

YURI ANDRADE COSTA LINS
Fiscal de Obras - CIMVALPI
CREA 233590/D
Aprovação: 20/08/2024

PEDRO MARTINO ZEFERINO
Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA
CREA 137.103/D

ANTÔNIO CARLOS MARTINS BRANDÃO
RT de Execução - PONTAL ENGENHARIA LTDA
CREA 45.957/D





RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº 0021	OBRA: CTP 0191/2024 - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE ACESSIBILIDADE	CONTRATO:		RESP. TÉCNICO: ANTONIO CARLOS MARTINS BRANDÃO
ENDEREÇO: TRECHO DA RODOVIA DE ACESSO A SANTO ANTONIO DO GRAMA, BAIRRO NOVO HORIZONTE.		INÍCIO: 01/07/2024		Nº CREA-MG: 45957/D
CIDDE:		PRAZO: 31/12/2024		Nº DA ART:
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA		UF:		COORDENADAS:
DATA: 19/08/2024	SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA ☔	IMPRATICÁVEL ☔
MANHÃ	✓			
TARDE	✓			
QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO		QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
1	ENCARREGADO DE OBRAS		2	PEDREIRO
6	AJUDANTE			
QTDE	EQUIPAMENTO			
2	CAVADEIRA RETA			
3	PÁ			
3	CHIBANCA			
5	ENXADA			
2	CARRINHO DE MÃO			
TAREFAS REALIZADAS				
NÚMERO DE T.R.	DESCRICAÇÃO		OBSERVAÇÕES	
1	ESCAVAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE MEIO FIO			
2	ASSENTAMENTO DE MEIO FIO		PISTA DE ACESSIBILIDADE	
REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)				






Data não informada



Data não informada



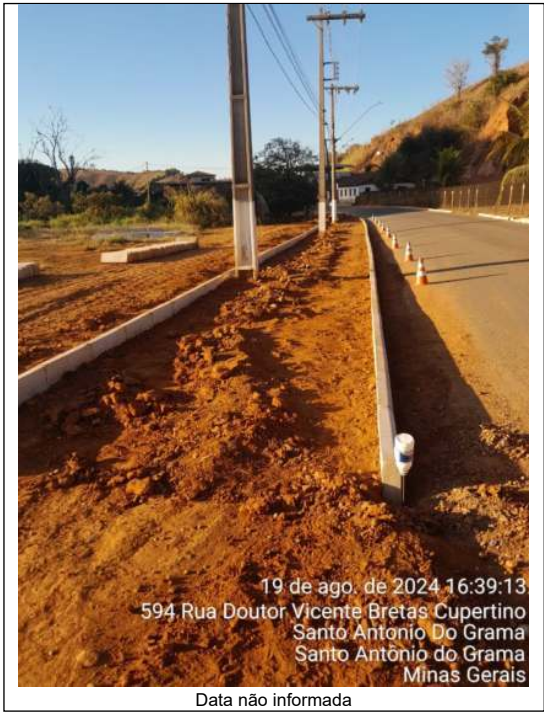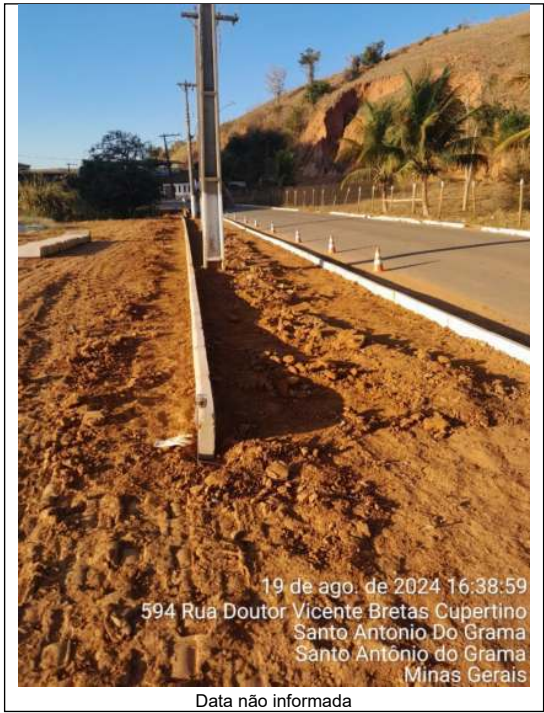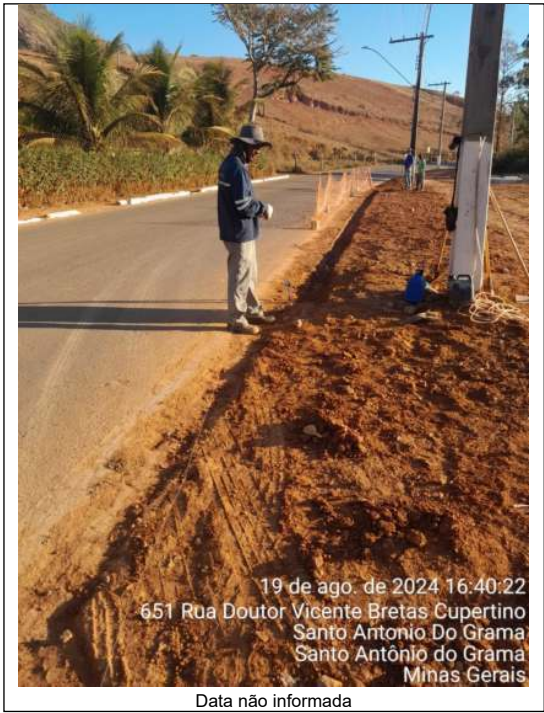

OCORRÊNCIAS		
NÚMERO DE OC	TIPO DE OCORRÊNCIA	DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA
CONFERÊNCIA		
MUNICÍPIO	CONSÓRCIO (Aprovado em 20/08/2024 - 13:21)	
Obs.:	Obs.:	
ASSINATURAS		
YURI ANDRADE COSTA LINS Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 233590/D	PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA CREA 137.103/D	ANTÔNIO CARLOS MARTINS BRANDÃO RT de Execução - PONTAL ENGENHARIA LTDA CREA 45.957/D





RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº 0020	OBRA: CTP 0191/2024 - SANTO ANTONÍO DO GRAMA - IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE ACESSIBILIDADE	CONTRATO:		RESP. TÉCNICO: ANTONIO CARLOS MARTINS BRANDÃO
ENDEREÇO: TRECHO DA RODOVIA DE ACESSO A SANTO ANTONIO DO GRAMA, BAIRRO NOVO HORIZONTE.		INÍCIO: 01/07/2024		Nº CREA-MG: 45957/D
CIDDE:		PRAZO: 31/12/2024		Nº DA ART:
DISTRITO: SANTO ANTONÍO DO GRAMA		UF:		COORDENADAS:
DATA: 16/08/2024	SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA ☔	IMPRATICÁVEL ☁
MANHÃ	✓			
TARDE	✓			
QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO		QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
1	ENCARREGADO DE OBRAS		2	PEDREIRO
4	AJUDANTE			
QTDE	EQUIPAMENTO			
2	CAVADEIRA RETA			
3	PÁ			
2	CHIBANCA			
5	ENXADA			
2	CARRINHO DE MÃO			
TAREFAS REALIZADAS				
NÚMERO DE T.R.	DESCRICAO		OBSERVAÇÕES	
1	INSTALAÇÃO DE MEIO FIO PREMOLDADO			
2	ESCAVAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE MEIO FIO			
3	CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE FERRAGEM		PARA FUNDAÇÕES DA PASSAGEM DE PEDESTRE	
REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)				





OCORRÊNCIAS		
NÚMERO DE OC	TIPO DE OCORRÊNCIA	DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA
CONFERÊNCIA		
MUNICÍPIO	CONSÓRCIO (Aprovado em 19/08/2024 - 09:00)	
Obs.:	Obs.:	
ASSINATURAS		
YURI ANDRADE COSTA LINS Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 233590/D	PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA CREA 137.103/D	ANTÔNIO CARLOS MARTINS BRANDÃO RT de Execução - PONTAL ENGENHARIA LTDA CREA 45.957/D






RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº 0019	OBRA: CTP 0191/2024 - SANTO ANTONIO DO GRAMA - IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE ACESSIBILIDADE	CONTRATO:	RESP. TÉCNICO: ANTONIO CARLOS MARTINS BRANDÃO
ENDEREÇO: TRECHO DA RODOVIA DE ACESSO A SANTO ANTONIO DO GRAMA, BAIRRO NOVO HORIZONTE.		INÍCIO: 01/07/2024	Nº CREA-MG: 45957/D
CIDDE:		PRAZO: 31/12/2024	Nº DA ART:
DISTRITO: SANTO ANTONIO DO GRAMA		UF:	COORDENADAS:
DATA: 15/08/2024	SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA ☔
MANHÃ	✓		IMPRATICÁVEL ☁
TARDE	✓		
QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
1	ENCARREGADO DE OBRAS	2	PEDREIRO
4	AJUDANTE		
QTDE	EQUIPAMENTO		
2	CAVADEIRA RETA		
1	DAMPER		
3	PÁ		
2	CHIBANCA		
5	ENXADA		
TAREFAS REALIZADAS			
NÚMERO DE T.R.	DESCRICAO	OBSERVAÇÕES	
1	ESCAVAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE MEIO FIO		
2	INSTALAÇÃO DE MEIO FIOS		
3	CORTE DOBRA E ARMAÇÃO DE FERRAGEM	PARA APLICAÇÃO NAS FUNDAÇÕES DA PASSAGEM DE PEDESTRE.	

REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)

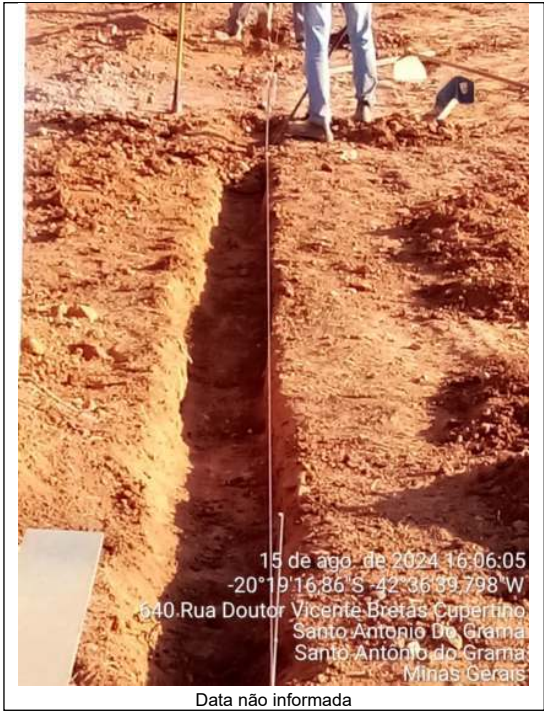


Data não informada



Data não informada



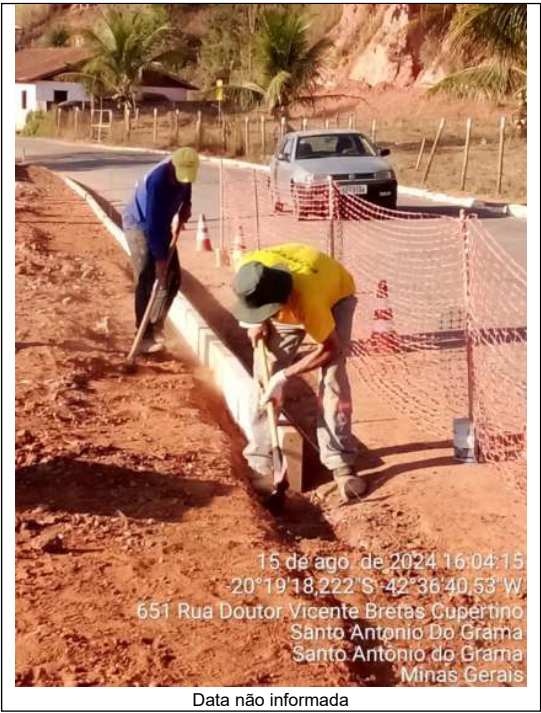


OCORRÊNCIAS		
NÚMERO DE OC	TIPO DE OCORRÊNCIA	DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA
CONFERÊNCIA		
MUNICÍPIO	CONSÓRCIO (Aprovado em 16/08/2024 - 09:31)	
Obs.:	Obs.:	
ASSINATURAS		
YURI ANDRADE COSTA LINS Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 233590/D	PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA CREA 137.103/D	ANTÔNIO CARLOS MARTINS BRANDÃO RT de Execução - PONTAL ENGENHARIA LTDA CREA 45.957/D



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº 0018	OBRA: CTP 0191/2024 - SANTO ANTONIO DO GRAMA - IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE ACESSIBILIDADE	CONTRATO:	RESP. TÉCNICO: ANTONIO CARLOS MARTINS BRANDÃO
ENDEREÇO: TRECHO DA RODOVIA DE ACESSO A SANTO ANTONIO DO GRAMA, BAIRRO NOVO HORIZONTE.	INÍCIO: 01/07/2024	Nº CREA-MG: 45957/D	
CIDDE:	PRAZO: 31/12/2024	Nº DA ART:	
DISTRITO: SANTO ANTONIO DO GRAMA	UF:	COORDENADAS:	
DATA: 14/08/2024	SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA ☔
MANHÃ	✓		IMPRATICÁVEL ☔
TARDE	✓		
QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
1	ENCARREGADO DE OBRAS	2	PEDREIRO
4	AJUDANTE		
QTDE	EQUIPAMENTO		
2	CAVADEIRA RETA		
20	CONE DE SINALIZAÇÃO		
1	DAMPER		
3	PÁ		
50	TELA DE PROTEÇÃO		
3	CHIBANCA		
5	ENXADA		
2	CARRINHO DE MÃO		
TAREFAS REALIZADAS			
NÚMERO DE T.R.	DESCRICAO	OBSERVAÇÕES	
1	CORTE DOBRA DE ARMADURAS DE AÇO	PARA FUNDAÇÕES PROFUNDAS DAS PASSAGENS DE PEDESTRE.	
2	PERFURAÇÃO DE FUNDAÇÕES PASSARELA DE PEDESTRES	FUNDAÇÕES PROFUNDOS DA PASSAGEM DE PEDESTRES	
3	MOVIMENTAÇÃO MANUAL DE SOLO	ESCAVAÇÕES PARA ASSENTAMENTO DE MEIO FIOS	

REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)

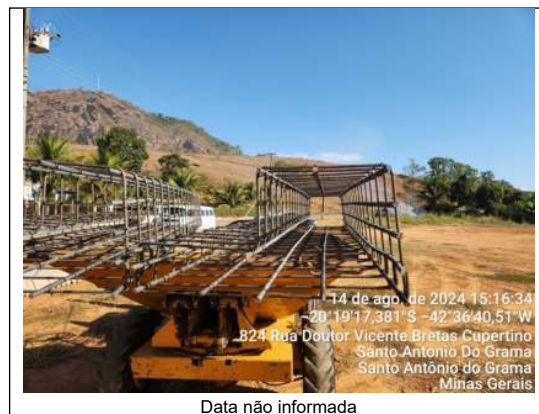



Data não informada


OCORRÊNCIAS	
NÚMERO DE OC	DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA
CONFERÊNCIA	
MUNICÍPIO	CONSÓRCIO (Aprovado em 15/08/2024 - 08:24)
Obs.:	Obs.:
ASSINATURAS	
YURI ANDRADE COSTA LINS Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 233590/D	PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA CREA 137.103/D
ANTÔNIO CARLOS MARTINS BRANDÃO RT de Execução - PONTAL ENGENHARIA LTDA CREA 45.957/D	





RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº 0017	OBRA: CTP 0191/2024 - SANTO ANTONÍO DO GRAMA - IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE ACESSIBILIDADE	CONTRATO:		RESP. TÉCNICO: ANTONIO CARLOS MARTINS BRANDÃO
ENDEREÇO: TRECHO DA RODOVIA DE ACESSO A SANTO ANTONIO DO GRAMA, BAIRRO NOVO HORIZONTE.		INÍCIO: 01/07/2024		Nº CREA-MG: 45957/D
CIDDE:		PRAZO: 31/12/2024		Nº DA ART:
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA		UF:		COORDENADAS:
DATA: 13/08/2024	SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA ☔	IMPRATICÁVEL ☔
MANHÃ	✓			
TARDE	✓			
QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO		QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
1	ENCARREGADO DE OBRAS		1	OPERADOR DE MOTONIVELADORA
2	PEDREIRO		4	AJUDANTE
QTDE	EQUIPAMENTO			
2	CAVADEIRA RETA			
3	PÁ			
4	ENXADA			
2	CHBANCA			
1	MOTONIVELADORA			
TAREFAS REALIZADAS				
NÚMERO DE T.R.	DESCRIÇÃO		OBSERVAÇÕES	
1	LIGAÇÃO DE PADRÃO COPASA			
2	DESCARGA DE MATERIAIS NA OBRA		AREIA, BRITA 01 E MEIO FIOS PREMOLDADOS	
3	CORTE E DOBRA DE ARMADURA PARA PASSAGEM DE PEDESTR			
4	ACERTO E NIVELAMENTO DE PISTA		ACABAMENTO DOS SERVIÇOS DE ATERRO E COMPACTAÇÃO DE SOLO NA ÁREA DE IMPLANTAÇÃO DA PISTA DE ACESSIBILIDADE	
REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)				

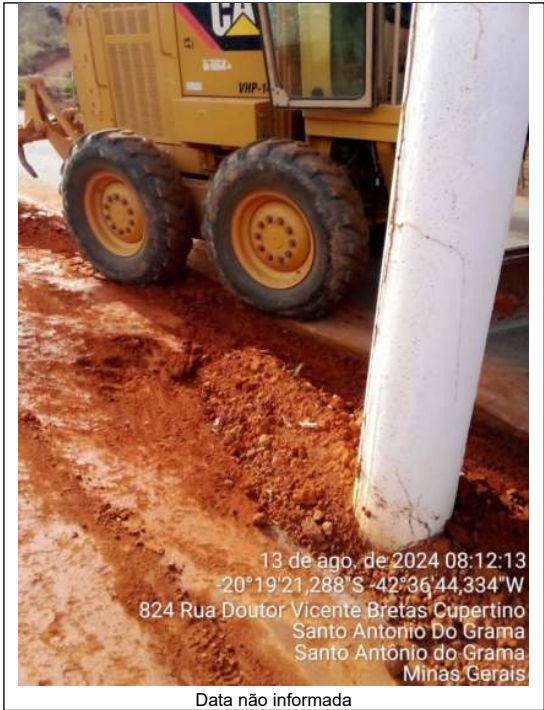



OCORRÊNCIAS		
NÚMERO DE OC	TIPO DE OCORRÊNCIA	DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA
CONFERÊNCIA		
MUNICÍPIO	CONSÓRCIO (Aprovado em 14/08/2024 - 08:37)	
Obs.:	Obs.:	
ASSINATURAS		
YURI ANDRADE COSTA LINS Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 233590/D	PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA CREA 137.103/D	ANTÔNIO CARLOS MARTINS BRANDÃO RT de Execução - PONTAL ENGENHARIA LTDA CREA 45.957/D






RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº 0016	OBRA: CTP 0191/2024 - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE ACESSIBILIDADE	CONTRATO:		RESP. TÉCNICO: ANTONIO CARLOS MARTINS BRANDÃO
ENDEREÇO: TRECHO DA RODOVIA DE ACESSO A SANTO ANTONIO DO GRAMA, BAIRRO NOVO HORIZONTE.		INÍCIO: 01/07/2024		Nº CREA-MG: 45957/D
CIDDE:		PRAZO: 31/12/2024		Nº DA ART:
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA		UF:		COORDENADAS:
DATA: 12/08/2024	SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA ☔	IMPRATICÁVEL ☔
MANHÃ	✓			
TARDE	✓			
QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO		QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
1	ENCARREGADO DE OBRAS		2	MOTORISTA DE CAMINHÃO CAÇAMBA
1	MOTORISTA DE CAMINHÃO PIPA		1	OPERADOR DE MOTONIVELADORA
2	PEDREIRO		1	OPERADOR DE ROLO PÉ DE CARNEIRO
	OPERADOR DE CARREGADEIRA		1	ENCARREGADO DE TERRAPLANAGEM
4	AJUDANTE			
QTDE	EQUIPAMENTO			
2	CAVADEIRA RETA			
1	PÁ CARREGADEIRA			
3	PÁ			
1	CAMINHÃO PIPA			
1	ROLO COMPACTADOR PÉ DE CARNEIRO			
3	ENXADA			
2	CAMINHÃO BASCULANTE			
1	MOTONIVELADORA			
TAREFAS REALIZADAS				
NÚMERO DE T.R.	DESCRICAÇÃO		OBSERVAÇÕES	
1	MOVIMENTAÇÃO MECANICA DE SOLO		PARA ACERTO E NIVELAMENTO DA ÁREA DE IMPLANTAÇÃO DA PISTA DE ACESIBILIDADE	
2	MOVIMENTAÇÃO MANUAL DE SOLO		PARA ACERTO E NIVELAMENTO DA ÁREA DE IMPLANTAÇÃO DA PISTA DE ACESIBILIDADE	
REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)				



Data não informada

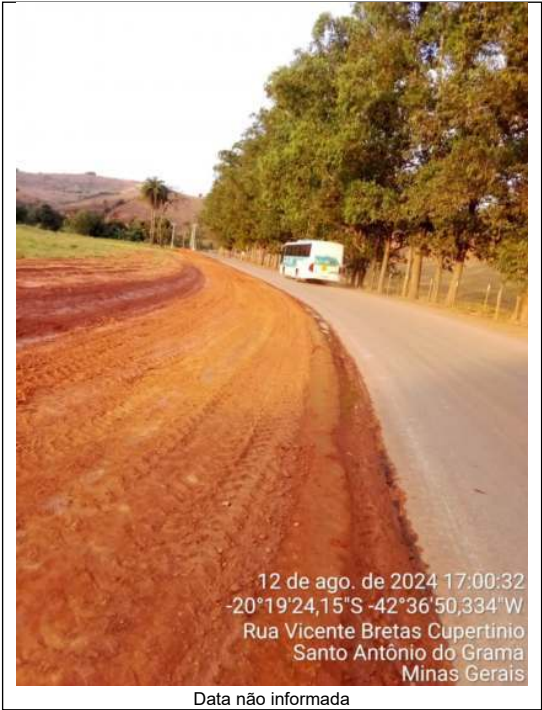


Data não informada





Data não informada

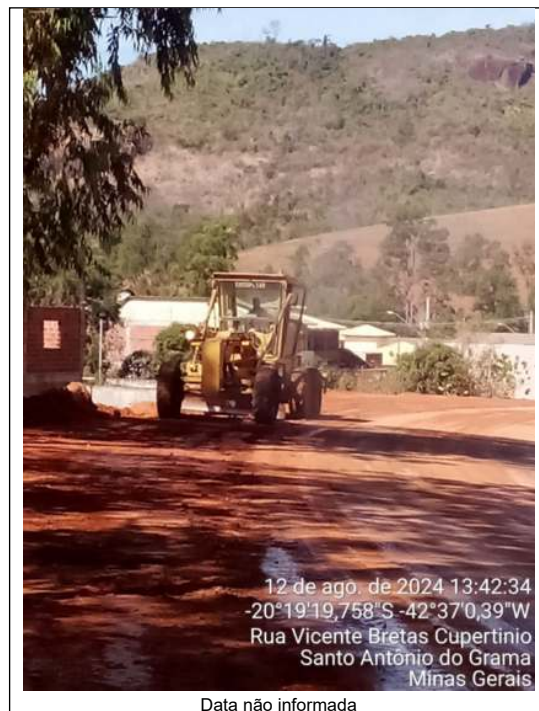

Data não informada



Data não informada



Data não informada



Data não informada



Data não informada

OCORRÊNCIAS		
NÚMERO DE OC	TIPO DE OCORRÊNCIA	DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA
CONFERÊNCIA		
MUNICÍPIO	CONSÓRCIO (Aprovado em 13/08/2024 - 08:24)	
Obs.:	Obs.:	
ASSINATURAS		
YURI ANDRADE COSTA LINS Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 233590/D	PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA CREA 137.103/D	ANTÔNIO CARLOS MARTINS BRANDÃO RT de Execução - PONTAL ENGENHARIA LTDA CREA 45.957/D





RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº 0015	OBRA: CTP 0191/2024 - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE ACESSIBILIDADE	CONTRATO:	RESP. TÉCNICO: ANTONIO CARLOS MARTINS BRANDÃO
ENDEREÇO: TRECHO DA RODOVIA DE ACESSO A SANTO ANTONIO DO GRAMA, BAIRRO NOVO HORIZONTE.		INÍCIO: 01/07/2024	Nº CREA-MG: 45957/D
CIDDE:		PRAZO: 31/12/2024	Nº DA ART:
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA		UF:	COORDENADAS:
DATA: 10/08/2024	SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA ☔
MANHÃ	✓		IMPRATICÁVEL ☁
TARDE	✓		
QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
1	ENCARREGADO DE OBRAS	2	MOTORISTA DE CAMINHÃO BÁSCULA
1	MOTORISTA DE CAMINHÃO PIPA	1	OPERADOR DE ROLO PÉ DE CARNEIRO
1	OPERADOR DE CARREGADEIRA	1	ENCARREGADO DE TERRAPLANAGEM
2	AJUDANTE		
QTDE	EQUIPAMENTO		
1	ROLO PÉ DE CARNEIRO		
1	PÁ CARREGADEIRA		
1	CAMINHÃO PIPA		
2	CAMINHÃO BASCULANTE		
TAREFAS REALIZADAS			
NÚMERO DE T.R.	DESCRICAO	OBSERVAÇÕES	
1	MOVIMENTAÇÃO MECANICA DE SOLO	PARA ACERTO E NIVELAMENTO DA AREA DE IMPLANTAÇÃO DA PISTA DE ACESSIBILIDADE	

REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)




Data não informada



Data não informada



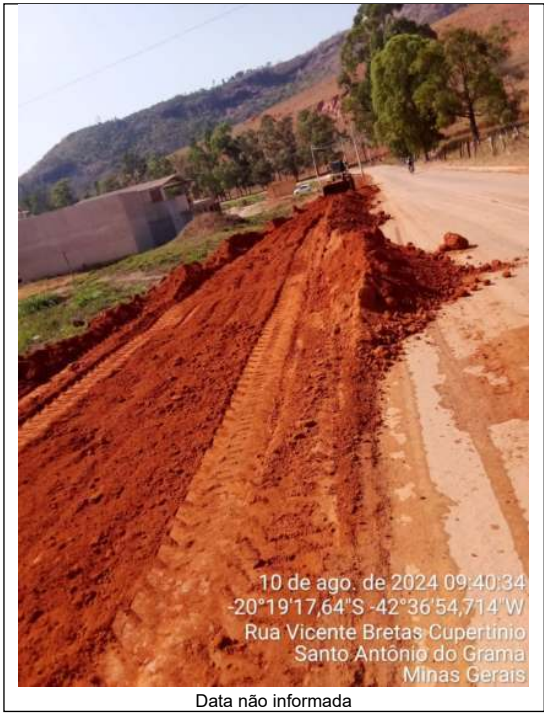

OCORRÊNCIAS		
NÚMERO DE OC	TIPO DE OCORRÊNCIA	DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA
CONFERÊNCIA		
MUNICÍPIO	CONSÓRCIO (Aprovado em 12/08/2024 - 08:03)	
Obs.:	Obs.:	
ASSINATURAS		
YURI ANDRADE COSTA LINS Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 233590/D	PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA CREA 137.103/D	ANTÔNIO CARLOS MARTINS BRANDÃO RT de Execução - PONTAL ENGENHARIA LTDA CREA 45.957/D








RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº 0014		OBRA: CTP 0191/2024 - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE ACESSIBILIDADE		CONTRATO:		RESP. TÉCNICO: ANTONIO CARLOS MARTINS BRANDÃO	
ENDEREÇO: TRECHO DA RODOVIA DE ACESSO A SANTO ANTONIO DO GRAMA, BAIRRO NOVO HORIZONTE.				INÍCIO: 01/07/2024		Nº CREA-MG: 45957/D	
CIDDE:				PRAZO: 31/12/2024		Nº DA ART:	
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA				UF:		COORDENADAS:	
DATA: 08/08/2024		SOL ☀		NUBLADO ☁		CHUVA ☔	
MANHÃ		✓				IMPRATICÁVEL ☔	
TARDE		✓					
QTDE		MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO				QTDE	
1		ENCARREGADO DE OBRAS				2	
1		MOTORISTA DE CAMINHÃO PIPA				1	
2		PEDREIRO				1	
1		ENCARREGADO DE TERRAPLANAGEM				4	
QTDE		EQUIPAMENTO					
1		PÁ CARREGADEIRA					
2		PÁ					
1		CAMINHÃO PIPA					
1		ROLO COMPACTADOR					
3		ENXADA					
2		CAMINHÃO BASCULANTE					
2		CARRINHO DE MÃO					
TAREFAS REALIZADAS							
NÚMERO DE T.R.		DESCRICAO				OBSERVAÇÕES	
1		RECEBIMENTO E DESCARGA DE MEIO FIO NA OBRA					
2		MOVIMENTAÇÃO MANUAL DE SOLO				PARA ACERTO E NIVELAMENTO FINO DO BERÇO DE ASSENTAMENTO DA PISTA DE CESSIBILIDADE	
3		MOVIMENTAÇÃO MECANICA DE SOLO				PARA ACERTO E NIVELAMENTO DO BERÇO DE ASSNTAMENTO DA PISTA DE CESSIBILIDADE	
REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)							



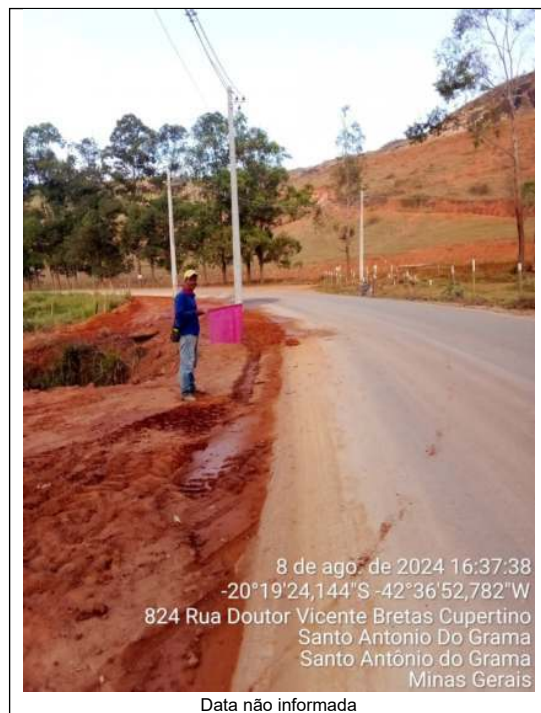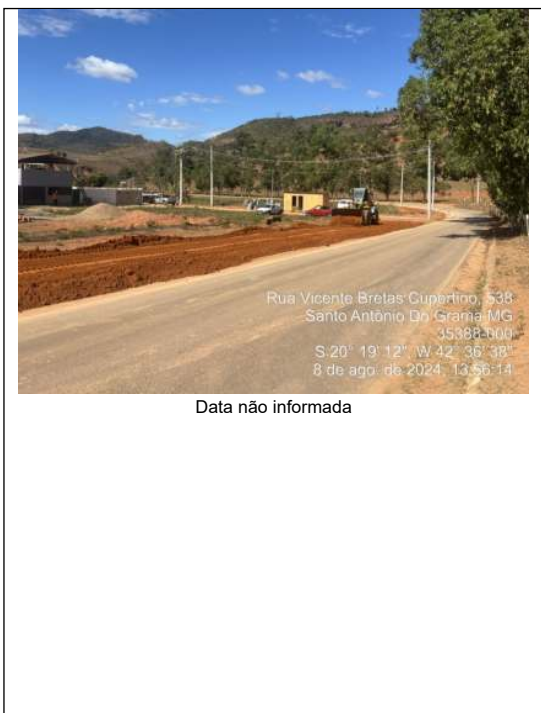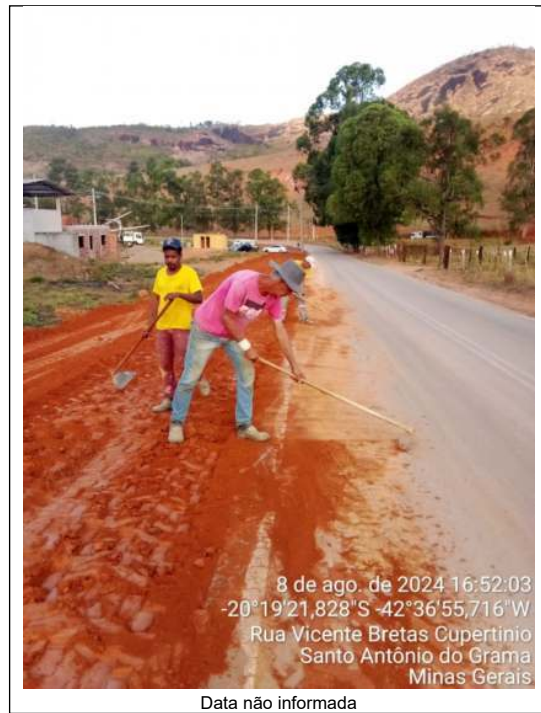


OCORRÊNCIAS		
NÚMERO DE OC	TIPO DE OCORRÊNCIA	DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA
CONFERÊNCIA		
MUNICÍPIO	CONSÓRCIO (Aprovado em 09/08/2024 - 11:50)	
Obs.:	Obs.:	
ASSINATURAS		
YURI ANDRADE COSTA LINS Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 233590/D	PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA CREA 137.103/D	ANTÔNIO CARLOS MARTINS BRANDÃO RT de Execução - PONTAL ENGENHARIA LTDA CREA 45.957/D






RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº 0013	OBRA: CTP 0191/2024 - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE ACESSIBILIDADE	CONTRATO:		RESP. TÉCNICO: ANTONIO CARLOS MARTINS BRANDÃO
ENDEREÇO: TRECHO DA RODOVIA DE ACESSO A SANTO ANTONIO DO GRAMA, BAIRRO NOVO HORIZONTE.		INÍCIO: 01/07/2024		Nº CREA-MG: 45957/D
CIDDE:		PRAZO: 31/12/2024		Nº DA ART:
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA		UF:		COORDENADAS:
DATA: 07/08/2024	SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA ☔	IMPRATICÁVEL ☔
MANHÃ	✓			
TARDE	✓			
QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO		QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
1	ENCARREGADO DE OBRAS		2	MOTORISTA DE CAMINHÃO CAÇAMBA
1	MOTORISTA DE CAMINHÃO PIPA		2	PEDREIRO
1	OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA		4	AJUDANTE
QTDE	EQUIPAMENTO			
1	PÁ CARREGADEIRA			
1	TRADO MANUAL			
2	CAMINHÃO CAÇAMBA			
3	PÁ			
1	CAMINHÃO PIPA			
3	ENXADA			
2	CARRINHO DE MÃO			
TAREFAS REALIZADAS				
NÚMERO DE T.R.	DESCRICAO		OBSERVAÇÕES	
1	CARGA, TRANSPORTE E ESPALHAMENTO DE SOLO		PARA NIVELAMENTO DA BASE DA PISTA	
2	MOVIMENTAÇÃO MECANICA DE SOLO		PREPARO DA PISTA DE IMPLANTAÇÃO	
3	ESCAVAÇÃO DE ESTACAS TIPO TRADO		FUNDAÇÕES PROFUNDAS DA PASSARELA DE PEDESTRES	
4	PINTURA DAS VIGAS METÁLICAS DA PASSARELA DE PEDEST			
REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)				

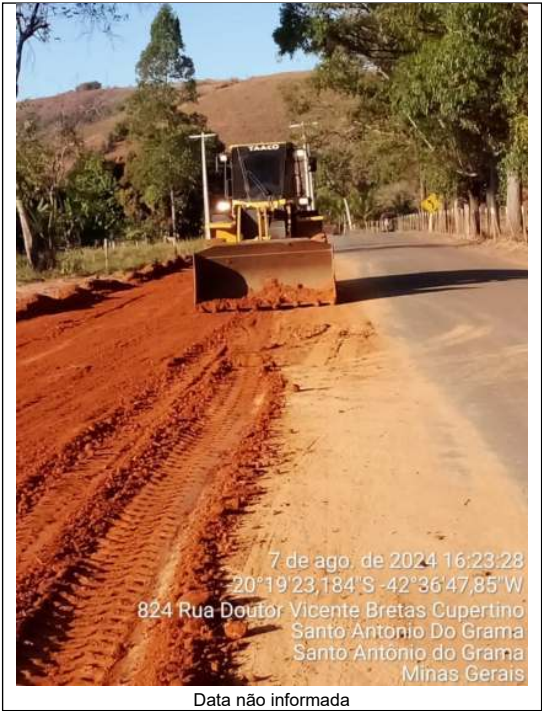



Data não informada

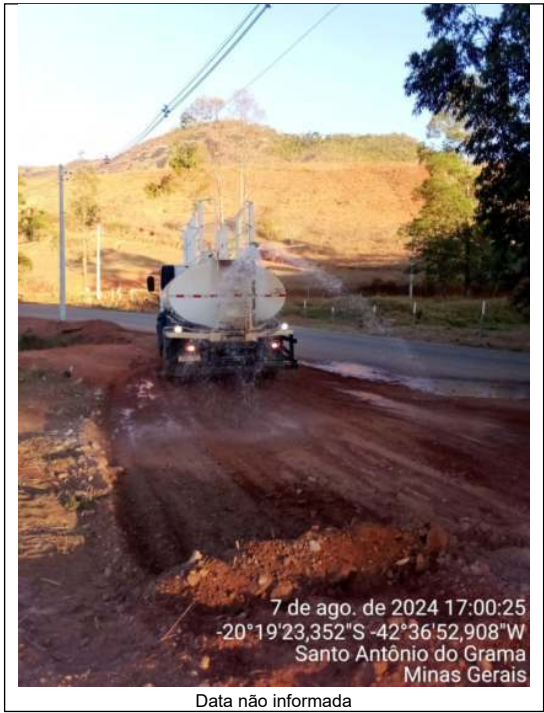

Data não informada



Data não informada

OCORRÊNCIAS		
NÚMERO DE OC	TIPO DE OCORRÊNCIA	DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA
CONFERÊNCIA		
MUNICÍPIO	CONSÓRCIO (Aprovado em 08/08/2024 - 07:45)	
Obs.:	Obs.:	
ASSINATURAS		
YURI ANDRADE COSTA LINS Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 233590/D	PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA CREA 137.103/D	ANTÔNIO CARLOS MARTINS BRANDÃO RT de Execução - PONTAL ENGENHARIA LTDA CREA 45.957/D






RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº 0012	OBRA: CTP 0191/2024 - SANTO ANTONIO DO GRAMA - IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE ACESSIBILIDADE	CONTRATO:	RESP. TÉCNICO: ANTONIO CARLOS MARTINS BRANDÃO
ENDEREÇO: TRECHO DA RODOVIA DE ACESSO A SANTO ANTONIO DO GRAMA, BAIRRO NOVO HORIZONTE.		INÍCIO: 01/07/2024	Nº CREA-MG: 45957/D
CIDDE:		PRAZO: 31/12/2024	Nº DA ART:
DISTRITO: SANTO ANTONIO DO GRAMA		UF:	COORDENADAS:
DATA: 06/08/2024	SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA ☔
IMPRATICÁVEL ☔			
MANHÃ	✓		
TARDE	✓		
QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
1	ENCARREGADO DE OBRAS	2	PEDREIRO
4	AJUDANTE		
QTDE	EQUIPAMENTO		
1	PÁ CARREGADEIRA		
1	DAMPER		
5	PÁ		
5	ENXADA		
2	CAMINHÃO BASCULANTE		
2	CARRINHO DE MÃO		
TAREFAS REALIZADAS			
NÚMERO DE T.R.	DESCRICAO	OBSERVAÇÕES	
1	RELOCAÇÃO DE PADRÃO CEMIG E OUTROS EQUIPAMENTOS	ESTAVAM OBSTRUINDO A ÁREA DE IMPLANTAÇÃO DA PISTA	
2	MOVIMENTAÇÃO MANUAL DE SOLO		
3	DESCARREGAMENTO DE VIGAS METÁLICAS NA OBRA		
4	MOVIMENTAÇÃO MECANICA DE SOLO		
REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)			



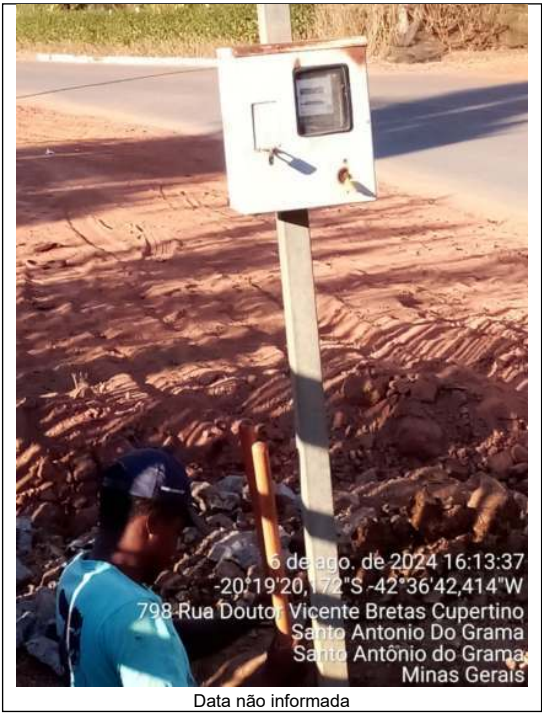



Data não informada

OCORRÊNCIAS		
NÚMERO DE OC	TIPO DE OCORRÊNCIA	DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA
CONFERÊNCIA		
MUNICÍPIO	CONSÓRCIO (Aprovado em 08/08/2024 - 07:43)	
Obs.:	Obs.:	
ASSINATURAS		
YURI ANDRADE COSTA LINS Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 233590/D	PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA CREA 137.103/D	ANTÔNIO CARLOS MARTINS BRANDÃO RT de Execução - PONTAL ENGENHARIA LTDA CREA 45.957/D






RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº 0011	OBRA: CTP 0191/2024 - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE ACESSIBILIDADE	CONTRATO:		RESP. TÉCNICO: ANTONIO CARLOS MARTINS BRANDÃO
ENDEREÇO: TRECHO DA RODOVIA DE ACESSO A SANTO ANTONIO DO GRAMA, BAIRRO NOVO HORIZONTE.		INÍCIO: 01/07/2024		Nº CREA-MG: 45957/D
CIDDE:		PRAZO: 31/12/2024		Nº DA ART:
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA		UF:		COORDENADAS:
DATA: 05/08/2024	SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA ☔	IMPRATICÁVEL ☔
MANHÃ	✓			
TARDE	✓			
QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO		QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
1	ENCARREGADO DE OBRAS		2	PEDREIRO
4	AJUDANTE			
QTDE	EQUIPAMENTO			
2	CAVADEIRA RETA			
1	DAMPER			
5	PÁ			
5	ENXADA			
2	CARRINHO DE MÃO			
1	CARREGADEIRA			
TAREFAS REALIZADAS				
NÚMERO DE T.R.	DESCRICAO		OBSERVAÇÕES	
1	DESCARGA DE MEIO FIOS NA OBRA		250 UNIDADES MEIO FIOS PREMOLDADOS	
2	MOVIMENTAÇÃO MECANICA DE SOLO		ACERTO E NIVELAMENTO DE PISO	
REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)				



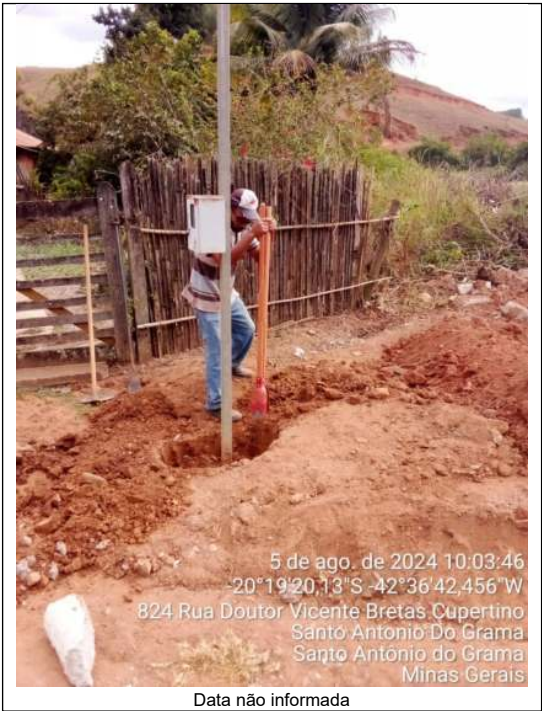

OCORRÊNCIAS		
NÚMERO DE OC	TIPO DE OCORRÊNCIA	DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA
CONFERÊNCIA		
MUNICÍPIO	CONSÓRCIO (Aprovado em 08/08/2024 - 07:43)	
Obs.:	Obs.:	
ASSINATURAS		
YURI ANDRADE COSTA LINS Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 233590/D	PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA CREA 137.103/D	ANTÔNIO CARLOS MARTINS BRANDÃO RT de Execução - PONTAL ENGENHARIA LTDA CREA 45.957/D





RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº 0010		OBRA: CTP 0191/2024 - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE ACESSIBILIDADE		CONTRATO:		RESP. TÉCNICO: ANTONIO CARLOS MARTINS BRANDÃO	
ENDEREÇO: TRECHO DA RODOVIA DE ACESSO A SANTO ANTONIO DO GRAMA, BAIRRO NOVO HORIZONTE.				INÍCIO: 01/07/2024		Nº CREA-MG: 45957/D	
CIDDE:				PRAZO: 31/12/2024		Nº DA ART:	
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA				UF:		COORDENADAS:	
DATA: 02/08/2024		SOL ☀		NUBLADO ☁		CHUVA ☔	
MANHÃ		✓				IMPRATICÁVEL ☔	
TARDE		✓					
QTDE		MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO		QTDE		MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	
1		ENCARREGADO DE OBRAS		2		PEDREIRO	
4		AJUDANTE					
QTDE				EQUIPAMENTO			
5		PÁ					
5		ENXADA					
2		CARRINHO DE MÃO					
3		CAVADEIRA MANUAL					
TAREFAS REALIZADAS							
NÚMERO DE T.R.		DESCRICAO			OBSERVAÇÕES		
REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)							
Data não informada				Data não informada			
Data não informada							
OCORRÊNCIAS							
NÚMERO DE OC		TIPO DE OCORRÊNCIA		DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA			
CONFERÊNCIA							
MUNICÍPIO				CONSÓRCIO (Aprovado em 08/08/2024 - 07:41)			
Obs.:				Obs.:			
ASSINATURAS							
YURI ANDRADE COSTA LINS Fiscal de Obras - CIMVALPI				PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA		ANTÔNIO CARLOS MARTINS BRANDÃO RT de Execução - PONTAL ENGENHARIA LTDA	



CREA 233590/D

CREA 137.103/D

CREA 45.957/D






RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº 0009	OBRA: CTP 0191/2024 - SANTO ANTONIO DO GRAMA - IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE ACESSIBILIDADE	CONTRATO:	RESP. TÉCNICO: ANTONIO CARLOS MARTINS BRANDÃO
ENDEREÇO: TRECHO DA RODOVIA DE ACESSO A SANTO ANTONIO DO GRAMA, BAIRRO NOVO HORIZONTE.		INÍCIO: 01/07/2024	Nº CREA-MG: 45957/D
CIDDE:		PRAZO: 31/12/2024	Nº DA ART:
DISTRITO: SANTO ANTONIO DO GRAMA		UF:	COORDENADAS:
DATA: 01/08/2024	SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA ☔
MANHÃ	✓		IMPRATICÁVEL ☔
TARDE	✓		
QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
1	ENCARREGADO DE OBRAS	2	PEDREIRO
4	AJUDANTE		
QTDE	EQUIPAMENTO		
5	PÁ		
5	ENXADA		
2	CARRINHO DE MÃO		
2	CAVADEIRA MANUAL		
TAREFAS REALIZADAS			
NÚMERO DE T.R.	DESCRICAO	OBSERVAÇÕES	
1	PERFURAÇÃO DE ESTACAS PASSARELA DE PEDESTRES		
2	APROVAÇÃO PLACA DE OBRA		

REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)

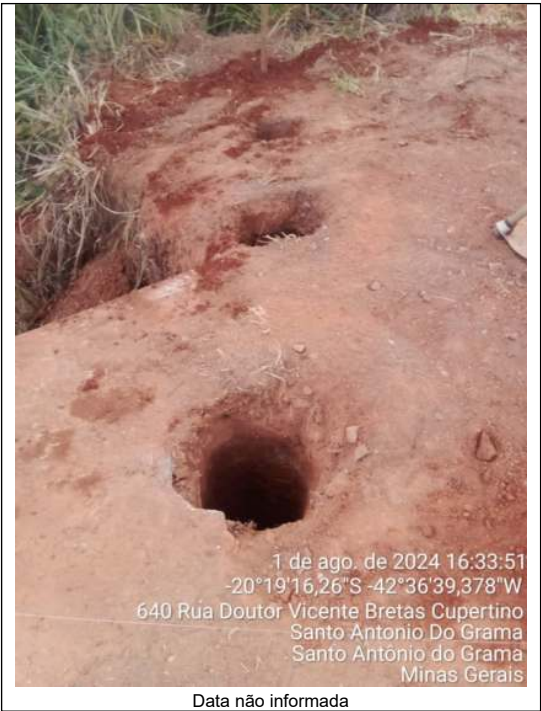

IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE ACESSIBILIDADE

GESTOR DA OBRA: CIMVALPI

AGENTE FINANCEIRO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO GRAMA

CONTRATO ADMINISTRATIVO: Nº 0191/2024

EMPRESA EXECUTORA: PONTAL ENGENHARIA LTDA

RESPONSÁVEL TÉCNICO: ENG CIVIL CREA MG 45.957 - ANTONIO CARLOS MARTINS BRANDÃO

VALOR DO CONTRATO: R\$ 778.901,38

PRAZO DE EXECUÇÃO: 180 DIAS

CIMVALPI

PREFEITURA MUNICIPAL SANTO ANTONIO DO GRAMA

Data não informada



OCORRÊNCIAS		
NÚMERO DE OC	TIPO DE OCORRÊNCIA	DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA
CONFERÊNCIA		
MUNICÍPIO	CONSÓRCIO (Aprovado em 08/08/2024 - 07:41)	
Obs.:	Obs.:	
ASSINATURAS		
YURI ANDRADE COSTA LINS Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 233590/D	PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA CREA 137.103/D	ANTÔNIO CARLOS MARTINS BRANDÃO RT de Execução - PONTAL ENGENHARIA LTDA CREA 45.957/D





RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº 0008	OBRA: CTP 0191/2024 - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE ACESSIBILIDADE	CONTRATO:	RESP. TÉCNICO: ANTONIO CARLOS MARTINS BRANDÃO
ENDEREÇO: TRECHO DA RODOVIA DE ACESSO A SANTO ANTONIO DO GRAMA, BAIRRO NOVO HORIZONTE.		INÍCIO: 01/07/2024	Nº CREA-MG: 45957/D
CIDDE:		PRAZO: 31/12/2024	Nº DA ART:
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA		UF:	COORDENADAS:
DATA: 31/07/2024	SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA ☔
MANHÃ		✓	IMPRATICÁVEL ☁
TARDE	✓		
QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
1	ENCARREGADO DE OBRAS	2	PEDREIRO
4	AJUDANTE		
QTDE	EQUIPAMENTO		
5	PÁ		
5	ENXADA		
3	CARRINHO DE MÃO		
3	CAVADEIRA MANUAL		
TAREFAS REALIZADAS			
NÚMERO DE T.R.	DESCRIÇÃO	OBSERVAÇÕES	
1	ESCAVAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE MEIO FIO		
REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)			
Data não informada		Data não informada	
OCORRÊNCIAS			
NÚMERO DE OC	TIPO DE OCORRÊNCIA	DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA	
CONFERÊNCIA			
MUNICÍPIO	CONSÓRCIO (Aprovado em 01/08/2024 - 16:00)		
Obs.:	Obs.: Providenciar a tela tapume para sinalizar/isolar a área de trabalho		
ASSINATURAS			
YURI ANDRADE COSTA LINS Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 233590/D		PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA CREA 137.103/D	
		ANTÔNIO CARLOS MARTINS BRANDÃO RT de Execução - PONTAL ENGENHARIA LTDA CREA 45.957/D	






RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº 0007	OBRA: CTP 0191/2024 - SANTO ANTONIO DO GRAMA - IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE ACESSIBILIDADE	CONTRATO:	RESP. TÉCNICO: ANTONIO CARLOS MARTINS BRANDÃO
ENDEREÇO: TRECHO DA RODOVIA DE ACESSO A SANTO ANTONIO DO GRAMA, BAIRRO NOVO HORIZONTE.		INÍCIO: 01/07/2024	Nº CREA-MG: 45957/D
CIDDE:		PRAZO: 31/12/2024	Nº DA ART:
DISTRITO: SANTO ANTONIO DO GRAMA		UF:	COORDENADAS:
DATA: 30/07/2024	SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA ☔
MANHÃ	✓		IMPRATICÁVEL ☁
TARDE	✓		
QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
1	ENCARREGADO DE OBRAS	2	PEDREIRO
4	AJUDANTE		
QTDE	EQUIPAMENTO		
5	PÁ		
5	ENXADA		
3	CARRINHO DE MÃO		
1	SERRA CIRCULAR		
1	BETONEIRA		
1	SERRA DE BANCADA		
TAREFAS REALIZADAS			
NÚMERO DE T.R.	DESCRICAO	OBSERVAÇÕES	
1	ESCAVAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DE MEIO FIO		
2	MOVIMENTAÇÃO MANUAL DE SOLO		

REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)



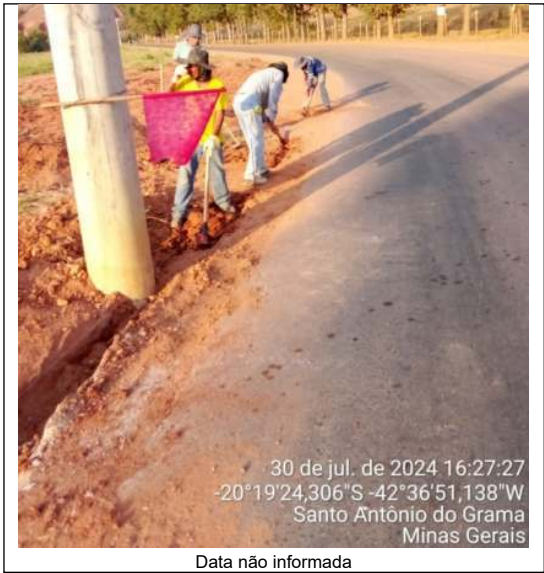

Data não informada

OCORRÊNCIAS		
NÚMERO DE OC	TIPO DE OCORRÊNCIA	DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA
CONFERÊNCIA		
MUNICÍPIO	CONSÓRCIO (Aprovado em 01/08/2024 - 15:59)	
Obs.:	Obs.: Providenciar tela tapume para sinalizar e isolar a área de trabalho	
ASSINATURAS		
YURI ANDRADE COSTA LINS Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 233590/D	PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA CREA 137.103/D	ANTÔNIO CARLOS MARTINS BRANDÃO RT de Execução - PONTAL ENGENHARIA LTDA CREA 45.957/D





CIMVALPI
CONSORCIO INTERMUNICIPAL
MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº 0006	OBRA: CTP 0191/2024 - SANTO ANTONIO DO GRAMA - IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE ACESSIBILIDADE	CONTRATO:	RESP. TÉCNICO: ANTONIO CARLOS MARTINS BRANDÃO
ENDEREÇO: TRECHO DA RODOVIA DE ACESSO A SANTO ANTONIO DO GRAMA, BAIRRO NOVO HORIZONTE.		INÍCIO: 01/07/2024	Nº CREA-MG: 45957/D
CIDDE:		PRAZO: 31/12/2024	Nº DA ART:
DISTRITO: SANTO ANTONIO DO GRAMA		UF:	COORDENADAS:
DATA: 30/07/2024	SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA ☔
MANHÃ	✓		IMPRATICÁVEL ☔
TARDE	✓		
QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
1	ENCARREGADO DE OBRAS	2	PEDREIRO
4	AJUDANTE		
QTDE	EQUIPAMENTO		
5	PÁ		
5	ENXADA		
1	RETROESCAVADEIRA		
1	SERRA CIRCULAR		
1	BETONEIRA		
1	SERRA DE BANCADA		
TAREFAS REALIZADAS			
NÚMERO DE T.R.	DESCRICAO	OBSERVAÇÕES	
1	REMOÇÃO MANUAL E MECÂNICA DE MEIO FIOS EXISTENTES		
2	MOVIMENTAÇÃO MECANICA DE SOLO		
3	MOVIMENTAÇÃO MANUAL DE SOLO		
REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)			
 29 de jul. de 2024 16:10:11 -20°19'24,189"S -42°36'52,318"W Santo Antônio do Grama Minas Gerais 29/07/2024 -20.323385833333, -42.614532777778		 29 de jul. de 2024 15:56:05 -20°19'20,693"S -42°36'43,2"W 824 Rua Doutor Vicente Bretas Cupertino Santo Antonio Do Grama Santo Antônio do Grama Minas Gerais 29/07/2024 -20.322414722222, -42.612	



Pag.: 37 / 47 ID. do Doc.: 8CD.682 - 20/08/2024 - 16:29:55 - ASSINADO POR(3): CPF:015.49*. **6.*9 CPF:084.94*. **6.*2 CPF:385.06*. **6.*4



Data não informada

OCORRÊNCIAS	
NÚMERO DE OC	TIPO DE OCORRÊNCIA
DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA	
OBSERVAÇÕES	
DATA 29/07/2024 SEGUNDA FEIRA. LANÇAMENTO DE INFORMAÇÕES EM ATRAZO, A PARTIR DA LIBERAÇÃO E TRENAMENTO DE OPERAÇÃO DO SISTEMA WAY.	
CONFERÊNCIA	
MUNICÍPIO	CONSÓRCIO (Aprovado em 01/08/2024 - 15:57)
Obs.:	Obs.:
ASSINATURAS	
YURI ANDRADE COSTA LINS Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 233590/D	PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA CREA 137.103/D
ANTÔNIO CARLOS MARTINS BRANDÃO RT de Execução - PONTAL ENGENHARIA LTDA CREA 45.957/D	





RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº 0005	OBRA: CTP 0191/2024 - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE ACESSIBILIDADE	CONTRATO:		RESP. TÉCNICO: ANTONIO CARLOS MARTINS BRANDÃO
ENDEREÇO: TRECHO DA RODOVIA DE ACESSO A SANTO ANTONIO DO GRAMA, BAIRRO NOVO HORIZONTE.		INÍCIO: 01/07/2024		Nº CREA-MG: 45957/D
CIDDE:		PRAZO: 31/12/2024		Nº DA ART:
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA		UF:		COORDENADAS:
DATA: 30/07/2024	SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA ☔	IMPRATICÁVEL ☁
MANHÃ	✓			
TARDE	✓			
QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO		QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
	ENCARREGADO DE OBRAS		2	PEDREIRO
5	AJUDANTE			
QTDE	EQUIPAMENTO			
5	PÁ			
5	ENXADA			
1	RETROESCAVADEIRA			
1	SERRA CIRCULAR			
1	BETONEIRA			
1	SERRA DE BANCADA			
TAREFAS REALIZADAS				
NÚMERO DE T.R.	DESCRICAO		OBSERVAÇÕES	
1	MOVIMENTAÇÃO MECANICA DE SOLO		ACERTO DE PISTA	
2	MOVIMENTAÇÃO MANUAL DE SOLO		ACERTO DE PISTA	
REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)				





29 de jul. de 2024 10:08:32
640 Rua Doutor Vicente Bretas Cupertino
Santo Antonio Do Grama
Santo Antonio do Grama
Minas Gerais

Data não informada

OCORRÊNCIAS		
NÚMERO DE OC	TIPO DE OCORRÊNCIA	
DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA		
OBSERVAÇÕES		
DATA 26/07/2024 SEGUNDA FEIRA. LANÇAMENTO DE INFORMAÇÕES EM ATRAZO, A PARTIR DA LIBERAÇÃO E TRENAMENTO DE OPERAÇÃO DO SISTEMA WAY.		
CONFERÊNCIA		
MUNICÍPIO	CONSÓRCIO (Aprovado em 01/08/2024 - 15:56)	
Obs.:	Obs.:	
ASSINATURAS		
YURI ANDRADE COSTA LINS Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 233590/D	PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA CREA 137.103/D	ANTÔNIO CARLOS MARTINS BRANDÃO RT de Execução - PONTAL ENGENHARIA LTDA CREA 45.957/D





RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº 0004	OBRA: CTP 0191/2024 - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE ACESSIBILIDADE	CONTRATO:	RESP. TÉCNICO: ANTONIO CARLOS MARTINS BRANDÃO
ENDEREÇO: TRECHO DA RODOVIA DE ACESSO A SANTO ANTONIO DO GRAMA, BAIRRO NOVO HORIZONTE.		INÍCIO: 01/07/2024	Nº CREA-MG: 45957/D
CIDDE:		PRAZO: 31/12/2024	Nº DA ART:
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA		UF:	COORDENADAS:
DATA: 30/07/2024	SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA ☔
MANHÃ	✓		IMPRATICÁVEL ☁
TARDE	✓		
QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
1	ENCARREGADO DE OBRAS	2	PEDREIRO
5	AJUDANTE		
QTDE	EQUIPAMENTO		
5	PÁ		
5	ENXADA		
3	CARRINHO DE MÃO		
1	SERRA CIRCULAR		
1	BETONEIRA		
1	SERRA DE BANCADA		
TAREFAS REALIZADAS			
NÚMERO DE T.R.	DESCRICAO	OBSERVAÇÕES	
1	LIMPEZA E CAPINA		
2	MOVIMENTAÇÃO MECANICA DE SOLO	PARA NIVELAMENTO DO TERRENO	
3	MOVIMENTAÇÃO MANUAL DE SOLO	PARA ACERTOS DO TERRENO	
REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)			
 29 de jul. de 2024 15:54:31 -20°19'18.808"S - 42°36'40.922"W 651 Rua Doutor Vicente Bretas Cupertino Santo Antônio do Gramma Santo Antônio do Gramma Minas Gerais 29/07/2024 -20.321891111111, -42.611366944444		 29 de jul. de 2024 07:44:03 Santo Antônio do Gramma Minas Gerais Data não informada	
OCORRÊNCIAS			
NÚMERO DE OC	TIPO DE OCORRÊNCIA	DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA	
OBSERVAÇÕES			
DATA 25/07/2024 SEGUNDA FEIRA. LANÇAMENTO DE INFORMAÇÕES EM ATRAZO, A PARTIR DA LIBERAÇÃO E TRENAMENTO DE OPERAÇÃO DO SISTEMA WAY.			
CONFERÊNCIA			
MUNICÍPIO	CONSÓRCIO (Aprovado em 01/08/2024 - 15:56)		
Obs.:	Obs.:		
ASSINATURAS			
YURI ANDRADE COSTA LINS Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 233590/D		PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA CREA 137.103/D	
		ANTÔNIO CARLOS MARTINS BRANDÃO RT de Execução - PONTAL ENGENHARIA LTDA CREA 45.957/D	





RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº 0003	OBRA: CTP 0191/2024 - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE ACESSIBILIDADE	CONTRATO:	RESP. TÉCNICO: ANTONIO CARLOS MARTINS BRANDÃO
ENDEREÇO: TRECHO DA RODOVIA DE ACESSO A SANTO ANTONIO DO GRAMA, BAIRRO NOVO HORIZONTE.		INÍCIO: 01/07/2024	Nº CREA-MG: 45957/D
CIDDE:		PRAZO: 31/12/2024	Nº DA ART:
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA		UF:	COORDENADAS:
DATA: 30/07/2024	SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA ☔
MANHÃ	✓		IMPRATICÁVEL ☔
TARDE	✓		
QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
1	ENCARREGADO DE OBRAS	2	PEDREIRO
4	AJUDANTE		
QTDE	EQUIPAMENTO		
5	PÁ		
5	ENXADA		
1	SERRA CIRCULAR		
1	BETONEIRA		
1	SERRA DE BANCADA		
TAREFAS REALIZADAS			
NÚMERO DE T.R.	DESCRIÇÃO	OBSERVAÇÕES	
1	ACERTO E NIVELAMENTO MANUAL DE PISTA		
2	REMOÇÃO DE CERCAS		
3	CONCLUSÃO DO BARRACO DE OBRA COM DEPOSITO E BANHEI	COBERTURA E CONCRETAGEM DO PISO	
4	LIMPEZA E CAPINA		
5	REALOCAÇÃO DE CERCAS		
6	CONSTRUÇÃO DE BARRACO DE OBRA		
REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)			



OCORRÊNCIAS		
NÚMERO DE OC	TIPO DE OCORRÊNCIA	DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA
OBSERVAÇÕES		
DATA 24/07/2024 SEGUNDA FEIRA. LANÇAMENTO DE INFORMAÇÕES EM ATRAZO, A PARTIR DA LIBERAÇÃO E TRENAMENTO DE OPERAÇÃO DO SISTEMA WAY.		
CONFERÊNCIA		
MUNICÍPIO	CONSÓRCIO (Aprovado em 01/08/2024 - 15:55)	
Obs.:	Obs.:	
ASSINATURAS		
YURI ANDRADE COSTA LINS Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 233590/D	PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA CREA 137.103/D	ANTÔNIO CARLOS MARTINS BRANDÃO RT de Execução - PONTAL ENGENHARIA LTDA CREA 45.957/D





CIMVALPI
CONSORCIO INTERMUNICIPAL
MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº 0002	OBRA: CTP 0191/2024 - SANTO ANTONIO DO GRAMA - IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE ACESSIBILIDADE	CONTRATO:	RESP. TÉCNICO: ANTONIO CARLOS MARTINS BRANDÃO
ENDEREÇO: TRECHO DA RODOVIA DE ACESSO A SANTO ANTONIO DO GRAMA, BAIRRO NOVO HORIZONTE.		INÍCIO: 01/07/2024	Nº CREA-MG: 45957/D
CIDDE:		PRAZO: 31/12/2024	Nº DA ART:
DISTRITO: SANTO ANTONIO DO GRAMA		UF:	COORDENADAS:
DATA: 30/07/2024	SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA ☔
MANHÃ	✓		IMPRATICÁVEL ☔
TARDE	✓		
QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
1	ENCARREGADO DE OBRAS	2	PEDREIRO
4	AJUDANTE		
QTDE	EQUIPAMENTO		
5	PÁ		
5	ENXADA		
3	CARRINHO DE MÃO		
1	SERRA CIRCULAR		
1	BETONEIRA		
1	SERRA DE BANCADA		
TAREFAS REALIZADAS			
NÚMERO DE T.R.	DESCRICAO	OBSERVAÇÕES	
1	CONSTRUÇÃO DE BARRACO DE OBRA	BANHEIRO E DEPOSITO 12 M²	
2	REMOÇÃO DE CERCAS		
3	REALOCAÇÃO DE CERCAS		
4	LIMPEZA E CAPINA		
REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)			
 29 de jul. de 2024 15:55:51 -20°19'20,826"S -42°36'43,038"W 824 Rua Doutor Vicente Bretas Cupertino Santo Antonio Do Grama Santo Antônio do Grama Minas Gerais 29/07/2024 -20.322451666667, -42.611955  29 de jul. de 2024 15:22:06 Santo Antonio do Grama Minas Gerais 29/07/2024 -20.323100555556, -42.6146625  29 de jul. de 2024 15:27:21 -20°19'23,84"S -42°36'53,481"W Santo Antonio do Grama Minas Gerais 29/07/2024 -20.323288888889, -42.614855833333			
OCORRÊNCIAS			



Pag.: 44 / 47 ID. do Doc.: 8CD.682 - 20/08/2024 - 16:29:55 - ASSINADO POR(3): CPF:015.49*. **6.*9 CPF:084.94*. **6.*2 CPF:385.06*. **6.*4

NÚMERO DE OC	TIPO DE OCORRÊNCIA	DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA
OBSERVAÇÕES		
DATA 23/07/2024 TERÇA FEIRA. LANÇAMENTO DE INFORMAÇÕES EM ATRAZO, A PARTIR DA LIBERAÇÃO E TRENAMENTO DE OPERAÇÃO DO SISTEMA WAY.		
CONFERÊNCIA		
MUNICÍPIO	CONSÓRCIO (Aprovado em 01/08/2024 - 15:55)	
Obs.:	Obs.:	
ASSINATURAS		
YURI ANDRADE COSTA LINS Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 233590/D	PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA CREA 137.103/D	ANTÔNIO CARLOS MARTINS BRANDÃO RT de Execução - PONTAL ENGENHARIA LTDA CREA 45.957/D





RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº 0001	OBRA: CTP 0191/2024 - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE ACESSIBILIDADE	CONTRATO:	RESP. TÉCNICO: ANTONIO CARLOS MARTINS BRANDÃO
ENDEREÇO: TRECHO DA RODOVIA DE ACESSO A SANTO ANTONIO DO GRAMA, BAIRRO NOVO HORIZONTE.		INÍCIO: 01/07/2024	Nº CREA-MG: 45957/D
CIDDE:		PRAZO: 31/12/2024	Nº DA ART:
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA		UF:	COORDENADAS:
DATA: 30/07/2024	SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA ☔
MANHÃ	✓		IMPRATICÁVEL ☁
TARDE	✓		
QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
1	ENCARREGADO DE OBRAS	2	PEDREIRO
4	AJUDANTE		
QTDE	EQUIPAMENTO		
5	PÁ		
5	ENXADA		
3	CARRINHO DE MÃO		
1	SERRA CIRCULAR		
1	BETONEIRA		
1	SERRA DE BANCADA		
TAREFAS REALIZADAS			
NÚMERO DE T.R.	DESCRICAO	OBSERVAÇÕES	
1	LIMPESA E CAPINA		
2	REMOÇÃO DE CERCAS		
REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)			
 29 de jul. de 2024 15:56:11 -20°19'20,718"S - 42°36'43,291"W 824 Rua Doutor Vicente Bretas Cupertino Santo Antonio Do Grama Santo Antônio do Grama Minas Gerais 29/07/2024 -20.322410833333, -42.612017777778  29 de jul. de 2024 16:01:30 -20°19'21,621"S - 42°36'44,958"W 824 Rua Doutor Vicente Bretas Cupertino Santo Antonio Do Grama Santo Antônio do Grama Minas Gerais 29/07/2024 -20.322672222222, -42.612488333333			
OCORRÊNCIAS			
NÚMERO DE OC	TIPO DE OCORRÊNCIA	DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA	
OBSERVAÇÕES			
DATA 22/07/2024 SEGUNDA FEIRA. LANÇAMENTO DE INFORMAÇÕES EM ATRAZO, A PARTIR DA LIBERAÇÃO E TRENAMENTO DE OPERAÇÃO DO SISTEMA WAY.			
CONFERÊNCIA			
MUNICÍPIO	CONSÓRCIO (Aprovado em 01/08/2024 - 15:54)		
Obs.:	Obs.:		
ASSINATURAS			
YURI ANDRADE COSTA LINS Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 233590/D		PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA CREA 137.103/D	
		ANTÔNIO CARLOS MARTINS BRANDÃO RT de Execução - PONTAL ENGENHARIA LTDA CREA 45.957/D	





Assinaturas do Documento



Documento Assinado Eletronicamente por **PEDRO MARTINO ZEFERINO**, CPF: 015.49*. **6- *9 em **21/08/2024 09:47:00**, Cód. Autenticidade da Assinatura: **09V4.4747.000V.W11X.0660**, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Documento Assinado Eletronicamente por **YURI ANDRADE COSTA LINS**, CPF: 084.94*. **6- *2 em **20/08/2024 17:01:17**, Cód. Autenticidade da Assinatura: **17E1.7K01.7173.232V.3772**, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Documento Assinado Eletronicamente por **ANTONIO CARLOS MARTINS BRANDÃO**, CPF: 385.06*. **6- *4 em **20/08/2024 16:51:05**, Cód. Autenticidade da Assinatura: **16Z0.4V51.505R.A532.3147**, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Informações do Documento

ID do Documento: **8CD.682** - Tipo de Documento: **FORMULÁRIO DE MEDIÇÕES.**

Elaborado por **GILBERTO ARAUJO GOMIDES**, CPF: 069.58*. **6- *7 , em **20/08/2024 - 16:29:55**

Código de Autenticidade deste Documento: 1638.7E29.5551.813R.7287

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:

<https://zeropapel.cimvalpi.mg.gov.br/verdocumento>

