

23/02/2024, 11:39

sistemas.waysistemas.com/cimvalpi/Blk_Medicao_Relatorio_Parcial/#



FORMULÁRIO DE MEDIÇÕES

RELATÓRIO PARCIAL (SITUAÇÃO: APROVADA PELO CONSÓRCIO)

Enviado por LUCAS CARVALHO SOARES em 20/02/2024 - 09:32

Registro: 20/02/2024			11ª MEDIÇÃO																	
Obra: CTP 229/2023 - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA			Período de 21/01/2024 a 20/02/2024																	
Local: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA																				
OBSERVAÇÕES																				
Enviada por LUCAS CARVALHO SOARES (FORNECEDOR) em 20/02/2024 às 09:32																				
							QUANTIDADE MEDIDA				VALOR MEDIDO									
ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	NESTA MEDIÇÃO	ACUMULADA	VALOR PREVISTO (BDI)	VALOR PREVISTO (ADMC)	NESTA MEDIÇÃO (BDI)	NESTA MEDIÇÃO (ADMC)	ACUMULADA (BDI)	ACUMULADA (ADMC)	SALDO (BDI)	SALDO (ADMC)				
01	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO																			
01.01	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA - para obras que exigem a utilização de grande quantidade de equipamentos e são executadas em centros urbanos ou próximos de centros urbanos. Obs.: Não se aplica aos serviços deTapa Buracos.																			
01.01.03	OBRAS DE VALOR ACIMA DE R\$ 3000.001,00 - MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA PAVIMENTAÇÃO, EXCLUSIVE PARA TAPA-BURACOS	%	0.2	R\$ 81.450.179,25	R\$ 166.536.094,60	R\$ 33.307.218,92	0.2	1.00003931964	R\$ 33.307.218,92	R\$ 43.749.032,06	R\$ 285,46	R\$ 295,34	R\$ 20.688,66	R\$ 23.467,81	R\$ 33.286.530,26	R\$ 43.725.564,25				
05.16	DRENAGEM COMPLEMENTAR																			
05.16.12	SARJETA DE CONCRETO EM ATERRO, TIPO DR. SCA-X/Y, LARGURA=100CM TIPO 70/30 (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)	M	5957.5	R\$ 72,58	R\$ 92,14	R\$ 548.924,05	585.85	5957.5	R\$ 548.924,05	R\$ 567.928,48	R\$ 53.980,22	R\$ 55.849,08	R\$ 548.924,05	R\$ 567.928,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00				
05.16.13	SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 02 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M	3450	R\$ 57,88	R\$ 73,48	R\$ 253.506,00	188	257.4	R\$ 253.506,00	R\$ 262.303,50	R\$ 13.814,24	R\$ 14.293,64	R\$ 18.913,75	R\$ 19.570,12	R\$ 234.592,25	R\$ 242.733,38				
05.16.16	VALETA DE PROTEÇÃO DE ATERROS COM REVESTIMENTO DE CONCRETO - VPA 04 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M	2267.5	R\$ 79,13	R\$ 100,45	R\$ 227.770,38	746	1225.3	R\$ 227.770,38	R\$ 235.661,28	R\$ 74.935,70	R\$ 77.531,78	R\$ 123.081,39	R\$ 127.345,43	R\$ 104.688,99	R\$ 108.315,85				
06	PAVIMENTAÇÃO																			
06.09	IMPRIMAÇÃO																			
06.09.01	IMPRIMAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)	m²	53475.53	R\$ 7,87	R\$ 9,99	R\$ 534.220,54	0	52220.42	R\$ 534.220,54	R\$ 552.936,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 521.682,00	R\$ 539.959,14	R\$ 12.538,54	R\$ 12.977,84				
06.10	PINTURA																			
06.10.01	PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-1C	m²	54475.53	R\$ 2,39	R\$ 3,04	R\$ 165.605,61	0	52220.42	R\$ 165.605,61	R\$ 171.053,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 158.750,08	R\$ 163.972,12	R\$ 6.855,53	R\$ 7.081,04				
06.11	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE																			
06.11.01	EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFALTICA ATÉ A PISTA	m³	2089.32	R\$ 1.370,82	R\$ 1.740,25	R\$ 3.635.939,13	0	2042.05	R\$ 3.635.939,13	R\$ 3.761.966,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.553.677,51	R\$ 3.676.853,97	R\$ 82.261,62	R\$ 85.112,94				
14	SERVICOS TÉCNICOS																			
14.01	TOPOGRAFIA																			
15	ADMINISTRAÇÃO LOCAL																			
15.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - % BASEADA ACORDÃO 2.622/2013 DO TCU SOBRE SOMA DOS ITENS 1 A 14	%	6.55	R\$ 132.737.097,60	R\$ 168.509.745,40	R\$ 1.103.738.832,37	6.55	52.400509054	R\$ 1.103.738.832,37	R\$ 1.141.993.663,94	R\$ 9.367,52	R\$ 9.692,02	R\$ 503.162,65	R\$ 528.984,28	R\$ 1.103.235.669,72	R\$ 1.141.464.679,66				
					TOTAL:												R\$ 152.383,14	R\$ 157.661,86	R\$ 11.656.728,83	R\$ 12.197.005,14



23/02/2024, 11:39

sistemas.waysistemas.com/cimvalpi/Blk_Medicao_Relatorio_Parcial/#

Luiz Henrique da Silva Borges
Fiscal de Obras - CIMVALPI
CREA 208579/D
Aprovação: 23/02/2024

PEDRO MARTINO ZEFERINO
Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA
CREA 137.103/D

Luciano Xavier de Castro
RT de Execução - CONSÓRCIO 3T –SOLOCAP-CONEP
CREA 59784/D





CIMVALPI
CONSORCIO INTERMUNICIPAL
MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº 0191	OBRA: CTP 229/2023 - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	CONTRATO:	RESP. TÉCNICO: LUCIANO XAVIER
ENDEREÇO: ESTRADA DE ACESSO ENTRE SANTO ANTÔNIO DO GRAMA E ABRE CAMPO		INÍCIO: 01/04/2023	Nº CREA-MG: 59784/D
CIDDE:		PRAZO: 01/10/2023	Nº DA ART:
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA		UF:	COORDENADAS:
DATA: 20/02/2024	SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA ☔
MANHÃ	✓		IMPRATICÁVEL ☁
TARDE	✓		
QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
2	ENCARREGADO DE OBRAS	1	OPERADOR
1	MOTORISTA	4	PEDREIRO
10	AJUDANTE		
QTDE	EQUIPAMENTO		
2	VEÍCULO DE APOIO		
1	SERRA CLIPPER		
1	CAMINHÃO BASCULANTE		
1	BETONEIRA		
TAREFAS REALIZADAS			
NÚMERO DE T.R.	DESCRIÇÃO	OBSERVAÇÕES	
1	EXECUÇÃO DE SARJETA		
2	SINALIZAÇÃO		
REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)			
 19 de fev. de 2024, 15:55:21 S 20° 17' 56", W 42° 34' 18" Altitude: 610.3meter Rapidez: 0.0km/h Data não informada			
OCORRÊNCIAS			
NÚMERO DE OC	TIPO DE OCORRÊNCIA	DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA	
OBSERVAÇÕES			
EQUIPE E05 19/02/2024			
CONFERÊNCIA			
MUNICÍPIO	CONSÓRCIO (Aprovado em 21/02/2024 - 15:08)		
Obs.:	Obs.: *Conforme executado em campo. *Apresentar mais fotos dos serviços.		
ASSINATURAS			
Luiz Henrique da Silva Borges Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 208579/D		PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA CREA 137.103/D	
		Luciano Xavier de Castro RT de Execução - CONSÓRCIO 3T -SOLOCAP-CONEPP CREA 59784/D	



CIMVALPI
CONSORCIO INTERMUNICIPAL
MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº 0190	OBRA: CTP 229/2023 - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	CONTRATO:	RESP. TÉCNICO: LUCIANO XAVIER
ENDEREÇO: ESTRADA DE ACESSO ENTRE SANTO ANTÔNIO DO GRAMA E ABRE CAMPO		INÍCIO: 01/04/2023	Nº CREA-MG: 59784/D
CIDDE:		PRAZO: 01/10/2023	Nº DA ART:
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA		UF:	COORDENADAS:
DATA: 15/02/2024	SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA ☔
MANHÃ	✓		IMPRATICÁVEL ☔
TARDE	✓		
QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
2	ENCARREGADO DE OBRAS	1	OPERADOR
1	MOTORISTA	4	PEDREIRO
10	AJUDANTE		
QTDE	EQUIPAMENTO		
2	VEÍCULO DE APOIO		
1	SERRA CLIPPER		
1	CAMINHÃO BASCULANTE		
1	RETROESCAVADEIRA		
1	BETONEIRA		
TAREFAS REALIZADAS			
NÚMERO DE T.R.	DESCRIÇÃO	OBSERVAÇÕES	
1	SINALIZAÇÃO		
2	EXECUÇÃO/REGULARIZAÇÃO DE VALA PARA SARJETA		
3	EXECUÇÃO DE SARJETA		
REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)			
 9 de fev. de 2024, 14:14:26 S 20° 17' 56", W 42° 34' 18" Altitude: 610.3meter Rapidez: 1.2km/h Data não informada  9 de fev. de 2024, 08:05:40 S 20° 17' 54", W 42° 34' 18" Altitude: 610.3meter Rapidez: 0.3km/h Data não informada  9 de fev. de 2024, 08:05:25 S 20° 17' 54", W 42° 34' 16" Altitude: 610.8meter Rapidez: 9.9km/h Data não informada  9 de fev. de 2024, 14:55:17 S 20° 17' 56", W 42° 34' 18" Altitude: 610.3meter Rapidez: 0.0km/h Data não informada			
OCORRÊNCIAS			
NÚMERO DE OC	TIPO DE OCORRÊNCIA	DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA	
OBSERVAÇÕES			
EQUIPE E05 09/02/2024			
CONFERÊNCIA			
MUNICÍPIO	CONSÓRCIO (Reprovado)		
Obs.:	Obs.: *Lançado fora do prazo. REPROVADO.		
ASSINATURAS			



Luiz Henrique da Silva Borges Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 208579/D	PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA CREA 137.103/D	Luciano Xavier de Castro RT de Execução - CONSÓRCIO 3T –SOLOCAP-CONEP CREA 59784/D
--	--	--





CIMVALPI
CONSORCIO INTERMUNICIPAL
MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº 0189	OBRA: CTP 229/2023 - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA		CONTRATO:	RESP. TÉCNICO: LUCIANO XAVIER	
ENDEREÇO: ESTRADA DE ACESSO ENTRE SANTO ANTÔNIO DO GRAMA E ABRE CAMPO			INÍCIO: 01/04/2023	Nº CREA-MG: 59784/D	
CIDDE:			PRAZO: 01/10/2023	Nº DA ART:	
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA			UF:	COORDENADAS:	
DATA: 09/02/2024	SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA ☔	IMPRATICÁVEL 🌧	
MANHÃ	✓				
TARDE	✓				
QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO		QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	
2	ENCARREGADO DE OBRAS		1	OPERADOR	
1	MOTORISTA		4	PEDREIRO	
10	AJUDANTE				
QTDE	EQUIPAMENTO				
2	VEÍCULO DE APOIO				
1	SERRA CLIPPER				
1	CAMINHÃO BASCULANTE				
1	RETROESCAVADEIRA				
1	BETONEIRA				
TAREFAS REALIZADAS					
NÚMERO DE T.R.	DESCRIÇÃO		OBSERVAÇÕES		
REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)					
OCORRÊNCIAS					
NÚMERO DE OC	TIPO DE OCORRÊNCIA		DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA		
1			FALTA DE ENERGIA		
OBSERVAÇÕES					
EQUIPE E05 08/02/2024 DEVIDO A PROBLEMA NA REDE ELÉTRICA, NÃO FOI POSSÍVEL REALIZAR AS TEREFAS PREVISTAS.					
CONFERÊNCIA					
MUNICÍPIO	CONSÓRCIO (Aprovado em 14/02/2024 - 12:49)				
Obs.:	Obs.: *Conforme relatado no RDO.				
ASSINATURAS					
Luiz Henrique da Silva Borges Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 208579/D		PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA CREA 137.103/D		Luciano Xavier de Castro RT de Execução - CONSÓRCIO 3T –SOLOCAP-CONEP CREA 59784/D	



CIMVALPI
CONSORCIO INTERMUNICIPAL
MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº 0188	OBRA: CTP 229/2023 - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	CONTRATO:	RESP. TÉCNICO: LUCIANO XAVIER
ENDEREÇO: ESTRADA DE ACESSO ENTRE SANTO ANTÔNIO DO GRAMA E ABRE CAMPO		INÍCIO: 01/04/2023	Nº CREA-MG: 59784/D
CIDDE:		PRAZO: 01/10/2023	Nº DA ART:
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA		UF:	COORDENADAS:
DATA: 08/02/2024	SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA ☔
MANHÃ	✓		IMPRATICÁVEL ☔
TARDE	✓		
QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
2	ENCARREGADO DE OBRAS	1	OPERADOR
1	MOTORISTA	4	PEDREIRO
10	AJUDANTE		
QTDE	EQUIPAMENTO		
2	VEÍCULO DE APOIO		
1	SERRA CLIPPER		
1	CAMINHÃO BASCULANTE		
1	RETROESCAVADEIRA		
1	BETONEIRA		
TAREFAS REALIZADAS			
NÚMERO DE T.R.	DESCRICAO	OBSERVAÇÕES	
1	EXECUÇÃO DE SARJETA		
2	SINALIZAÇÃO		
3	EXECUÇÃO/REGULARIZAÇÃO DE VALA PARA SARJETA		
REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)			
 7 de fev. de 2024, 12:38:00 S 20° 18' 3" W 42° 34' 22" Altitude: 607.6meter Rapidez: 18.2km/h Data não informada  7 de fev. de 2024, 14:51:21 S 20° 17' 59" W 42° 34' 22" Altitude: 610.8meter Rapidez: 0.0km/h Data não informada  7 de fev. de 2024, 12:38:09 S 20° 17' 59" W 42° 34' 22" Altitude: 606.9meter Rapidez: 0.0km/h Data não informada			
OCORRÊNCIAS			
NÚMERO DE OC	TIPO DE OCORRÊNCIA	DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA	
OBSERVAÇÕES			
EQUIPE E05 07/02/2024			
CONFERÊNCIA			
MUNICÍPIO	CONSÓRCIO (Aprovado em 14/02/2024 - 12:56)		
Obs.:	Obs.: *Construção de sarjetas Est. 225 a Est. 228 total de 102,20 mts.		
ASSINATURAS			



Luiz Henrique da Silva Borges Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 208579/D	PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA CREA 137.103/D	Luciano Xavier de Castro RT de Execução - CONSÓRCIO 3T –SOLOCAP-CONEP CREA 59784/D
--	--	--





CIMVALPI
CONSORCIO INTERMUNICIPAL
MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº 0187	OBRA: CTP 229/2023 - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	CONTRATO:	RESP. TÉCNICO: LUCIANO XAVIER
ENDEREÇO: ESTRADA DE ACESSO ENTRE SANTO ANTÔNIO DO GRAMA E ABRE CAMPO		INÍCIO: 01/04/2023	Nº CREA-MG: 59784/D
CIDDE:		PRAZO: 01/10/2023	Nº DA ART:
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA		UF:	COORDENADAS:
DATA: 07/02/2024	SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA ☔
MANHÃ	✓		IMPRATICÁVEL ☔
TARDE	✓		
QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
2	ENCARREGADO DE OBRAS	1	OPERADOR
1	MOTORISTA	4	PEDREIRO
10	AJUDANTE		
QTDE	EQUIPAMENTO		
2	VEÍCULO DE APOIO		
1	SERRA CLIPPER		
1	CAMINHÃO BASCULANTE		
1	RETROESCAVADEIRA		
1	BETONEIRA		
TAREFAS REALIZADAS			
NÚMERO DE T.R.	DESCRIÇÃO	OBSERVAÇÕES	
1	EXECUÇÃO/REGULARIZAÇÃO DE VALA PARA SARJETA		
2	SINALIZAÇÃO		
3	EXECUÇÃO DE SARJETA		
REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)			
 6 de fev. de 2024, 16:00:39 S 20° 17' 58", W 42° 34' 21" Altitude: 630.6meter Rapidez: 5.8km/h Data não informada  6 de fev. de 2024, 14:55:09 S 20° 18' 5", W 42° 34' 22" Altitude: 630.6meter Rapidez: 0.2km/h Data não informada  6 de fev. de 2024, 09:51:26 S 20° 18' 3", W 42° 34' 22" Altitude: 605.6meter Rapidez: 0.0km/h Data não informada			
OCORRÊNCIAS			
NÚMERO DE OC	TIPO DE OCORRÊNCIA	DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA	
OBSERVAÇÕES			
EQUIPE E05 06/02/2024			
CONFERÊNCIA			
MUNICÍPIO	CONSÓRCIO (Aprovado em 08/02/2024 - 16:28)		
Obs.:	Obs.: *Construção de sarjetas com 109,80 com descida da água nas Est. 214 a Est. 228 lado esquerdo.		
ASSINATURAS			



Luiz Henrique da Silva Borges Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 208579/D	PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA CREA 137.103/D	Luciano Xavier de Castro RT de Execução - CONSÓRCIO 3T –SOLOCAP-CONEP CREA 59784/D
--	--	--





CIMVALPI
CONSORCIO INTERMUNICIPAL
MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº 0186	OBRA: CTP 229/2023 - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	CONTRATO:	RESP. TÉCNICO: LUCIANO XAVIER
ENDEREÇO: ESTRADA DE ACESSO ENTRE SANTO ANTÔNIO DO GRAMA E ABRE CAMPO		INÍCIO: 01/04/2023	Nº CREA-MG: 59784/D
CIDDE:		PRAZO: 01/10/2023	Nº DA ART:
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA		UF:	COORDENADAS:
DATA: 06/02/2024	SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA ☔
MANHÃ	✓		IMPRATICÁVEL ☔
TARDE	✓		
QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
2	ENCARREGADO DE OBRAS	1	OPERADOR
1	MOTORISTA	4	PEDREIRO
10	AJUDANTE		
QTDE	EQUIPAMENTO		
2	VEÍCULO DE APOIO		
1	SERRA CLIPPER		
1	CAMINHÃO BASCULANTE		
1	RETROESCAVADEIRA		
1	BETONEIRA		
TAREFAS REALIZADAS			
NÚMERO DE T.R.	DESCRIÇÃO	OBSERVAÇÕES	
1	SINALIZAÇÃO		
2	EXECUÇÃO DE CORTE E REATERRO ATRÁS DA SARJETA		
3	EXECUÇÃO DE SARJETA		
REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)			
 Data não informada			
OCORRÊNCIAS			
NÚMERO DE OC	TIPO DE OCORRÊNCIA	DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA	
OBSERVAÇÕES			
EQUIPE E05 05/02/2024			
CONFERÊNCIA			
MUNICÍPIO	CONSÓRCIO (Aprovado em 07/02/2024 - 10:04)		
Obs.:	Obs.: *Construção de sarjetas 100 mts nas Est. 209 a Est. 215.		
ASSINATURAS			
Luiz Henrique da Silva Borges Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 208579/D		PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA CREA 137.103/D	
		Luciano Xavier de Castro RT de Execução - CONSÓRCIO 3T –SOLOCAP-CONEPP CREA 59784/D	



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº 0185	OBRA: CTP 229/2023 - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	CONTRATO:		RESP. TÉCNICO: LUCIANO XAVIER
ENDEREÇO: ESTRADA DE ACESSO ENTRE SANTO ANTÔNIO DO GRAMA E ABRE CAMPO		INÍCIO: 01/04/2023		Nº CREA-MG: 59784/D
CIDDE:		PRAZO: 01/10/2023		Nº DA ART:
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA		UF:		COORDENADAS:
DATA: 05/02/2024	SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA ☔	IMPRATICÁVEL ☁
MANHÃ	✓			
TARDE	✓			
QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	
2	ENCARREGADO DE OBRAS	1	MOTORISTA	
4	PEDREIRO	10	AJUDANTE	
QTDE	EQUIPAMENTO			
2	VEÍCULO DE APOIO			
1	SERRA CLIPPER			
1	CAMINHÃO BASCULANTE			
1	BETONEIRA			
TAREFAS REALIZADAS				
NÚMERO DE T.R.	DESCRICAÇÃO	OBSERVAÇÕES		
1	SINALIZAÇÃO			
2	EXECUÇÃO DE SARJETA			
3	EXECUÇÃO DE VPA			

REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)



Data não informada



Data não informada



Data não informada



Data não informada





Data não informada

OCORRÊNCIAS	
NÚMERO DE OC	TIPO DE OCORRÊNCIA
DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA	
OBSERVAÇÕES	
EQUIPE E05 02/02/2024	
CONFERÊNCIA	
MUNICÍPIO	CONSÓRCIO (Aprovado em 07/02/2024 - 10:02)
Obs.:	Obs.: *Construção de sarjetas nas Est. 205 a Est. 211 lado esquerdo - Total de 115,90mts.
ASSINATURAS	
Luiz Henrique da Silva Borges Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 208579/D	PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA CREA 137.103/D
Luciano Xavier de Castro RT de Execução - CONSÓRCIO 3T - SOLOCAP-CONEP CREA 59784/D	





CIMVALPI
CONSORCIO INTERMUNICIPAL
MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº 0184	OBRA: CTP 229/2023 - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	CONTRATO:	RESP. TÉCNICO: LUCIANO XAVIER
ENDEREÇO: ESTRADA DE ACESSO ENTRE SANTO ANTÔNIO DO GRAMA E ABRE CAMPO		INÍCIO: 01/04/2023	Nº CREA-MG: 59784/D
CIDDE:		PRAZO: 01/10/2023	Nº DA ART:
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA		UF:	COORDENADAS:
DATA: 02/02/2024	SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA ☔
MANHÃ	✓		IMPRATICÁVEL ☁
TARDE	✓		
QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
2	ENCARREGADO DE OBRAS	1	MOTORISTA
4	PEDREIRO	10	AJUDANTE
QTDE	EQUIPAMENTO		
2	VEÍCULO DE APOIO		
1	SERRA CLIPPER		
1	CAMINHÃO BASCULANTE		
1	BETONEIRA		
TAREFAS REALIZADAS			
NÚMERO DE T.R.	DESCRICAO	OBSERVAÇÕES	
1	SINALIZAÇÃO		
2	EXECUÇÃO DE SARJETA		
3	EXECUÇÃO DE VPA		
REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)			
 1 de fev de 2024, 15:09:14 S 20° 18' 22" W 42° 34' 53" Santo Antônio Do Grama MG 35388-000 Brasil Altitude: 591.9meter Rapidez: 3.8km/h Data não informada  1 de fev de 2024, 15:08:28 Altitude: 590.3meter Rapidez: 2.1km/h Data não informada  1 de fev de 2024, 15:09:07 S 20° 18' 22" W 42° 34' 53" Santo Antônio Do Grama MG 35388-000 Brasil Altitude: 590.9meter Rapidez: 1.2km/h Data não informada			
OCORRÊNCIAS			
NÚMERO DE OC	TIPO DE OCORRÊNCIA	DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA	
OBSERVAÇÕES			
EQUIPE E05 01/02/2024			
CONFERÊNCIA			
MUNICÍPIO			
CONSÓRCIO (Aprovado em 05/02/2024 - 08:40)			
Obs.:		Obs.: *Construção de valetas da Est. 168 a Est. 169 + 10 - Total de 28,20mts e construção de sarjetas da Est. 159 até Est 166 - Total 113,80mts.	
ASSINATURAS			



Luiz Henrique da Silva Borges Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 208579/D	PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA CREA 137.103/D	Luciano Xavier de Castro RT de Execução - CONSÓRCIO 3T –SOLOCAP-CONEP CREA 59784/D
--	--	--





RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº 0183	OBRA: CTP 229/2023 - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	CONTRATO:	RESP. TÉCNICO: LUCIANO XAVIER
ENDEREÇO: ESTRADA DE ACESSO ENTRE SANTO ANTÔNIO DO GRAMA E ABRE CAMPO		INÍCIO: 01/04/2023	Nº CREA-MG: 59784/D
CIDDE:		PRAZO: 01/10/2023	Nº DA ART:
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA		UF:	COORDENADAS:
DATA: 01/02/2024	SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA ☔
MANHÃ	✓		IMPRATICÁVEL ☔
TARDE	✓		
QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
2	ENCARREGADO DE OBRAS	1	MOTORISTA
4	PEDREIRO	10	AJUDANTE
QTDE	EQUIPAMENTO		
2	VEÍCULO DE APOIO		
1	SERRA CLIPPER		
1	CAMINHÃO BASCULANTE		
1	BETONEIRA		
TAREFAS REALIZADAS			
NÚMERO DE T.R.	DESCRICAÇÃO	OBSERVAÇÕES	
1	EXECUÇÃO DE SARJETA		
2	SINALIZAÇÃO		
REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)			
 31 de jan. de 2024, 15:37:34 S 20° 18' 20" W 42° 34' 48" Santo Antônio Do Grama MG 35388-000 Brasil Altitude: 598.2 meter Rapidez: 3.4 km/h Data não informada  31 de jan. de 2024, 15:37:27 S 20° 18' 20" W 42° 34' 48" Santo Antônio Do Grama MG 35388-000 Brasil Altitude: 595.3 meter Rapidez: 0.0 km/h Data não informada  31 de jan. de 2024, 15:08:34 S 20° 18' 20" W 42° 34' 49" Santo Antônio Do Grama MG 35388-000 Brasil Altitude: 594.3 meter Rapidez: 0.0 km/h Data não informada			
OCORRÊNCIAS			
NÚMERO DE OC	TIPO DE OCORRÊNCIA	DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA	
OBSERVAÇÕES			
EQUIPE E05 31/01/2024			
CONFERÊNCIA			
MUNICÍPIO	CONSÓRCIO (Aprovado em 05/02/2024 - 08:38)		
Obs.:	Obs.: *Construção de sarjetas Est. 164 a Est. 170 - Total de 125,80 mts.		
ASSINATURAS			

Luiz Henrique da Silva Borges
Fiscal de Obras - CIMVALPI
CREA 208579/D

PEDRO MARTINO ZEFERINO
Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA
CREA 137.103/D

Luciano Xavier de Castro
RT de Execução - CONSÓRCIO 3T - SOLOCAP-CONEP
CREA 59784/D







CIMVALPI
CONSORCIO INTERMUNICIPAL
MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº 0182	OBRA: CTP 229/2023 - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	CONTRATO:	RESP. TÉCNICO: LUCIANO XAVIER
ENDEREÇO: ESTRADA DE ACESSO ENTRE SANTO ANTÔNIO DO GRAMA E ABRE CAMPO		INÍCIO: 01/04/2023	Nº CREA-MG: 59784/D
CIDDE:		PRAZO: 01/10/2023	Nº DA ART:
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA		UF:	COORDENADAS:
DATA: 31/01/2024	SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA ☔
MANHÃ	✓		IMPRATICÁVEL 🌧
TARDE	✓		
QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
2	ENCARREGADO DE OBRAS	1	MOTORISTA
4	PEDREIRO	10	AJUDANTE
QTDE	EQUIPAMENTO		
2	VEÍCULO DE APOIO		
1	SERRA CLIPPER		
1	CAMINHÃO BASCULANTE		
2	BETONEIRA		
TAREFAS REALIZADAS			
NÚMERO DE T.R.	DESCRIÇÃO	OBSERVAÇÕES	
1	SINALIZAÇÃO		
2	EXECUÇÃO DE SARJETA		
REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)			
 30 de jan. de 2024, 14:04:58 S 20° 18' 11", W 42° 34' 28" Altitude: 607.2meter Rapidez: 2.7km/h Data não informada		 30 de jan. de 2024, 16:57:40 Altitude: 598.0meter Rapidez: 2.5km/h Data não informada	
OCORRÊNCIAS			
NÚMERO DE OC	TIPO DE OCORRÊNCIA	DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA	
OBSERVAÇÕES			
EQUIPE E05 30/01/2024			
CONFERÊNCIA			
MUNICÍPIO	CONSÓRCIO (Aprovado em 05/02/2024 - 08:36)		
Obs.:	Obs.: *Construção de sarjetas Est. 202 a Est. 207 - Total 116,20 mts.		
ASSINATURAS			
Luiz Henrique da Silva Borges Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 208579/D		PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA CREA 137.103/D	
Luciano Xavier de Castro RT de Execução - CONSÓRCIO 3T - SOLOCAP-CONEP CREA 59784/D			



CIMVALPI
CONSORCIO INTERMUNICIPAL
MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº 0181	OBRA: CTP 229/2023 - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	CONTRATO:	RESP. TÉCNICO: LUCIANO XAVIER
ENDEREÇO: ESTRADA DE ACESSO ENTRE SANTO ANTÔNIO DO GRAMA E ABRE CAMPO		INÍCIO: 01/04/2023	Nº CREA-MG: 59784/D
CIDDE:		PRAZO: 01/10/2023	Nº DA ART:
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA		UF:	COORDENADAS:
DATA: 30/01/2024	SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA ☔
MANHÃ	✓		IMPRATICÁVEL ☁
TARDE	✓		
QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
2	ENCARREGADO DE OBRAS	1	MOTORISTA
4	PEDREIRO	10	AJUDANTE
QTDE	EQUIPAMENTO		
2	VEÍCULO DE APOIO		
1	SERRA CLIPPER		
1	CAMINHÃO BASCULANTE		
1	BETONEIRA		
TAREFAS REALIZADAS			
NÚMERO DE T.R.	DESCRIÇÃO	OBSERVAÇÕES	
1	SINALIZAÇÃO		
2	EXECUÇÃO DE SARJETA		
REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)			
 Data não informada		 Data não informada	
OCORRÊNCIAS			
NÚMERO DE OC	TIPO DE OCORRÊNCIA	DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA	
OBSERVAÇÕES			
EQUIPE E05 29/01/2024			
CONFERÊNCIA			
MUNICÍPIO	CONSÓRCIO (Aprovado em 05/02/2024 - 09:10)		
Obs.:	Obs.: *Construção de sarjetas nas Est. 246 a Est.252 - Total 105,90mts.		
ASSINATURAS			
Luiz Henrique da Silva Borges Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 208579/D		PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA CREA 137.103/D	
Luciano Xavier de Castro RT de Execução - CONSÓRCIO 3T -SOLOCAP-CONEP CREA 59784/D			



CIMVALPI
CONSORCIO INTERMUNICIPAL
MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº 0180	OBRA: CTP 229/2023 - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA		CONTRATO:	RESP. TÉCNICO: LUCIANO XAVIER	
ENDEREÇO: ESTRADA DE ACESSO ENTRE SANTO ANTÔNIO DO GRAMA E ABRE CAMPO		INÍCIO: 01/04/2023		Nº CREA-MG: 59784/D	
CIDDE:		PRAZO: 01/10/2023		Nº DA ART:	
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA		UF:		COORDENADAS:	
DATA: 30/01/2024	SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA ☔	IMPRATICÁVEL 🌧	
MANHÃ		✓			
TARDE		✓			
QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO		QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	
2	ENCARREGADO DE OBRAS		1	MOTORISTA	
4	PEDREIRO		10	AJUDANTE	
QTDE	EQUIPAMENTO				
2	VEÍCULO DE APOIO				
1	SERRA CLIPPER				
1	CAMINHÃO BASCULANTE				
1	BETONEIRA				
TAREFAS REALIZADAS					
NÚMERO DE T.R.	DESCRICAÇÃO		OBSERVAÇÕES		
1	SINALIZAÇÃO				
2	REPARO EM SARJETAS DANIFICADAS PELA CHUVA				
REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)					
 26 de jan. de 2024, 14:50:44 S 20° 18' 37" W 42° 35' 59" Santo Antônio Do Grama MG 35388-000 Brasil Altitude: 482.6 meter Rapidez: 0.0 km/h Data não informada  26 de jan. de 2024, 14:50:55 S 20° 18' 37" W 42° 35' 59" Santo Antônio Do Grama MG 35388-000 Brasil Altitude: 486.4 meter Rapidez: 4.3 km/h Data não informada					
OCORRÊNCIAS					
NÚMERO DE OC	TIPO DE OCORRÊNCIA		DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA		
OBSERVAÇÕES					
EQUIPE E05 26/01/2024					
CONFERÊNCIA					
MUNICÍPIO		CONSÓRCIO (Reprovado)			
Obs.:		Obs.: *Recuperação de sarjetas danificadas 80,60mts. *Rdo lançado fora do período (REPROVADO).			
ASSINATURAS					
Luiz Henrique da Silva Borges Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 208579/D		PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA CREA 137.103/D		Luciano Xavier de Castro RT de Execução - CONSÓRCIO 3T -SOLOCAP-CONEPP CREA 59784/D	





CIMVALPI
CONSORCIO INTERMUNICIPAL
MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº 0179	OBRA: CTP 229/2023 - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	CONTRATO:	RESP. TÉCNICO: LUCIANO XAVIER
ENDEREÇO: ESTRADA DE ACESSO ENTRE SANTO ANTÔNIO DO GRAMA E ABRE CAMPO		INÍCIO: 01/04/2023	Nº CREA-MG: 59784/D
CIDDE:		PRAZO: 01/10/2023	Nº DA ART:
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA		UF:	COORDENADAS:
DATA: 26/01/2024	SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA ☔
MANHÃ		✓	IMPRATICÁVEL ☔
TARDE		✓	
QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
2	ENCARREGADO DE OBRAS	1	MOTORISTA
4	PEDREIRO	10	AJUDANTE
QTDE	EQUIPAMENTO		
2	VEÍCULO DE APOIO		
1	SERRA CLIPPER		
1	CAMINHÃO BASCULANTE		
1	BETONEIRA		
TAREFAS REALIZADAS			
NÚMERO DE T.R.	DESCRIÇÃO	OBSERVAÇÕES	
1	EXECUÇÃO DE VALETA	RETRABALHOS: 18M	
2	SINALIZAÇÃO		
3	REPARO EM SARJETAS DANIFICADAS PELA CHUVA		
4	EXECUÇÃO DE SARJETA	RETRABALHO: 19M	
5	EXECUÇÃO DE DESCIDA D'ÁGUA	RETRABALHO: 12M	
REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)			
 Data não informada  Data não informada  Data não informada  Data não informada			
OCORRÊNCIAS			
NÚMERO DE OC	TIPO DE OCORRÊNCIA	DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA	
1	A VAZÃO PLUVIAL FOI MAIOR QUE A PROJETADA, PROVOCANDO TRANSBORDAMENTO E DANOS DA ESTRUTURA. NESSE SENTIDO FOI NECESSÁRIO O RETRABALHO DAS PARTES DANIFICAS	RETRABALHO DE DRENAGEM SUPERFICIAL	
OBSERVAÇÕES			
EQUIPE E05 25/01/2024			
CONFERÊNCIA			
MUNICÍPIO		CONSÓRCIO (Aprovado em 26/01/2024 - 16:42)	



Obs.:		Obs.: *Decida dagua danificada 12,50 metros e valetas 23 metros. *Sarjetas danificadas, 63 metros.
ASSINATURAS		
Luiz Henrique da Silva Borges Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 208579/D	PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA CREA 137.103/D	Luciano Xavier de Castro RT de Execução - CONSÓRCIO 3T –SOLOCAP-CONEPP CREA 59784/D





CIMVALPI
CONSORCIO INTERMUNICIPAL
MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº 0178	OBRA: CTP 229/2023 - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	CONTRATO:	RESP. TÉCNICO: LUCIANO XAVIER
ENDEREÇO: ESTRADA DE ACESSO ENTRE SANTO ANTÔNIO DO GRAMA E ABRE CAMPO		INÍCIO: 01/04/2023	Nº CREA-MG: 59784/D
CIDDE:		PRAZO: 01/10/2023	Nº DA ART:
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA		UF:	COORDENADAS:
DATA: 25/01/2024	SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA ☔
MANHÃ			IMPRATICÁVEL ☁☔
TARDE			✓
QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
2	ENCARREGADO DE OBRAS	1	MOTORISTA
3	PEDREIRO	8	AJUDANTE
QTDE	EQUIPAMENTO		
2	VEÍCULO DE APOIO		
1	CAMINHÃO BASCULANTE		
TAREFAS REALIZADAS			
NÚMERO DE T.R.	DESCRICAO	OBSERVAÇÕES	
REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)			
OCORRÊNCIAS			
NÚMERO DE OC	TIPO DE OCORRÊNCIA	DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA	
OBSERVAÇÕES			
EQUIPE E05 24/01/2024 EQUIPE À DISPOSIÇÃO, POIS NÃO HOUVE ATIVIDADES DEVIDO AO TEMPO CHUVOSO			
CONFERÊNCIA			
MUNICÍPIO			
		CONSÓRCIO (Aprovado em 26/01/2024 - 08:40)	
Obs.:		Obs.: Sem atividades devido a chuva. *Decida dagua danificada 12,50 metros e valetas 23 metros. *Sarjetas danificadas, 63 metros.	
ASSINATURAS			
Luiz Henrique da Silva Borges Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 208579/D		PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA CREA 137.103/D	
		Luciano Xavier de Castro RT de Execução - CONSÓRCIO 3T -SOLOCAP-CONEP CREA 59784/D	



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº 0177	OBRA: CTP 229/2023 - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	CONTRATO:	RESP. TÉCNICO: LUCIANO XAVIER
ENDEREÇO: ESTRADA DE ACESSO ENTRE SANTO ANTÔNIO DO GRAMA E ABRE CAMPO	INÍCIO: 01/04/2023	Nº CREA-MG: 59784/D	
CIDDE:	PRAZO: 01/10/2023	Nº DA ART:	
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA	UF:	COORDENADAS:	
DATA: 24/01/2024	SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA ☔
MANHÃ	✓		IMPRATICÁVEL ☔
TARDE	✓		
QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
2	ENCARREGADO DE OBRAS	1	MOTORISTA
3	PEDREIRO	8	AJUDANTE
QTDE	EQUIPAMENTO		
2	VEÍCULO DE APOIO		
1	CAMINHÃO BASCULANTE		
TAREFAS REALIZADAS			
NÚMERO DE T.R.	DESCRIÇÃO	OBSERVAÇÕES	
1	EXECUÇÃO MANUAL DE VALA P/ SARJETA TRIANGULAR		
2	SINALIZAÇÃO		
3	EXECUÇÃO DE SARJETA TRIANGULAR		

REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)




Data não informada



Data não informada



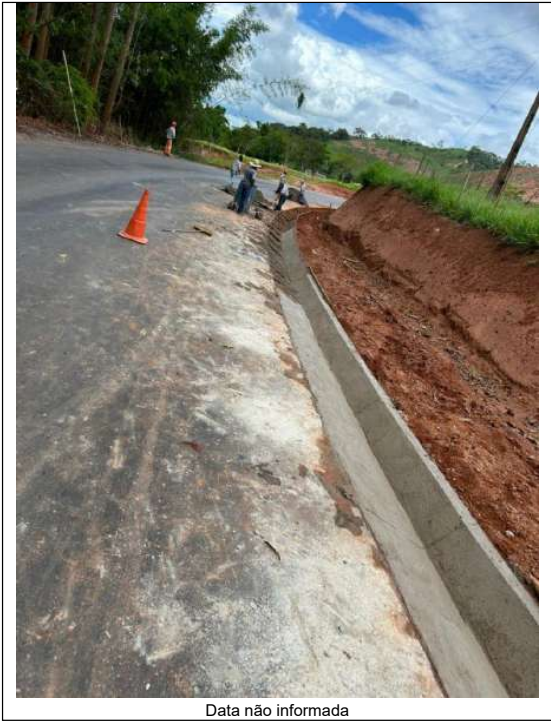

Data não informada



Data não informada

OCORRÊNCIAS		
NÚMERO DE OC	TIPO DE OCORRÊNCIA	DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA
OBSERVAÇÕES		
EQUIPE E05 23/01/2024		
CONFERÊNCIA		
MUNICÍPIO	CONSÓRCIO (Aprovado em 26/01/2024 - 08:34)	
Obs.:	Obs.: Construção de sarjeta nas Est. 257 a Est. 263, com total de 114 metros.	
ASSINATURAS		
Luiz Henrique da Silva Borges Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 208579/D	PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA CREA 137.103/D	Luciano Xavier de Castro RT de Execução - CONSÓRCIO 3T –SOLOCAP-CONEPP CREA 59784/D




RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº 0176	OBRA: CTP 229/2023 - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	CONTRATO:		RESP. TÉCNICO: LUCIANO XAVIER
ENDEREÇO: ESTRADA DE ACESSO ENTRE SANTO ANTÔNIO DO GRAMA E ABRE CAMPO		INÍCIO: 01/04/2023		Nº CREA-MG: 59784/D
CIDDE:		PRAZO: 01/10/2023		Nº DA ART:
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA		UF:		COORDENADAS:
DATA: 23/01/2024	SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA ☔	IMPRATICÁVEL ☁
MANHÃ	✓			
TARDE	✓			
QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO		QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
2	ENCARREGADO DE OBRAS		1	SUPERVISOR
1	MOTORISTA		2	PEDREIRO
7	AJUDANTE			
QTDE	EQUIPAMENTO			
2	VEÍCULO DE APOIO			
1	CAMINHÃO BASCULANTE			
TAREFAS REALIZADAS				
NÚMERO DE T.R.	DESCRIÇÃO		OBSERVAÇÕES	
1	SINALIZAÇÃO			
2	EXECUÇÃO DE SARJETA TRIANGULAR			

REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)



Data não informada

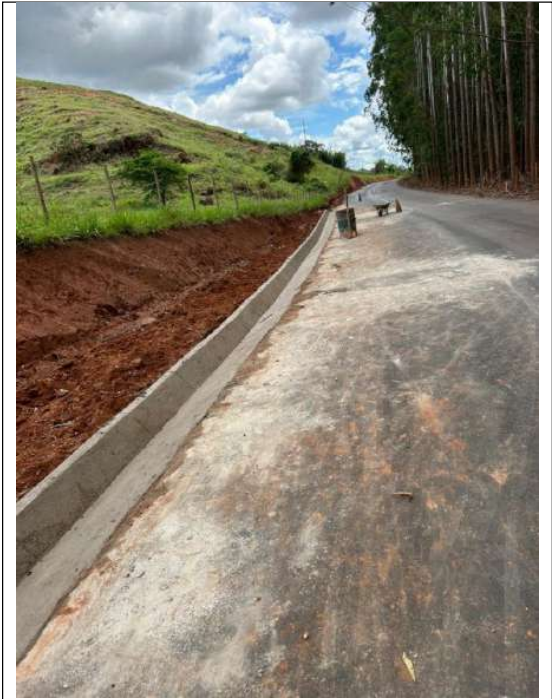

Data não informada



Data não informada

OCORRÊNCIAS		
NÚMERO DE OC	TIPO DE OCORRÊNCIA	DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA
OBSERVAÇÕES		
EQUIPE E05 22/01/2024		

CONFERÊNCIA	
MUNICÍPIO	CONSÓRCIO (Aprovado em 26/01/2024 - 08:30)
Obs.:	Obs.: Construção de sarjetas nas estacas 265 a 269 total de 86,20 metros lado esquerdo.
ASSINATURAS	
Luiz Henrique da Silva Borges Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 208579/D	PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA CREA 137.103/D
	Luciano Xavier de Castro RT de Execução - CONSÓRCIO 3T -SOLOCAP-CONEPP CREA 59784/D





CIMVALPI
CONSORCIO INTERMUNICIPAL
MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº 0175	OBRA: CTP 229/2023 - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	CONTRATO:	RESP. TÉCNICO: LUCIANO XAVIER
ENDEREÇO: ESTRADA DE ACESSO ENTRE SANTO ANTÔNIO DO GRAMA E ABRE CAMPO		INÍCIO: 01/04/2023	Nº CREA-MG: 59784/D
CIDDE:		PRAZO: 01/10/2023	Nº DA ART:
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA		UF:	COORDENADAS:
DATA: 22/01/2024	SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA ☔
MANHÃ	✓		IMPRATICÁVEL ☔
TARDE	✓		
QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
1	ENCARREGADO DE OBRAS	1	SUPERVISOR
1	MOTORISTA	5	PEDREIRO
11	AJUDANTE		
QTDE	EQUIPAMENTO		
2	VEÍCULO DE APOIO		
1	SERRA CLIPPER		
1	CAMINHÃO BASCULANTE		
1	BETONEIRA		
TAREFAS REALIZADAS			
NÚMERO DE T.R.	DESCRIÇÃO	OBSERVAÇÕES	
1	EXECUÇÃO DE SARJETA TRIANGULAR		
2	PREPARAÇÃO MANUAL/MECÂNICA DE TERRENO P/ DRENAGEM	DRENAGEM SUPERFICIAL	
3	SINALIZAÇÃO		
4	EXECUÇÃO DE DESCIDA D'ÁGUA		
5	LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA FRENTES DE SERVIÇO		
REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATORIOS)			
			
Data não informada		Data não informada	
			
Data não informada		Data não informada	
OCORRÊNCIAS			
NÚMERO DE OC	TIPO DE OCORRÊNCIA	DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA	
OBSERVAÇÕES			
EQUIPE E05 19/01/2024			
CONFERÊNCIA			
MUNICÍPIO		CONSÓRCIO (Reprovado)	
Obs.:		Obs.: *RDO REPROVADO, LANÇADO FORA DO PRAZO, COM FOTOS SEM LOCALIZAÇÃO E DATA.	
ASSINATURAS			
Luiz Henrique da Silva Borges Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 208579/D		PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA CREA 137.103/D	
		Luciano Xavier de Castro RT de Execução - CONSÓRCIO 3T -SOLOCAP-CONEP CREA 59784/D	



CIMVALPI
CONSORCIO INTERMUNICIPAL
MULTISETORIAL DO VALE DO PIRANGA

Assinaturas do Documento



Documento Assinado Eletronicamente por **LUCIANO XAVIER DE CASTRO**, CPF: 760.22*. **6- *5 em **26/02/2024 14:24:07**, Cód. Autenticidade da Assinatura: **1442.6U24.8073.X754.4334**, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Documento Assinado Eletronicamente por **PEDRO MARTINO ZEFERINO**, CPF: 015.49*. **6- *9 em **26/02/2024 13:47:09**, Cód. Autenticidade da Assinatura: **13R7.2U47.8089.H317.7606**, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Documento Assinado Eletronicamente por **LUIZ HENRIQUE DA SILVA BORGES**, CPF: 016.28*. **6- *7 em **23/02/2024 11:49:33**, Cód. Autenticidade da Assinatura: **1171.1E49.533K.R183.7746**, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Informações do Documento

ID do Documento: **3EC.80B** - Tipo de Documento: **FORMULÁRIO DE MEDIÇÕES.**

Elaborado por **JOSÉ MAURICIO PEREIRA DA SILVA FILHO**, CPF: 054.42*. **6- *8 , em **23/02/2024 - 11:48:41**

Código de Autenticidade deste Documento: 11U5.7U48.341Z.R21H.4842

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
<https://zeropapel.cimvalpi.mg.gov.br/verdocumento>

