

## FORMULÁRIO DE MEDIÇÕES

RELATÓRIO PARCIAL (SITUAÇÃO: APROVADA PELO CONSÓRCIO)

Enviado por PEDRO HENRIQUE TETTE HOSKEN em 18/10/2024 - 10:06

Registro: 18/10/2024							16ª MEDIÇÃO									
Obra: CTP 229/2023 - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA							Período de 21/09/2024 a 20/10/2024									
Local: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA																
OBSERVAÇÕES																
Enviada por PEDRO HENRIQUE TETTE HOSKEN (FORNECEDOR) em 18/10/2024 às 10:06																
ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	QUANTIDADE MEDIDA		VALOR MEDIDO		VALOR MEDIDO		VALOR MEDIDO		SALDO (BDI)	SALDO (ADMC)
							NESTA MEDIÇÃO	ACUMULADA	VALOR PREVISTO (BDI)	VALOR PREVISTO (ADMC)	NESTA MEDIÇÃO (BDI)	NESTA MEDIÇÃO (ADMC)	ACUMULADA (BDI)	ACUMULADA (ADMC)		
<b>04</b>	<b>TRABALHOS EM TERRA</b>															
04.03	ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA															
04.03.01	EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	m³	54169.88	R\$ 5,86	R\$ 7,44	R\$ 403.023,91	0.04	27084.94	R\$ 403.023,91	R\$ 417.108,08	R\$ 0,32	R\$ 0,33	R\$ 201.511,98	R\$ 208.554,06	R\$ 201.511,93	R\$ 208.554,02
04.03.03*	DESMONTE DE MATAÇÕES OU BLOCO DE ROCHA POR MEIO DE EXPLOSIVOS	M³	489.8	R\$ 39,61	R\$ 50,29	R\$ 24.632,04	489.8	489.8	R\$ 24.632,04	R\$ 25.983,89	R\$ 24.632,04	R\$ 25.983,89	R\$ 24.632,04	R\$ 25.983,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04.04	CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO															
04.04.02	MECANICA	m³	612.25	R\$ 2,11	R\$ 2,68	R\$ 1.640,83	612.25	612.25	R\$ 1.640,83	R\$ 1.695,93	R\$ 1.640,83	R\$ 1.695,93	R\$ 1.640,83	R\$ 1.695,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04.05	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA															
04.05.02	1 KM < DMT <= 2 KM	m³	3346.34	R\$ 11,92	R\$ 15,12	R\$ 50.596,66	612.25	1673.17	R\$ 50.596,66	R\$ 52.403,68	R\$ 4.806,16	R\$ 4.977,59	R\$ 12.826,72	R\$ 13.284,60	R\$ 37.769,94	R\$ 39.119,09
04.05.03	2 KM < DMT <= 5 KM	m³ x km	7584.49	R\$ 2,52	R\$ 3,20	R\$ 24.270,37	7584.49	7584.49	R\$ 24.270,37	R\$ 25.104,66	R\$ 24.270,37	R\$ 25.104,66	R\$ 24.270,37	R\$ 25.104,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>05</b>	<b>DRENAGEM URBANA</b>															
05.11	ENROCAMENTO COM PEDRA DE MÃO															
05.11.02	ARRUMADA	m³	481.25	R\$ 265,29	R\$ 336,79	R\$ 162.080,19	481.25	481.25	R\$ 162.080,19	R\$ 167.696,38	R\$ 162.080,19	R\$ 167.696,38	R\$ 162.080,19	R\$ 167.696,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05.13	FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE MATERIAL DRENANTE															
05.13.01	BRITA	m³	38.5	R\$ 176,74	R\$ 224,38	R\$ 8.638,63	38.5	38.5	R\$ 8.638,63	R\$ 8.937,78	R\$ 8.638,63	R\$ 8.937,78	R\$ 8.638,63	R\$ 8.937,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>07</b>	<b>OBRAS CIVIS (PONTES, PASSARELAS, CORTINAS E GABIÕES)</b>															
07.07	GABIÃO															
07.07.01	ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM SOLO MOLE COM DESCARGA DIRETA SOBRE CAMINHÃO	m³	1944.74	R\$ 16,85	R\$ 21,39	R\$ 41.597,99	1944.74	1944.74	R\$ 41.597,99	R\$ 43.037,10	R\$ 41.597,99	R\$ 43.037,10	R\$ 41.597,99	R\$ 43.037,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00
07.07.07	MANTA GEOTÊXTIL NÃO TECIDA, A/300, OP/30 OU SIMILAR, RESISTÊNCIA À TRAÇÃO DE 21 KN/M2 (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO, TRANSPORTE E COLOCAÇÃO)	m²	1540	R\$ 4,87	R\$ 6,19	R\$ 9.532,60	1540	1540	R\$ 9.532,60	R\$ 9.856,00	R\$ 9.532,60	R\$ 9.856,00	R\$ 9.532,60	R\$ 9.856,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>TOTAL:</b>											<b>R\$ 277.199,13</b>	<b>R\$ 287.289,65</b>	<b>R\$ 12.747.078,18</b>	<b>R\$ 13.325.607,76</b>		



---

JOSE MAURICIO PEREIRA DA SILVA  
Fiscal de Obras - CIMVALPI  
CREA 16403/D  
Aprovação: 25/10/2024

---



PEDRO MARTINO ZEFERINO  
Fiscal de Obras - SANTO ANTONIO DO GRAMA  
CREA 137.103/D


---

Luciano Xavier de Castro  
RT de Execução - CONSÓRCIO 3T - SOLOCAP - CONEPP - PAVOTEC  
CREA 59784/D



Relatório de RDO,s da 16ª Medição do CTP 239/2023

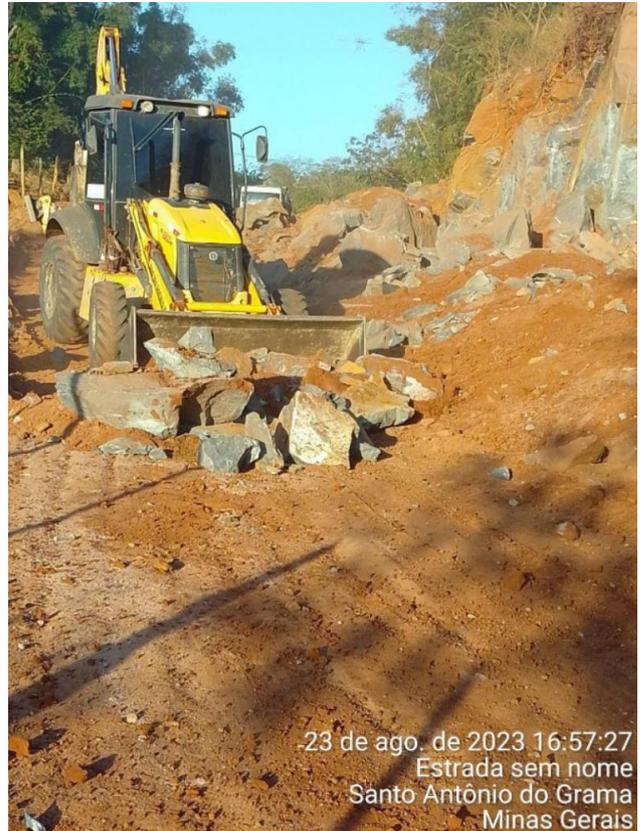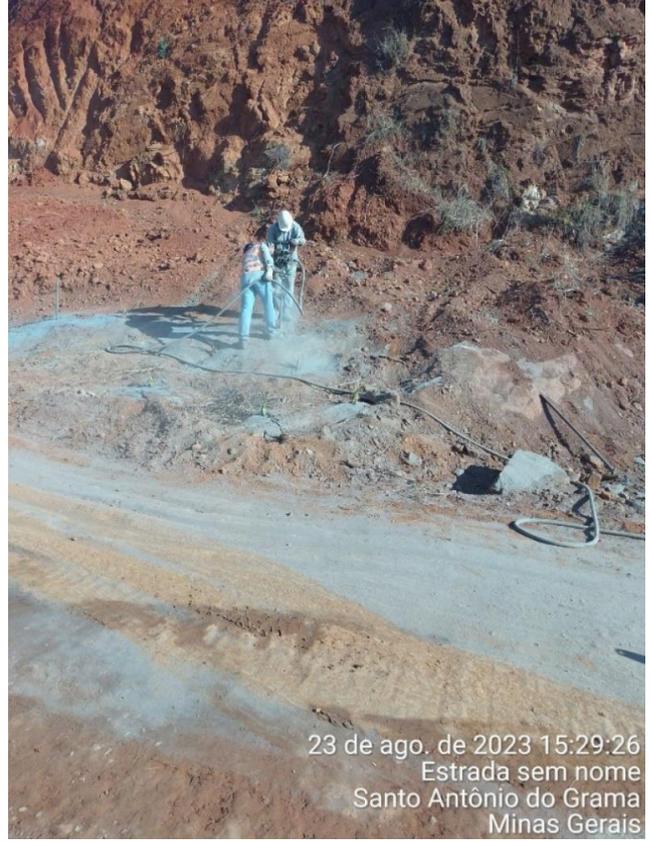

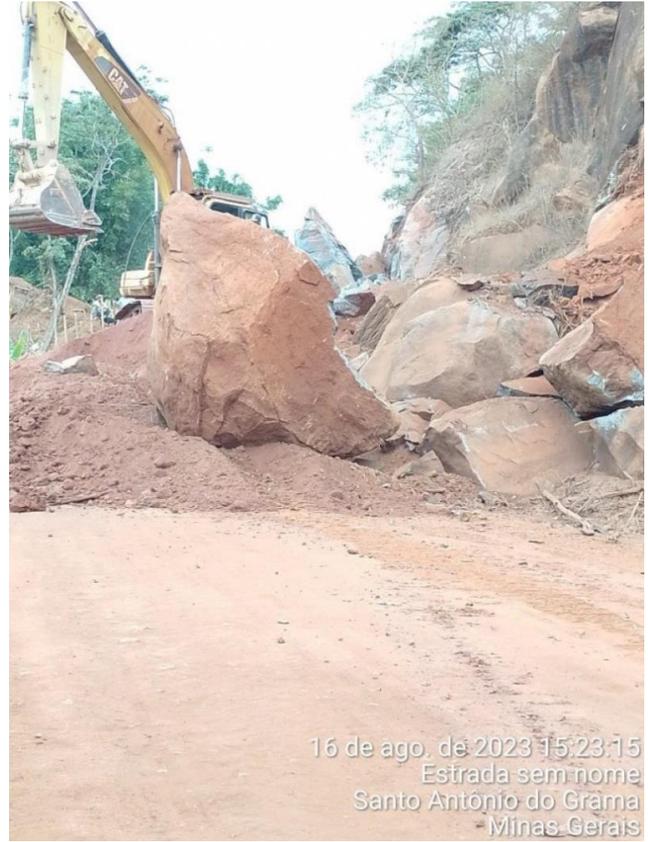

### **Desmonte de Matacões ou Blocos de Rocha por meio de Explosivos nas Estaca 74 e Estacas 89 à 91**

Foram necessárias intervenções de Desmonte de Material de 3ª Categoria nas Estacas citadas acima.

Este relatório tem a finalidade de demonstrar os RDO's desses serviços executados que não foram pagos no momento da execução e estão sendo liquidados nessa medição.

Abaixo estarão demonstrados os RDO's do local onde se executou o desvio da estrada, obrigando a se fazer uma intervenção com a retirada de solo mole, calçamento com matacões, transição com brita 3, manta Geotêxtil selo com argila e em seguida a sub-base, base e capa em CBUQ.





**Alargamento de pista ente as Estacas 179 e 186, onde executou-se retirada do solo mole enrocamento**  
Ponte Nova, 25 de outubro de 2024





**CIMVALPI**

CONSORCIO INTERMUNICIPAL  
MULTISETORIAL DO VALE DO PIRANGA

## Assinaturas do Documento



Documento Assinado Eletronicamente por **LUCIANO XAVIER DE CASTRO**, CPF: 760.22\*. \*\*6- \*5 em **28/10/2024 15:15:06**, Cód. Autenticidade da Assinatura: 1522.8A15.706R.A81R.8305, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Documento Assinado Eletronicamente por **EDUARDO PEREIRA REAL - ASSESSOR TÉCNICO**, CPF: 417.92\*. \*\*6- \*8 em **28/10/2024 11:26:01**, Cód. Autenticidade da Assinatura: 11V4.7A26.101Z.W86K.7010, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



## Informações do Documento

ID do Documento: **ACB.955** - Tipo de Documento: **FORMULÁRIO DE MEDIÇÕES.**

Elaborado por **GILBERTO ARAUJO GOMIDES**, CPF: 069.58\*. \*\*6- \*7 , em **25/10/2024 - 16:33:06**

Código de Autenticidade deste Documento: 16A4.6133.1067.9819.2603

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:  
<https://zeropapel.cimvalpi.mg.gov.br/verdocumento>

