

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 99.0209-21.2025.17

UNIDADE ADMINISTRATIVA: PROG-OBRAS - PROGRAMA DE SERVIÇOS E OBRAS CIVIS DE ENGENHARIA

PROCEDIMENTO: ADMINISTRATIVO - **TIPO DE PROCESSO:** OUTROS OBJETOS (FILHOTE) - OUTROS OBJETOS

DEPARTAMENTO/PROGRAMA ATUAL: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SITUAÇÃO: ARQUIVADO - **POSSUI PROCESSO FILHOTE:**

OBJETO: BM 01 CTP 191/2024 - PAVIMENTAÇÃO - 2º ADITIVO - IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE ACESSIBILIDADE

ABERTO EM: 04/06/2025 às 11:20:06

DOCUMENTOS JUNTADOS (16)

ID	TIPO DE DOCUMENTO	QTD PÁGS	JUNTADO EM
1.0CC.C33	TERMO DE ABERTURA	1	04/06/2025 às 11:20:06
1.0CC.E8B	FORMULÁRIO DE MEDIÇÕES	79	04/06/2025 às 11:22:01
1.0E5.F75	MEMORANDO	1	09/06/2025 às 08:09:26
1.103.0FA	ORDEM DE FORNECIMENTO DIGITALIZADO	2	11/06/2025 às 09:12:28
1.103.16F	NF - NOTA FISCAL	3	11/06/2025 às 09:12:29
1.106.E53	CONFORMIDADE DE LIQUIDAÇÃO	2	11/06/2025 às 11:31:44
1.107.25F	EXTRA ORÇAMENTO	2	11/06/2025 às 11:51:18
1.107.28C	EXTRA ORÇAMENTO	2	11/06/2025 às 11:51:19
1.107.331	EXTRA ORÇAMENTO	2	11/06/2025 às 11:51:20
1.107.3CA	EXTRA ORÇAMENTO	2	11/06/2025 às 11:53:31
1.107.442	DL - DOCUMENTO DE LIQUIDAÇÃO	2	11/06/2025 às 11:54:28
1.149.D88	COMPROVANTE DE PAGAMENTO	2	23/06/2025 às 11:24:04
1.149.DD7	COMPROVANTE DE PAGAMENTO	2	23/06/2025 às 11:24:05
1.149.E3B	COMPROVANTE DE PAGAMENTO	2	23/06/2025 às 11:24:06
1.149.EA2	COMPROVANTE DE PAGAMENTO	2	23/06/2025 às 11:24:07
1.149.EF9	COMPROVANTE DE PAGAMENTO	2	23/06/2025 às 11:24:08

PONTE NOVA - MG, 06 de novembro de 2025 às 11:46:59.

TERMO DE ABERTURA DE PROCESSO

Aos 04 dias do mês de junho de 2025, procedemos a abertura do Processo Nº **209/2025**

Para constar, eu JONATHAN GABRIEL SILVA SANTOS portador do CPF nº 141.95*.**6-*8, lavro o presente TERMO DE ABERTURA que constará nos auto administrativos.

Assinatura do Documento



Documento Assinado Eletronicamente por **JONATHAN GABRIEL SILVA SANTOS**, CPF: 141.95*.**6-*8 em **04/06/2025 11:20:06**, Cód. Autenticidade da Assinatura: **11A1.0A20.006A.473U.5584**, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Informações do Documento

ID do Documento: **1.0CC.C33** - Tipo de Documento: **TERMO DE ABERTURA**.

Elaborado por **JONATHAN GABRIEL SILVA SANTOS**, CPF: 141.95*.**6-*8, em **04/06/2025 11:20:06**, contendo 39 palavras.

Código de Autenticidade deste Documento: 1175.2620.1067.8176.7416

A autenticidade do documento pode ser conferida no site: <https://zeropapel.cimvalpi.mg.gov.br/verdocumento>





FORMULÁRIO DE MEDIÇÕES

RELATÓRIO PARCIAL (SITUAÇÃO: APROVADA PELO CONSÓRCIO)

Enviado por ANTONIO CARLOS MARTINS BRANDAO em 30/05/2025 - 12:16

Registro: 30/05/2025			1ª MEDIÇÃO									
Obra: 635.3 - CTP 191/2024 - PAVIMENTAÇÃO - 2º ADITIVO - IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE ACESSIBILIDADE			Período de 21/05/2025 a 28/05/2025									
Ordens de Serviço: 000412/2025			Local: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA									
OBSERVAÇÕES												
Enviada por ANTONIO CARLOS MARTINS BRANDAO (FORNECEDOR) em 30/05/2025 às 12:16												
							QUANTIDADE MEDIDA			VALOR MEDIDO		
ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	NESTA MEDIÇÃO	ACUMULADA	VALOR PREVISTO (BDI)	NESTA MEDIÇÃO (BDI)	ACUMULADA (BDI)	SALDO (BDI)
01	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO											
01.01	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA - para obras que exigem a utilização de grande quantidade de equipamentos e são executadas em centros urbanos ou próximos de centros urbanos. Obs.: Não se aplica aos serviços deTapa Buracos.											
01.01.01	OBRAS ATÉ O VALOR DE R\$ 1.000.000,00 - MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA PAVIMENTAÇÃO, EXCLUSIVE PARA TAPA-BURACOS	%	1.5	R\$ 25,00	R\$ 31,62	R\$ 47,43	0.5	0.5	R\$ 47,43	R\$ 283,26	R\$ 283,26	R\$ -235,83
02	INSTALAÇÕES DA OBRA											
02.07	TAPUME / ISOLAMENTOS											
02.07.03	CERCA DE 5 FIOS DE ARAME FARPA DO E MOURÕES DE EUCALIPTO	M	450	R\$ 33,36	R\$ 42,34	R\$ 19.053,00	150	150	R\$ 19.053,00	R\$ 6.351,00	R\$ 6.351,00	R\$ 12.702,00
04	TRABALHOS EM TERRA											
04.06	ATERRO E REATERRO COMPACTADO											
04.06.02	COM PLACA VIBRATORIA	m³	531.72	R\$ 16,89	R\$ 21,45	R\$ 11.405,39	177.24	177.24	R\$ 11.405,39	R\$ 3.801,80	R\$ 3.801,80	R\$ 7.603,59
04.08	ESCAVAÇÃO MECANICA DE VALAS COM DESCARGA LATERAL											



Cod. de Autenticidade do Doc.: 11E4.3622.4013.R27E.5511 - ZeroPapel - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA - MG

Proc. Adm: 99.0209-21.2025.17

04/06/2025, 11:11

sistemas.waysistemas.com/cimvalpi/Blk_Medicao_Relatorio_Parcial/

04.08.02	1.5 M < H <= 3.0 M	m³	759.6	R\$ 5,29	R\$ 6,73	R\$ 5.112,11	253.2	253.2	R\$ 5.112,11	R\$ 1.704,04	R\$ 1.704,04	R\$ 3.408,07
05	DRENAGEM URBANA											
05.08	BUEIRO TUBULAR											
05.08.04*	BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO, CLASSE CA-1. BSTC Ø1,20 M - CORPO (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E BERÇO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E COMPACTAÇÃO)	M	12	R\$ 1.273,95	R\$ 1.617,29	R\$ 19.407,48	6	6	R\$ 19.407,48	R\$ 9.703,74	R\$ 9.703,74	R\$ 9.703,74
05.08.20*	TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA1, DIÂMETRO 600MM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO	M	66	R\$ 232,29	R\$ 294,90	R\$ 19.463,40	22	22	R\$ 19.463,40	R\$ 6.487,80	R\$ 6.487,80	R\$ 12.975,60
05.08.21*	TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA1, DIÂMETRO 800MM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO	M	138	R\$ 381,38	R\$ 484,16	R\$ 66.814,08	46	46	R\$ 66.814,08	R\$ 22.271,36	R\$ 22.271,36	R\$ 44.542,72
05.10	CAIXA DE CAPTAÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL											
05.10.01	CAIXA DE CAPTAÇÃO E DRENAGEM TIPO A (100 X 100 X 120 CM), D = 500 MM A 1500MM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA FORA	un	9	R\$ 1.291,07	R\$ 1.639,02	R\$ 14.751,18	3	3	R\$ 14.751,18	R\$ 4.917,06	R\$ 4.917,06	R\$ 9.834,12
05.11	ENROCAMENTO COM PEDRA DE MÃO											
05.11.01	JOGADA	m³	16.8	R\$ 132,75	R\$ 168,53	R\$ 2.831,30	8.4	8.4	R\$ 2.831,30	R\$ 1.415,65	R\$ 1.415,65	R\$ 1.415,65
15	ADMINISTRAÇÃO LOCAL											
15.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - % BASEADA ACÓRDÃO 2.622/2013 DO TCU SOBRE SOMA DOS ITENS 1 A 14	%	19.65	R\$ 329,17	R\$ 416,25	R\$ 8.179,31	6.55	6.55	R\$ 8.179,31	R\$ 3.729,29	R\$ 3.729,29	R\$ 4.450,02
TOTAL:									R\$ 60.665,00	R\$ 60.665,00		

YURI ANDRADE COSTA LINS
Fiscal de Obras - CIMVALPI
CREA 233590/D
Aprovação: 02/06/2025

PEDRO MARTINO ZEFERINO
Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA
CREA 137.103/D

ANTÔNIO CARLOS MARTINS BRANDÃO
RT de Execução - PONTAL ENGENHARIA LTDA
CREA 45.957/D

https://sistemas.waysistemas.com/cimvalpi/Blk_Medicao_Relatorio_Parcial/





RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº 0151	OBRA: CTP 0191/2024 - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE ACESSIBILIDADE	CONTRATO:	RESP. TÉCNICO: ANTONIO CARLOS MARTINS BRANDÃO
ENDEREÇO: TRECHO DA RODOVIA DE ACESSO A SANTO ANTONIO DO GRAMA, BAIRRO NOVO HORIZONTE.		INÍCIO: 01/07/2024	Nº CREA-MG: 45957/D
CIDDE:		PRAZO: 31/12/2024	Nº DA ART:
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA		UF:	COORDENADAS:
DATA: 21/02/2025	SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA ☔
MANHÃ	✓		IMPRATICÁVEL ☔
TARDE	✓		
QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
1	ENCARREGADO	3	PEDREIRO
3	AJUDANTE		
QTDE	EQUIPAMENTO		
2	PÁ		
2	ENXADA		
2	CARRINHO DE MÃO		
TAREFAS REALIZADAS			
NÚMERO DE T.R.	DESCRICAO	OBSERVAÇÕES	
1	FIXAÇÃO E PINTURA DE GUARDA CORPO		
2	CONCRETAGEM DE CAIXA DE PASSAGEM		
3	LIMPEZA DE OBRA		
4	CONSTRUÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM		

REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)





OCORRÊNCIAS		
NÚMERO DE OC	TIPO DE OCORRÊNCIA	DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA
CONFERÊNCIA		
MUNICÍPIO	CONSÓRCIO (Aprovado em 24/02/2025 - 08:45)	
Obs.:	Obs.:	
ASSINATURAS		
YURI ANDRADE COSTA LINS Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 233590/D	PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA CREA 137.103/D	ANTÔNIO CARLOS MARTINS BRANDÃO RT de Execução - PONTAL ENGENHARIA LTDA CREA 45.957/D



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº 0150	OBRA: CTP 0191/2024 - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE ACESSIBILIDADE	CONTRATO:	RESP. TÉCNICO: ANTONIO CARLOS MARTINS BRANDÃO
ENDEREÇO: TRECHO DA RODOVIA DE ACESSO A SANTO ANTONIO DO GRAMA, BAIRRO NOVO HORIZONTE.	INÍCIO: 01/07/2024	Nº CREA-MG: 45957/D	
CIDDE:	PRAZO: 31/12/2024	Nº DA ART:	
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA	UF:	COORDENADAS:	
DATA: 20/02/2025	SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA ☔
MANHÃ	✓		IMPRATICÁVEL ☔
TARDE	✓		
QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
1	ENCARREGADO DE OBRAS	1	OPERADOR DE ESCAVADEIRA
3	PEDREIRO	3	AJUDANTE
QTDE	EQUIPAMENTO		
1	ESCAVADEIRA		
2	PÁ		
2	CHIBANCA		
2	ENXADA		
3	CARRINHO DE MÃO		
TAREFAS REALIZADAS			
NÚMERO DE T.R.	DESCRIÇÃO	OBSERVAÇÕES	
1	ENRONCAMENTO DE FUNDO DE VALA		
2	INSTALAÇÃO DE ENSECADEIRA COM TUBO DE DRENAGEM		
3	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS	PARA IMPLANTAÇÃO DE REDE PLUVIAL	

REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)





OCORRÊNCIAS	
NÚMERO DE OC	TIPO DE OCORRÊNCIA
CONFERÊNCIA	
MUNICÍPIO	CONSÓRCIO (Aprovado em 21/02/2025 - 08:33)
Obs.:	Obs.:
ASSINATURAS	
YURI ANDRADE COSTA LINS Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 233590/D	PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA CREA 137.103/D
ANTÔNIO CARLOS MARTINS BRANDÃO RT de Execução - PONTAL ENGENHARIA LTDA CREA 45.957/D	



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº 0149	OBRA: CTP 0191/2024 - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE ACESSIBILIDADE	CONTRATO:	RESP. TÉCNICO: ANTONIO CARLOS MARTINS BRANDÃO
ENDEREÇO: TRECHO DA RODOVIA DE ACESSO A SANTO ANTONIO DO GRAMA, BAIRRO NOVO HORIZONTE.		INÍCIO: 01/07/2024	Nº CREA-MG: 45957/D
CIDDE:		PRAZO: 31/12/2024	Nº DA ART:
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA		UF:	COORDENADAS:
DATA: 19/02/2025	SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA ☔
MANHÃ	✓		IMPRATICÁVEL ☔
TARDE	✓		
QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
1	ENCARREGADO DE OBRAS	3	AJUDANTE
3	RASTELEIRO		
QTDE	EQUIPAMENTO		
1	DAMPER		
3	PÁ		
3	ENXADA		
4	CARRINHO DE MÃO		
1	BETONEIRA		
TAREFAS REALIZADAS			
NÚMERO DE T.R.	DESCRIÇÃO	OBSERVAÇÕES	
1	REJUNTAMENTO DE MANILHAS		
2	LIMPEZA E CAPINA		
3	CONCRETAGEM DE ACESSO À MANILHA		

REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)






Data não informada



Data não informada

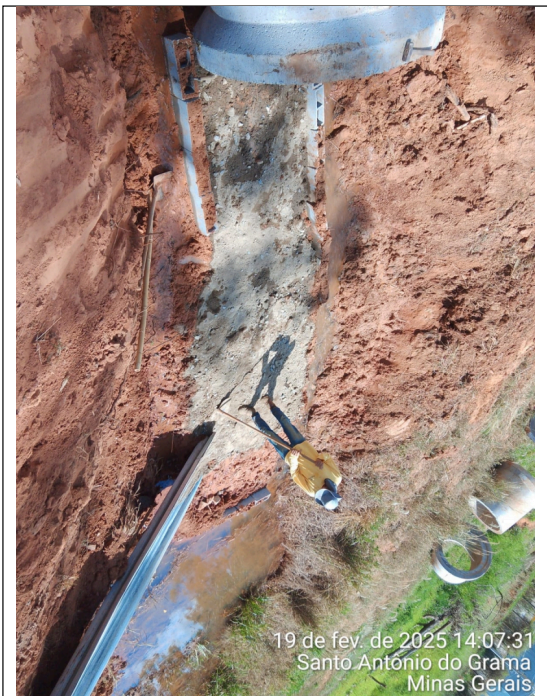

Data não informada



Data não informada

OCORRÊNCIAS		
NÚMERO DE OC	TIPO DE OCORRÊNCIA	DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA
CONFERÊNCIA		
MUNICÍPIO	CONSÓRCIO (Aprovado em 21/02/2025 - 08:33)	
Obs.:	Obs.:	
ASSINATURAS		
YURI ANDRADE COSTA LINS Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 233590/D	PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA CREA 137.103/D	ANTÔNIO CARLOS MARTINS BRANDÃO RT de Execução - PONTAL ENGENHARIA LTDA CREA 45.957/D



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº 0148	OBRA: CTP 0191/2024 - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE ACESSIBILIDADE	CONTRATO:	RESP. TÉCNICO: ANTONIO CARLOS MARTINS BRANDÃO
ENDEREÇO: TRECHO DA RODOVIA DE ACESSO A SANTO ANTONIO DO GRAMA, BAIRRO NOVO HORIZONTE.	INÍCIO: 01/07/2024	Nº CREA-MG: 45957/D	
CIDDE:	PRAZO: 31/12/2024	Nº DA ART:	
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA	UF:	COORDENADAS:	
DATA: 18/02/2025	SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA ☔
MANHÃ	✓		IMPRATICÁVEL ☔
TARDE	✓		
QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
1	ENCARREGADO DE OBRAS	1	OPERADOR DE ESCAVADEIRA
3	PEDREIRO	3	AJUDANTE
QTDE	EQUIPAMENTO		
2	CAVADEIRA RETA		
1	ESCAVADEIRA		
2	PÁ		
3	ENXADA		
TAREFAS REALIZADAS			
NÚMERO DE T.R.	DESCRICAO	OBSERVAÇÕES	
1	ESCAVAÇÃO DE VALA PARA INSTALAÇÃO DE MANILHAS		
2	INSTALAÇÃO DE MANILHAS PARA CANALIZAÇÃO DE CORREGO		
3	RECEBIMENTO E DESCARGA DE MANILHAS		

REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)



Data não informada




Data não informada



18 de fev. de 2025 13:42:33
Santo Antônio do Gramma
Minas Gerais

Data não informada

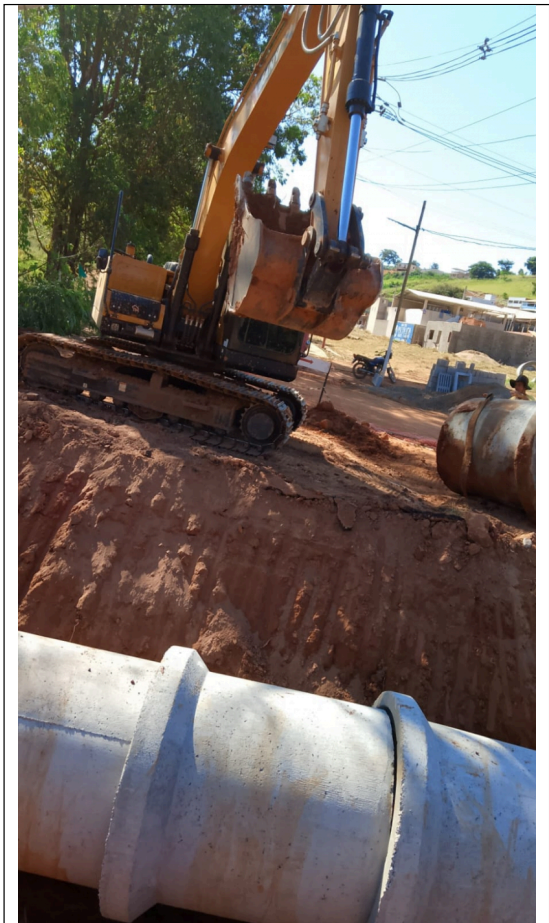

Data não informada



18 de fev. de 2025 13:42:24
Santo Antônio do Gramma
Minas Gerais

Data não informada



18 de fev. de 2025 16:42:30
Santo Antônio do Gramma
Minas Gerais

Data não informada

OCORRÊNCIAS		
NÚMERO DE OC	TIPO DE OCORRÊNCIA	DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA
CONFERÊNCIA		
MUNICÍPIO	CONSÓRCIO (Aprovado em 19/02/2025 - 09:34)	
Obs.:	Obs.:	
ASSINATURAS		

YURI ANDRADE COSTA LINS

PEDRO MARTINO ZEFERINO

ANTÔNIO CARLOS MARTINS BRANDÃO

02/06/2025, 13:32

sistemas.waysistemas.com/cimvalpi/Blk_Medicao_Relatorio_Parcial/

Fiscal de Obras - CIMVALPI
CREA 233590/D

Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA
CREA 137.103/D

RT de Execução - PONTAL ENGENHARIA LTDA
CREA 45.957/D

https://sistemas.waysistemas.com/cimvalpi/Blk_Medicao_Relatorio_Parcial/





RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO


Nº 0147	OBRA: CTP 0191/2024 - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE ACESSIBILIDADE		CONTRATO:		RESP. TÉCNICO: ANTONIO CARLOS MARTINS BRANDÃO	
ENDEREÇO: TRECHO DA RODOVIA DE ACESSO A SANTO ANTONIO DO GRAMA, BAIRRO NOVO HORIZONTE.			INÍCIO: 01/07/2024		Nº CREA-MG: 45957/D	
CIDDE:			PRAZO: 31/12/2024		Nº DA ART:	
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA			UF:		COORDENADAS:	
DATA: 17/02/2025	SOL ☀		NUBLADO ☁		CHUVA ☔	IMPRATICÁVEL ☔
MANHÃ	✓					
TARDE	✓					
QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO				QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
1	ENCARREGADO DE OBRAS				1	OPERADOR DE ESCAVADEIRA
3	PEDREIRO				3	AJUDANTE
QTDE	EQUIPAMENTO					
1	ESCAVADEIRA					
3	PÁ					
1	CAMINHÃO CARROCERIA					
3	ENXADA					
4	CARRINHO DE MÃO					
TAREFAS REALIZADAS						
NÚMERO DE T.R.	DESCRICAO				OBSERVAÇÕES	
1	CONCRETAGEM DE SARJETA					
2	TRANSPORTE DE PEYVER PARA PROXIMO DO CANTEIRO					
3	CONSTRUÇÃO DE DESVIO NA RODOVIA					
4	COMPACTAÇÃO DE PISTA COM ROLO					
5	REJUNTAMENTO DE MEIO FIO PREMOLDADO					
REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)						



Data não informada



Data não informada

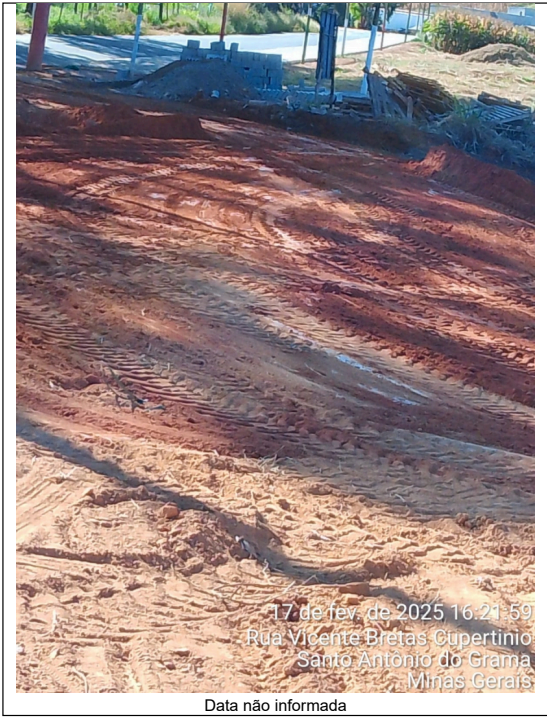

OCORRÊNCIAS		
NÚMERO DE OC	TIPO DE OCORRÊNCIA	DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA
CONFERÊNCIA		
MUNICÍPIO	CONSÓRCIO (Aprovado em 18/02/2025 - 08:38)	
Obs.:	Obs.:	
ASSINATURAS		
YURI ANDRADE COSTA LINS Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 233590/D	PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA CREA 137.103/D	ANTÔNIO CARLOS MARTINS BRANDÃO RT de Execução - PONTAL ENGENHARIA LTDA CREA 45.957/D



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº 0146	OBRA: CTP 0191/2024 - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE ACESSIBILIDADE	CONTRATO:	RESP. TÉCNICO: ANTONIO CARLOS MARTINS BRANDÃO
ENDEREÇO: TRECHO DA RODOVIA DE ACESSO A SANTO ANTONIO DO GRAMA, BAIRRO NOVO HORIZONTE.		INÍCIO: 01/07/2024	Nº CREA-MG: 45957/D
CIDDE:		PRAZO: 31/12/2024	Nº DA ART:
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA		UF:	COORDENADAS:
DATA: 14/02/2025	SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA ☔
MANHÃ	✓		IMPRATICÁVEL ☔
TARDE	✓		
QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
1	ENCARREGADO DE OBRAS	3	PEDREIRO
3	AJUDANTE		
QTDE	EQUIPAMENTO		
3	PÁ		
1	CAMINHÃO CARROCERIA		
3	ENXADA		
4	CARRINHO DE MÃO		
1	SERRA DE BANCADA		
TAREFAS REALIZADAS			
NÚMERO DE T.R.	DESCRIÇÃO	OBSERVAÇÕES	
1	TRANSPORTE DE PEYVER PARA PROXIMO DO CANTEIRO		
2	ESPALHAMENTO DE AREIA PARA BERÇO NA PISTA		
3	PAVIMENTAÇÃO EM PEYVER DE CONCRETO		
REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)			
 14 de fev. de 2025 15:18:49 Santo Antônio do Grama Minas Gerais Data não informada		 14 de fev. de 2025 15:19:29 Rua Vicente Bretas Cupertino Santo Antônio do Grama Minas Gerais Data não informada	
OCORRÊNCIAS			
NÚMERO DE OC	TIPO DE OCORRÊNCIA	DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA	
CONFERÊNCIA			
MUNICÍPIO	CONSÓRCIO (Aprovado em 17/02/2025 - 09:14)		
Obs.:	Obs.:		
ASSINATURAS			
YURI ANDRADE COSTA LINS Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 233590/D		PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA CREA 137.103/D	
		ANTÔNIO CARLOS MARTINS BRANDÃO RT de Execução - PONTAL ENGENHARIA LTDA CREA 45.957/D	



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº 0145	OBRA: CTP 0191/2024 - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE ACESSIBILIDADE	CONTRATO:	RESP. TÉCNICO: ANTONIO CARLOS MARTINS BRANDÃO
ENDEREÇO: TRECHO DA RODOVIA DE ACESSO A SANTO ANTONIO DO GRAMA, BAIRRO NOVO HORIZONTE.		INÍCIO: 01/07/2024	Nº CREA-MG: 45957/D
CIDDE:		PRAZO: 31/12/2024	Nº DA ART:
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA		UF:	COORDENADAS:
DATA: 13/02/2025	SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA ☔
MANHÃ	✓		IMPRATICÁVEL ☔
TARDE	✓		
QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
1	ENCARREGADO DE OBRAS	3	PEDREIRO
3	AJUDANTE		
QTDE	EQUIPAMENTO		
3	PÁ		
1	ROLO COMPACTADOR		
2	CHIBANCA		
3	ENXADA		
4	CARRINHO DE MÃO		
1	BETONEIRA		
TAREFAS REALIZADAS			
NÚMERO DE T.R.	DESCRICAO	OBSERVAÇÕES	
1	COMPACTAÇÃO DE PISTA COM ROLO		
2	ACERTO E NIVELAMENTO DE PISTA MANUAL		
3	CONCRETAGEM LATERAL DE MANILHA		
4	DESMANCHE DE CERCA		
5	EXECUÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM		
6	EXECUÇÃO DE BOCA DE LOBO		

REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)






OCORRÊNCIAS		
NÚMERO DE OC	TIPO DE OCORRÊNCIA	DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA
CONFERÊNCIA		
MUNICÍPIO	CONSÓRCIO (Aprovado em 14/02/2025 - 08:26)	
Obs.:	Obs.:	
ASSINATURAS		
YURI ANDRADE COSTA LINS Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 233590/D	PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA CREA 137.103/D	ANTÔNIO CARLOS MARTINS BRANDÃO RT de Execução - PONTAL ENGENHARIA LTDA CREA 45.957/D



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº 0144	OBRA: CTP 0191/2024 - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE ACESSIBILIDADE	CONTRATO:	RESP. TÉCNICO: ANTONIO CARLOS MARTINS BRANDÃO
ENDEREÇO: TRECHO DA RODOVIA DE ACESSO A SANTO ANTONIO DO GRAMA, BAIRRO NOVO HORIZONTE.	INÍCIO: 01/07/2024	Nº CREA-MG: 45957/D	
CIDDE:	PRAZO: 31/12/2024	Nº DA ART:	
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA	UF:	COORDENADAS:	
DATA: 12/02/2025	SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA ☔
MANHÃ	✓		IMPRATICÁVEL ☔
TARDE	✓		
QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
1	ENCARREGADO DE OBRAS	1	OPERADOR DE ESCAVADEIRA
3	PEDREIRO	3	AJUDANTE
QTDE	EQUIPAMENTO		
3	CAVADEIRA RETA		
1	ESCAVADEIRA		
3	ENXADA		
2	CARRINHO DE MÃO		
	TAREFAS REALIZADAS		
NÚMERO DE T.R.	DESCRICAO	OBSERVAÇÕES	
1	REJUNTAMENTO DE MANILHAS		
2	INSTALAÇÃO DE MANILHAS PARA CANALIZAÇÃO DE CORREGO		
3	LIMPEZA DE CORREGO		
	REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)		

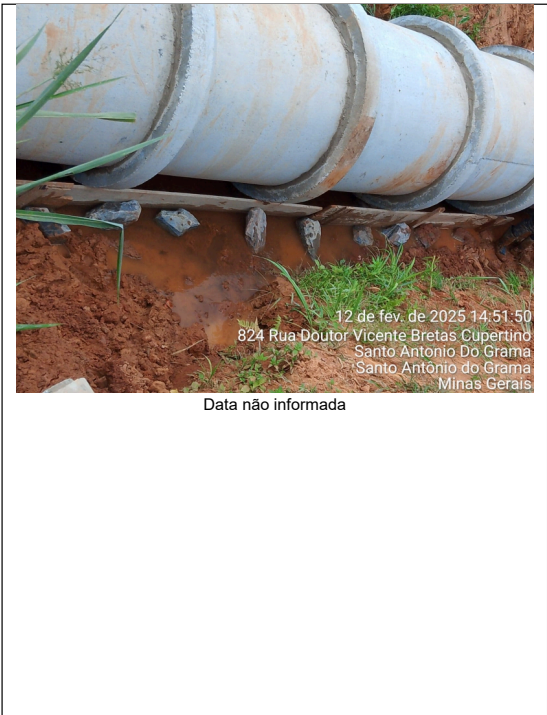



Data não informada



Data não informada


OCORRÊNCIAS		
NÚMERO DE OC	TIPO DE OCORRÊNCIA	DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA
CONFERÊNCIA		
MUNICÍPIO	CONSÓRCIO (Aprovado em 14/02/2025 - 08:26)	
Obs.:	Obs.:	
ASSINATURAS		
YURI ANDRADE COSTA LINS Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 233590/D	PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA CREA 137.103/D	ANTÔNIO CARLOS MARTINS BRANDÃO RT de Execução - PONTAL ENGENHARIA LTDA CREA 45.957/D




RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº 0166	OBRA: CTP 0191/2024 - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE ACESSIBILIDADE	CONTRATO:	RESP. TÉCNICO: ANTONIO CARLOS MARTINS BRANDÃO
ENDEREÇO: TRECHO DA RODOVIA DE ACESSO A SANTO ANTONIO DO GRAMA, BAIRRO NOVO HORIZONTE.	INÍCIO: 01/07/2024	Nº CREA-MG: 45957/D	
CIDDE:	PRAZO: 31/12/2024	Nº DA ART:	
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA	UF:	COORDENADAS:	
DATA: 18/03/2025	SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA ☔
MANHÃ	✓		IMPRATICÁVEL ☔
TARDE	✓		
QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
1	ENCARREGADO DE OBRAS	3	PEDREIRO
3	AJUDANTE		
QTDE	EQUIPAMENTO		
1	COMPACTADOR DE SOLO		
3	PÁ		
3	ENXADA		
2	CARRINHO DE MÃO		
TAREFAS REALIZADAS			
NÚMERO DE T.R.	DESCRICAO	OBSERVAÇÕES	
1	COMPACTAÇÃO DE VALA		
2	REJUNTAMENTO DE MANILHAS		
3	ATERRAMENTO DE MANILHAS		
4	INSTALAÇÃO DE MANILHAS DE 600MM		

REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)

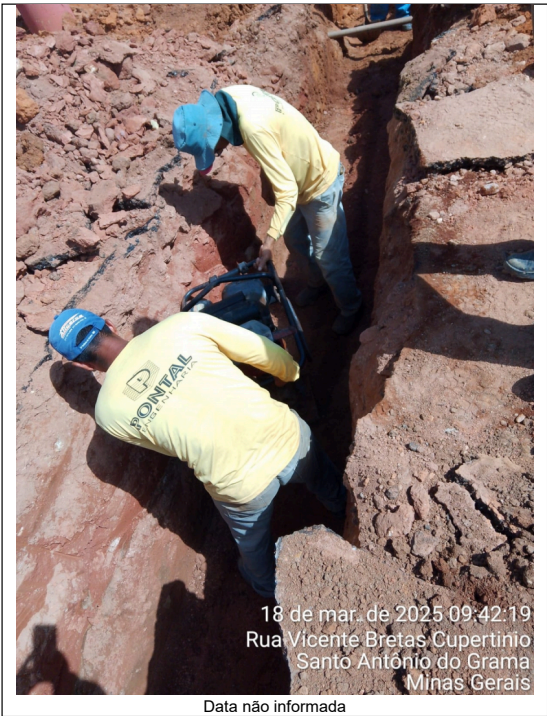

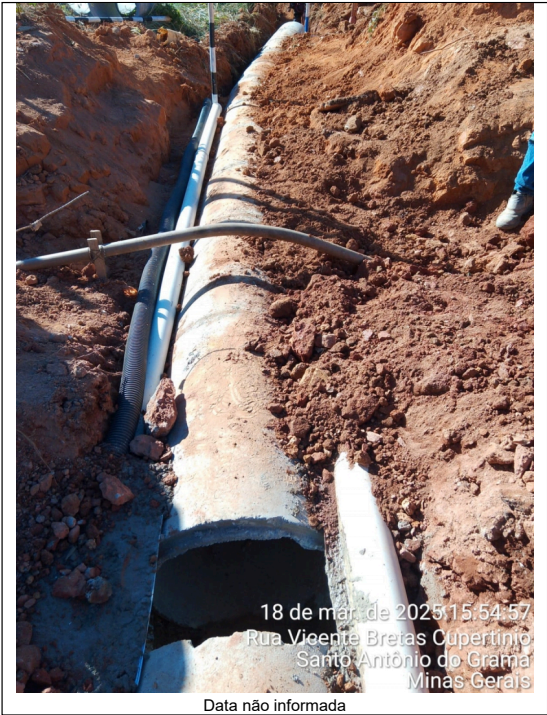


OCORRÊNCIAS		
NÚMERO DE OC	TIPO DE OCORRÊNCIA	DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA
CONFERÊNCIA		
MUNICÍPIO	CONSÓRCIO (Aprovado em 19/03/2025 - 14:45)	
Obs.:	Obs.:	
ASSINATURAS		
YURI ANDRADE COSTA LINS Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 233590/D	PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA CREA 137.103/D	ANTÔNIO CARLOS MARTINS BRANDÃO RT de Execução - PONTAL ENGENHARIA LTDA CREA 45.957/D



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº 0165	OBRA: CTP 0191/2024 - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE ACESSIBILIDADE	CONTRATO:	RESP. TÉCNICO: ANTONIO CARLOS MARTINS BRANDÃO
ENDEREÇO: TRECHO DA RODOVIA DE ACESSO A SANTO ANTONIO DO GRAMA, BAIRRO NOVO HORIZONTE.		INÍCIO: 01/07/2024	Nº CREA-MG: 45957/D
CIDDE:		PRAZO: 31/12/2024	Nº DA ART:
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA		UF:	COORDENADAS:
DATA: 17/03/2025	SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA ☔
MANHÃ	✓		IMPRATICÁVEL ☔
TARDE		✓	
QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
1	ENCARREGADO DE OBRAS	1	OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA
3	PEDREIRO	3	AJUDANTE
QTDE	EQUIPAMENTO		
2	CAVADEIRA RETA		
3	PÁ		
1	ROLO COMPACTADOR		
3	CHIBANCA		
3	ENXADA		
2	CARRINHO DE MÃO		
1	RETROESCAVADEIRA		
TAREFAS REALIZADAS			
NÚMERO DE T.R.	DESCRIÇÃO	OBSERVAÇÕES	
1	ESCAVAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE MANILHA DE 600MM		
2	REJUNTAMENTO DE MEIO FIO PREMOLDADO		
3	ESPALHAMENTO DE AREIA PARA BERÇO NA PISTA		
4	PAVIMENTAÇÃO EM PEYVER DE CONCRETO		
5	COMPACTAÇÃO DE PISTA COM ROLO		

REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)

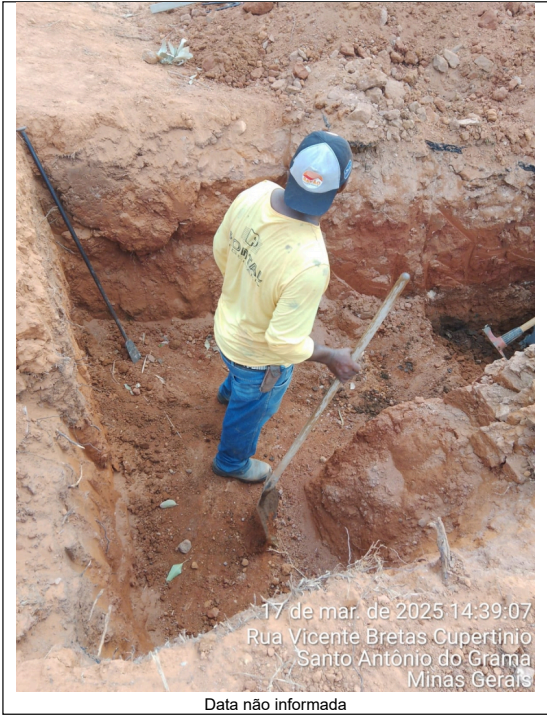



OCORRÊNCIAS		
NÚMERO DE OC	TIPO DE OCORRÊNCIA	DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA
CONFERÊNCIA		
MUNICÍPIO	CONSÓRCIO (Aprovado em 19/03/2025 - 14:45)	
Obs.:	Obs.:	
ASSINATURAS		
YURI ANDRADE COSTA LINS Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 233590/D	PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA CREA 137.103/D	ANTÔNIO CARLOS MARTINS BRANDÃO RT de Execução - PONTAL ENGENHARIA LTDA CREA 45.957/D



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº 0164	OBRA: CTP 0191/2024 - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE ACESSIBILIDADE	CONTRATO:	RESP. TÉCNICO: ANTONIO CARLOS MARTINS BRANDÃO
ENDEREÇO: TRECHO DA RODOVIA DE ACESSO A SANTO ANTONIO DO GRAMA, BAIRRO NOVO HORIZONTE.		INÍCIO: 01/07/2024	Nº CREA-MG: 45957/D
CIDDE:		PRAZO: 31/12/2024	Nº DA ART:
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA		UF:	COORDENADAS:
DATA: 14/03/2025	SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA ☔
MANHÃ	✓		IMPRATICÁVEL ☔
TARDE	✓		
QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
1	ENCARREGADO DE OBRAS	3	PEDREIRO
3	AJUDANTE		
QTDE	EQUIPAMENTO		
1	MARTELETE		
3	PÁ		
1	ROLO COMPACTADOR		
3	ENXADA		
4	CARRINHO DE MÃO		
1	RETROESCAVADEIRA		
TAREFAS REALIZADAS			
NÚMERO DE T.R.	DESCRICAO	OBSERVAÇÕES	
1	CONCRETAGEM DE MEIO FIO		
2	ACERTO E NIVELAMENTO DE PISTA COM RETROESCAVADEIRA		
3	DESMONTE DE FORMA		
4	CONCRETAGEM DE SARJETA		
5	COMPACTAÇÃO DE PISTA COM ROLO		
REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)			



Data não informada



Data não informada



Data não informada



Data não informada



Data não informada

OCORRÊNCIAS		
NÚMERO DE OC	TIPO DE OCORRÊNCIA	DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA
CONFERÊNCIA		
MUNICÍPIO	CONSÓRCIO (Aprovado em 17/03/2025 - 16:19)	
Obs.:	Obs.:	
ASSINATURAS		
YURI ANDRADE COSTA LINS Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 233590/D	PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA CREA 137.103/D	ANTÔNIO CARLOS MARTINS BRANDÃO RT de Execução - PONTAL ENGENHARIA LTDA CREA 45.957/D



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº 0163	OBRA: CTP 0191/2024 - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE ACESSIBILIDADE	CONTRATO:	RESP. TÉCNICO: ANTONIO CARLOS MARTINS BRANDÃO
ENDEREÇO: TRECHO DA RODOVIA DE ACESSO A SANTO ANTONIO DO GRAMA, BAIRRO NOVO HORIZONTE.		INÍCIO: 01/07/2024	Nº CREA-MG: 45957/D
CIDDE:		PRAZO: 31/12/2024	Nº DA ART:
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA		UF:	COORDENADAS:
DATA: 13/03/2025	SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA ☔
MANHÃ	✓		IMPRATICÁVEL ☔
TARDE	✓		
QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
1	ENCARREGADO DE OBRAS	3	PEDREIRO
3	AJUDANTE		
QTDE	EQUIPAMENTO		
2	CAVADEIRA RETA		
1	DAMPER		
3	PÁ		
2	CHIBANCA		
3	ENXADA		
4	CARRINHO DE MÃO		
1	BETONEIRA		
TAREFAS REALIZADAS			
NÚMERO DE T.R.	DESCRICAO	OBSERVAÇÕES	
1	PAVIMENTAÇÃO EM PEYVER DE CONCRETO		
2	INSTALAÇÃO DE MEIO FIO PREMOLDADO		
3	ESPALHAMENTO DE AREIA PARA BERÇO NA PISTA		
4	EXECUÇÃO DE FORMA PARA CONCRETAGEM DE ALA	ALA DE CONCRETO ARMADO	
5	ESCAVAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE MEIO FIO E SARGETA		
6	ARMAÇÃO DE FERRAGEM DE ALA	ALA DE CONCRETO ARMADO	
7	CONCRETAGEM DE SARGETA		
8	CONCRETAGEM DE ALA	ALA DE CONCRETO ARMADO	
REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)			



Data não informada



Data não informada



Data não informada



Data não informada



Data não informada



Data não informada

Ocorrências		
NÚMERO DE OC	TIPO DE OCORRÊNCIA	DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA
CONFERÊNCIA		
MUNICÍPIO	CONSÓRCIO (Aprovado em 17/03/2025 - 16:18)	
Obs.:	Obs.:	
ASSINATURAS		
YURI ANDRADE COSTA LINS Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 233590/D	PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA CREA 137.103/D	ANTÔNIO CARLOS MARTINS BRANDÃO RT de Execução - PONTAL ENGENHARIA LTDA CREA 45.957/D



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº 0162	OBRA: CTP 0191/2024 - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE ACESSIBILIDADE	CONTRATO:	RESP. TÉCNICO: ANTONIO CARLOS MARTINS BRANDÃO
ENDEREÇO: TRECHO DA RODOVIA DE ACESSO A SANTO ANTONIO DO GRAMA, BAIRRO NOVO HORIZONTE.	INÍCIO: 01/07/2024	Nº CREA-MG: 45957/D	
CIDDE:	PRAZO: 31/12/2024	Nº DA ART:	
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA	UF:	COORDENADAS:	
DATA: 12/03/2025	SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA ☔
MANHÃ	✓		IMPRATICÁVEL ☔
TARDE	✓		
QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
1	ENCARREGADO DE OBRAS	3	PEDREIRO
3	AJUDANTE		
QTDE	EQUIPAMENTO		
1	DAMPER		
3	PÁ		
3	ENXADA		
4	CARRINHO DE MÃO		
1	BETONEIRA		
TAREFAS REALIZADAS			
NÚMERO DE T.R.	DESCRIÇÃO	OBSERVAÇÕES	
1	EXECUÇÃO DE FORMA PARA CONCRETAGEM DE ALA	ALA DE CONCRETO ARMADO	
2	CONCRETAGEM DE ALA	ALA DE CONCRETO ARMADO	
3	ARMAÇÃO DE FERRAGEM DE ALA	ALA DE CONCRETO ARMADO	

REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)






Data não informada



Data não informada

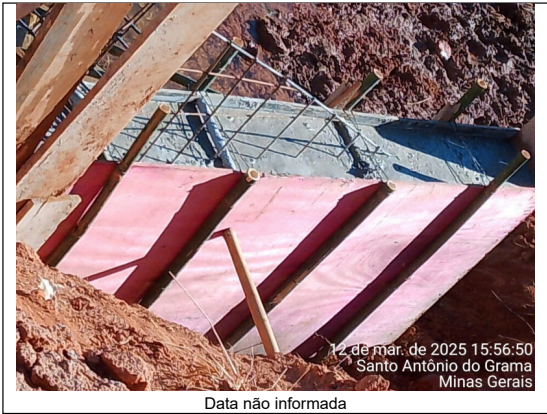

Data não informada

OCORRÊNCIAS		
NÚMERO DE OC	TIPO DE OCORRÊNCIA	DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA
CONFERÊNCIA		
MUNICÍPIO	CONSÓRCIO (Aprovado em 13/03/2025 - 08:47)	
Obs.:	Obs.:	
ASSINATURAS		
YURI ANDRADE COSTA LINS Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 233590/D	PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA CREA 137.103/D	ANTÔNIO CARLOS MARTINS BRANDÃO RT de Execução - PONTAL ENGENHARIA LTDA CREA 45.957/D



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº 0161	OBRA: CTP 0191/2024 - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE ACESSIBILIDADE	CONTRATO:	RESP. TÉCNICO: ANTONIO CARLOS MARTINS BRANDÃO
ENDEREÇO: TRECHO DA RODOVIA DE ACESSO A SANTO ANTONIO DO GRAMA, BAIRRO NOVO HORIZONTE.		INÍCIO: 01/07/2024	Nº CREA-MG: 45957/D
CIDDE:		PRAZO: 31/12/2024	Nº DA ART:
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA		UF:	COORDENADAS:
DATA: 11/03/2025	SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA ☔
MANHÃ	✓		IMPRATICÁVEL ☔
TARDE	✓		
QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
1	ENCARREGADO DE OBRAS	3	PEDREIRO
3	AJUDANTE		
QTDE	EQUIPAMENTO		
1	DAMPER		
3	PÁ		
2	CHIBANCA		
3	ENXADA		
4	CARRINHO DE MÃO		
1	BETONEIRA		
TAREFAS REALIZADAS			
NÚMERO DE T.R.	DESCRICAO	OBSERVAÇÕES	
1	ESCAVAÇÃO E LIMPEZA MANUAL DE ACESSO À MANILHA 120		
2	CONCRETAGEM DE ACESSO À MANILHA 1200MM		

REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)





Data não informada



Data não informada




Data não informada

OCORRÊNCIAS		
NÚMERO DE OC	TIPO DE OCORRÊNCIA	DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA
CONFERÊNCIA		
MUNICÍPIO	CONSÓRCIO (Aprovado em 13/03/2025 - 08:47)	
Obs.:	Obs.:	
ASSINATURAS		
YURI ANDRADE COSTA LINS Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 233590/D	PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA CREA 137.103/D	ANTÔNIO CARLOS MARTINS BRANDÃO RT de Execução - PONTAL ENGENHARIA LTDA CREA 45.957/D



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº 0160	OBRA: CTP 0191/2024 - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE ACESSIBILIDADE	CONTRATO:		RESP. TÉCNICO: ANTONIO CARLOS MARTINS BRANDÃO
ENDEREÇO: TRECHO DA RODOVIA DE ACESSO A SANTO ANTONIO DO GRAMA, BAIRRO NOVO HORIZONTE.		INÍCIO: 01/07/2024		Nº CREA-MG: 45957/D
CIDDE:		PRAZO: 31/12/2024		Nº DA ART:
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA		UF:		COORDENADAS:
DATA: 10/03/2025	SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA ☔	IMPRATICÁVEL ☔
MANHÃ	✓			
TARDE	✓			
QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO		QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
1	ENCARREGADO DE OBRAS		1	OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA
3	PEDREIRO		3	AJUDANTE
QTDE	EQUIPAMENTO			
2	CAVADEIRA RETA			
3	CAVADEIRA DE BOCA			
3	ENXADA			
3	CARRINHO DE MÃO			
1	RETROESCAVADEIRA			
TAREFAS REALIZADAS				
NÚMERO DE T.R.	DESCRICAO		OBSERVAÇÕES	
1	ESCAVAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DE MANILHAS 1200MM			
2	CONFECAÇÃO DE CERCA DE ARAME FARPADO			
REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)				

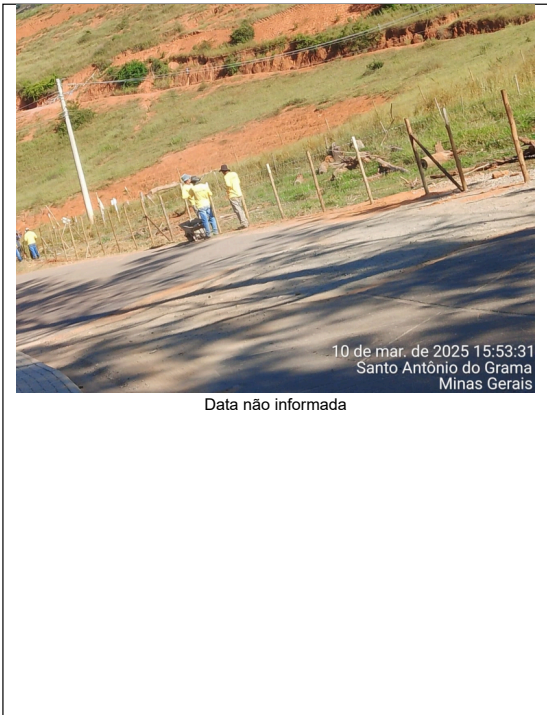



Data não informada



Data não informada



Data não informada


OCORRÊNCIAS		
NÚMERO DE OC	TIPO DE OCORRÊNCIA	DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA
CONFERÊNCIA		
MUNICÍPIO	CONSÓRCIO (Aprovado em 13/03/2025 - 08:47)	
Obs.:	Obs.:	
ASSINATURAS		
YURI ANDRADE COSTA LINS Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 233590/D	PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA CREA 137.103/D	ANTÔNIO CARLOS MARTINS BRANDÃO RT de Execução - PONTAL ENGENHARIA LTDA CREA 45.957/D



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº 0159	OBRA: CTP 0191/2024 - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE ACESSIBILIDADE	CONTRATO:	RESP. TÉCNICO: ANTONIO CARLOS MARTINS BRANDÃO
ENDEREÇO: TRECHO DA RODOVIA DE ACESSO A SANTO ANTONIO DO GRAMA, BAIRRO NOVO HORIZONTE.		INÍCIO: 01/07/2024	Nº CREA-MG: 45957/D
CIDDE:		PRAZO: 31/12/2024	Nº DA ART:
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA		UF:	COORDENADAS:
DATA: 07/03/2025	SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA ☔
MANHÃ	✓		IMPRATICÁVEL ☔
TARDE	✓		
QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
1	ENCARREGADO DE OBRAS	3	PEDREIRO
3	AJUDANTE		
QTDE	EQUIPAMENTO		
3	PÁ		
3	ENXADA		
4	CARRINHO DE MÃO		
1	BETONEIRA		
1	SERRA DE BANCADA		
TAREFAS REALIZADAS			
NÚMERO DE T.R.	DESCRICAO	OBSERVAÇÕES	
1	ESPALHAMENTO DE AREIA PARA BERÇO NA PISTA		
2	PAVIMENTAÇÃO EM PEYVER DE CONCRETO		
3	REJUNTAMENTO DE MEIO FIO PREMOLDADO		
4	ARREIMATE DE PISTA		
REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)			



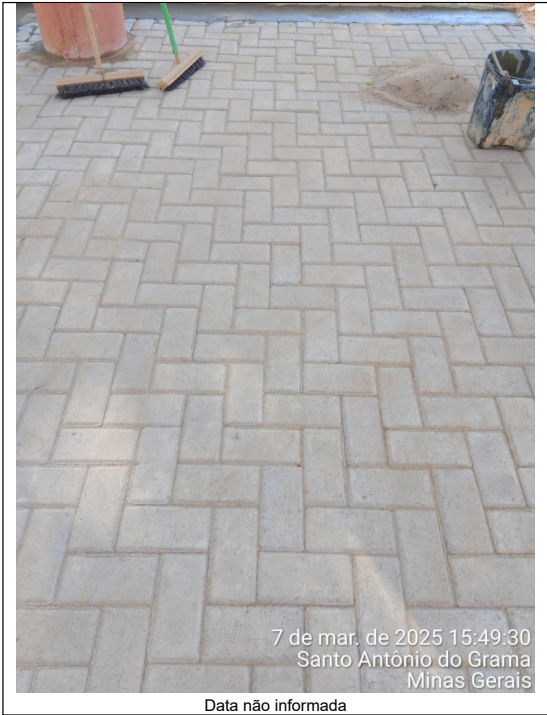

OCORRÊNCIAS		
NÚMERO DE OC	TIPO DE OCORRÊNCIA	DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA
CONFERÊNCIA		
MUNICÍPIO	CONSÓRCIO (Aprovado em 10/03/2025 - 08:50)	
Obs.:	Obs.:	
ASSINATURAS		
YURI ANDRADE COSTA LINS Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 233590/D	PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA CREA 137.103/D	ANTÔNIO CARLOS MARTINS BRANDÃO RT de Execução - PONTAL ENGENHARIA LTDA CREA 45.957/D



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº 0158	OBRA: CTP 0191/2024 - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE ACESSIBILIDADE	CONTRATO:	RESP. TÉCNICO: ANTONIO CARLOS MARTINS BRANDÃO
ENDEREÇO: TRECHO DA RODOVIA DE ACESSO A SANTO ANTONIO DO GRAMA, BAIRRO NOVO HORIZONTE.	INÍCIO: 01/07/2024	Nº CREA-MG: 45957/D	
CIDDE:	PRAZO: 31/12/2024	Nº DA ART:	
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA	UF:	COORDENADAS:	
DATA: 06/03/2025	SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA ☔
MANHÃ	✓		IMPRATICÁVEL ☔
TARDE	✓		
QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
1	ENCARREGADO DE OBRAS	3	PEDREIRO
3	AJUDANTE		
QTDE	EQUIPAMENTO		
1	ROLO LISO		
2	PÁ		
2	ENXADA		
2	CARRINHO DE MÃO		
	TAREFAS REALIZADAS		
NÚMERO DE T.R.	DESCRIÇÃO	OBSERVAÇÕES	
1	ESCAVAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE MEIO FIO E SARJETA		
2	PAVIMENTAÇÃO EM PAVER DE CONCRETO		
3	INSTALAÇÃO DE MEIO FIO PREMOLDADO		


REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)



Data não informada



Data não informada

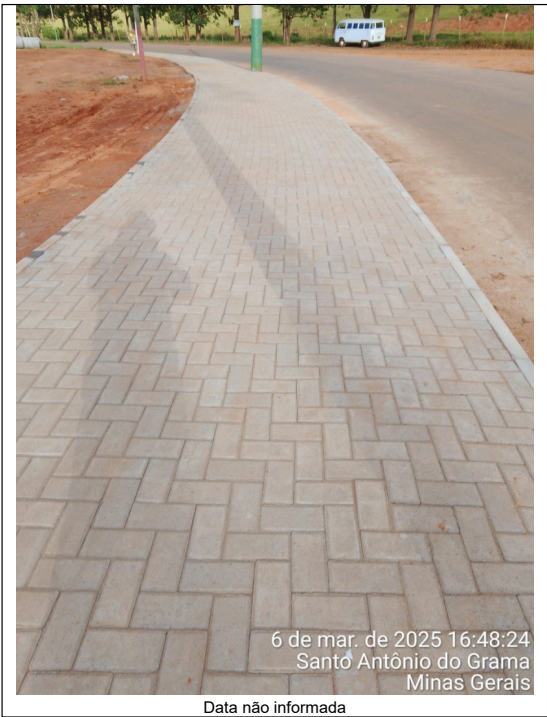

OCORRÊNCIAS		
NÚMERO DE OC	TIPO DE OCORRÊNCIA	DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA
CONFERÊNCIA		
MUNICÍPIO	CONSÓRCIO (Aprovado em 07/03/2025 - 07:55)	
Obs.:	Obs.:	
ASSINATURAS		
YURI ANDRADE COSTA LINS Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 233590/D	PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA CREA 137.103/D	ANTÔNIO CARLOS MARTINS BRANDÃO RT de Execução - PONTAL ENGENHARIA LTDA CREA 45.957/D




RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº 0157	OBRA: CTP 0191/2024 - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE ACESSIBILIDADE	CONTRATO:	RESP. TÉCNICO: ANTONIO CARLOS MARTINS BRANDÃO
ENDEREÇO: TRECHO DA RODOVIA DE ACESSO A SANTO ANTONIO DO GRAMA, BAIRRO NOVO HORIZONTE.		INÍCIO: 01/07/2024	Nº CREA-MG: 45957/D
CIDDE:		PRAZO: 31/12/2024	Nº DA ART:
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA		UF:	COORDENADAS:
DATA: 05/03/2025	SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA ☔
MANHÃ	✓		IMPRATICÁVEL ☁
TARDE	✓		
QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
1	ENCARREGADO DE OBRAS	3	PEDREIRO
3	AJUDANTE		
QTDE	EQUIPAMENTO		
3	PÁ		
1	CAMINHÃO CARROCERIA		
3	ENXADA		
4	CARRINHO DE MÃO		
1	SERRA DE BANCADA		
TAREFAS REALIZADAS			
NÚMERO DE T.R.	DESCRICAO	OBSERVAÇÕES	
1	ESPALHAMENTO DE AREIA PARA BERÇO NA PISTA		
2	PAVIMENTAÇÃO EM PEYVER DE CONCRETO		
3	RECEBIMENTO DE AREIA NA OBRA		

REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)



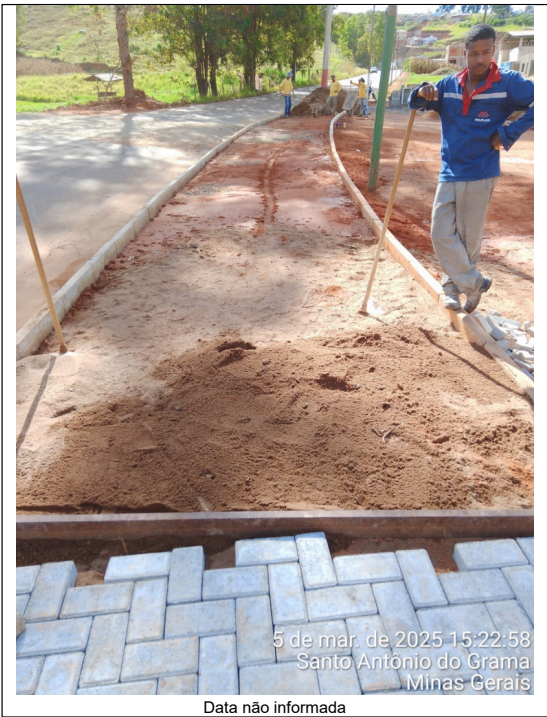

OCORRÊNCIAS		
NÚMERO DE OC	TIPO DE OCORRÊNCIA	DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA
CONFERÊNCIA		
MUNICÍPIO	CONSÓRCIO (Aprovado em 06/03/2025 - 09:35)	
Obs.:	Obs.:	
ASSINATURAS		
YURI ANDRADE COSTA LINS Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 233590/D	PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA CREA 137.103/D	ANTÔNIO CARLOS MARTINS BRANDÃO RT de Execução - PONTAL ENGENHARIA LTDA CREA 45.957/D



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº 0156	OBRA: CTP 0191/2024 - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE ACESSIBILIDADE	CONTRATO:	RESP. TÉCNICO: ANTONIO CARLOS MARTINS BRANDÃO
ENDEREÇO: TRECHO DA RODOVIA DE ACESSO A SANTO ANTONIO DO GRAMA, BAIRRO NOVO HORIZONTE.		INÍCIO: 01/07/2024	Nº CREA-MG: 45957/D
CIDDE:		PRAZO: 31/12/2024	Nº DA ART:
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA		UF:	COORDENADAS:
DATA: 28/02/2025	SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA ☔
MANHÃ	✓		IMPRATICÁVEL ☔
TARDE	✓		
QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
1	ENCARREGADO DE OBRAS	3	PEDREIRO
3	AJUDANTE		
QTDE	EQUIPAMENTO		
2	CAVADEIRA RETA		
3	PÁ		
1	CAMINHÃO CARROCERIA		
1	ROLO COMPACTADOR		
2	CHIBANCA		
3	ENXADA		
4	CARRINHO DE MÃO		
TAREFAS REALIZADAS			
NÚMERO DE T.R.	DESCRICAO	OBSERVAÇÕES	
1	ESCAVAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE MEIO FIO E SARJETA		
2	TRANSPORTE DE PEYVER PARA PROXIMO DO CANTEIRO		
3	COMPACTAÇÃO DE PISTA COM ROLO		
4	INSTALAÇÃO DE MEIO FIO PREMOLDADO		
5	ACERTO E NIVELAMENTO DE PISTA MANUAL		
6	CONCRETAGEM DE SARGETA		
REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)			





OCORRÊNCIAS		
NÚMERO DE OC	TIPO DE OCORRÊNCIA	DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA
CONFERÊNCIA		
MUNICÍPIO	CONSÓRCIO (Aprovado em 06/03/2025 - 09:35)	
Obs.:	Obs.:	
ASSINATURAS		
YURI ANDRADE COSTA LINS Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 233590/D	PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA CREA 137.103/D	ANTÔNIO CARLOS MARTINS BRANDÃO RT de Execução - PONTAL ENGENHARIA LTDA CREA 45.957/D



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº 0155	OBRA: CTP 0191/2024 - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE ACESSIBILIDADE	CONTRATO:	RESP. TÉCNICO: ANTONIO CARLOS MARTINS BRANDÃO
ENDEREÇO: TRECHO DA RODOVIA DE ACESSO A SANTO ANTONIO DO GRAMA, BAIRRO NOVO HORIZONTE.		INÍCIO: 01/07/2024	Nº CREA-MG: 45957/D
CIDDE:		PRAZO: 31/12/2024	Nº DA ART:
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA		UF:	COORDENADAS:
DATA: 27/02/2025	SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA ☔
MANHÃ	✓		IMPRATICÁVEL ☔
TARDE	✓		
QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
1	ENCARREGADO DE OBRAS	3	PEDREIRO
3	AJUDANTE		
QTDE	EQUIPAMENTO		
2	CAVADEIRA RETA		
3	PÁ		
1	ROLO COMPACTADOR		
2	CHIBANCA		
3	ENXADA		
4	CARRINHO DE MÃO		
TAREFAS REALIZADAS			
NÚMERO DE T.R.	DESCRICAÇÃO	OBSERVAÇÕES	
1	CONCRETAGEM DE SARJETA		
2	COMPACTAÇÃO DE PISTA COM ROLO		
3	ESCAVAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE MEIO FIO E SARGETA		
4	ACERTO E NIVELAMENTO DE PISTA MANUAL		
5	INSTALAÇÃO DE MEIO FIO PREMOLDADO		
REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)			





Data não informada



Data não informada

OCORRÊNCIAS		
NÚMERO DE OC	TIPO DE OCORRÊNCIA	DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA
CONFERÊNCIA		
MUNICÍPIO	CONSÓRCIO (Aprovado em 28/02/2025 - 09:58)	
Obs.:	Obs.:	
ASSINATURAS		
YURI ANDRADE COSTA LINS Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 233590/D	PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA CREA 137.103/D	ANTÔNIO CARLOS MARTINS BRANDÃO RT de Execução - PONTAL ENGENHARIA LTDA CREA 45.957/D



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº 0154	OBRA: CTP 0191/2024 - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE ACESSIBILIDADE	CONTRATO:	RESP. TÉCNICO: ANTONIO CARLOS MARTINS BRANDÃO
ENDEREÇO: TRECHO DA RODOVIA DE ACESSO A SANTO ANTONIO DO GRAMA, BAIRRO NOVO HORIZONTE.	INÍCIO: 01/07/2024	Nº CREA-MG: 45957/D	
CIDDE:	PRAZO: 31/12/2024	Nº DA ART:	
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA	UF:	COORDENADAS:	
DATA: 26/02/2025	SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA ☔
MANHÃ	✓		IMPRATICÁVEL ☔
TARDE	✓		
QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
1	ENCARREGADO DE OBRAS	1	MOTORISTA DE CAMINHÃO BÁSCULA
3	PEDREIRO	1	OPERADOR DE CARREGADEIRA
3	AJUDANTE		
QTDE	EQUIPAMENTO		
1	PÁ CARREGADEIRA		
1	COMPACTADOR DE SOLO		
1	ROLO COMPACTADOR		
1	CAMINHÃO BASCULANTE		
TAREFAS REALIZADAS			
NÚMERO DE T.R.	DESCRIÇÃO	OBSERVAÇÕES	
1	ATERRO COMPACTADO DE VALA		
2	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSP. DE MATERIAL PARA ATERRO		
3	ENCASCALHAMENTO DE PISTA SOBRE ATERRO COMPACTADO		

REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)





Data não informada



Data não informada



Data não informada

OCORRÊNCIAS		
NÚMERO DE OC	TIPO DE OCORRÊNCIA	DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA
CONFERÊNCIA		
MUNICÍPIO	CONSÓRCIO (Aprovado em 27/02/2025 - 08:46)	
Obs.:	Obs.:	
ASSINATURAS		
YURI ANDRADE COSTA LINS Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 233590/D	PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA CREA 137.103/D	ANTÔNIO CARLOS MARTINS BRANDÃO RT de Execução - PONTAL ENGENHARIA LTDA CREA 45.957/D



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº 0153	OBRA: CTP 0191/2024 - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE ACESSIBILIDADE	CONTRATO:		RESP. TÉCNICO: ANTONIO CARLOS MARTINS BRANDÃO
ENDEREÇO: TRECHO DA RODOVIA DE ACESSO A SANTO ANTONIO DO GRAMA, BAIRRO NOVO HORIZONTE.		INÍCIO: 01/07/2024		Nº CREA-MG: 45957/D
CIDDE:		PRAZO: 31/12/2024		Nº DA ART:
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA		UF:		COORDENADAS:
DATA: 25/02/2025	SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA ☔	IMPRATICÁVEL ☔
MANHÃ	✓			
TARDE		✓		
QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO		QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
1	ENCARREGADO DE OBRAS		1	MOTORISTA DE CAMINHÃO CAÇAMBA
1	OPERADOR DE ESCAVADEIRA		3	PEDREIRO
3	AJUDANTE			
QTDE	EQUIPAMENTO			
1	ESCAVADEIRA			
1	COMPACTADOR DE SOLO			
3	PÁ			
1	CAMINHÃO BASCULANTE			
3	CARRINHO DE MÃO			
1	BETONEIRA			
TAREFAS REALIZADAS				
NÚMERO DE T.R.	DESCRICAO		OBSERVAÇÕES	
1	ATERRO COMPACTADO DE VALA			
2	EXECUÇÃO DE CONTRABERÇO EM REDE PLUVIAL 1200 MM			
3	CORTE, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL PARA ATERRO			
REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)				



Data não informada



Data não informada



Data não informada



Data não informada

OCORRÊNCIAS		
NÚMERO DE OC	TIPO DE OCORRÊNCIA	DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA
CONFERÊNCIA		
MUNICÍPIO	CONSÓRCIO (Aprovado em 26/02/2025 - 08:19)	
Obs.:	Obs.:	
ASSINATURAS		
YURI ANDRADE COSTA LINS Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 233590/D	PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA CREA 137.103/D	ANTÔNIO CARLOS MARTINS BRANDÃO RT de Execução - PONTAL ENGENHARIA LTDA CREA 45.957/D



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº 0152	OBRA: CTP 0191/2024 - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE ACESSIBILIDADE		CONTRATO:		RESP. TÉCNICO: ANTONIO CARLOS MARTINS BRANDÃO	
ENDEREÇO: TRECHO DA RODOVIA DE ACESSO A SANTO ANTONIO DO GRAMA, BAIRRO NOVO HORIZONTE.			INÍCIO: 01/07/2024		Nº CREA-MG: 45957/D	
CIDDE:			PRAZO: 31/12/2024		Nº DA ART:	
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA			UF:		COORDENADAS:	
DATA: 24/02/2025	SOL ☀		NUBLADO ☁		CHUVA ☔	IMPRATICÁVEL ☔
MANHÃ	✓					
TARDE	✓					
QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO				QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
1	ENCARREGADO DE OBRAS				3	PEDREIRO
3	AJUDANTE					
QTDE	EQUIPAMENTO					
2	PÁ					
2	ENXADA					
3	CARRINHO DE MÃO					
1	BETONEIRA					
TAREFAS REALIZADAS						
NÚMERO DE T.R.	DESCRICAO				OBSERVAÇÕES	
1	REBOCO E INSTALAÇÃO DE TAMPA DE CAIXA DE PASSAGEM					
2	REJUNTAMENTO DE REDE PLUVIAL 1200 MM					
3	EXECUÇÃO DE CONTRABERÇO EM REDE PLUVIAL 1200 MM					
REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)						





Data não informada

OCORRÊNCIAS		
NÚMERO DE OC	TIPO DE OCORRÊNCIA	DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA
CONFERÊNCIA		
MUNICÍPIO	CONSÓRCIO (Aprovado em 26/02/2025 - 08:19)	
Obs.:	Obs.:	
ASSINATURAS		
YURI ANDRADE COSTA LINS Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 233590/D	PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA CREA 137.103/D	ANTÔNIO CARLOS MARTINS BRANDÃO RT de Execução - PONTAL ENGENHARIA LTDA CREA 45.957/D



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº 0182	OBRA: CTP 0191/2024 - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE ACESSIBILIDADE	CONTRATO:	RESP. TÉCNICO: ANTONIO CARLOS MARTINS BRANDÃO
ENDEREÇO: TRECHO DA RODOVIA DE ACESSO A SANTO ANTONIO DO GRAMA, BAIRRO NOVO HORIZONTE.	INÍCIO: 01/07/2024	Nº CREA-MG: 45957/D	
CIDDE:	PRAZO: 31/12/2024	Nº DA ART:	
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA	UF:	COORDENADAS:	
DATA: 09/04/2025	SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA ☔
MANHÃ	✓		IMPRATICÁVEL ☔
TARDE	✓		
QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
1	ENCARREGADO DE OBRAS	3	PEDREIRO
3	AJUDANTE		
QTDE	EQUIPAMENTO		
3	PÁ		
1	ROLO COMPACTADOR		
3	ENXADA		
2	CARRINHO DE MÃO		
	TAREFAS REALIZADAS		
NÚMERO DE T.R.	DESCRIÇÃO	OBSERVAÇÕES	
1	LIMPEZA DO CANTEIRO DE OBRAS		
2	CORREÇÃO DE IMPERFEIÇÕES NA PISTA DE ACESSIBILIDAD		
3	ARREIMATE DAS QUINAS DA PONTE		
4	COMPACTAÇÃO DE PISTA COM ROLO		

REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)



Cod. de Autenticidade do Doc.: 11E4.3622.4013.R27E.5511 - ZeroPapel - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA - MG

Proc. Adm: 99.0209-21.2025.17

02/06/2025, 13:28

sistemas.waysistemas.com/cimvalpi/Blk_Medicao_Relatorio_Parcial/



OCORRÊNCIAS		
NÚMERO DE OC	TIPO DE OCORRÊNCIA	DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA
CONFERÊNCIA		
MUNICÍPIO	CONSÓRCIO (Aprovado em 10/04/2025 - 08:05)	
Obs.:	Obs.:	
ASSINATURAS		
YURI ANDRADE COSTA LINS Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 233590/D	PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA CREA 137.103/D	ANTÔNIO CARLOS MARTINS BRANDÃO RT de Execução - PONTAL ENGENHARIA LTDA CREA 45.957/D

https://sistemas.waysistemas.com/cimvalpi/Blk_Medicao_Relatorio_Parcial/






RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº 0181	OBRA: CTP 0191/2024 - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE ACESSIBILIDADE		CONTRATO:		RESP. TÉCNICO: ANTONIO CARLOS MARTINS BRANDÃO
ENDEREÇO: TRECHO DA RODOVIA DE ACESSO A SANTO ANTONIO DO GRAMA, BAIRRO NOVO HORIZONTE.			INÍCIO: 01/07/2024		Nº CREA-MG: 45957/D
CIDDE:			PRAZO: 31/12/2024		Nº DA ART:
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA			UF:		COORDENADAS:
DATA: 08/04/2025	SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA ☔	IMPRATICÁVEL ☔	
MANHÃ	✓				
TARDE	✓				
QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO			QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
1	ENCARREGADO DE OBRAS			3	PEDREIRO
3	AJUDANTE				
QTDE	EQUIPAMENTO				
2	PÁ				
1	CAVADEIRA DE BOCA				
1	CHIBANCA				
2	ENXADA				
2	CARRINHO DE MÃO				
1	MINI CARREGADEIRA				
1	PERFURADOR				
TAREFAS REALIZADAS					
NÚMERO DE T.R.	DESCRIÇÃO				OBSERVAÇÕES
1	CORREÇÃO DE IMPERFEIÇÕES NA PISTA DE ACESSIBILIDADE				
2	CONFEÇÃO DE CERCA DE ARAME FARPADO				
3	LIMPEZA DE ACESSO À BOCA DE LOBO				

REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)



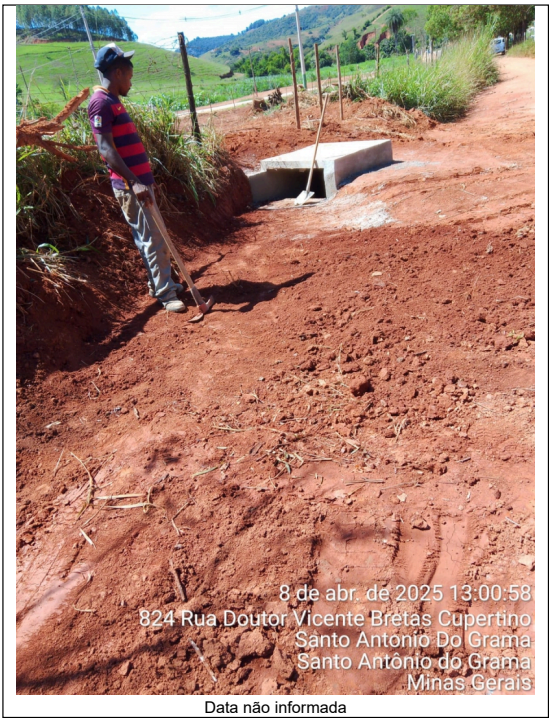

OCORRÊNCIAS		
NÚMERO DE OC	TIPO DE OCORRÊNCIA	DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA
CONFERÊNCIA		
MUNICÍPIO	CONSÓRCIO (Aprovado em 10/04/2025 - 08:05)	
Obs.:	Obs.:	
ASSINATURAS		
YURI ANDRADE COSTA LINS Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 233590/D	PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA CREA 137.103/D	ANTÔNIO CARLOS MARTINS BRANDÃO RT de Execução - PONTAL ENGENHARIA LTDA CREA 45.957/D



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº 0180	OBRA: CTP 0191/2024 - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE ACESSIBILIDADE		CONTRATO:		RESP. TÉCNICO: ANTONIO CARLOS MARTINS BRANDÃO	
ENDEREÇO: TRECHO DA RODOVIA DE ACESSO A SANTO ANTONIO DO GRAMA, BAIRRO NOVO HORIZONTE.			INÍCIO: 01/07/2024		Nº CREA-MG: 45957/D	
CIDDE:			PRAZO: 31/12/2024		Nº DA ART:	
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA			UF:		COORDENADAS:	
DATA: 07/04/2025	SOL ☀		NUBLADO ☁		CHUVA ☔	IMPRATICÁVEL ☔
MANHÃ	✓					
TARDE	✓					
QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO				QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
1	ENCARREGADO DE OBRAS				3	PEDREIRO
3	AJUDANTE					
QTDE	EQUIPAMENTO					
2	PÁ					
1	CHIBANCA					
2	ENXADA					
2	CARRINHO DE MÃO					
TAREFAS REALIZADAS						
NÚMERO DE T.R.	DESCRICAO				OBSERVAÇÕES	
1	ARREIMATE DA CAIXA DE PASSAGEM					
2	CORREÇÃO DE IMPERFEIÇÕES NA PISTA DE ACESSIBILIDAD					
REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATORIOS)						

REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)





Data não informada



Data não informada



Data não informada



Data não informada

OCORRÊNCIAS		
NÚMERO DE OC	TIPO DE OCORRÊNCIA	DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA
CONFERÊNCIA		
MUNICÍPIO	CONSÓRCIO (Aprovado em 08/04/2025 - 07:47)	
Obs.:	Obs.:	
ASSINATURAS		
YURI ANDRADE COSTA LINS Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 233590/D	PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA CREA 137.103/D	ANTÔNIO CARLOS MARTINS BRANDÃO RT de Execução - PONTAL ENGENHARIA LTDA CREA 45.957/D



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº 0179	OBRA: CTP 0191/2024 - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE ACESSIBILIDADE	CONTRATO:	RESP. TÉCNICO: ANTONIO CARLOS MARTINS BRANDÃO
ENDEREÇO: TRECHO DA RODOVIA DE ACESSO A SANTO ANTONIO DO GRAMA, BAIRRO NOVO HORIZONTE.		INÍCIO: 01/07/2024	Nº CREA-MG: 45957/D
CIDDE:		PRAZO: 31/12/2024	Nº DA ART:
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA		UF:	COORDENADAS:
DATA: 04/04/2025	SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA ☔
MANHÃ	✓		IMPRATICÁVEL ☔
TARDE	✓		
QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
1	ENCARREGADO DE OBRAS	3	PEDREIRO
3	AJUDANTE		
QTDE	EQUIPAMENTO		
2	PÁ		
2	ENXADA		
2	CARRINHO DE MÃO		
TAREFAS REALIZADAS			
NÚMERO DE T.R.	DESCRICAÇÃO	OBSERVAÇÕES	
1	CONSTRUÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM		

REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)



Data não informada



Data não informada



Data não informada



Data não informada



Data não informada

OCORRÊNCIAS		
NÚMERO DE OC	TIPO DE OCORRÊNCIA	DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA
CONFERÊNCIA		
MUNICÍPIO	CONSÓRCIO (Aprovado em 04/04/2025 - 16:36)	
Obs.:	Obs.:	
ASSINATURAS		
YURI ANDRADE COSTA LINS Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 233590/D	PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA CREA 137.103/D	ANTÔNIO CARLOS MARTINS BRANDÃO RT de Execução - PONTAL ENGENHARIA LTDA CREA 45.957/D



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº 0178	OBRA: CTP 0191/2024 - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE ACESSIBILIDADE		CONTRATO:		RESP. TÉCNICO: ANTONIO CARLOS MARTINS BRANDÃO	
ENDEREÇO: TRECHO DA RODOVIA DE ACESSO A SANTO ANTONIO DO GRAMA, BAIRRO NOVO HORIZONTE.			INÍCIO: 01/07/2024		Nº CREA-MG: 45957/D	
CIDDE:			PRAZO: 31/12/2024		Nº DA ART:	
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA			UF:		COORDENADAS:	
DATA: 03/04/2025	SOL ☀		NUBLADO ☁		CHUVA ☔	IMPRATICÁVEL ☔
MANHÃ	✓					
TARDE	✓					
QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO			QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	
1	ENCARREGADO DE OBRAS			3	PEDREIRO	
3	AJUDANTE					
QTDE	EQUIPAMENTO					
3	PÁ					
1	CAMINHÃO CARROCERIA					
3	ENXADA					
3	CARRINHO DE MÃO					
1	BETONEIRA					
TAREFAS REALIZADAS						
NÚMERO DE T.R.	DESCRICAO			OBSERVAÇÕES		
1	CONSTRUÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM					
2	CONFECÇÃO DE TAMPA PARA CAIXA DE PASSAGEM					
REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)						





Data não informada	
OCORRÊNCIAS	
NÚMERO DE OC	TIPO DE OCORRÊNCIA
CONFERÊNCIA	
MUNICÍPIO	CONSÓRCIO (Aprovado em 04/04/2025 - 07:58)
Obs.:	Obs.:
ASSINATURAS	
YURI ANDRADE COSTA LINS Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 233590/D	PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA CREA 137.103/D
ANTÔNIO CARLOS MARTINS BRANDÃO RT de Execução - PONTAL ENGENHARIA LTDA CREA 45.957/D	





RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº 0177	OBRA: CTP 0191/2024 - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE ACESSIBILIDADE	CONTRATO:	RESP. TÉCNICO: ANTONIO CARLOS MARTINS BRANDÃO
ENDEREÇO: TRECHO DA RODOVIA DE ACESSO A SANTO ANTONIO DO GRAMA, BAIRRO NOVO HORIZONTE.		INÍCIO: 01/07/2024	Nº CREA-MG: 45957/D
CIDDE:		PRAZO: 31/12/2024	Nº DA ART:
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA		UF:	COORDENADAS:
DATA: 02/04/2025	SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA ☔
MANHÃ	✓		IMPRATICÁVEL ☔
TARDE	✓		
QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
1	ENCARREGADO DE OBRAS	1	OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA
3	PEDREIRO	3	AJUDANTE
QTDE	EQUIPAMENTO		
2	PÁ		
1	CAVADEIRA DE BOCA		
3	ENXADA		
2	CARRINHO DE MÃO		
1	RETROESCAVADEIRA		
TAREFAS REALIZADAS			
NÚMERO DE T.R.	DESCRICAO	OBSERVAÇÕES	
1	ATERRAMENTO DE MANILHAS		
2	CONSTRUÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM		
3	RECONSTRUÇÃO DE CERCA		

REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)






Data não informada



Data não informada

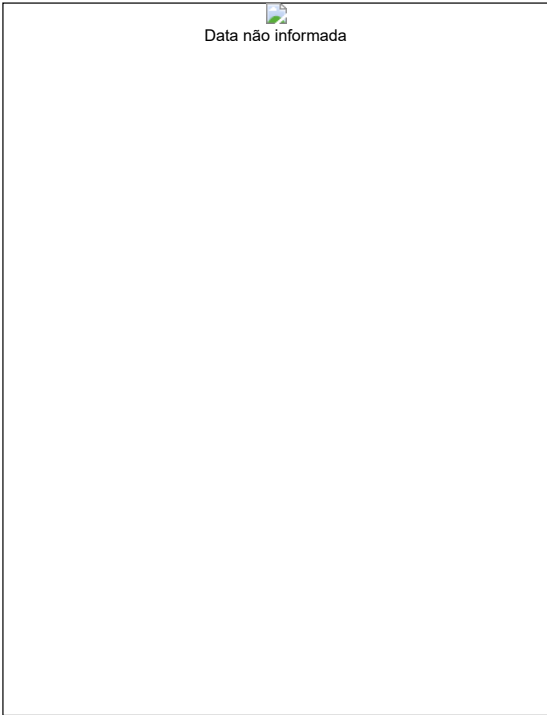

Data não informada



Data não informada



2 de abr. de 2025 16:32:18
Santo Antônio do Gramma
Minas Gerais

Data não informada		
OCORRÊNCIAS		
NÚMERO DE OC	TIPO DE OCORRÊNCIA	DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA
CONFERÊNCIA		
MUNICÍPIO	CONSÓRCIO (Aprovado em 04/04/2025 - 07:58)	
Obs.:	Obs.:	
ASSINATURAS		
YURI ANDRADE COSTA LINS Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 233590/D	PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA CREA 137.103/D	ANTÔNIO CARLOS MARTINS BRANDÃO RT de Execução - PONTAL ENGENHARIA LTDA CREA 45.957/D





RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº 0176	OBRA: CTP 0191/2024 - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE ACESSIBILIDADE		CONTRATO:		RESP. TÉCNICO: ANTONIO CARLOS MARTINS BRANDÃO	
ENDEREÇO: TRECHO DA RODOVIA DE ACESSO A SANTO ANTONIO DO GRAMA, BAIRRO NOVO HORIZONTE.			INÍCIO: 01/07/2024		Nº CREA-MG: 45957/D	
CIDDE:			PRAZO: 31/12/2024		Nº DA ART:	
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA			UF:		COORDENADAS:	
DATA: 01/04/2025	SOL ☀		NUBLADO ☁	CHUVA ☔	IMPRATICÁVEL ☔	
MANHÃ	✓					
TARDE	✓					
QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO			QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	
1	ENCARREGADO DE OBRAS			1	OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA	
3	PEDREIRO			3	AJUDANTE	
QTDE	EQUIPAMENTO					
2	CAVADEIRA RETA					
2	PÁ					
3	ENXADA					
1	CARRINHO DE MÃO					
1	RETROESCAVADEIRA					
TAREFAS REALIZADAS						
NÚMERO DE T.R.	DESCRICAÇÃO			OBSERVAÇÕES		
1	ATERRAMENTO DE MANILHAS					
2	INSTALAÇÃO DE MANILHAS DE 800MM					
3	RECEBIMENTO E DESCARGA DE MANILHA DE 800MM					
4	ESCAVAÇÃO DE VALA PARA INSTALAÇÃO MANILHAS					
5	REJUNTAMENTO DE MANILHAS					
REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)						



Data não informada



Data não informada



Data não informada



Data não informada

OCORRÊNCIAS		
NÚMERO DE OC	TIPO DE OCORRÊNCIA	DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA
CONFERÊNCIA		
MUNICÍPIO	CONSÓRCIO (Aprovado em 02/04/2025 - 16:33)	
Obs.:	Obs.:	
ASSINATURAS		
YURI ANDRADE COSTA LINS Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 233590/D	PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA CREA 137.103/D	ANTÔNIO CARLOS MARTINS BRANDÃO RT de Execução - PONTAL ENGENHARIA LTDA CREA 45.957/D



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº 0175	OBRA: CTP 0191/2024 - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE ACESSIBILIDADE		CONTRATO:		RESP. TÉCNICO: ANTONIO CARLOS MARTINS BRANDÃO	
ENDEREÇO: TRECHO DA RODOVIA DE ACESSO A SANTO ANTONIO DO GRAMA, BAIRRO NOVO HORIZONTE.			INÍCIO: 01/07/2024		Nº CREA-MG: 45957/D	
CIDDE:			PRAZO: 31/12/2024		Nº DA ART:	
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA			UF:		COORDENADAS:	
DATA: 31/03/2025	SOL ☀		NUBLADO ☁		CHUVA ☔	IMPRATICÁVEL ☔
MANHÃ	✓					
TARDE	✓					
QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO				QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
1	ENCARREGADO DE OBRAS				1	OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA
3	PEDREIRO				3	AJUDANTE
QTDE						EQUIPAMENTO
2						CAVADEIRA RETA
3						PÁ
3						ENXADA
2						CARRINHO DE MÃO
1						RETROESCAVADEIRA
TAREFAS REALIZADAS						
NÚMERO DE T.R.	DESCRICAÇÃO				OBSERVAÇÕES	
1	INSTALAÇÃO DE MANILHAS DE 800MM					
2	RECEBIMENTO E DESCARGA DE MANILHAS DE 800MM					
3	ESCAVAÇÃO DE VALA PARA INSTALAÇÃO DE MANILHAS DE 8					
4	TRAVAMENTO DE CALÇAMENTO DE BLOQUETES SEXTAVADO					
REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)						





OCORRÊNCIAS		
NÚMERO DE OC	TIPO DE OCORRÊNCIA	DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA
CONFERÊNCIA		
MUNICÍPIO	CONSÓRCIO (Aprovado em 01/04/2025 - 07:48)	
Obs.:	Obs.:	
ASSINATURAS		
YURI ANDRADE COSTA LINS Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 233590/D	PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA CREA 137.103/D	ANTÔNIO CARLOS MARTINS BRANDÃO RT de Execução - PONTAL ENGENHARIA LTDA CREA 45.957/D



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº 0174	OBRA: CTP 0191/2024 - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE ACESSIBILIDADE		CONTRATO:		RESP. TÉCNICO: ANTONIO CARLOS MARTINS BRANDÃO	
ENDEREÇO: TRECHO DA RODOVIA DE ACESSO A SANTO ANTONIO DO GRAMA, BAIRRO NOVO HORIZONTE.			INÍCIO: 01/07/2024		Nº CREA-MG: 45957/D	
CIDDE:			PRAZO: 31/12/2024		Nº DA ART:	
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA			UF:		COORDENADAS:	
DATA: 28/03/2025	SOL ☀		NUBLADO ☁	CHUVA ☔	IMPRATICÁVEL ☔	
MANHÃ	✓					
TARDE	✓					
QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO			QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	
1	ENCARREGADO DE OBRAS			3	PEDREIRO	
3	AJUDANTE					
QTDE	EQUIPAMENTO					
3	PÁ					
2	CHIBANCA					
3	ENXADA					
3	CARRINHO DE MÃO					
1	BETONEIRA					
TAREFAS REALIZADAS						
NÚMERO DE T.R.	DESCRICAO			OBSERVAÇÕES		
1	CONCRETAGEM DE MEIO FIO					
2	CONCRETAGEM DE SARJETA					
3	PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE SEXTAVADO					
4	DEMOLIÇÃO DE CALÇAMENTO EM PEYVER					
REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)						





Data não informada




Data não informada

OCORRÊNCIAS		
NÚMERO DE OC	TIPO DE OCORRÊNCIA	DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA
CONFERÊNCIA		
MUNICÍPIO	CONSÓRCIO (Aprovado em 31/03/2025 - 08:07)	
Obs.:	Obs.:	
ASSINATURAS		
YURI ANDRADE COSTA LINS Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 233590/D	PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA CREA 137.103/D	ANTÔNIO CARLOS MARTINS BRANDÃO RT de Execução - PONTAL ENGENHARIA LTDA CREA 45.957/D



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº 0173	OBRA: CTP 0191/2024 - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE ACESSIBILIDADE	CONTRATO:	RESP. TÉCNICO: ANTONIO CARLOS MARTINS BRANDÃO
ENDEREÇO: TRECHO DA RODOVIA DE ACESSO A SANTO ANTONIO DO GRAMA, BAIRRO NOVO HORIZONTE.		INÍCIO: 01/07/2024	Nº CREA-MG: 45957/D
CIDDE:		PRAZO: 31/12/2024	Nº DA ART:
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA		UF:	COORDENADAS:
DATA: 27/03/2025	SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA ☔
MANHÃ		✓	IMPRATICÁVEL ☔
TARDE	✓		
QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
1	ENCARREGADO DE OBRAS	3	PEDREIRO
3	AJUDANTE		
QTDE	EQUIPAMENTO		
3	PÁ		
1	ROLO COMPACTADOR		
2	CHIBANCA		
3	ENXADA		
2	CARRINHO DE MÃO		
TAREFAS REALIZADAS			
NÚMERO DE T.R.	DESCRICAO	OBSERVAÇÕES	
1	CONCRETAGEM DE BOCA DE LOBO		
2	CONCRETAGEM DE SAIDA DE MANILHA		
3	COMPACTAÇÃO DE SOLO COM ROLO		
4	DEMOLIÇÃO DE SARJETA		
REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)			

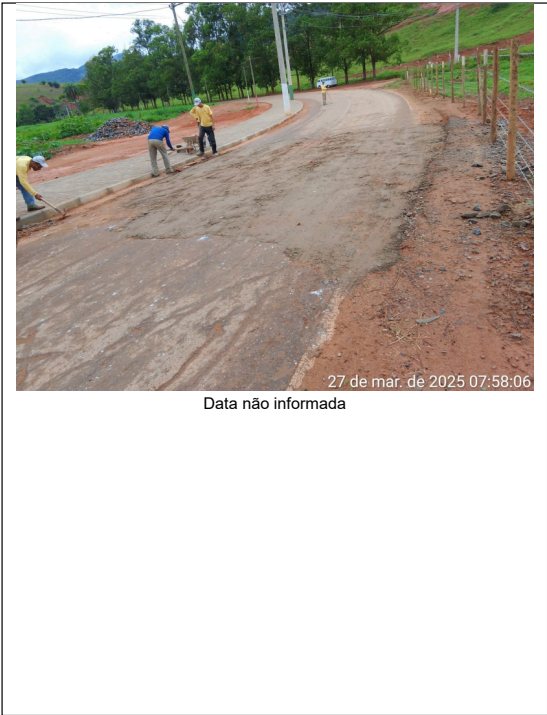



27 de mar. de 2025 07:58:13
Data não informada



27 de mar. de 2025 10:18:54
798 Rua Doutor Vicente Bretas Cupertino
Santo Antonio Do Grama
Santo Antônio do Grama
Minas Gerais



27 de mar. de 2025 10:18:46
798 Rua Doutor Vicente Bretas Cupertino
Santo Antonio Do Grama
Santo Antônio do Grama
Minas Gerais



27 de mar. de 2025 07:58:24
Santo Antônio do Grama
Minas Gerais


OCORRÊNCIAS		
NÚMERO DE OC	TIPO DE OCORRÊNCIA	DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA
CONFERÊNCIA		
MUNICÍPIO	CONSÓRCIO (Aprovado em 28/03/2025 - 08:14)	
Obs.:	Obs.:	
ASSINATURAS		
YURI ANDRADE COSTA LINS Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 233590/D PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA CREA 137.103/D ANTÔNIO CARLOS MARTINS BRANDÃO RT de Execução - PONTAL ENGENHARIA LTDA CREA 45.957/D		



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº 0172	OBRA: CTP 0191/2024 - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE ACESSIBILIDADE	CONTRATO:	RESP. TÉCNICO: ANTONIO CARLOS MARTINS BRANDÃO
ENDEREÇO: TRECHO DA RODOVIA DE ACESSO A SANTO ANTONIO DO GRAMA, BAIRRO NOVO HORIZONTE.	INÍCIO: 01/07/2024	Nº CREA-MG: 45957/D	
CIDDE:	PRAZO: 31/12/2024	Nº DA ART:	
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA	UF:	COORDENADAS:	
DATA: 26/03/2025	SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA ☔
MANHÃ	✓		IMPRATICÁVEL ☔
TARDE	✓		
QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
1	ENCARREGADO DE OBRAS	3	PEDREIRO
3	AJUDANTE		
QTDE	EQUIPAMENTO		
3	PÁ		
3	ENXADA		
2	CARRINHO DE MÃO		
1	SERRA DE BANCADA		
	TAREFAS REALIZADAS		
NÚMERO DE T.R.	DESCRICAÇÃO	OBSERVAÇÕES	
1	PAVIMENTAÇÃO EM PEYVER DE CONCRETO		
2	ESPALHAMENTO E NIVELAMENTO DE AREIA PARA BERÇO		

REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)

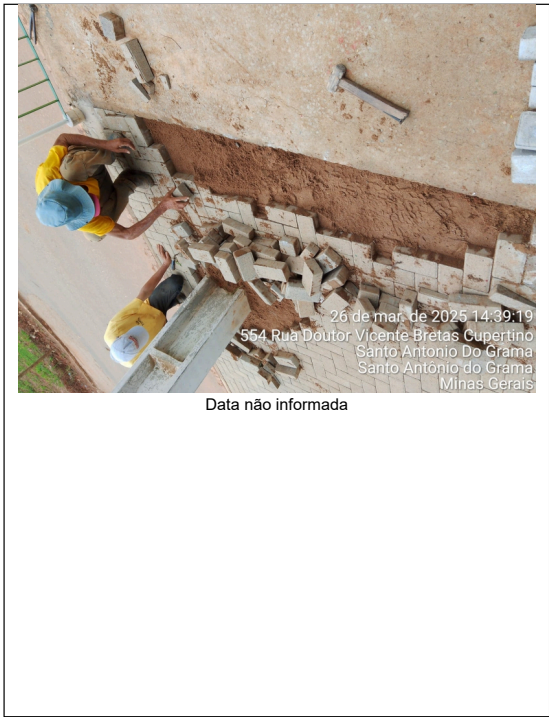




OCORRÊNCIAS		
NÚMERO DE OC	TIPO DE OCORRÊNCIA	DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA
CONFERÊNCIA		
MUNICÍPIO	CONSÓRCIO (Aprovado em 27/03/2025 - 08:14)	
Obs.:	Obs.:	
ASSINATURAS		
YURI ANDRADE COSTA LINS Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 233590/D	PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA CREA 137.103/D	ANTÔNIO CARLOS MARTINS BRANDÃO RT de Execução - PONTAL ENGENHARIA LTDA CREA 45.957/D



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº 0171	OBRA: CTP 0191/2024 - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE ACESSIBILIDADE	CONTRATO:	RESP. TÉCNICO: ANTONIO CARLOS MARTINS BRANDÃO
ENDEREÇO: TRECHO DA RODOVIA DE ACESSO A SANTO ANTONIO DO GRAMA, BAIRRO NOVO HORIZONTE.		INÍCIO: 01/07/2024	Nº CREA-MG: 45957/D
CIDDE:		PRAZO: 31/12/2024	Nº DA ART:
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA		UF:	COORDENADAS:
DATA: 25/03/2025	SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA ☔
MANHÃ	✓		IMPRATICÁVEL ☔
TARDE	✓		
QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
1	ENCARREGADO DE OBRAS	3	PEDREIRO
3	AJUDANTE		
QTDE	EQUIPAMENTO		
2	PÁ		
2	ENXADA		
2	CARRINHO DE MÃO		
1	BETONEIRA		
2	MARTELO		
TAREFAS REALIZADAS			
NÚMERO DE T.R.	DESCRIÇÃO	OBSERVAÇÕES	
1	INSTALAÇÃO DE MEIO FIO PREMOLDADO		
2	ESPALHAMENTO E NIVELAMENTO DE AREIA PARA BERÇO		
3	CONSTRUÇÃO DE SARGETA		
4	CONSTRUÇÃO DE CERCA DE ARAME FARPADO		
5	PAVIMENTAÇÃO EM PAVER DE CONCRETO		
REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)			



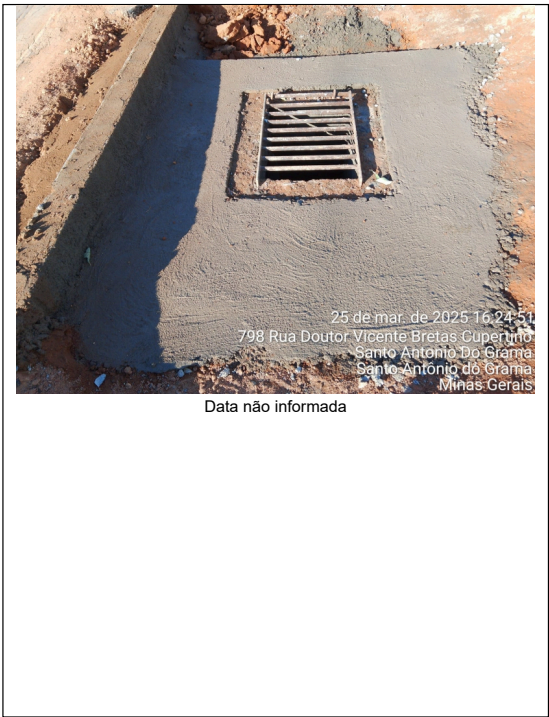

OCORRÊNCIAS		
NÚMERO DE OC	TIPO DE OCORRÊNCIA	DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA
CONFERÊNCIA		
MUNICÍPIO	CONSÓRCIO (Aprovado em 26/03/2025 - 09:22)	
Obs.:	Obs.:	
ASSINATURAS		
YURI ANDRADE COSTA LINS Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 233590/D	PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA CREA 137.103/D	ANTÔNIO CARLOS MARTINS BRANDÃO RT de Execução - PONTAL ENGENHARIA LTDA CREA 45.957/D



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº 0170	OBRA: CTP 0191/2024 - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE ACESSIBILIDADE		CONTRATO:		RESP. TÉCNICO: ANTONIO CARLOS MARTINS BRANDÃO	
ENDEREÇO: TRECHO DA RODOVIA DE ACESSO A SANTO ANTONIO DO GRAMA, BAIRRO NOVO HORIZONTE.			INÍCIO: 01/07/2024		Nº CREA-MG: 45957/D	
CIDDE:			PRAZO: 31/12/2024		Nº DA ART:	
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA			UF:		COORDENADAS:	
DATA: 24/03/2025	SOL ☀		NUBLADO ☁		CHUVA ☔	IMPRATICÁVEL ☔
MANHÃ	✓					
TARDE			✓			
QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO				QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
1	ENCARREGADO DE OBRAS				3	PEDREIRO
3	AJUDANTE					
QTDE	EQUIPAMENTO					
3	PÁ					
2	CHIBANCA					
3	ENXADA					
4	CARRINHO DE MÃO					
1	BETONEIRA					
TAREFAS REALIZADAS						
NÚMERO DE T.R.	DESCRICAÇÃO				OBSERVAÇÕES	
1	CONCRETAGEM DE BASE DE CERCA					
2	ESCAVAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE MEIO FIO E SARJETA					
3	INSTALAÇÃO DE MEIO FIO PREMOLDADO					
4	CONSTRUÇÃO DE BOCA DE LOBO					
5	CONCRETAGEM DE SARJETA					
REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)						





OCORRÊNCIAS		
NÚMERO DE OC	TIPO DE OCORRÊNCIA	DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA
CONFERÊNCIA		
MUNICÍPIO	CONSÓRCIO (Aprovado em 25/03/2025 - 09:33)	
Obs.:	Obs.:	
ASSINATURAS		
YURI ANDRADE COSTA LINS Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 233590/D	PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA CREA 137.103/D	ANTÔNIO CARLOS MARTINS BRANDÃO RT de Execução - PONTAL ENGENHARIA LTDA CREA 45.957/D




RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº 0169	OBRA: CTP 0191/2024 - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE ACESSIBILIDADE	CONTRATO:	RESP. TÉCNICO: ANTONIO CARLOS MARTINS BRANDÃO
ENDEREÇO: TRECHO DA RODOVIA DE ACESSO A SANTO ANTONIO DO GRAMA, BAIRRO NOVO HORIZONTE.		INÍCIO: 01/07/2024	Nº CREA-MG: 45957/D
CIDDE:		PRAZO: 31/12/2024	Nº DA ART:
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA		UF:	COORDENADAS:
DATA: 21/03/2025	SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA ☔
MANHÃ	✓		IMPRATICÁVEL ☔
TARDE	✓		
QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
1	ENCARREGADO DE OBRAS	1	OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA
3	PEDREIRO	3	AJUDANTE
QTDE	EQUIPAMENTO		
3	PÁ		
2	CHIBANCA		
3	ENXADA		
2	CARRINHO DE MÃO		
1	SERRA MÁRMORE		
1	RETROESCAVADEIRA		
TAREFAS REALIZADAS			
NÚMERO DE T.R.	DESCRICAO	OBSERVAÇÕES	
1	ATERRAMENTO DE MANILHAS		
2	ACERTO E NIVELAMENTO DE PISTA MANUAL		
3	REJUNTAMENTO DE MANILHAS		
4	INSTALAÇÃO DE MANILHAS DE 600MM		
5	ACABAMENTO DE CALÇAMENTO NO ENTORNO DOS POSTES		

REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)



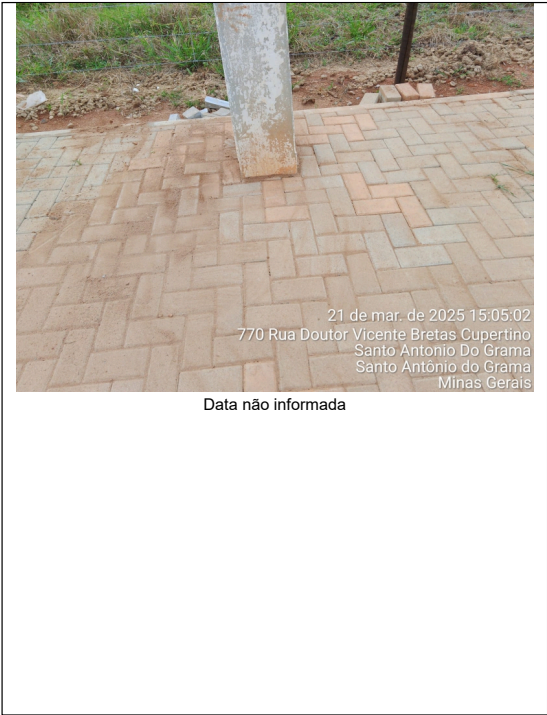

OCORRÊNCIAS		
NÚMERO DE OC	TIPO DE OCORRÊNCIA	DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA
CONFERÊNCIA		
MUNICÍPIO	CONSÓRCIO (Aprovado em 24/03/2025 - 11:05)	
Obs.:	Obs.:	
ASSINATURAS		
YURI ANDRADE COSTA LINS Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 233590/D	PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA CREA 137.103/D	ANTÔNIO CARLOS MARTINS BRANDÃO RT de Execução - PONTAL ENGENHARIA LTDA CREA 45.957/D



CIMVALPI

CONSORCIO INTERMUNICIPAL
MULTISETORIAL DO VALE DO PIRANGA

Assinaturas do Documento



Documento Assinado Eletronicamente por **ANTONIO CARLOS MARTINS BRANDÃO**,
CPF: 385.06*. **6- *4 em **04/06/2025 11:40:08**, Cód. Autenticidade da Assinatura:
11V2.0K40.708U.757A.8156, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de
2020.



Documento Assinado Eletronicamente por **YURI ANDRADE COSTA LINS -**
ENGENHEIRO CIVIL JÚNIOR, **CPF: 084.94*. **6- *2** em **04/06/2025 11:24:51**, Cód.
Autenticidade da Assinatura: **11H6.2V24.451A.8629.4677**, Com fundamento na Lei Nº
14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Informações do Documento

ID do Documento: **1.0CC.E8B** - Tipo de Documento: **FORMULÁRIO DE MEDIÇÕES.**

Elaborado por **JONATHAN GABRIEL SILVA SANTOS**, **CPF: 141.95*. **6- *8**, em **04/06/2025 - 11:22:01**

Código de Autenticidade deste Documento: **11E4.3622.4013.R27E.5511**

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
<https://zeropapel.cimvalpi.mg.gov.br/verdocumento>



MEMORANDO

Nº 3.325/2025

PONTE NOVA/MG, 09 de junho de 2025.

Assunto: Taxa de remuneração de gestão referente às liquidações do contrato de programa 191/2024

Referência: Medições – Pavimentação – Santo Antônio do Grama

Referência	Valor BDI	Taxa	Taxa de remuneração
BM 01 - 30/05/2025 - Pavimentação - 2º Aditivo - Implantação de Pista de Acessibilidade	R\$ 60.665,00	5,50	R\$ 3.336,58
TOTAL			R\$ 3.336,58

Ordens de serviço:

- 000412/2025 - Nº do empenho 000839/2025 – ordem de fornecimento: 000001/2025

Valor da taxa de remuneração de gestão: R\$ 3.336,58

Atenciosamente,

Yuri Andrade Costa Lins
Engenheiro Civil – CREA 233590/D
Fiscal do Contrato

Assinatura do Documento



Documento Assinado Eletronicamente por **YURI ANDRADE COSTA LINS - ENGENHEIRO CIVIL JÚNIOR**, CPF: 084.94*.**6-*2 em 09/06/2025 08:53:04, Cód. Autenticidade da Assinatura: **08Z6.1R53.103H.U30W.8106**, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Informações do Documento

ID do Documento: **1.0E5.F75** - Tipo de Documento: **MEMORANDO - Nº 3.325/2025**

Elaborado por **JONATHAN GABRIEL SILVA SANTOS**, CPF: 141.95*.**6-*8, em 09/06/2025 08:09:26, contendo 97 palavras.

Código de Autenticidade deste Documento: 0827.2209.6267.247V.7768

A autenticidade do documento pode ser conferida no site: <https://zeropapel.cimvalpi.mg.gov.br/verdocumento>





CIMVALPI - Consórcio Intermunicipal Multissetorial do Vale do Piranga
Estado de Minas Gerais
ORDEM DE FORNECIMENTO

ORDEM DE FORNECIMENTO
000001/2025



DADOS DA ENTIDADE / ORGÃO

Endereço: Rua Jaime Pereira, 127 - Progresso
Ponte Nova, Minas Gerais, Brasil- C.E.P : 35430-000
C.N.P.J.: 19.738.706/0001-83 Inscrição Estadual
Telefone: (31)38813273 Fax: (31)38813273

Ordem de Serviço / Compra 000412/2025	Número do Empenho 000839/2025	Ficha Orçamentária 00186	Sector Contabil CIMVALPI
---	---	------------------------------------	------------------------------------

Processo de Compra
070018/2024

Condição de Pagamento: Pagamento Parcelado
Prazo de Entrega: Durante a Vigência do Contrato
Garantia: Material Não Possui Garantia
Assistência Técnica: Pelo Próprio Fornecedor ou Por Concessionária

Fornecedor: **001484 - PONTAL ENGENHARIA LTDA**
Endereço: Avenida Doutor Otávio Soares, 266 - Palmeiras
Ponte Nova, Minas Gerais, Brasil - C.E.P : 35.430-000
CNPJ: 05.527.293/0001-83 Inscrição Estadual
Telefone: Fax
Email: Banco
Conta p/ Pagamento.....:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE AQUISIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
0001	00025371 - Prestação de serviços da pista de acessibilidade ao bairro Novo Horizonte a ser executada ao longo da saída do município de Santo Antônio do Grama (perímetro urbano) até o portal da cidade.	Unidade	1,0000	60.665,0000	60.665,0000

VALOR TOTAL DA ORDEM DE FORNECIMENTO **60.665,00**

Valor.....: **R\$ 60.665,00 (Sessenta Mil e Seiscentos e Sessenta e Cinco Reais)**

As informações a seguir são referentes aos locais de entrega, os locais de origem dos pedidos, os números dos pedidos e quantidade de cada material especificado a ser entregue no local de entrega.

LOCAL DE ENTREGA

LOCAL DO PEDIDO A SER ATENDIDO NO LOCAL DE ENTREGA	NÚMERO DO PEDIDO
01 - Cimvalpi	070116/2024

OBSERVAÇÃO : CTP 191 2024 SANTO ANTONIO DO GRAMA

Favor Informar nas Notas Fiscais o Número do Processo de Compras, Ordem de Serviço / Compras e a Ordem de Fornecimento.

Ponte Nova-MG, 21 de Maio de 2025

Verônica Aparecida de Carvalho Lima
Gerente Administrativo
CIMVALPI



CIMVALPI
CONSORCIO INTERMUNICIPAL
MULTISETORIAL DO VALE DO PIRANGA

Assinatura do Documento



Documento Assinado Eletronicamente por **VERÔNICA APARECIDA DE CARVALHO LIMA - GERENTE ADMINISTRATIVO**, CPF: 013.32*. **6-*4 em 11/06/2025 09:12:28, Cód. Autenticidade da Assinatura: 09K1.1U12.5287.W529.1763, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Informações do Documento

ID do Documento: **1.103.0FA** - Tipo de Documento: **ORDEN DE FORNECIMENTO DIGITALIZADO.**

Elaborado por **VERÔNICA APARECIDA DE CARVALHO LIMA**, CPF: 013.32*. **6-*4 , em 11/06/2025 - 09:12:28

Código de Autenticidade deste Documento: 09H7.7X12.2286.E282.4570

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
<https://zeropapel.cimvalpi.mg.gov.br/verdocumento>





Município de Ponte Nova - MG
Secretaria Municipal de Fazenda
Rua Avenida Caetano Marinho, Centro, 306 - 35430000 - Ponte Nova - MG

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

NÚMERO DA NOTA FISCAL
2025/9



Dados da NFS-e

Natureza da Operação: Tributação fora do município Nº RPS:	Código de Autenticidade: 68430078 Nº NFS-e: 2025/9	Data de Emissão: 06/06/2025 11:51:36 Data Emissão RPS:
---	---	---

Dados do Prestador

Razão Social: PONTAL ENGENHARIA LTDA
Nome Fantasia: PONTAL ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 05.527.293/0001-83 Inscrição Estadual: Inscrição Municipal: 78010886
Endereço: Avenida Doutor Otávio Soares, 266, , Palmeiras, Cep:35430229, PONTE NOVA - MG
Telefone: (31) 3881-2824 E-mail: pontal@pontal.eng.br
Incentivador Cultural: Não Simples Nacional: Não optante Regime Especial: Nenhum

Dados do Tomador

Razão Social: CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA
CNPJ: 19.738.706/0001-83 Insc. Estadual: Insc. Municipal:
Endereço: RUA JAIME PEREIRA, 127, PROGRESSO - CEP 35.430-186 - PONTE NOVA - MG Tel: (31) 3881-3408
E-mail: adm.cimvalpi@gmail.com

Discriminação dos Serviços

CTP 191 2024 – PAVIMENTAÇÃO – 2º ADITIVO - IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE ACESSIBILIDADE - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - BM 01.
Processo de Compras 070018/2024, Ordem de Serviço 000412/2024, Empenho 00839/2024 e a Ordem de Fornecimento 00001/2025.

Observações

- APENAS PARA FINS DE RETENÇÃO A SEGURIDADE SOCIAL:
PERCENTUAL DE MÃO DE OBRA 35% - R\$ 21.232,75.
PERCENTUAL DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS FORNECIDOS 65% - R\$ 39.432,25.
-EMPRESA COM MÃO DE OBRA DESONERADA- ALIQUOTA RETENÇÃO SEGURIDADE SOCIAL SOBRE O VALOR BRUTO DA NF: 3,5%. APROPRIAÇÃO E RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL): CNO 90.020.56642/77
- ALIQUOTA RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA: 1,2%, CONFORME ANEXO 1 DA IN RFB Nº 1234 DE 11/01/2012 ALTERADA PELA IN RFB 2145 DE 26/06/2023.
- OPÇÃO PELO ARTIGO 4º DO DECRETO MUNICIPAL Nº32 DE 05/08/2015, ESTANDO A APLICAÇÃO DE MATERIAIS LIMITADO A 50% DO VALOR INTEGRAL DA NOTA FISCAL PARA FINS DE APURAÇÃO DE BASE DE CÁLCULO DO ISSQN.
ALÍQUOTA ISSQN CONFORME ITEM 7.02, TABELA 2, DO CÓD.TRIBUTÁRIO MUNICIPAL STO ANT. DO GRAMA -5,00% .
- DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL, AGENCIA 0146, CONTA CORRENTE 578554574-4.

Código/Serviço - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

Código CNAE 4120400	ISSQN Retido Sim	Local Prestação dos Serviços 3160108 - SANTO ANTONIO DO GRAMA - MG	Local de Incidência ISSQN 3160108 - SANTO ANTONIO DO GRAMA - MG
------------------------	---------------------	---	--

Retenções Federais

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 2.123,28	IR R\$ 727,98	CSLL R\$ 0,00	OUTRAS R\$ 0,00
-----------------	--------------------	----------------------	------------------	------------------	--------------------

Valores da NFS-e

Valor Total dos Serviços R\$ 60.665,00	Deduções R\$ 30.332,50	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Desconto Condicionado R\$ 0,00	Base de Calculo R\$ 30.332,50
---	---------------------------	-------------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------



Alíquota 5.00	Valor do ISSQN R\$ 1.516,63	Valor Total R\$ 60.665,00	Valor Líquido R\$ 56.297,11
------------------	--------------------------------	------------------------------	--

Recebemos de PONTAL ENGENHARIA LTDA os serviços discriminados na nota fiscal eletrônica indicada ao lado.		NFS-e 2025/9
Data de recebimento	Assinatura e Documento do recebedor	





CIMVALPI
CONSORCIO INTERMUNICIPAL
MULTISETORIAL DO VALE DO PIRANGA

Assinatura do Documento



Documento Assinado Eletronicamente por **VERÔNICA APARECIDA DE CARVALHO LIMA - GERENTE ADMINISTRATIVO**, CPF: 013.32*. **6-*4 em 11/06/2025 09:12:29, Cód. Autenticidade da Assinatura: 09A4.2812.7289.H414.4772, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Informações do Documento

ID do Documento: **1.103.16F** - Tipo de Documento: **NF - NOTA FISCAL**

Elaborado por **VERÔNICA APARECIDA DE CARVALHO LIMA**, CPF: 013.32*. **6-*4 , em 11/06/2025 - 09:12:29

Código de Autenticidade deste Documento: 0946.5K12.028X.Z164.6262

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
<https://zeropapel.cimvalpi.mg.gov.br/verdocumento>





CIMVALPI - Consórcio Intermunicipal Multissetorial do Vale do Piranga
Estado de Minas Gerais
CONFORMIDADE DE LIQUIDAÇÃO

CONFORMIDADE
LIQUIDAÇÃO
000001/2025

Processo de Compra
070018/2024

Ordem de Serviço / Compra
000412/2025

Número do Empenho
000839/2025

Ficha Orçamentária
00186

Ordem de Fornecimento
000001/2025

DADOS DA ENTIDADE / ORGÃO

Endereço: Rua Jaime Pereira, 127 - Progresso
Ponte Nova, Minas Gerais, Brasil- C.E.P : 35430-000
C.N.P.J.: 19.738.706/0001-83 Inscrição Estadual:
Telefone: (31)38813273 Fax: (31)38813273

Setor Contabil

CIMVALPI

Condição de Pagamento: Pagamento Parcelado
Prazo de Entrega: Durante a Vigência do Contrato
Garantia: Material Não Possui Garantia
Assistência Técnica: Pelo Próprio Fornecedor ou Por Concessionária

Fornecedor: 001484 - PONTAL ENGENHARIA LTDA
Endereço: Avenida Doutor Otávio Soares, 266 - Palmeiras
Ponte Nova, Minas Gerais, Brasil - C.E.P : 35.430-000
CNPJ: 05.527.293/0001-83 Inscrição Estadual:
Telefone: Fax:
Email:
Conta p/ Pagamento.....: Banco

VALOR DA CONFORMIDADE DE LIQUIDAÇÃO **60.665,00**

Valor.....: **R\$ 60.665,00** (**Sessenta Mil e Seiscentos e Sessenta e Cinco Reais**)

Ponte Nova-MG, 11 de Junho de 2025

Página: 00001





CIMVALPI

CONSORCIO INTERMUNICIPAL
MULTISETORIAL DO VALE DO PIRANGA

Assinatura do Documento



Documento Assinado Eletronicamente por **VERÔNICA APARECIDA DE CARVALHO LIMA - GERENTE ADMINISTRATIVO**, CPF: 013.32*. **6-*4 em 11/06/2025 11:31:44, Cód. Autenticidade da Assinatura: 11U6.5V31.844K.7156.8782, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Informações do Documento

ID do Documento: **1.106.E53** - Tipo de Documento: **CONFORMIDADE DE LIQUIDAÇÃO**.

Elaborado por **VERÔNICA APARECIDA DE CARVALHO LIMA**, CPF: 013.32*. **6-*4 , em 11/06/2025 - 11:31:44

Código de Autenticidade deste Documento: 1142.7A31.144U.H504.2845

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
<https://zeropapel.cimvalpi.mg.gov.br/verdocumento>





**CIMVALPI - Consórcio Intermunicipal
Multissetorial do Vale do Piranga**

ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Exercício
2025

Fonte
1.869.000.0000

Número
04773

PROCESSO

Requisição de Compra

Nº:
EM:

Convênio.....: 00447 - ST. ANT. DO GRAMA - 191/2024 IMPLAN

Vencimento:

Centro de Custo.....: 00113 - IMPOSTO DE RENDA

NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA-SE QUE SEJA EXECUTADA, NESTE EXERCÍCIO, A DESPESA A SEGUIR ESPECIFICADA.

**ORDEM DE PAGAMENTO
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
Imposto de Renda CTP**

Favorecido: **000104 - Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Grama**

Telefone: **(31) 3872-5005**

Endereço: **Rua Padre João Coutinho , 121 , 35.388-000**

Cidade: **Santo Antônio do Grama - MG**

Conta Bancária

**CNPJ / CPF
18.836.973/0001-20**

Especificação
da Despesa

**VALOR REFERE-SE A REPASSE DE IMPOSTO DE RENDA DA NOTA FISCAL 009 DA EMPRESA PONTAL
ENGENHARIA.**

Valor: **R\$ 727,98** (Setecentos e Vinte e Sete Reais e Noventa e Oito Centavos)

Data: **11 / 06 / 2025**

Ordenador da Despesa:

DEMONSTRAÇÃO

CONTADOR

Detalhamento dos Descontos:

Despesa Bruta: **727,98**

Descontos: **0,00**

Despesa Líquida: **727,98**

**RONALDO ADRIANO DA SILVEIRA RIBEIRO
CRC MG-101957/O-0**

LIQUIDAÇÃO

ORDEM DE PAGAMENTO

CONTROLE INTERNO

O MATERIAL OU SERVIÇO
FOI ENTREGUE CONFORME
SOLICITADO. / /

FACE À LIQUIDAÇÃO
PROCESSADA DETERMINO
O SEU PAGAMENTO. / /

EXAMINAMOS O PERCURSO DA DESPESA, EM
CONFORMIDADE COM AS DISPOSIÇÕES LEGAIS
QUE DISCIPLINAM O SEU PROCESSAMENTO.

**DIRETOR ADMINISTRATIVO
JULIO CORREA GUIMARAES**

**ANALISTA DE CONFORMIDADE
VITOR CORTEZÃO ANGELO GOMES**

RECIBO

Recebi o valor acima descrito referente a despesa com materiais e / ou serviços
acima especificado, para a qual dou quitação, para um só efeito.

Documento: (Tipo / Número)

Data: / /

Nome

Assinatura

Banco

Cheque

Conta

Recursos





Assinaturas do Documento



Documento Assinado Eletronicamente por **JÚLIO CORREA GUIMARÃES -
ORDENADOR DE PAGAMENTO**, CPF: 012.04*. **6-*0 em 11/06/2025 17:45:55, Cód.
Autenticidade da Assinatura: 1785.4945.655W.V132.6846, Com fundamento na Lei Nº
14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Documento Assinado Eletronicamente por **VITOR CORTEZÃO ANGELO GOMES -
ANALISTA DE CONFORMIDADE**, CPF: 016.50*. **6-*2 em 11/06/2025 16:35:52, Cód.
Autenticidade da Assinatura: 16U0.7835.052V.926H.0565, Com fundamento na Lei Nº
14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Documento Assinado Eletronicamente por **RONALDO ADRIANO DA SILVEIRA
RIBEIRO**, CPF: 992.49*. **6-*4 em 11/06/2025 14:17:38, Cód. Autenticidade da
Assinatura: 1487.4A17.2388.9068.3103, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de
Setembro de 2020.



Informações do Documento

ID do Documento: **1.107.25F** - Tipo de Documento: **EXTRA ORÇAMENTO**.

Elaborado por **ANA BEATRIZ RIBEIRO CORCINI**, CPF: 139.21*. **6-*8 , em 11/06/2025 - 11:51:18

Código de Autenticidade deste Documento: 1172.8X51.618U.9653.4426

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:

<https://zeropapel.cimvalpi.mg.gov.br/verdocumento>





**CIMVALPI - Consórcio Intermunicipal
Multissetorial do Vale do Piranga**

ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Exercício
2025

Fonte
1.869.000.0000

Número
04775

PROCESSO

Requisição de Compra

Nº:
EM:

Convênio.....: 00447 - ST. ANT. DO GRAMA - 191/2024 IMPLAN

Vencimento:

Centro de Custo.....: 00019 - ISS

NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA-SE QUE SEJA EXECUTADA, NESTE EXERCÍCIO, A DESPESA A SEGUIR ESPECIFICADA.

**ORDEM DE PAGAMENTO
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
Iss**

Favorecido: **000104 - Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Grama**

Telefone: **(31) 3872-5005**

Endereço: **Rua Padre João Coutinho , 121 , 35.388-000**

Cidade: **Santo Antônio do Grama - MG**

Conta Bancária

**CNPJ / CPF
18.836.973/0001-20**

Especificação
da Despesa

VALOR REFERE-SE A REPASSE DE ISS DA NOTA FISCAL 009 DA EMPRESA PONTAL ENGENHARIA.

Valor: **R\$ 1.516,63** (Um Mil e Quinhentos e Dezesesseis Reais e Sessenta e Tres Centavos)

Data: **11 / 06 / 2025**

Ordenador da Despesa:

DEMONSTRAÇÃO

CONTADOR

Detalhamento dos Descontos:

Despesa Bruta: **1.516,63**

Descontos: **0,00**

Despesa Líquida: **1.516,63**

**RONALDO ADRIANO DA SILVEIRA RIBEIRO
CRC MG-101957/O-0**

LIQUIDAÇÃO

ORDEM DE PAGAMENTO

CONTROLE INTERNO

O MATERIAL OU SERVIÇO
FOI ENTREGUE CONFORME
SOLICITADO. / /

FACE À LIQUIDAÇÃO
PROCESSADA DETERMINO
O SEU PAGAMENTO. / /

EXAMINAMOS O PERCURSO DA DESPESA, EM
CONFORMIDADE COM AS DISPOSIÇÕES LEGAIS
QUE DISCIPLINAM O SEU PROCESSAMENTO.

**DIRETOR ADMINISTRATIVO
JULIO CORREA GUIMARAES**

**ANALISTA DE CONFORMIDADE
VITOR CORTEZÃO ANGELO GOMES**

RECIBO

Recebi o valor acima descrito referente a despesa com materiais e / ou serviços
acima especificado, para a qual dou quitação, para um só efeito.

Documento: (Tipo / Número)

Data: / /

Nome

Assinatura

Banco: _____

Cheque: _____

Conta: _____

Recursos: _____





CIMVALPI

CONSORCIO INTERMUNICIPAL
MULTISETORIAL DO VALE DO PIRANGA

Assinaturas do Documento



Documento Assinado Eletronicamente por **JÚLIO CORREA GUIMARÃES -
ORDENADOR DE PAGAMENTO**, CPF: 012.04*. **6-*0 em 11/06/2025 17:45:55, Cód.
Autenticidade da Assinatura: 17V4.2R45.855Z.H12V.2171, Com fundamento na Lei Nº
14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Documento Assinado Eletronicamente por **VITOR CORTEZÃO ANGELO GOMES -
ANALISTA DE CONFORMIDADE**, CPF: 016.50*. **6-*2 em 11/06/2025 16:35:52, Cód.
Autenticidade da Assinatura: 16U1.7H35.7528.V23V.5455, Com fundamento na Lei Nº
14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Documento Assinado Eletronicamente por **RONALDO ADRIANO DA SILVEIRA
RIBEIRO**, CPF: 992.49*. **6-*4 em 11/06/2025 14:17:38, Cód. Autenticidade da
Assinatura: 14X1.7H17.738A.730U.3045, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de
Setembro de 2020.



Informações do Documento

ID do Documento: **1.107.28C** - Tipo de Documento: **EXTRA ORÇAMENTO**.

Elaborado por **ANA BEATRIZ RIBEIRO CORCINI**, CPF: 139.21*. **6-*8 , em 11/06/2025 - 11:51:19

Código de Autenticidade deste Documento: 11K7.8R51.6184.U507.5500

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:

<https://zeropapel.cimvalpi.mg.gov.br/verdocumento>



 CIMVALPI - Consórcio Intermunicipal Multissetorial do Vale do Piranga ESTADO DE MINAS GERAIS		NOTA DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
Exercício 2025		Fonte 1.869.000.0000		Número 04777
PROCESSO				Requisição de Compra Nº: EM:
Convênio.....: 00447 - ST. ANT. DO GRAMA - 191/2024 IMPLAN				Vencimento:
Centro de Custo.....: 00006 - INSS				
NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA-SE QUE SEJA EXECUTADA, NESTE EXERCÍCIO, A DESPESA A SEGUIR ESPECIFICADA.				
ORDEN DE PAGAMENTO DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Inss				
Favorecido: 000005 - INSS Endereço: Rua ST Saus Quadra 02 Bloco O , 6 - Andar , 70.070-946 Cidade: Brasília - DF Conta Bancária:				Telefone: CNPJ / CPF 29.979.036/0001-40
Especificação da Despesa	VALOR REFERE-SE A REPASSE DE INSS RETIDO DA NOTA FISCAL 009 DA EMPRESA PONTAL ENGENHARIA.			
Valor: R\$ 2.123,28 (Dois Mil e Cento e Vinte e Tres Reais e Vinte e Oito Centavos)				
Data: 11 / 06 / 2025		Ordenador da Despesa:		
DEMONSTRAÇÃO				
CONTADOR	Detalhamento dos Descontos:		Despesa Bruta: 2.123,28	
RONALDO ADRIANO DA SILVEIRA RIBEIRO CRC MG-101957/O-0			Descontos: 0,00	
			Despesa Líquida: 2.123,28	
LIQUIDAÇÃO	ORDEN DE PAGAMENTO		CONTROLE INTERNO	
O MATERIAL OU SERVIÇO FOI ENTREGUE CONFORME SOLICITADO. / /	FACE À LIQUIDAÇÃO PROCESSADA DETERMINO O SEU PAGAMENTO. / /		EXAMINAMOS O PERCURSO DA DESPESA, EM CONFORMIDADE COM AS DISPOSIÇÕES LEGAIS QUE DISCIPLINAM O SEU PROCESSAMENTO.	
	DIRETOR ADMINISTRATIVO JULIO CORREA GUIMARAES		ANALISTA DE CONFORMIDADE VITOR CORTEZÃO ANGELO GOMES	
RECIBO				
Recebi o valor acima descrito referente a despesa com materiais e / ou serviços acima especificado, para a qual dou quitação, para um só efeito.			Documento: (Tipo / Número)	
Data: / /			Banco: _____	
Nome _____			Cheque: _____	
Assinatura _____			Conta: _____	
			Recursos: _____	





CIMVALPI

CONSORCIO INTERMUNICIPAL
MULTISETORIAL DO VALE DO PIRANGA

Assinaturas do Documento



Documento Assinado Eletronicamente por **JÚLIO CORREA GUIMARÃES -
ORDENADOR DE PAGAMENTO**, CPF: 012.04*. **6-*0 em 11/06/2025 17:45:55, Cód.
Autenticidade da Assinatura: 17U2.8745.5558.V733.3345, Com fundamento na Lei Nº
14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Documento Assinado Eletronicamente por **VITOR CORTEZÃO ANGELO GOMES -
ANALISTA DE CONFORMIDADE**, CPF: 016.50*. **6-*2 em 11/06/2025 16:35:52, Cód.
Autenticidade da Assinatura: 1662.8935.352H.R02R.3722, Com fundamento na Lei Nº
14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Documento Assinado Eletronicamente por **RONALDO ADRIANO DA SILVEIRA
RIBEIRO**, CPF: 992.49*. **6-*4 em 11/06/2025 14:17:38, Cód. Autenticidade da
Assinatura: 1497.0X17.0382.204H.1322, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de
Setembro de 2020.



Informações do Documento

ID do Documento: **1.107.331** - Tipo de Documento: **EXTRA ORÇAMENTO**.

Elaborado por **ANA BEATRIZ RIBEIRO CORCINI**, CPF: 139.21*. **6-*8 , em 11/06/2025 - 11:51:20

Código de Autenticidade deste Documento: 11W0.4Z51.0186.310H.2472

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:

<https://zeropapel.cimvalpi.mg.gov.br/verdocumento>



 CIMVALPI - Consórcio Intermunicipal Multissetorial do Vale do Piranga ESTADO DE MINAS GERAIS		NOTA DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
		Exercício 2025	Fonte 1.869.000.0000	Número 04776
PROCESSO				Requisição de Compra Nº: EM:
Convênio.....: 00447 - ST. ANT. DO GRAMA - 191/2024 IMPLAN				Vencimento:
Centro de Custo.....: 00095 - TAXA DE SERVIÇOS				
NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA-SE QUE SEJA EXECUTADA, NESTE EXERCÍCIO, A DESPESA A SEGUIR ESPECIFICADA.				
ORDEM DE PAGAMENTO DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Taxa administrativa				
Favorecido: 000029 - CIMVALPI - Consórcio Intermunicipal Multissetorial do Vale do Piranga Endereço: Rua Jaime Pereira , 127 , 35.430-000 Cidade: Ponte Nova - MG Conta Bancária:				Telefone: (31) 3881-3273 CNPJ / CPF 19.738.706/0001-83
Especificação da Despesa	VALOR REFERE-SE A TAXA ADMINISTRATIVA OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO - BM 01 - IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE ACESSIBILIDADE, CONFORME MEMORANDO 3.325/2025 (ID 1.0E5.F75).			
Valor: R\$ 3.336,58 (Tres Mil e Trezentos e Trinta e Seis Reais e Cinquenta e Oito Centavos)				
Data: 11 / 06 / 2025		Ordenador da Despesa:		
DEMONSTRAÇÃO				
CONTADOR	Detalhamento dos Descontos:		Despesa Bruta: 3.336,58	
RONALDO ADRIANO DA SILVEIRA RIBEIRO CRC MG-101957/O-0			Descontos: 0,00	
			Despesa Líquida: 3.336,58	
LIQUIDAÇÃO	ORDEM DE PAGAMENTO		CONTROLE INTERNO	
O MATERIAL OU SERVIÇO FOI ENTREGUE CONFORME SOLICITADO. / /	FACE À LIQUIDAÇÃO PROCESSADA DETERMINO O SEU PAGAMENTO. / /		EXAMINAMOS O PERCURSO DA DESPESA, EM CONFORMIDADE COM AS DISPOSIÇÕES LEGAIS QUE DISCIPLINAM O SEU PROCESSAMENTO.	
	DIRETOR ADMINISTRATIVO JULIO CORREA GUIMARAES		ENGENHEIRO DE CONTROLE JOSE MAURICIO PEREIRA DA SILVA FILHO	
RECIBO				
Recebi o valor acima descrito referente a despesa com materiais e / ou serviços acima especificado, para a qual dou quitação, para um só efeito.			Documento: (Tipo / Número)	
Data: / /			Banco: _____	
Nome _____			Cheque: _____	
Assinatura _____			Conta: _____	
			Recursos: _____	





CIMVALPI

CONSORCIO INTERMUNICIPAL
MULTISETORIAL DO VALE DO PIRANGA

Assinaturas do Documento



Documento Assinado Eletronicamente por **JÚLIO CORREA GUIMARÃES -
ORDENADOR DE PAGAMENTO**, CPF: 012.04*. **6-*0 em 11/06/2025 17:45:55, Cód.
Autenticidade da Assinatura: 17X0.1K45.6558.X477.6724, Com fundamento na Lei Nº
14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Documento Assinado Eletronicamente por **JOSÉ MAURICIO PEREIRA DA SILVA
FILHO - ENGENHEIRO DE CONTROLE**, CPF: 054.42*. **6-*8 em 11/06/2025 15:12:16,
Cód. Autenticidade da Assinatura: 15R8.8Z12.516W.V70R.5672, Com fundamento na
Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Documento Assinado Eletronicamente por **RONALDO ADRIANO DA SILVEIRA
RIBEIRO**, CPF: 992.49*. **6-*4 em 11/06/2025 14:17:38, Cód. Autenticidade da
Assinatura: 1425.0417.438K.K389.3213, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de
Setembro de 2020.



Informações do Documento

ID do Documento: **1.107.3CA** - Tipo de Documento: **EXTRA ORÇAMENTO**.

Elaborado por **ANA BEATRIZ RIBEIRO CORCINI**, CPF: 139.21*. **6-*8 , em 11/06/2025 - 11:53:31

Código de Autenticidade deste Documento: 1135.7753.4317.X246.2558

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:

<https://zeropapel.cimvalpi.mg.gov.br/verdocumento>



 CIMVALPI - Consórcio Intermunicipal Multissetorial do Vale do Piranga ESTADO DE MINAS GERAIS		SUBEMPENHO	
Exercício 2025		Ficha 00186	Sub-Empenho / Tipo 001/00839 / Estimativo
Convênio.....: 00447 - ST. ANT. DO GRAMA - 191/2024 IMPLAN		Emissão: 21 / 05 / 2025	
Centro de Custo.....: 00111 - OBRAS E INSTALAÇÕES		Vencimento:	
LICITAÇÃO			
Modalidade : Dispensa		Número: 201	Data: 09 / 07 / 2024
Nº Processo de Compra : 70018		Data : 09 / 07 / 2024	Ordem de Serviço : 412/2025
Contrato : 205/2024			
Favorecido: 001484 - PONTAL ENGENHARIA LTDA		Telefone:	
Endereço: Avenida Dr Otavio Soares , 266 , 35.430-000		CNPJ / CPF : 05.527.293/0001-83	
Cidade: Ponte Nova - MG			
Conta Bancária:			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA E FONTE DE RECURSOS			
Órgão: 01 CIMVALPI - Consórcio Interm. Multisset. do Vale do Piranga			
Unidade: 01 CIMVALPI - Consórcio Interm. Multisset. do Vale do Piranga			
Subunidade: 07 Serviços e Obras Cíveis de Engenharia			
Função: 15 Urbanismo			
Subfunção: 451 Infra-Estrutura Urbana			
Programa: 0001 Apoio a Administração Pública			
Projeto/Atividade: 1.019 OBRAS E SERVIÇOS AUXILIARES E OU COMPLEMENTARES DA CONSTRUÇÃO CIVIL			
Natureza: 4.4.90.51.01 Obras e Instalações de Domínio Público			
Fonte de Recurso: 1.710.010.0000 Transferência Especial do Estado - Acordo Judicial de Reparação dos Impactos Socioeconômicos e Ambientais do Rompimento de Barragem em Brumadinho			
Especificação da Despesa	VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO - BM 01 - IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE ACESSIBILIDADE.		
Valor	R\$ 60.665,00 (Sessenta Mil e Seiscentos e Sessenta e Cinco Reais)		
DEMONSTRAÇÃO DO SALDO DA DOTAÇÃO			
Descontos:		Saldo Anterior: 60.665,00	
Imposto de Renda CTP 727,98 Inss 2.123,28		Despesa Empenhada..: 60.665,00	
Iss 1.516,63		Saldo Disponível: 0,00	
Despesa Bruta.: 60.665,00		Descontos.: 4.367,89	
Despesa Líquida: 56.297,11			
ORDENADOR DA DESPESA		CONTADOR	
Nos termos da legislação vigente e no uso competente das minhas atribuições de Ordenador da Despesa determina-se que seja processada a despesa acima especificada			
_____ EDUARDO PEREIRA REAL		_____ RONALDO ADRIANO DA SILVEIRA RIBEIRO MG-101957/O-0	
LIQUIDAÇÃO		ORDEM DE PAGAMENTO	
O material ou serviço foi entregue conforme solicitado.		Face à liquidação processada determino o seu pagamento.	
Data: 11 / 06 / 2025		Data: / /	
_____ YURI ANDRADE COSTA LINS ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR		_____ JULIO CORREA GUIMARAES DIRETOR ADMINISTRATIVO	
		_____ JOSE MAURICIO PEREIRA DA SILVA FILHO ENGENHEIRO DE CONTROLE	
RECIBO			
Recebi o valor acima descrito referente a despesa com materiais e / ou serviços acima especificado, para a qual dou quitação, para um só efeito.		Documento de Identificação:	
Data: / /		Banco: _____	
Nome _____		Documento: _____	
Assinatura _____		Conta: _____	
		Recursos: _____	



Assinaturas do Documento



Documento Assinado Eletronicamente por **JÚLIO CORREA GUIMARÃES - ORDENADOR DE PAGAMENTO**, CPF: 012.04*. **6-*0 em 11/06/2025 17:45:55, Cód. Autenticidade da Assinatura: 17V4.5745.055R.667A.0008, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Documento Assinado Eletronicamente por **JOSÉ MAURICIO PEREIRA DA SILVA FILHO - ENGENHEIRO DE CONTROLE**, CPF: 054.42*. **6-*8 em 11/06/2025 15:16:54, Cód. Autenticidade da Assinatura: 15U6.0A16.054R.U414.2327, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Documento Assinado Eletronicamente por **EDUARDO PEREIRA REAL - ASSESSOR TÉCNICO**, CPF: 417.92*. **6-*8 em 11/06/2025 14:54:05, Cód. Autenticidade da Assinatura: 14H8.3W54.005A.4387.7562, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Documento Assinado Eletronicamente por **RONALDO ADRIANO DA SILVEIRA RIBEIRO**, CPF: 992.49*. **6-*4 em 11/06/2025 14:17:38, Cód. Autenticidade da Assinatura: 14X0.2V17.6389.4036.0184, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Documento Assinado Eletronicamente por **YURI ANDRADE COSTA LINS - ENGENHEIRO CIVIL JÚNIOR**, CPF: 084.94*. **6-*2 em 11/06/2025 12:03:18, Cód. Autenticidade da Assinatura: 12A1.7V03.018H.H34X.5828, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Informações do Documento

ID do Documento: **1.107.442** - Tipo de Documento: **DL - DOCUMENTO DE LIQUIDAÇÃO**

Elaborado por **ANA BEATRIZ RIBEIRO CORCINI**, CPF: 139.21*. **6-*8, em 11/06/2025 - 11:54:28

Código de Autenticidade deste Documento: 11E3.2K54.328V.W82E.4217

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:

<https://zeropapel.cimvalpi.mg.gov.br/verdocumento>



Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)

Num. Pendência: 1000332
Transação: Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)
Cooperativa: 3164
Conta Corrente: 823708

Dados da Transação

Criado por: SAMIRA GOMES PEREIRA DE FREITAS
Chave de acesso de criação: ui6737
Tipo da Transferência: Titularidade/CPF diferente
Cooperativa de Débito: 3164
Conta de Débito: 82.370-8
Nome do Favorecido: PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DO GRAMA
CPF/CNPJ do Favorecido: 18836973000120
Banco do Favorecido: 001 - BANCO DO BRASIL
Agência do Favorecido: 2538
Conta do Favorecido: 7.543-4 \ PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DO GRAMA
Modalidade da Conta: Conta Corrente
Finalidade: PAG.IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS
Valor da Transferência: R\$ 727,98
Data da Transferência: 23/06/2025
Observação:

Transação efetuada com sucesso por: VIVIANE APARECIDA SALGADO

Assinado por: SAMIRA GOMES PEREIRA DE FREITAS
VIVIANE APARECIDA SALGADO



23/06/2025



Assinatura do Documento



Documento Assinado Eletronicamente por **VIVIANE APARECIDA SALGADO - CHEFE DO DEPARTAMENTO DE TESOUREARIA**, CPF: 064.80*. **6-*4 em 23/06/2025 11:24:04, Cód. Autenticidade da Assinatura: 11W2.2V24.5042.X74X.5131, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Informações do Documento

ID do Documento: **1.149.D88** - Tipo de Documento: **COMPROVANTE DE PAGAMENTO**.

Elaborado por **VIVIANE APARECIDA SALGADO**, CPF: 064.80*. **6-*4 , em 23/06/2025 - 11:24:04

Código de Autenticidade deste Documento: 11V3.4724.504X.R137.4741

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
<https://zeropapel.cimvalpi.mg.gov.br/verdocumento>



Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)

Num. Pendência: 1000331
Transação: Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)
Cooperativa: 3164
Conta Corrente: 823708

Dados da Transação

Criado por: SAMIRA GOMES PEREIRA DE FREITAS
Chave de acesso de criação: ui6737
Tipo da Transferência: Titularidade/CPF diferente
Cooperativa de Débito: 3164
Conta de Débito: 82.370-8
Nome do Favorecido: PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DO GRAMA
CPF/CNPJ do Favorecido: 18836973000120
Banco do Favorecido: 001 - BANCO DO BRASIL
Agência do Favorecido: 2538
Conta do Favorecido: 7.543-4 \ PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DO GRAMA
Modalidade da Conta: Conta Corrente
Finalidade: PAG.IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS
Valor da Transferência: R\$ 1.516,63
Data da Transferência: 23/06/2025
Observação:

Transação efetuada com sucesso por: VIVIANE APARECIDA SALGADO

Assinado por: SAMIRA GOMES PEREIRA DE FREITAS
VIVIANE APARECIDA SALGADO





Assinatura do Documento



Documento Assinado Eletronicamente por **VIVIANE APARECIDA SALGADO - CHEFE DO DEPARTAMENTO DE TESOUREARIA**, CPF: 064.80*. **6-*4 em 23/06/2025 11:24:05, Cód. Autenticidade da Assinatura: 11R0.5A24.804W.232K.4674, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Informações do Documento

ID do Documento: **1.149.DD7** - Tipo de Documento: **COMPROVANTE DE PAGAMENTO**.

Elaborado por **VIVIANE APARECIDA SALGADO**, CPF: 064.80*. **6-*4 , em 23/06/2025 - 11:24:05

Código de Autenticidade deste Documento: 1191.3124.004A.W739.3683

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
<https://zeropapel.cimvalpi.mg.gov.br/verdocumento>



SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR
23/06/2025 **Detalhar Transação Pendente** 11:20:57

Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)

Num. Pendência: 1000330
Transação: Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)
Cooperativa: 3164
Conta Corrente: 823708

Dados da Transação

Criado por: SAMIRA GOMES PEREIRA DE FREITAS
Chave de acesso de criação: ui6737
Tipo da Transferência: Mesma titularidade/CPF
Cooperativa de Débito: 3164
Conta de Débito: 82.370-8
Banco do Favorecido: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Agência do Favorecido: 146
Conta do Favorecido: 71.319-1 \ PAGAMENTO INSS
Modalidade da Conta: Conta Corrente
Finalidade: PAG.IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS
Valor da Transferência: R\$ 2.123,28
Data da Transferência: 23/06/2025
Observação:

Transação efetuada com sucesso por: VIVIANE APARECIDA SALGADO

Assinado por: SAMIRA GOMES PEREIRA DE FREITAS
VIVIANE APARECIDA SALGADO





CIMVALPI

CONSORCIO INTERMUNICIPAL
MULTISETORIAL DO VALE DO PIRANGA

Assinatura do Documento



Documento Assinado Eletronicamente por **VIVIANE APARECIDA SALGADO - CHEFE DO DEPARTAMENTO DE TESOUREARIA**, CPF: 064.80*. **6-*4 em 23/06/2025 11:24:06, Cód. Autenticidade da Assinatura: 1166.7R24.304H.K41R.8731, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Informações do Documento

ID do Documento: **1.149.E3B** - Tipo de Documento: **COMPROVANTE DE PAGAMENTO**.

Elaborado por **VIVIANE APARECIDA SALGADO**, CPF: 064.80*. **6-*4 , em 23/06/2025 - 11:24:06

Código de Autenticidade deste Documento: 1138.3W24.104K.K23K.0842

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:

<https://zeropapel.cimvalpi.mg.gov.br/verdocumento>



Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)

Num. Pendência: 1000329

Transação: Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)

Cooperativa: 3164

Conta Corrente: 823708

Dados da Transação

Criado por: SAMIRA GOMES PEREIRA DE FREITAS

Chave de acesso de criação: ui6737

Tipo da Transferência: Mesma titularidade/CPF

Cooperativa de Débito: 3164

Conta de Débito: 82.370-8

Banco do Favorecido: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência do Favorecido: 146

Conta do Favorecido: 71.291-8 \ TAXA CIVIL

Modalidade da Conta: Conta Corrente

Finalidade: PAG.IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS

Valor da Transferência: R\$ 3.336,58

Data da Transferência: 23/06/2025

Observação:

Transação efetuada com sucesso por: VIVIANE APARECIDA SALGADO

Assinado por: SAMIRA GOMES PEREIRA DE FREITAS

VIVIANE APARECIDA SALGADO





CIMVALPI

CONSORCIO INTERMUNICIPAL
MULTISETORIAL DO VALE DO PIRANGA

Assinatura do Documento



Documento Assinado Eletronicamente por **VIVIANE APARECIDA SALGADO - CHEFE DO DEPARTAMENTO DE TESOUREARIA**, CPF: 064.80*. **6-*4 em 23/06/2025 11:24:07, Cód. Autenticidade da Assinatura: 1145.1624.804U.V34U.1374, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Informações do Documento

ID do Documento: **1.149.EA2** - Tipo de Documento: **COMPROVANTE DE PAGAMENTO**.

Elaborado por **VIVIANE APARECIDA SALGADO**, CPF: 064.80*. **6-*4 , em 23/06/2025 - 11:24:07

Código de Autenticidade deste Documento: 1184.4724.0046.Z54K.0554

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:

<https://zeropapel.cimvalpi.mg.gov.br/verdocumento>



SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR
23/06/2025 **Detalhar Transação Pendente** 11:20:23

Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)

Num. Pendência: 1000328
Transação: Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)
Cooperativa: 3164
Conta Corrente: 823708

Dados da Transação

Criado por: SAMIRA GOMES PEREIRA DE FREITAS
Chave de acesso de criação: ui6737
Tipo da Transferência: Titularidade/CPF diferente
Cooperativa de Débito: 3164
Conta de Débito: 82.370-8
Nome do Favorecido: PONTAL ENGENHARIA LTDA
CPF/CNPJ do Favorecido: 05527293000183
Banco do Favorecido: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Agência do Favorecido: 146
Conta do Favorecido: 578.554.574-4 \ PONTAL ENGENHARIA LTDA
Modalidade da Conta: Conta Corrente
Finalidade: PAG.IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS
Valor da Transferência: R\$ 56.297,11
Data da Transferência: 23/06/2025
Observação:

Transação efetuada com sucesso por: VIVIANE APARECIDA SALGADO

Assinado por: SAMIRA GOMES PEREIRA DE FREITAS
VIVIANE APARECIDA SALGADO



23/06/2025



CIMVALPI

CONSORCIO INTERMUNICIPAL
MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA

Assinatura do Documento



Documento Assinado Eletronicamente por **VIVIANE APARECIDA SALGADO - CHEFE DO DEPARTAMENTO DE TESOUREARIA**, CPF: 064.80*. **6-*4 em 23/06/2025 11:24:08, Cód. Autenticidade da Assinatura: 11Z4.5K24.104V.H374.3318, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Informações do Documento

ID do Documento: **1.149.EF9** - Tipo de Documento: **COMPROVANTE DE PAGAMENTO**.

Elaborado por **VIVIANE APARECIDA SALGADO**, CPF: 064.80*. **6-*4 , em 23/06/2025 - 11:24:08

Código de Autenticidade deste Documento: 1146.8E24.3044.841E.3075

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:

<https://zeropapel.cimvalpi.mg.gov.br/verdocumento>

