



PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 09.0209-3.2024.15

UNIDADE ADMINISTRATIVA: PROG-LICI - PROGRAMA DE LICITAÇÕES, CONTRATAÇÕES E COMPRAS COMPARTILHADAS
PROCEDIMENTO: ADMINISTRATIVO - TIPO DE PROCESSO: PREPARATÓRIO LICITAÇÃO/CONTRATAÇÃO (FILHOTE) - EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATO DE PROGRAMAS E RATEIO
DEPARTAMENTO/PROGRAMA ATUAL: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SITUAÇÃO: ARQUIVADO - POSSUI PROCESSO FILHOTE:
OBJETO: CTP 0191 2024 - IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE ACESSIBILIDADE - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - BM 01 - NF 11
ABERTO EM: 26/08/2024 às 09:07:33

DOCUMENTOS JUNTADOS (17)

ID	TIPO DE DOCUMENTO	QTD PÁGS	JUNTADO EM
8F2.D6E	TERMO DE ABERTURA	1	26/08/2024 às 09:07:33
8CD.682	FORMULÁRIO DE MEDIÇÕES	47	20/08/2024 às 16:29:55
8F3.2EE	ORDEM DE FORNECIMENTO DIGITALIZADO	2	26/08/2024 às 09:10:55
8F3.6EB	NF - NOTA FISCAL	3	26/08/2024 às 09:22:19
8F3.DFA	CONFORMIDADE DE LIQUIDAÇÃO	2	26/08/2024 às 09:33:24
8E0.06C	MEMORANDO	1	22/08/2024 às 13:48:36
906.24E	EXTRA ORÇAMENTO	2	27/08/2024 às 08:58:13
906.2BE	DL - DOCUMENTO DE LIQUIDAÇÃO	2	27/08/2024 às 08:58:14
906.38F	EXTRA ORÇAMENTO	2	27/08/2024 às 08:59:51
906.3FD	EXTRA ORÇAMENTO	2	27/08/2024 às 08:59:52
906.459	EXTRA ORÇAMENTO	2	27/08/2024 às 08:59:53
923.2C3	COMPROVANTE DE PAGAMENTO	2	29/08/2024 às 11:44:12
923.306	COMPROVANTE DE PAGAMENTO	2	29/08/2024 às 11:44:13
923.38F	COMPROVANTE DE PAGAMENTO	2	29/08/2024 às 11:44:14
923.3D8	COMPROVANTE DE PAGAMENTO	2	29/08/2024 às 11:44:15
923.436	COMPROVANTE DE PAGAMENTO	2	29/08/2024 às 11:44:16
93D.404	ERRATA	2	03/09/2024 às 09:59:50

PONTE NOVA - MG, 06 de novembro de 2025 às 11:35:15.

TERMO DE ABERTURA DE PROCESSO

Aos 26 dias do mês de agosto de 2024, procedemos a abertura do Processo Nº **209/2024**

Para constar, eu JÚLIO HENRIQUE DO CARMO FREITAS portador do CPF nº 156.178.896-13, lavro o presente TERMO DE ABERTURA que constará nos auto administrativos.

Assinatura do Documento



Documento Assinado Eletronicamente por **JÚLIO HENRIQUE DO CARMO FREITAS - AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO**, CPF: 156.17*.**6-*3 em **26/08/2024 09:07:33**, Cód. Autenticidade da Assinatura: 0978.5U07.733K.V303.0438, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Informações do Documento

ID do Documento: **8F2.D6E** - Tipo de Documento: **TERMO DE ABERTURA**.

Elaborado por **JÚLIO HENRIQUE DO CARMO FREITAS** CPF: 156.17*.**6-*3, em **26/08/2024 09:07:33**, contendo 40 palavras.

Código de Autenticidade deste Documento: 0915.4907.4337.644A.3706

A autenticidade do documento pode ser conferida no site: <https://zeropapel.cimvalpi.mg.gov.br/verdocumento>





FORMULÁRIO DE MEDIÇÕES

RELATÓRIO PARCIAL (SITUAÇÃO: APROVADA PELO CONSÓRCIO)

Enviado por ANTONIO CARLOS MARTINS BRANDAO em 19/08/2024 - 20:51

Registro: 19/08/2024			1ª MEDIÇÃO									
Obra: CTP 0191/2024 - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE ACESSIBILIDADE			Período de 22/07/2024 a 19/08/2024									
Local: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA												
OBSERVAÇÕES												
Enviada por ANTONIO CARLOS MARTINS BRANDAO (FORNECEDOR) em 19/08/2024 às 20:51												
							QUANTIDADE MEDIDA			VALOR MEDIDO		
ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	NESTA MEDIÇÃO	ACUMULADA	VALOR PREVISTO (BDI)	NESTA MEDIÇÃO (BDI)	ACUMULADA (BDI)	SALDO (BDI)
01	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO											
01.01	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA - para obras que exigem a utilização de grande quantidade de equipamentos e são executadas em centros urbanos ou próximos de centros urbanos. Obs.: Não se aplica aos serviços deTapa Buracos.											
01.01.01	OBRAS ATÉ O VALOR DE R\$ 1.000.000,00 - MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA PAVIMENTAÇÃO, EXCLUSIVE PARA TAPA-BURACOS	%	0.5	R\$ 25,00	R\$ 31,62	R\$ 15,81	0.5	0.5	R\$ 15,81	R\$ 644,11	R\$ 644,11	R\$ -628,30
02	INSTALAÇÕES DA OBRA											
02.01	ESCRITORIOS											
02.01.04	DEPOSITO E FERRAMENTARIA	m²	12	R\$ 278,61	R\$ 353,69	R\$ 4.244,28	12	12	R\$ 4.244,28	R\$ 4.244,28	R\$ 4.244,28	R\$ 0,00
02.05	BANHEIRO QUIMICO											
02.05.01	BANHEIRO QUIMICO 110 cm x 120 cm x 230 cm COM MANUTENÇÃO	mês	5	R\$ 628,10	R\$ 797,37	R\$ 3.986,85	1	1	R\$ 3.986,85	R\$ 797,37	R\$ 797,37	R\$ 3.189,48
02.06	SINALIZAÇÃO/SEGURANÇA											
02.06.01	PLACA DE OBRA EM LONA IMPRESSAO DIGITAL P. SUDECAP	m²	4.5	R\$ 239,48	R\$ 304,03	R\$ 1.368,14	4.5	4.5	R\$ 1.368,14	R\$ 1.368,14	R\$ 1.368,14	R\$ 0,00



02.06.05	CONE EM PVC H = 75 cm	un	20	R\$ 33,50	R\$ 42,54	R\$ 850,80	20	20	R\$ 850,80	R\$ 850,80	R\$ 850,80	R\$ 0,00
02.07	TAPUME / ISOLAMENTOS											
02.07.01	TELA-TAPUME DE POLIPROPILENO H = 1,20 M, INCL. BASE	m	500	R\$ 6,95	R\$ 8,81	R\$ 4.405,00	500	500	R\$ 4.405,00	R\$ 4.405,00	R\$ 4.405,00	R\$ 0,00
04	TRABALHOS EM TERRA											
04.01	ESCAVAÇÃO MECANICA INCLUSIVE TRANSPORTE ATE 50 m											
04.01.01	CAPINA MANUAL DE TERRENO	m²	4863.9	R\$ 2,57	R\$ 3,27	R\$ 15.904,95	4863.9	4863.9	R\$ 15.904,95	R\$ 15.904,95	R\$ 15.904,95	R\$ 0,00
04.04	CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO											
04.04.02	MECANICA	m³	4639.83	R\$ 2,11	R\$ 2,68	R\$ 12.434,74	4639.83	4639.83	R\$ 12.434,74	R\$ 12.434,74	R\$ 12.434,74	R\$ 0,00
04.05	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA											
04.05.04	DMT > 5 KM	m³ x km	4639.83	R\$ 1,53	R\$ 1,93	R\$ 8.954,87	4639.83	4639.83	R\$ 8.954,87	R\$ 8.954,87	R\$ 8.954,87	R\$ 0,00
04.06	ATERRO E REATERRO COMPACTADO											
04.06.02	COM PLACA VIBRATORIA	m³	1003.86	R\$ 16,89	R\$ 21,45	R\$ 21.532,80	1003.86	1003.86	R\$ 21.532,80	R\$ 21.532,80	R\$ 21.532,80	R\$ 0,00
04.09	REGULARIIIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO											
04.09.02	COM PLACA VIBRATORIA	m²	4863.9	R\$ 3,52	R\$ 4,46	R\$ 21.692,99	4863.9	4863.9	R\$ 21.692,99	R\$ 21.692,99	R\$ 21.692,99	R\$ 0,00
07	OBRAS CIVIS (PONTES, PASSARELAS, CORTINAS E GABIÕES)											
07.01	ESCAVAÇÕES											
07.01.02	ESCAVACAO MANUAL H > 3,0 M	m³	2.26	R\$ 58,66	R\$ 74,47	R\$ 168,30	2.26	2.26	R\$ 168,30	R\$ 168,30	R\$ 168,30	R\$ 0,00
08	ESTRUTURA METÁLICA											
08.01	FORNECIMENTO, FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIS LAMINADOS, INCLUSIVE PINTURA PRIMER	kg	700	R\$ 19,53	R\$ 24,77	R\$ 17.339,00	700	700	R\$ 17.339,00	R\$ 17.339,00	R\$ 17.339,00	R\$ 0,00
09	URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES											
09.01	MEIO FIO PADRÃO SUDECAP											
09.01.02	MEIO FIO EM CONCRETO PRE-MOLDADO FCK>=20MPA, PADRÃO SUDECAP TIPO B, 40 X 15/12 (H X L1/L2), COMPRIMENTO 80CM	m	1980	R\$ 35,45	R\$ 45,01	R\$ 89.119,80	425	425	R\$ 89.119,80	R\$ 19.129,25	R\$ 19.129,25	R\$ 69.990,55
15	ADMINISTRAÇÃO LOCAL											



15.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - % BASEADA ACÓRDÃO 2.622/2013 DO TCU SOBRE SOMA DOS ITENS 1 A 14	%	7.55	R\$ 329,17	R\$ 416,25	R\$ 3.142,69	6.55	6.55		R\$ 3.142,69	R\$ 8.480,06	R\$ 8.480,06	R\$ -5.337,37
						TOTAL:				R\$ 137.946,67	R\$ 137.946,67		

YURI ANDRADE COSTA LINS
Fiscal de Obras - CIMVALPI
CREA 233590/D
Aprovação: 20/08/2024

PEDRO MARTINO ZEFERINO
Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA
CREA 137.103/D

ANTÔNIO CARLOS MARTINS BRANDÃO
RT de Execução - PONTAL ENGENHARIA LTDA
CREA 45.957/D





RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº 0021	OBRA: CTP 0191/2024 - SANTO ANTONIO DO GRAMA - IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE ACESSIBILIDADE	CONTRATO:	RESP. TÉCNICO: ANTONIO CARLOS MARTINS BRANDÃO
ENDEREÇO: TRECHO DA RODOVIA DE ACESSO A SANTO ANTONIO DO GRAMA, BAIRRO NOVO HORIZONTE.		INÍCIO: 01/07/2024	Nº CREA-MG: 45957/D
CIDDE:		PRAZO: 31/12/2024	Nº DA ART:
DISTRITO: SANTO ANTONIO DO GRAMA		UF:	COORDENADAS:
DATA: 19/08/2024	SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA ☔
MANHÃ	✓		IMPRATICÁVEL ☁
TARDE	✓		
QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
1	ENCARREGADO DE OBRAS	2	PEDREIRO
6	AJUDANTE		
QTDE	EQUIPAMENTO		
2	CAVADEIRA RETA		
3	PÁ		
3	CHIBANCA		
5	ENXADA		
2	CARRINHO DE MÃO		
TAREFAS REALIZADAS			
NÚMERO DE T.R.	DESCRICAÇÃO	OBSERVAÇÕES	
1	ESCAVAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE MEIO FIO		
2	ASSENTAMENTO DE MEIO FIO	PISTA DE ACESSIBILIDADE	
REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATORIOS)			





Data não informada



Data não informada



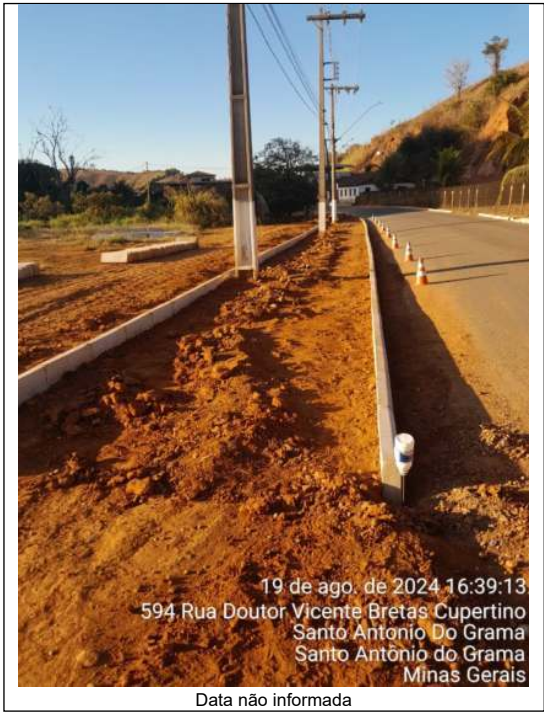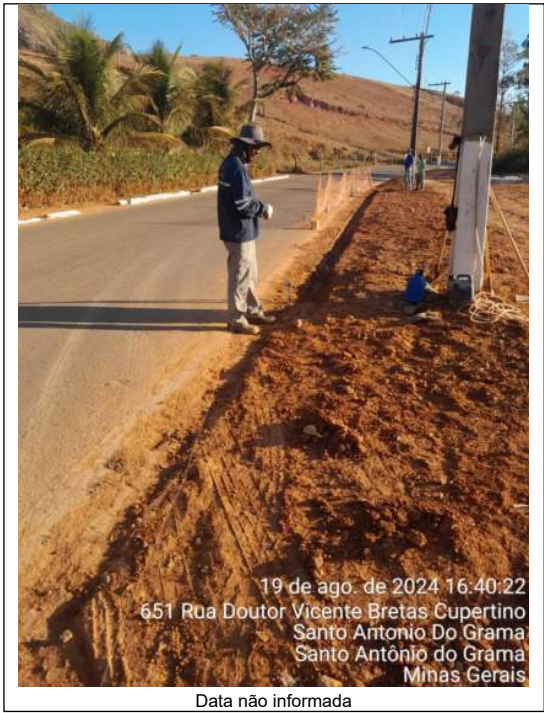

OCORRÊNCIAS		
NÚMERO DE OC	TIPO DE OCORRÊNCIA	DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA
CONFERÊNCIA		
MUNICÍPIO	CONSÓRCIO (Aprovado em 20/08/2024 - 13:21)	
Obs.:	Obs.:	
ASSINATURAS		
YURI ANDRADE COSTA LINS Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 233590/D	PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA CREA 137.103/D	ANTÔNIO CARLOS MARTINS BRANDÃO RT de Execução - PONTAL ENGENHARIA LTDA CREA 45.957/D





RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº 0020	OBRA: CTP 0191/2024 - SANTO ANTONIO DO GRAMA - IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE ACESSIBILIDADE	CONTRATO:	RESP. TÉCNICO: ANTONIO CARLOS MARTINS BRANDÃO
ENDEREÇO: TRECHO DA RODOVIA DE ACESSO A SANTO ANTONIO DO GRAMA, BAIRRO NOVO HORIZONTE.		INÍCIO: 01/07/2024	Nº CREA-MG: 45957/D
CIDDE:		PRAZO: 31/12/2024	Nº DA ART:
DISTRITO: SANTO ANTONIO DO GRAMA		UF:	COORDENADAS:
DATA: 16/08/2024	SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA ☔
MANHÃ	✓		IMPRATICÁVEL ☁
TARDE	✓		
QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
1	ENCARREGADO DE OBRAS	2	PEDREIRO
4	AJUDANTE		
QTDE	EQUIPAMENTO		
2	CAVADEIRA RETA		
3	PÁ		
2	CHIBANCA		
5	ENXADA		
2	CARRINHO DE MÃO		
TAREFAS REALIZADAS			
NÚMERO DE T.R.	DESCRICAÇÃO	OBSERVAÇÕES	
1	INSTALAÇÃO DE MEIO FIO PREMOLDADO		
2	ESCAVAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE MEIO FIO		
3	CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE FERRAGEM	PARA FUNDAÇÕES DA PASSAGEM DE PEDESTRE	
REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)			





OCORRÊNCIAS		
NÚMERO DE OC	TIPO DE OCORRÊNCIA	DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA
CONFERÊNCIA		
MUNICÍPIO	CONSÓRCIO (Aprovado em 19/08/2024 - 09:00)	
Obs.:	Obs.:	
ASSINATURAS		
YURI ANDRADE COSTA LINS Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 233590/D	PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA CREA 137.103/D	ANTÔNIO CARLOS MARTINS BRANDÃO RT de Execução - PONTAL ENGENHARIA LTDA CREA 45.957/D






RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº 0019	OBRA: CTP 0191/2024 - SANTO ANTONIO DO GRAMA - IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE ACESSIBILIDADE	CONTRATO:	RESP. TÉCNICO: ANTONIO CARLOS MARTINS BRANDÃO
ENDEREÇO: TRECHO DA RODOVIA DE ACESSO A SANTO ANTONIO DO GRAMA, BAIRRO NOVO HORIZONTE.		INÍCIO: 01/07/2024	Nº CREA-MG: 45957/D
CIDDE:		PRAZO: 31/12/2024	Nº DA ART:
DISTRITO: SANTO ANTONIO DO GRAMA		UF:	COORDENADAS:
DATA: 15/08/2024	SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA ☔
MANHÃ	✓		IMPRATICÁVEL ☁
TARDE	✓		
QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
1	ENCARREGADO DE OBRAS	2	PEDREIRO
4	AJUDANTE		
QTDE	EQUIPAMENTO		
2	CAVADEIRA RETA		
1	DAMPER		
3	PÁ		
2	CHIBANCA		
5	ENXADA		
TAREFAS REALIZADAS			
NÚMERO DE T.R.	DESCRICAO	OBSERVAÇÕES	
1	ESCAVAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE MEIO FIO		
2	INSTALAÇÃO DE MEIO FIOS		
3	CORTE DOBRA E ARMAÇÃO DE FERRAGEM	PARA APLICAÇÃO NAS FUNDAÇÕES DA PASSAGEM DE PEDESTRE.	

REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)

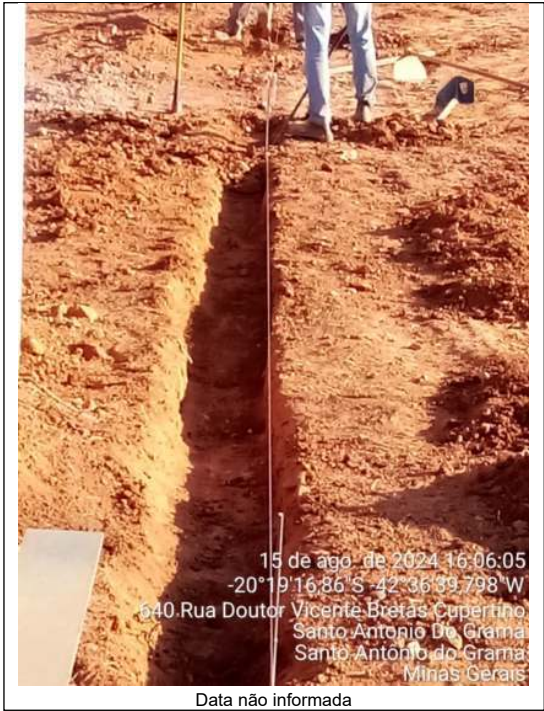

Data não informada




Data não informada





15 de ago. de 2024 16:04:52
-20°19'17,574"S -42°36'40,302"W
640 Rua Doutor Vicente Bretas Cupertino
Santo Antônio Do Grama
Santo Antônio do Grama
Minas Gerais

Data não informada

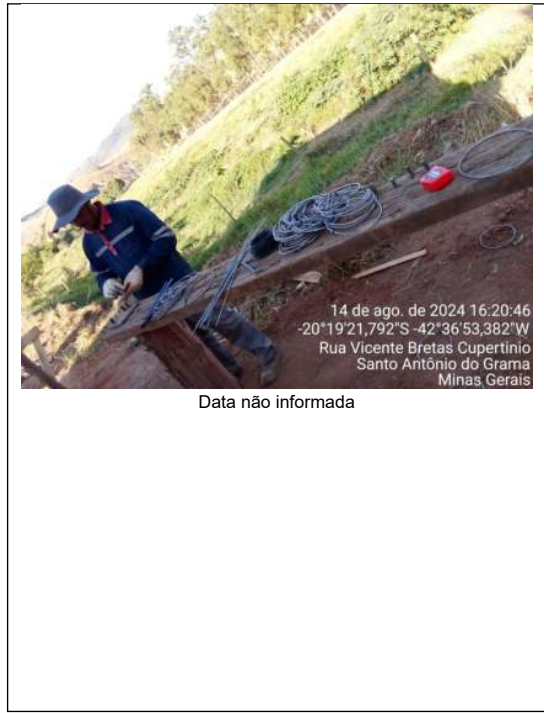

14 de ago. de 2024 16:20:46
-20°19'21,792"S -42°36'53,382"W
Rua Vicente Bretas Cupertino
Santo Antônio do Grama
Minas Gerais

Data não informada



15 de ago. de 2024 16:04:24
-20°19'18,204"S -42°36'40,542"W
640 Rua Doutor Vicente Bretas Cupertino
Santo Antônio Do Grama
Santo Antônio do Grama
Minas Gerais

Data não informada



15 de ago. de 2024 16:04:15
-20°19'18,222"S -42°36'40,53"W
651 Rua Doutor Vicente Bretas Cupertino
Santo Antônio Do Grama
Santo Antônio do Grama
Minas Gerais

Data não informada

OCORRÊNCIAS		
NÚMERO DE OC	TIPO DE OCORRÊNCIA	DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA
CONFERÊNCIA		
MUNICÍPIO	CONSÓRCIO (Aprovado em 16/08/2024 - 09:31)	
Obs.:	Obs.:	
ASSINATURAS		
YURI ANDRADE COSTA LINS Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 233590/D	PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA CREA 137.103/D	ANTÔNIO CARLOS MARTINS BRANDÃO RT de Execução - PONTAL ENGENHARIA LTDA CREA 45.957/D





RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº 0018	OBRA: CTP 0191/2024 - SANTO ANTONIO DO GRAMA - IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE ACESSIBILIDADE	CONTRATO:	RESP. TÉCNICO: ANTONIO CARLOS MARTINS BRANDÃO
ENDEREÇO: TRECHO DA RODOVIA DE ACESSO A SANTO ANTONIO DO GRAMA, BAIRRO NOVO HORIZONTE.		INÍCIO: 01/07/2024	Nº CREA-MG: 45957/D
CIDDE:		PRAZO: 31/12/2024	Nº DA ART:
DISTRITO: SANTO ANTONIO DO GRAMA		UF:	COORDENADAS:
DATA: 14/08/2024	SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA ☔
MANHÃ	✓		IMPRATICÁVEL ☔
TARDE	✓		
QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
1	ENCARREGADO DE OBRAS	2	PEDREIRO
4	AJUDANTE		
QTDE	EQUIPAMENTO		
2	CAVADEIRA RETA		
20	CONE DE SINALIZAÇÃO		
1	DAMPER		
3	PÁ		
50	TELA DE PROTEÇÃO		
3	CHIBANCA		
5	ENXADA		
2	CARRINHO DE MÃO		
TAREFAS REALIZADAS			
NÚMERO DE T.R.	DESCRICAÇÃO	OBSERVAÇÕES	
1	CORTE DOBRA DE ARMADURAS DE AÇO	PARA FUNDAÇÕES PROFUNDAS DAS PASSAGENS DE PEDESTRE.	
2	PERFURAÇÃO DE FUNDAÇÕES PASSARELA DE PEDESTRES	FUNDAÇÕES PROFUNDAS DA PASSAGEM DE PEDESTRES	
3	MOVIMENTAÇÃO MANUAL DE SOLO	ESCAVAÇÕES PARA ASSENTAMENTO DE MEIO FIOS	
REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)			





Data não informada


OCORRÊNCIAS		
NÚMERO DE OC	TIPO DE OCORRÊNCIA	DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA
CONFERÊNCIA		
MUNICÍPIO	CONSÓRCIO (Aprovado em 15/08/2024 - 08:24)	
Obs.:	Obs.:	
ASSINATURAS		
YURI ANDRADE COSTA LINS Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 233590/D	PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA CREA 137.103/D	ANTÔNIO CARLOS MARTINS BRANDÃO RT de Execução - PONTAL ENGENHARIA LTDA CREA 45.957/D





RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº 0017	OBRA: CTP 0191/2024 - SANTO ANTONÍO DO GRAMA - IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE ACESSIBILIDADE	CONTRATO:		RESP. TÉCNICO: ANTONIO CARLOS MARTINS BRANDÃO
ENDEREÇO: TRECHO DA RODOVIA DE ACESSO A SANTO ANTONIO DO GRAMA, BAIRRO NOVO HORIZONTE.		INÍCIO: 01/07/2024		Nº CREA-MG: 45957/D
CIDDE:		PRAZO: 31/12/2024		Nº DA ART:
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA		UF:		COORDENADAS:
DATA: 13/08/2024	SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA ☔	IMPRATICÁVEL ☔
MANHÃ	✓			
TARDE	✓			
QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO		QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
1	ENCARREGADO DE OBRAS		1	OPERADOR DE MOTONIVELADORA
2	PEDREIRO		4	AJUDANTE
QTDE	EQUIPAMENTO			
2	CAVADEIRA RETA			
3	PÁ			
4	ENXADA			
2	CHBANCA			
1	MOTONIVELADORA			
TAREFAS REALIZADAS				
NÚMERO DE T.R.	DESCRIÇÃO		OBSERVAÇÕES	
1	LIGAÇÃO DE PADRÃO COPASA			
2	DESCARGA DE MATERIAIS NA OBRA		AREIA, BRITA 01 E MEIO FIOS PREMOLDADOS	
3	CORTE E DOBRA DE ARMADURA PARA PASSAGEM DE PEDESTR			
4	ACERTO E NIVELAMENTO DE PISTA		ACABAMENTO DOS SERVIÇOS DE ATERRO E COMPACTAÇÃO DE SOLO NA ÁREA DE IMPLANTAÇÃO DA PISTA DE ACESSIBILIDADE	
REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)				

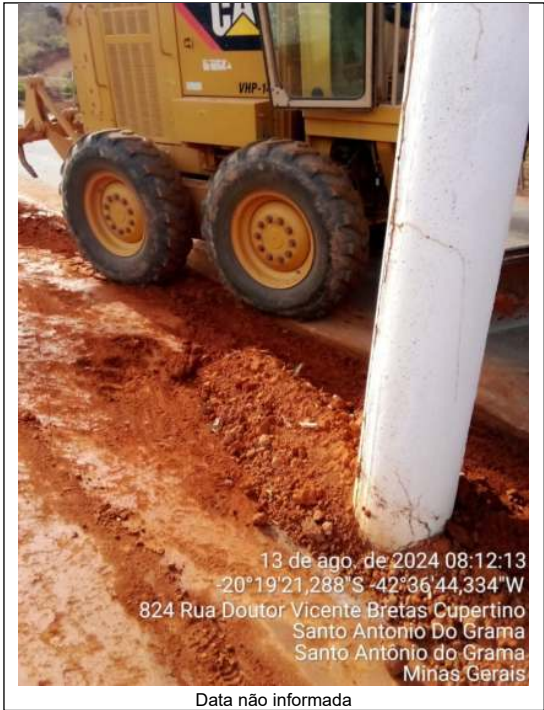



OCORRÊNCIAS		
NÚMERO DE OC	TIPO DE OCORRÊNCIA	DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA
CONFERÊNCIA		
MUNICÍPIO	CONSÓRCIO (Aprovado em 14/08/2024 - 08:37)	
Obs.:	Obs.:	
ASSINATURAS		
YURI ANDRADE COSTA LINS Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 233590/D	PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA CREA 137.103/D	ANTÔNIO CARLOS MARTINS BRANDÃO RT de Execução - PONTAL ENGENHARIA LTDA CREA 45.957/D






RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO


Nº 0016	OBRA: CTP 0191/2024 - SANTO ANTONIO DO GRAMA - IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE ACESSIBILIDADE	CONTRATO:	RESP. TÉCNICO: ANTONIO CARLOS MARTINS BRANDÃO
ENDEREÇO: TRECHO DA RODOVIA DE ACESSO A SANTO ANTONIO DO GRAMA, BAIRRO NOVO HORIZONTE.		INÍCIO: 01/07/2024	Nº CREA-MG: 45957/D
CIDDE:		PRAZO: 31/12/2024	Nº DA ART:
DISTRITO: SANTO ANTONIO DO GRAMA		UF:	COORDENADAS:
DATA: 12/08/2024	SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA ☔
MANHÃ	✓		IMPRATICÁVEL ☔
TARDE	✓		
QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
1	ENCARREGADO DE OBRAS	2	MOTORISTA DE CAMINHÃO CAÇAMBA
1	MOTORISTA DE CAMINHÃO PIPA	1	OPERADOR DE MOTONIVELADORA
2	PEDREIRO	1	OPERADOR DE ROLO PÉ DE CARNEIRO
1	OPERADOR DE CARREGADEIRA	1	ENCARREGADO DE TERRAPLANAGEM
4	AJUDANTE		
QTDE	EQUIPAMENTO		
2	CAVADEIRA RETA		
1	PÁ CARREGADEIRA		
3	PÁ		
1	CAMINHÃO PIPA		
1	ROLO COMPACTADOR PÉ DE CARNEIRO		
3	ENXADA		
2	CAMINHÃO BASCULANTE		
1	MOTONIVELADORA		
TAREFAS REALIZADAS			
NÚMERO DE T.R.	DESCRICAÇÃO	OBSERVAÇÕES	
1	MOVIMENTAÇÃO MECANICA DE SOLO	PARA ACERTO E NIVELAMENTO DA ÁREA DE IMPLANTAÇÃO DA PISTA DE ACESIBILIDADE	
2	MOVIMENTAÇÃO MANUAL DE SOLO	PARA ACERTO E NIVELAMENTO DA ÁREA DE IMPLANTAÇÃO DA PISTA DE ACESIBILIDADE	

REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)

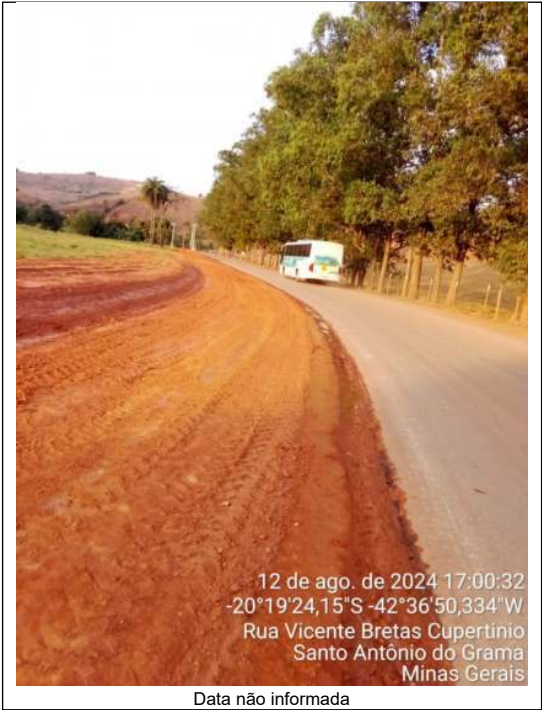



Data não informada

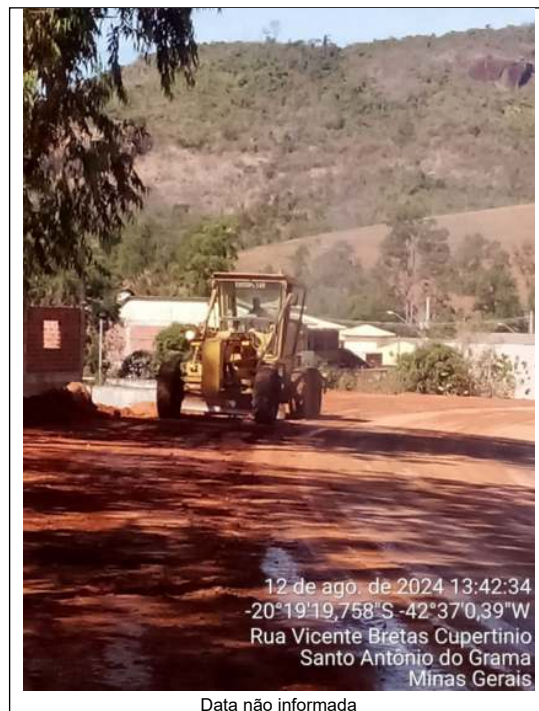

Data não informada



Data não informada



Data não informada



Data não informada



Data não informada

OCORRÊNCIAS		
NÚMERO DE OC	TIPO DE OCORRÊNCIA	DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA
CONFERÊNCIA		
MUNICÍPIO	CONSÓRCIO (Aprovado em 13/08/2024 - 08:24)	
Obs.:	Obs.:	
ASSINATURAS		
YURI ANDRADE COSTA LINS Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 233590/D	PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA CREA 137.103/D	ANTÔNIO CARLOS MARTINS BRANDÃO RT de Execução - PONTAL ENGENHARIA LTDA CREA 45.957/D





RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº 0015	OBRA: CTP 0191/2024 - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE ACESSIBILIDADE	CONTRATO:		RESP. TÉCNICO: ANTONIO CARLOS MARTINS BRANDÃO
ENDEREÇO: TRECHO DA RODOVIA DE ACESSO A SANTO ANTONIO DO GRAMA, BAIRRO NOVO HORIZONTE.		INÍCIO: 01/07/2024		Nº CREA-MG: 45957/D
CIDDE:		PRAZO: 31/12/2024		Nº DA ART:
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA		UF:		COORDENADAS:
DATA: 10/08/2024	SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA ☔	IMPRATICÁVEL ☁
MANHÃ	✓			
TARDE	✓			
QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO		QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
1	ENCARREGADO DE OBRAS		2	MOTORISTA DE CAMINHÃO BÁSCULA
1	MOTORISTA DE CAMINHÃO PIPA		1	OPERADOR DE ROLO PÉ DE CARNEIRO
1	OPERADOR DE CARREGADEIRA		1	ENCARREGADO DE TERRAPLANAGEM
2	AJUDANTE			
QTDE	EQUIPAMENTO			
1	ROLO PÉ DE CARNEIRO			
1	PÁ CARREGADEIRA			
1	CAMINHÃO PIPA			
2	CAMINHÃO BASCULANTE			
TAREFAS REALIZADAS				
NÚMERO DE T.R.	DESCRICAO		OBSERVAÇÕES	
1	MOVIMENTAÇÃO MECANICA DE SOLO		PARA ACERTO E NIVELAMENTO DA AREA DE IMPLANTAÇÃO DA PISTA DE ACESSIBILIDADE	
REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)				

REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)




Data não informada



Data não informada



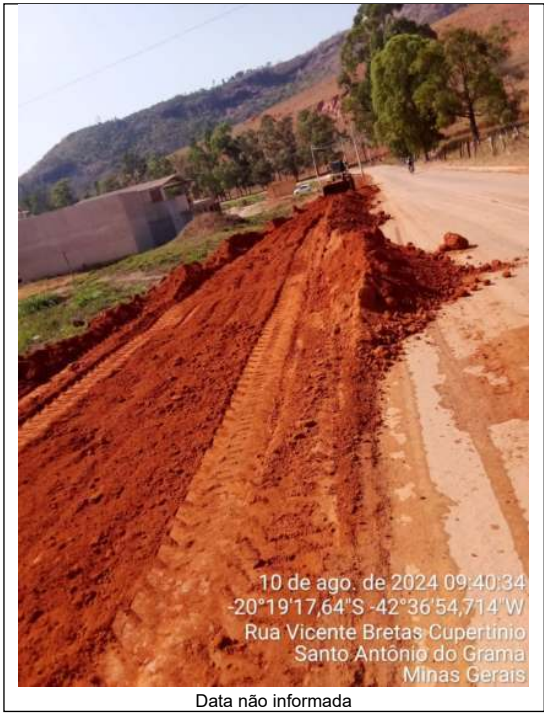

OCORRÊNCIAS		
NÚMERO DE OC	TIPO DE OCORRÊNCIA	DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA
CONFERÊNCIA		
MUNICÍPIO	CONSÓRCIO (Aprovado em 12/08/2024 - 08:03)	
Obs.:	Obs.:	
ASSINATURAS		
YURI ANDRADE COSTA LINS Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 233590/D	PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA CREA 137.103/D	ANTÔNIO CARLOS MARTINS BRANDÃO RT de Execução - PONTAL ENGENHARIA LTDA CREA 45.957/D







RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº 0014	OBRA: CTP 0191/2024 - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE ACESSIBILIDADE	CONTRATO:		RESP. TÉCNICO: ANTONIO CARLOS MARTINS BRANDÃO
ENDEREÇO: TRECHO DA RODOVIA DE ACESSO A SANTO ANTONIO DO GRAMA, BAIRRO NOVO HORIZONTE.		INÍCIO: 01/07/2024		Nº CREA-MG: 45957/D
CIDDE:		PRAZO: 31/12/2024		Nº DA ART:
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA		UF:		COORDENADAS:
DATA: 08/08/2024	SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA ☔	IMPRATICÁVEL ☔
MANHÃ	✓			
TARDE	✓			
QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO		QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
1	ENCARREGADO DE OBRAS		2	MOTORISTA DE CAMINHÃO CAÇAMBA
1	MOTORISTA DE CAMINHÃO PIPA		1	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR
2	PEDREIRO		1	OPERADOR DE CARREGADEIRA
1	ENCARREGADO DE TERRAPLANAGEM		4	AJUDANTE
QTDE	EQUIPAMENTO			
1	PÁ CARREGADEIRA			
2	PÁ			
1	CAMINHÃO PIPA			
1	ROLO COMPACTADOR			
3	ENXADA			
2	CAMINHÃO BASCULANTE			
2	CARRINHO DE MÃO			
TAREFAS REALIZADAS				
NÚMERO DE T.R.	DESCRICAÇÃO		OBSERVAÇÕES	
1	RECEBIMENTO E DESCARGA DE MEIO FIO NA OBRA			
2	MOVIMENTAÇÃO MANUAL DE SOLO		PARA ACERTO E NIVELAMENTO FINO DO BERÇO DE ASSENTAMENTO DA PISTA DE CESSIBILIDADE	
3	MOVIMENTAÇÃO MECANICA DE SOLO		PARA ACERTO E NIVELAMENTO DO BERÇO DE ASSNTAMENTO DA PISTA DE CESSIBILIDADE	
REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)				



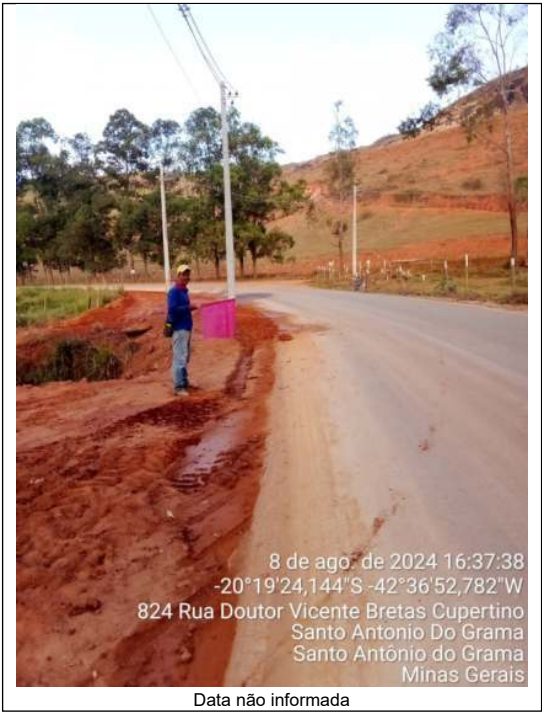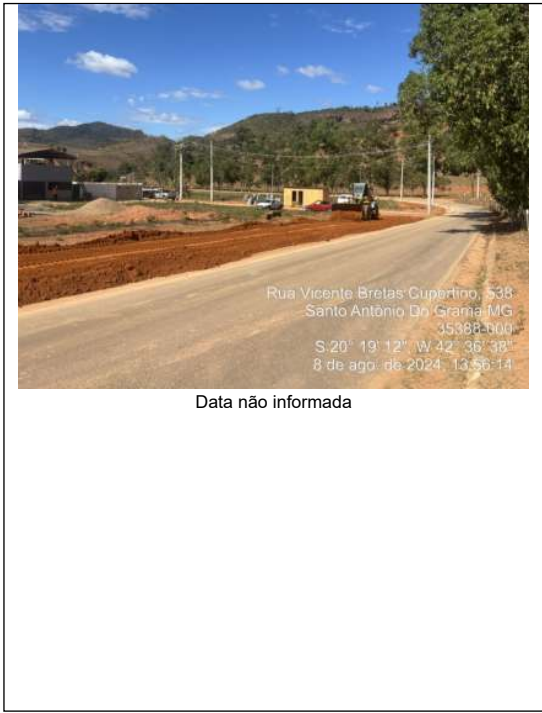


OCORRÊNCIAS		
NÚMERO DE OC	TIPO DE OCORRÊNCIA	DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA
CONFERÊNCIA		
MUNICÍPIO	CONSÓRCIO (Aprovado em 09/08/2024 - 11:50)	
Obs.:	Obs.:	
ASSINATURAS		
YURI ANDRADE COSTA LINS Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 233590/D	PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA CREA 137.103/D	ANTÔNIO CARLOS MARTINS BRANDÃO RT de Execução - PONTAL ENGENHARIA LTDA CREA 45.957/D



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº 0013		OBRA: CTP 0191/2024 - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE ACESSIBILIDADE		CONTRATO:		RESP. TÉCNICO: ANTONIO CARLOS MARTINS BRANDÃO	
ENDEREÇO: TRECHO DA RODOVIA DE ACESSO A SANTO ANTONIO DO GRAMA, BAIRRO NOVO HORIZONTE.				INÍCIO: 01/07/2024		Nº CREA-MG: 45957/D	
CIDDE:				PRAZO: 31/12/2024		Nº DA ART:	
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA				UF:		COORDENADAS:	
DATA: 07/08/2024		SOL ☀		NUBLADO ☁		CHUVA ☔	
MANHÃ		✓				IMPRATICÁVEL ☔	
TARDE		✓					
QTDE		MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO				QTDE	
1		ENCARREGADO DE OBRAS				2	
1		MOTORISTA DE CAMINHÃO PIPA				2	
1		OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA				4	
QTDE		EQUIPAMENTO					
1		PÁ CARREGADEIRA					
1		TRADO MANUAL					
2		CAMINHAO CAÇAMBA					
3		PÁ					
1		CAMINHÃO PIPA					
3		ENXADA					
2		CARRINHO DE MÃO					
TAREFAS REALIZADAS							
NÚMERO DE T.R.		DESCRICAO				OBSERVAÇÕES	
1		CARGA, TRANSPORTE E ESPALHAMENTO DE SOLO				PARA NIVELAMENTO DA BASE DA PISTA	
2		MOVIMENTAÇÃO MECANICA DE SOLO				PREPARO DA PISTA DE IMPLANTAÇÃO	
3		ESCAVAÇÃO DE ESTACAS TIPO TRADO				FUNDAÇÕES PROFUNDAS DA PASSARELA DE PEDESTRES	
4		PINTURA DAS VIGAS METÁLICAS DA PASSARELA DE PEDEST					
REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)							

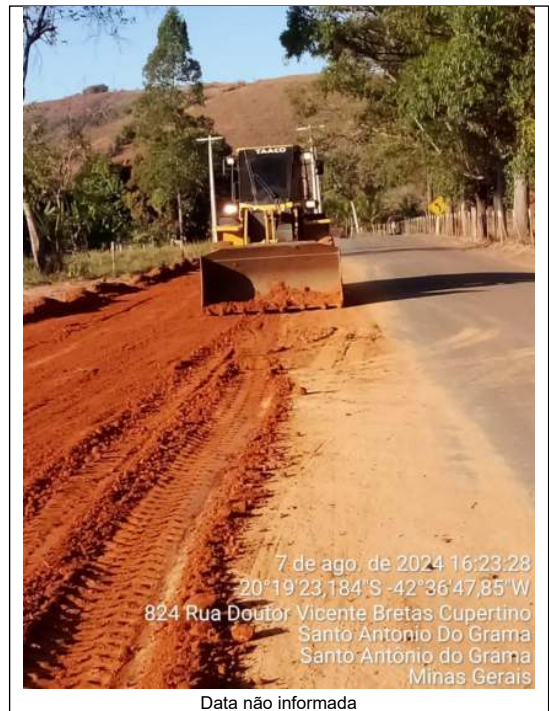



OCORRÊNCIAS		
NÚMERO DE OC	TIPO DE OCORRÊNCIA	DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA
CONFERÊNCIA		
MUNICÍPIO	CONSÓRCIO (Aprovado em 08/08/2024 - 07:45)	
Obs.:	Obs.:	
ASSINATURAS		
YURI ANDRADE COSTA LINS Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 233590/D	PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA CREA 137.103/D	ANTÔNIO CARLOS MARTINS BRANDÃO RT de Execução - PONTAL ENGENHARIA LTDA CREA 45.957/D





RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº 0012	OBRA: CTP 0191/2024 - SANTO ANTONIO DO GRAMA - IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE ACESSIBILIDADE	CONTRATO:	RESP. TÉCNICO: ANTONIO CARLOS MARTINS BRANDÃO
ENDEREÇO: TRECHO DA RODOVIA DE ACESSO A SANTO ANTONIO DO GRAMA, BAIRRO NOVO HORIZONTE.		INÍCIO: 01/07/2024	Nº CREA-MG: 45957/D
CIDDE:		PRAZO: 31/12/2024	Nº DA ART:
DISTRITO: SANTO ANTONIO DO GRAMA		UF:	COORDENADAS:
DATA: 06/08/2024	SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA ☔
IMPRATICÁVEL ☔	MANHÃ ✓		
TARDE ✓			
QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
1	ENCARREGADO DE OBRAS	2	PEDREIRO
4	AJUDANTE		
QTDE	EQUIPAMENTO		
1	PÁ CARREGADEIRA		
1	DAMPER		
5	PÁ		
5	ENXADA		
2	CAMINHÃO BASCULANTE		
2	CARRINHO DE MÃO		
TAREFAS REALIZADAS			
NÚMERO DE T.R.	DESCRICAÇÃO	OBSERVAÇÕES	
1	RELOCAÇÃO DE PADRÃO CEMIG E OUTROS EQUIPAMENTOS	ESTAVAM OBSTRUINDO A ÁREA DE IMPLANTAÇÃO DA PISTA	
2	MOVIMENTAÇÃO MANUAL DE SOLO		
3	DESCARREGAMENTO DE VIGAS METÁLICAS NA OBRA		
4	MOVIMENTAÇÃO MECANICA DE SOLO		
REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)			







Data não informada

OCORRÊNCIAS		
NÚMERO DE OC	TIPO DE OCORRÊNCIA	DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA
CONFERÊNCIA		
MUNICÍPIO	CONSÓRCIO (Aprovado em 08/08/2024 - 07:43)	
Obs.:	Obs.:	
ASSINATURAS		
YURI ANDRADE COSTA LINS Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 233590/D	PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA CREA 137.103/D	ANTÔNIO CARLOS MARTINS BRANDÃO RT de Execução - PONTAL ENGENHARIA LTDA CREA 45.957/D






CIMVALPI
CONSORCIO INTERMUNICIPAL
MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº 0011	OBRA: CTP 0191/2024 - SANTO ANTONIO DO GRAMA - IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE ACESSIBILIDADE	CONTRATO:	RESP. TÉCNICO: ANTONIO CARLOS MARTINS BRANDÃO
ENDEREÇO: TRECHO DA RODOVIA DE ACESSO A SANTO ANTONIO DO GRAMA, BAIRRO NOVO HORIZONTE.		INÍCIO: 01/07/2024	Nº CREA-MG: 45957/D
CIDDE:		PRAZO: 31/12/2024	Nº DA ART:
DISTRITO: SANTO ANTONIO DO GRAMA		UF:	COORDENADAS:
DATA: 05/08/2024	SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA ☔
MANHÃ	✓		IMPRATICÁVEL ☔
TARDE	✓		
QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
1	ENCARREGADO DE OBRAS	2	PEDREIRO
4	AJUDANTE		
QTDE	EQUIPAMENTO		
2	CAVADEIRA RETA		
1	DAMPER		
5	PÁ		
5	ENXADA		
2	CARRINHO DE MÃO		
1	CARREGADEIRA		
TAREFAS REALIZADAS			
NÚMERO DE T.R.	DESCRICAO	OBSERVAÇÕES	
1	DESCARGA DE MEIO FIOS NA OBRA	250 UNIDADES MEIO FIOS PREMOLDADOS	
2	MOVIMENTAÇÃO MECANICA DE SOLO	ACERTO E NIVELAMENTO DE PISO	
REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)			
 5 de ago. de 2024 10:04:02 -20°19'20,1"S -42°36'42,342"W 824 Rua Doutor Vicente Bretas Cupertino Santo Antonio Do Grama Santo Antônio do Grama Minas Gerais Data não informada  5 de ago. de 2024 09:16:55 -20°19'19,158"S -42°36'41,43"W 32 Praça Padre Antônio Ribeiro de Pinto Santo Antônio do Grama Minas Gerais Data não informada			



Pág: 29/79

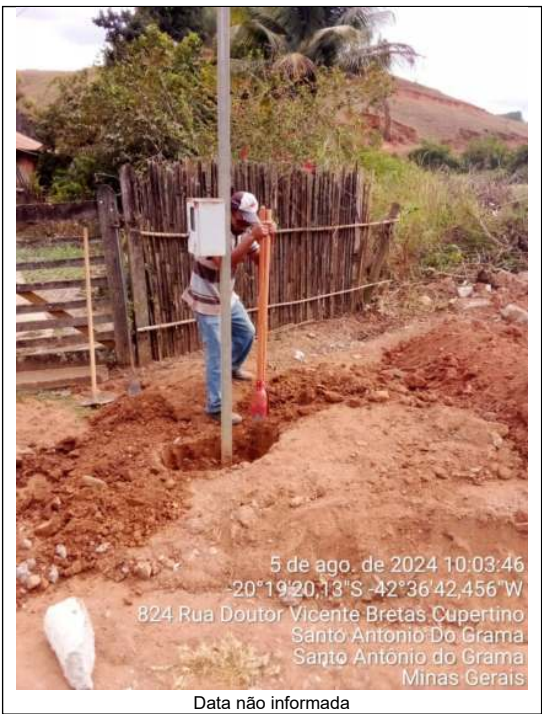

OCORRÊNCIAS		
NÚMERO DE OC	TIPO DE OCORRÊNCIA	DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA
CONFERÊNCIA		
MUNICÍPIO	CONSÓRCIO (Aprovado em 08/08/2024 - 07:43)	
Obs.:	Obs.:	
ASSINATURAS		
YURI ANDRADE COSTA LINS Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 233590/D	PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA CREA 137.103/D	ANTÔNIO CARLOS MARTINS BRANDÃO RT de Execução - PONTAL ENGENHARIA LTDA CREA 45.957/D





RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº 0010

OBRA: CTP 0191/2024 - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE ACESSIBILIDADE

CONTRATO:

RESP. TÉCNICO: ANTONIO CARLOS MARTINS BRANDÃO

ENDEREÇO: TRECHO DA RODOVIA DE ACESSO A SANTO ANTONIO DO GRAMA, BAIRRO NOVO HORIZONTE.

INÍCIO: 01/07/2024

Nº CREA-MG: 45957/D

CIDDE:

DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA

PRAZO: 31/12/2024

UF:

Nº DA ART:

COORDENADAS:

DATA: 02/08/2024

SOL ☀

NUBLADO ☁

CHUVA ☔

IMPRATICÁVEL 🌧

MANHÃ

✓

TARDE

✓

QTDE

MÃO DE OBRA INDIRETA
FUNÇÃO / CARGO

QTDE

MÃO DE OBRA INDIRETA
FUNÇÃO / CARGO

1

ENCARREGADO DE OBRAS

2

PEDREIRO

4

AJUDANTE

QTDE

EQUIPAMENTO

5

PÁ

5

ENXADA

2

CARRINHO DE MÃO

3

CAVADEIRA MANUAL

TAREFAS REALIZADAS

NÚMERO DE T.R.

DESCRICAO

OBSERVAÇÕES

REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)



2 de ago. de 2024 15:45:77

-20°19'16,752"S - 42°36'39,516"W

640 Rua Doutor Vicente Bretas Cupertino

Santo Antonio Do Grama

Santo Antonio do Grama

Minas Gerais

Data não informada



2 de ago. de 2024 15:45:18

-20°19'16,638"S - 42°36'39,474"W

640 Rua Doutor Vicente Bretas Cupertino

Santo Antonio Do Grama

Santo Antonio do Grama

Minas Gerais

Data não informada



2 de ago. de 2024 15:44:45

-20°19'16,086"S - 42°36'39,42"W

32 Praça Padre Antônio Ribeiro de Pinto

Santo Antonio do Grama

Minas Gerais

Data não informada

OCORRÊNCIAS

NÚMERO DE OC

TIPO DE OCORRÊNCIA

DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA

CONFERÊNCIA

MUNICÍPIO

CONSÓRCIO (Aprovado em 08/08/2024 - 07:41)

Obs.:

Obs.:

ASSINATURAS

YURI ANDRADE COSTA LINS

Fiscal de Obras - CIMVALPI

PEDRO MARTINO ZEFERINO

Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA

ANTÔNIO CARLOS MARTINS BRANDÃO

RT de Execução - PONTAL ENGENHARIA LTDA



Pag.: 30 / 47 ID. do Doc.: 8CD.682 - 20/08/2024 - 16:29:55 - ASSINADO POR(3): CPF:015.49*. **6.*9 CPF:084.94*. **6.*2 CPF:385.06*. **6.*4

Pág: 32/79






RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº 0009	OBRA: CTP 0191/2024 - SANTO ANTONIO DO GRAMA - IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE ACESSIBILIDADE	CONTRATO:	RESP. TÉCNICO: ANTONIO CARLOS MARTINS BRANDÃO
ENDEREÇO: TRECHO DA RODOVIA DE ACESSO A SANTO ANTONIO DO GRAMA, BAIRRO NOVO HORIZONTE.		INÍCIO: 01/07/2024	Nº CREA-MG: 45957/D
CIDDE:		PRAZO: 31/12/2024	Nº DA ART:
DISTRITO: SANTO ANTONIO DO GRAMA		UF:	COORDENADAS:
DATA: 01/08/2024	SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA ☔
MANHÃ	✓		IMPRATICÁVEL ☔
TARDE	✓		
QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
1	ENCARREGADO DE OBRAS	2	PEDREIRO
4	AJUDANTE		
QTDE	EQUIPAMENTO		
5	PÁ		
5	ENXADA		
2	CARRINHO DE MÃO		
2	CAVADEIRA MANUAL		
TAREFAS REALIZADAS			
NÚMERO DE T.R.	DESCRICAÇÃO	OBSERVAÇÕES	
1	PERFURAÇÃO DE ESTACAS PASSARELA DE PEDESTRES		
2	APROVAÇÃO PLACA DE OBRA		

REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)

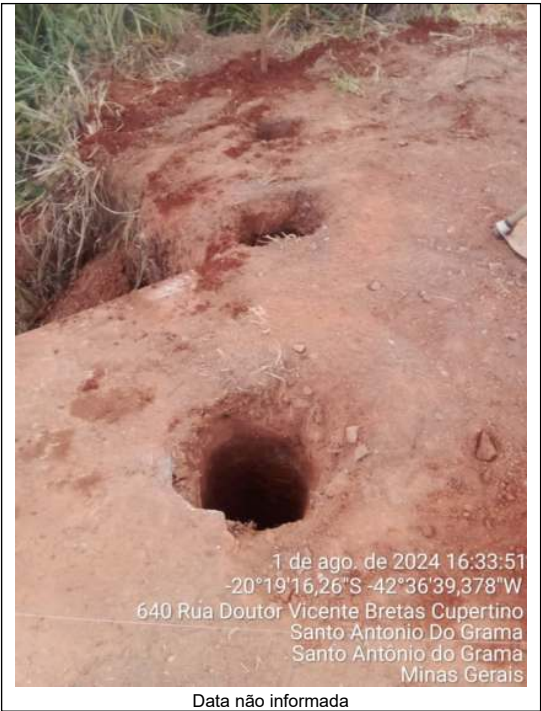

IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE ACESSIBILIDADE

GESTOR DA OBRA: CIMVALPI

AGENTE FINANCEIRO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO GRAMA

CONTRATO ADMINISTRATIVO: Nº 0191/2024

EMPRESA EXECUTORA: PONTAL ENGENHARIA LTDA

RESPONSÁVEL TÉCNICO: ENG CIVIL CREA MG 45.957 - ANTONIO CARLOS MARTINS BRANDÃO

VALOR DO CONTRATO: R\$ 776.901,38

PRAZO DE EXECUÇÃO: 180 DIAS

PREFEITURA MUNICIPAL
SANTO ANTONIO DO GRAMA

Data não informada



OCORRÊNCIAS		
NÚMERO DE OC	TIPO DE OCORRÊNCIA	DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA
CONFERÊNCIA		
MUNICÍPIO	CONSÓRCIO (Aprovado em 08/08/2024 - 07:41)	
Obs.:	Obs.:	
ASSINATURAS		
YURI ANDRADE COSTA LINS Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 233590/D	PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA CREA 137.103/D	ANTÔNIO CARLOS MARTINS BRANDÃO RT de Execução - PONTAL ENGENHARIA LTDA CREA 45.957/D




 CIMVALPI CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO		
Nº 0008		OBRA: CTP 0191/2024 - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE ACESSIBILIDADE	CONTRATO:	RESP. TÉCNICO: ANTONIO CARLOS MARTINS BRANDÃO
ENDEREÇO: TRECHO DA RODOVIA DE ACESSO A SANTO ANTONIO DO GRAMA, BAIRRO NOVO HORIZONTE.		INÍCIO: 01/07/2024		Nº CREA-MG: 45957/D
CIDDE:		PRAZO: 31/12/2024		Nº DA ART:
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA		UF:		COORDENADAS:
DATA: 31/07/2024	SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA ☔	IMPRATICÁVEL ☔
MANHÃ		✓		
TARDE	✓			
QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO		QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
1	ENCARREGADO DE OBRAS		2	PEDREIRO
4	AJUDANTE			
QTDE	EQUIPAMENTO			
5	PÁ			
5	ENXADA			
3	CARRINHO DE MÃO			
3	CAVADEIRA MANUAL			
TAREFAS REALIZADAS				
NÚMERO DE T.R.	DESCRIÇÃO		OBSERVAÇÕES	
1	ESCAVAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE MEIO FIO			
REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)				
 31 de jul. de 2024 16:39:58 -20°19'24,228"S -42°36'50,136"W Santo Antônio do Grama Minas Gerais Data não informada		 31 de jul. de 2024 16:40:06 -20°19'24,348"S -42°36'50,4"W Santo Antônio do Grama Minas Gerais Data não informada		
OCORRÊNCIAS				
NÚMERO DE OC	TIPO DE OCORRÊNCIA		DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA	
CONFERÊNCIA				
MUNICÍPIO	CONSÓRCIO (Aprovado em 01/08/2024 - 16:00)			
Obs.:	Obs.: Providenciar a tela tapume para sinalizar/isolar a área de trabalho			
ASSINATURAS				
YURI ANDRADE COSTA LINS Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 233590/D		PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA CREA 137.103/D		ANTÔNIO CARLOS MARTINS BRANDÃO RT de Execução - PONTAL ENGENHARIA LTDA CREA 45.957/D



 CIMVALPI CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO		
Nº 0007		OBRA: CTP 0191/2024 - SANTO ANTONIO DO GRAMA - IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE ACESSIBILIDADE	CONTRATO:	RESP. TÉCNICO: ANTONIO CARLOS MARTINS BRANDÃO
ENDEREÇO: TRECHO DA RODOVIA DE ACESSO A SANTO ANTONIO DO GRAMA, BAIRRO NOVO HORIZONTE.		INÍCIO: 01/07/2024		Nº CREA-MG: 45957/D
CIDDE:		PRAZO: 31/12/2024		Nº DA ART:
DISTRITO: SANTO ANTONIO DO GRAMA		UF:		COORDENADAS:
DATA: 30/07/2024	SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA ☔	IMPRATICÁVEL ☔
MANHÃ	✓			
TARDE	✓			
QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO		QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
1	ENCARREGADO DE OBRAS		2	PEDREIRO
4	AJUDANTE			
QTDE	EQUIPAMENTO			
5	PÁ			
5	ENXADA			
3	CARRINHO DE MÃO			
1	SERRA CIRCULAR			
1	BETONEIRA			
1	SERRA DE BANCADA			
TAREFAS REALIZADAS				
NÚMERO DE T.R.	DESCRICAO		OBSERVAÇÕES	
1	ESCAVAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DE MEIO FIO			
2	MOVIMENTAÇÃO MANUAL DE SOLO			
REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)				
 30 de jul. de 2024 16:26:44 -20°19'23,826"S -42°36'52,626"W Santo Antônio do Grama Minas Gerais Data não informada  30 de jul. de 2024 16:26:44 -20°19'23,826"S -42°36'52,626"W Santo Antônio do Grama Minas Gerais Data não informada				



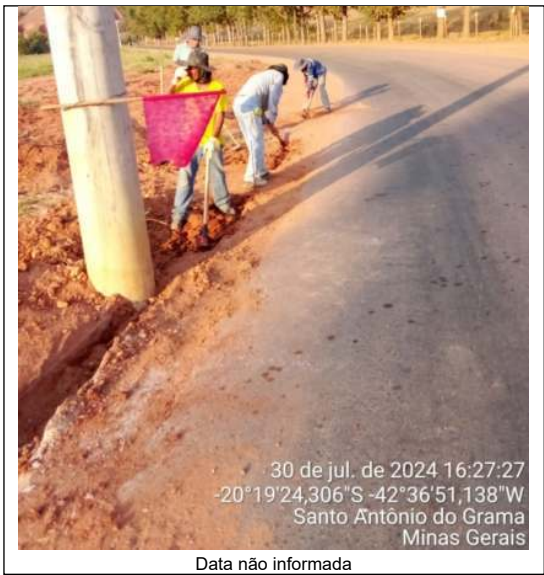

Data não informada

OCORRÊNCIAS		
NÚMERO DE OC	TIPO DE OCORRÊNCIA	DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA
CONFERÊNCIA		
MUNICÍPIO	CONSÓRCIO (Aprovado em 01/08/2024 - 15:59)	
Obs.:	Obs.: Providenciar tela tapume para sinalizar e isolar a área de trabalho	
ASSINATURAS		
YURI ANDRADE COSTA LINS Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 233590/D	PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA CREA 137.103/D	ANTÔNIO CARLOS MARTINS BRANDÃO RT de Execução - PONTAL ENGENHARIA LTDA CREA 45.957/D





CIMVALPI
CONSORCIO INTERMUNICIPAL
MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº 0006	OBRA: CTP 0191/2024 - SANTO ANTONIO DO GRAMA - IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE ACESSIBILIDADE	CONTRATO:	RESP. TÉCNICO: ANTONIO CARLOS MARTINS BRANDÃO
ENDEREÇO: TRECHO DA RODOVIA DE ACESSO A SANTO ANTONIO DO GRAMA, BAIRRO NOVO HORIZONTE.		INÍCIO: 01/07/2024	Nº CREA-MG: 45957/D
CIDDE:		PRAZO: 31/12/2024	Nº DA ART:
DISTRITO: SANTO ANTONIO DO GRAMA		UF:	COORDENADAS:
DATA: 30/07/2024	SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA ☔
MANHÃ	✓		IMPRATICÁVEL ☔
TARDE	✓		
QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
1	ENCARREGADO DE OBRAS	2	PEDREIRO
4	AJUDANTE		
QTDE	EQUIPAMENTO		
5	PÁ		
5	ENXADA		
1	RETROESCAVADEIRA		
1	SERRA CIRCULAR		
1	BETONEIRA		
1	SERRA DE BANCADA		
TAREFAS REALIZADAS			
NÚMERO DE T.R.	DESCRICAO	OBSERVAÇÕES	
1	REMOÇÃO MANUAL E MECÂNICA DE MEIO FIOS EXISTENTES		
2	MOVIMENTAÇÃO MECANICA DE SOLO		
3	MOVIMENTAÇÃO MANUAL DE SOLO		
REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)			
 29 de jul. de 2024 16:10:11 -20°19'24,189"S - 42°36'52,318"W Santo Antônio do Grama Minas Gerais 29/07/2024 -20.323385833333, -42.614532777778		 29 de jul. de 2024 15:56:05 -20°19'20,693"S - 42°36'43,2"W 824 Rua Doutor Vicente Bretas Cupertino Santo Antonio Do Grama Santo Antônio do Grama Minas Gerais 29/07/2024 -20.322414722222, -42.612	





29 de jul. de 2024 10:08:32
640 Rua Doutor Vicente Bretas Cupertino
Santo Antonio Do Grama
Santo Antônio do Grama
Minas Gerais

Data não informada

OCORRÊNCIAS	
NÚMERO DE OC	TIPO DE OCORRÊNCIA
DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA	
OBSERVAÇÕES	
DATA 29/07/2024 SEGUNDA FEIRA. LANÇAMENTO DE INFORMAÇÕES EM ATRAZO, A PARTIR DA LIBERAÇÃO E TRENAMENTO DE OPERAÇÃO DO SISTEMA WAY.	
CONFERÊNCIA	
MUNICÍPIO	CONSÓRCIO (Aprovado em 01/08/2024 - 15:57)
Obs.:	Obs.:
ASSINATURAS	
YURI ANDRADE COSTA LINS Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 233590/D	PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA CREA 137.103/D
ANTÔNIO CARLOS MARTINS BRANDÃO RT de Execução - PONTAL ENGENHARIA LTDA CREA 45.957/D	



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº 0005	OBRA: CTP 0191/2024 - SANTO ANTONÍO DO GRAMA - IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE ACESSIBILIDADE	CONTRATO:		RESP. TÉCNICO: ANTONIO CARLOS MARTINS BRANDÃO
ENDEREÇO: TRECHO DA RODOVIA DE ACESSO A SANTO ANTONIO DO GRAMA, BAIRRO NOVO HORIZONTE.		INÍCIO: 01/07/2024		Nº CREA-MG: 45957/D
CIDDE:		PRAZO: 31/12/2024		Nº DA ART:
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA		UF:		COORDENADAS:
DATA: 30/07/2024	SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA ☔	IMPRATICÁVEL ☔
MANHÃ	✓			
TARDE	✓			
QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO		QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
1	ENCARREGADO DE OBRAS		2	PEDREIRO
5	AJUDANTE			
QTDE	EQUIPAMENTO			
5	PÁ			
5	ENXADA			
1	RETROESCAVADEIRA			
1	SERRA CIRCULAR			
1	BETONEIRA			
1	SERRA DE BANCADA			
TAREFAS REALIZADAS				
NÚMERO DE T.R.	DESCRICAO		OBSERVAÇÕES	
1	MOVIMENTAÇÃO MECANICA DE SOLO		ACERTO DE PISTA	
2	MOVIMENTAÇÃO MANUAL DE SOLO		ACERTO DE PISTA	
REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)				





29 de jul. de 2024 10:08:32
640 Rua Doutor Vicente Bretas Cupertino
Santo Antonio Do Grama
Santo Antonio do Grama
Minas Gerais

Data não informada

OCORRÊNCIAS		
NÚMERO DE OC	TIPO DE OCORRÊNCIA	DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA
OBSERVAÇÕES		
DATA 26/07/2024 SEGUNDA FEIRA. LANÇAMENTO DE INFORMAÇÕES EM ATRAZO, A PARTIR DA LIBERAÇÃO E TRENAMENTO DE OPERAÇÃO DO SISTEMA WAY.		
CONFERÊNCIA		
MUNICÍPIO	CONSÓRCIO (Aprovado em 01/08/2024 - 15:56)	
Obs.:	Obs.:	
ASSINATURAS		
YURI ANDRADE COSTA LINS Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 233590/D	PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA CREA 137.103/D	ANTÔNIO CARLOS MARTINS BRANDÃO RT de Execução - PONTAL ENGENHARIA LTDA CREA 45.957/D





RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº 0004	OBRA: CTP 0191/2024 - SANTO ANTONIO DO GRAMA - IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE ACESSIBILIDADE	CONTRATO:	RESP. TÉCNICO: ANTONIO CARLOS MARTINS BRANDÃO
ENDEREÇO: TRECHO DA RODOVIA DE ACESSO A SANTO ANTONIO DO GRAMA, BAIRRO NOVO HORIZONTE.		INÍCIO: 01/07/2024	Nº CREA-MG: 45957/D
CIDDE:		PRAZO: 31/12/2024	Nº DA ART:
DISTRITO: SANTO ANTONIO DO GRAMA		UF:	COORDENADAS:
DATA: 30/07/2024	SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA ☔
MANHÃ	✓		IMPRATICÁVEL ☔
TARDE	✓		
QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
1	ENCARREGADO DE OBRAS	2	PEDREIRO
5	AJUDANTE		
QTDE	EQUIPAMENTO		
5	PÁ		
5	ENXADA		
3	CARRINHO DE MÃO		
1	SERRA CIRCULAR		
1	BETONEIRA		
1	SERRA DE BANCADA		
TAREFAS REALIZADAS			
NÚMERO DE T.R.	DESCRICAO	OBSERVAÇÕES	
1	LIMPEZA E CAPINA		
2	MOVIMENTAÇÃO MECANICA DE SOLO	PARA NIVELAMENTO DO TERRENO	
3	MOVIMENTAÇÃO MANUAL DE SOLO	PARA ACERTOS DO TERRENO	
REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)			
 29 de jul. de 2024 15:54:31 -20°19'18.808"S - 42°36'40.922"W 651 Rua Doutor Vicente Bretas Cupertino Santo Antonio Do Grama Santo Antonio do Grama Minas Gerais 29/07/2024 -20.321891111111, -42.611366944444		 29 de jul. de 2024 07:44:03 Santo Antonio do Grama Minas Gerais Data não informada	
OCORRÊNCIAS			
NÚMERO DE OC	TIPO DE OCORRÊNCIA	DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA	
OBSERVAÇÕES			
DATA 25/07/2024 SEGUNDA FEIRA. LANÇAMENTO DE INFORMAÇÕES EM ATRAZO, A PARTIR DA LIBERAÇÃO E TRENAMENTO DE OPERAÇÃO DO SISTEMA WAY.			
CONFERÊNCIA			
MUNICÍPIO	CONSÓRCIO (Aprovado em 01/08/2024 - 15:56)		
Obs.:	Obs.:		
ASSINATURAS			
YURI ANDRADE COSTA LINS Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 233590/D		PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTONIO DO GRAMA CREA 137.103/D	
		ANTÔNIO CARLOS MARTINS BRANDÃO RT de Execução - PONTAL ENGENHARIA LTDA CREA 45.957/D	



Cod. de Autenticidade do Doc.: 1638.7E29.5551.813R.7287 - ZeroPapel - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA - MG
Proc. Adm: 09.0209-3.2024.15



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº 0003	OBRA: CTP 0191/2024 - SANTO ANTONIO DO GRAMA - IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE ACESSIBILIDADE	CONTRATO:	RESP. TÉCNICO: ANTONIO CARLOS MARTINS BRANDÃO
ENDEREÇO: TRECHO DA RODOVIA DE ACESSO A SANTO ANTONIO DO GRAMA, BAIRRO NOVO HORIZONTE.		INÍCIO: 01/07/2024	Nº CREA-MG: 45957/D
CIDDE:		PRAZO: 31/12/2024	Nº DA ART:
DISTRITO: SANTO ANTONIO DO GRAMA		UF:	COORDENADAS:
DATA: 30/07/2024	SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA ☔
MANHÃ	✓		IMPRATICÁVEL ☔
TARDE	✓		
QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
1	ENCARREGADO DE OBRAS	2	PEDREIRO
4	AJUDANTE		
QTDE	EQUIPAMENTO		
5	PÁ		
5	ENXADA		
1	SERRA CIRCULAR		
1	BETONEIRA		
1	SERRA DE BANCADA		
TAREFAS REALIZADAS			
NÚMERO DE T.R.	DESCRIÇÃO	OBSERVAÇÕES	
1	ACERTO E NIVELAMENTO MANUAL DE PISTA		
2	REMOÇÃO DE CERCAS		
3	CONCLUSÃO DO BARRACO DE OBRA COM DEPOSITO E BANHEI	COBERTURA E CONCRETAGEM DO PISO	
4	LIMPEZA E CAPINA		
5	REALOCAÇÃO DE CERCAS		
6	CONSTRUÇÃO DE BARRACO DE OBRA		

REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)



OCORRÊNCIAS		
NÚMERO DE OC	TIPO DE OCORRÊNCIA	DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA
OBSERVAÇÕES		
DATA 24/07/2024 SEGUNDA FEIRA. LANÇAMENTO DE INFORMAÇÕES EM ATRAZO, A PARTIR DA LIBERAÇÃO E TRENAMENTO DE OPERAÇÃO DO SISTEMA WAY.		
CONFERÊNCIA		
MUNICÍPIO	CONSÓRCIO (Aprovado em 01/08/2024 - 15:55)	
Obs.:	Obs.:	
ASSINATURAS		
YURI ANDRADE COSTA LINS Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 233590/D	PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA CREA 137.103/D	ANTÔNIO CARLOS MARTINS BRANDÃO RT de Execução - PONTAL ENGENHARIA LTDA CREA 45.957/D





CIMVALPI
CONSORCIO INTERMUNICIPAL
MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº 0002	OBRA: CTP 0191/2024 - SANTO ANTONIO DO GRAMA - IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE ACESSIBILIDADE	CONTRATO:	RESP. TÉCNICO: ANTONIO CARLOS MARTINS BRANDÃO
ENDEREÇO: TRECHO DA RODOVIA DE ACESSO A SANTO ANTONIO DO GRAMA, BAIRRO NOVO HORIZONTE.		INÍCIO: 01/07/2024	Nº CREA-MG: 45957/D
CIDDE:		PRAZO: 31/12/2024	Nº DA ART:
DISTRITO: SANTO ANTONIO DO GRAMA		UF:	COORDENADAS:
DATA: 30/07/2024	SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA ☔
MANHÃ	✓		IMPRATICÁVEL ☔
TARDE	✓		
QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
1	ENCARREGADO DE OBRAS	2	PEDREIRO
4	AJUDANTE		
QTDE	EQUIPAMENTO		
5	PÁ		
5	ENXADA		
3	CARRINHO DE MÃO		
1	SERRA CIRCULAR		
1	BETONEIRA		
1	SERRA DE BANCADA		
TAREFAS REALIZADAS			
NÚMERO DE T.R.	DESCRICAO	OBSERVAÇÕES	
1	CONSTRUÇÃO DE BARRACO DE OBRA	BANHEIRO E DEPOSITO 12 M²	
2	REMOÇÃO DE CERCAS		
3	REALOCAÇÃO DE CERCAS		
4	LIMPEZA E CAPINA		
REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)			
 29 de jul. de 2024 15:55:51 -20°19'20,826"S -42°36'43,038"W 824 Rua Doutor Vicente Bretas Cupertino Santo Antonio Do Grama Santo Antônio do Grama Minas Gerais 29/07/2024 -20.322451666667, -42.611955  29 de jul. de 2024 15:22:06 Santo Antonio do Grama Minas Gerais 29/07/2024 -20.323100555556, -42.6146625  29 de jul. de 2024 15:27:21 -20°19'23,84"S -42°36'53,481"W Santo Antonio do Grama Minas Gerais 29/07/2024 -20.323288888889, -42.614855833333			
OCORRÊNCIAS			



Pág.: 44 / 47 ID. do Doc.: 8CD.682 - 20/08/2024 - 16:29:55 - ASSINADO POR(3): CPF:015.49*. **6.*9 CPF:084.94*. **6.*2 CPF:385.06*. **6.*4

Pág: 46/79

NÚMERO DE OC	TIPO DE OCORRÊNCIA	DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA
OBSERVAÇÕES		
DATA 23/07/2024 TERÇA FEIRA. LANÇAMENTO DE INFORMAÇÕES EM ATRAZO, A PARTIR DA LIBERAÇÃO E TRENAMENTO DE OPERAÇÃO DO SISTEMA WAY.		
CONFERÊNCIA		
MUNICÍPIO	CONSÓRCIO (Aprovado em 01/08/2024 - 15:55)	
Obs.:	Obs.:	
ASSINATURAS		
YURI ANDRADE COSTA LINS Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 233590/D	PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA CREA 137.103/D	ANTÔNIO CARLOS MARTINS BRANDÃO RT de Execução - PONTAL ENGENHARIA LTDA CREA 45.957/D



 CIMVALPI CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO		
Nº 0001		OBRA: CTP 0191/2024 - SANTO ANTONIO DO GRAMA - IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE ACESSIBILIDADE	CONTRATO:	RESP. TÉCNICO: ANTONIO CARLOS MARTINS BRANDÃO
ENDEREÇO: TRECHO DA RODOVIA DE ACESSO A SANTO ANTONIO DO GRAMA, BAIRRO NOVO HORIZONTE.		INÍCIO: 01/07/2024		Nº CREA-MG: 45957/D
CIDDE:		PRAZO: 31/12/2024		Nº DA ART:
DISTRITO: SANTO ANTONIO DO GRAMA		UF:		COORDENADAS:
DATA: 30/07/2024	SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA ☔	IMPRATICÁVEL 🌧
MANHÃ	✓			
TARDE	✓			
QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO		QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
1	ENCARREGADO DE OBRAS		2	PEDREIRO
4	AJUDANTE			
QTDE			EQUIPAMENTO	
5	PÁ			
5	ENXADA			
3	CARRINHO DE MÃO			
1	SERRA CIRCULAR			
1	BETONEIRA			
1	SERRA DE BANCADA			
TAREFAS REALIZADAS				
NÚMERO DE T.R.	DESCRICAO		OBSERVAÇÕES	
1	LIMPESA E CAPINA			
2	REMOÇÃO DE CERCAS			
REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)				
 29 de jul. de 2024 15:56:11 -20°19'20,718"S - 42°36'43,291"W 824 Rua Doutor Vicente Bretas Cupertino Santo Antonio Do Grama Santo Antônio do Grama Minas Gerais 29/07/2024 -20.322410833333, -42.612017777778  29 de jul. de 2024 16:01:30 -20°19'21,621"S - 42°36'44,958"W 824 Rua Doutor Vicente Bretas Cupertino Santo Antonio Do Grama Santo Antônio do Grama Minas Gerais 29/07/2024 -20.322672222222, -42.612488333333				
OCORRÊNCIAS				
NÚMERO DE OC	TIPO DE OCORRÊNCIA	DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA		
OBSERVAÇÕES				
DATA 22/07/2024 SEGUNDA FEIRA. LANÇAMENTO DE INFORMAÇÕES EM ATRAZO, A PARTIR DA LIBERAÇÃO E TRENAMENTO DE OPERAÇÃO DO SISTEMA WAY.				
CONFERÊNCIA				
MUNICÍPIO	CONSÓRCIO (Aprovado em 01/08/2024 - 15:54)			
Obs.:	Obs.:			
ASSINATURAS				
YURI ANDRADE COSTA LINS Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 233590/D		PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTONIO DO GRAMA CREA 137.103/D		ANTONIO CARLOS MARTINS BRANDÃO RT de Execução - PONTAL ENGENHARIA LTDA CREA 45.957/D





Assinaturas do Documento



Documento Assinado Eletronicamente por **PEDRO MARTINO ZEFERINO**, CPF: 015.49*. **6- *9 em **21/08/2024 09:47:00**, Cód. Autenticidade da Assinatura: **09V4.4747.000V.W11X.0660**, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Documento Assinado Eletronicamente por **YURI ANDRADE COSTA LINS**, CPF: 084.94*. **6- *2 em **20/08/2024 17:01:17**, Cód. Autenticidade da Assinatura: **17E1.7K01.7173.232V.3772**, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Documento Assinado Eletronicamente por **ANTONIO CARLOS MARTINS BRANDÃO**, CPF: 385.06*. **6- *4 em **20/08/2024 16:51:05**, Cód. Autenticidade da Assinatura: **16Z0.4V51.505R.A532.3147**, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Informações do Documento

ID do Documento: **8CD.682** - Tipo de Documento: **FORMULÁRIO DE MEDIÇÕES.**

Elaborado por **GILBERTO ARAUJO GOMIDES**, CPF: 069.58*. **6- *7 , em **20/08/2024 - 16:29:55**

Código de Autenticidade deste Documento: 1638.7E29.5551.813R.7287

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:

<https://zeropapel.cimvalpi.mg.gov.br/verdocumento>





CIMVALPI - Consórcio Intermunicipal Multissetorial do Vale do Piranga
Estado de Minas Gerais
ORDEN DE FORNECIMENTO

ORDEN DE FORNECIMENTO
000001/2024

DADOS DA ENTIDADE / ORGÃO

Endereço Rua Jaime Pereira, 127 - Progresso
Ponte Nova, Minas Gerais, Brasil- C.E.P : 35430-000
C.N.P.J. 19.738.706/0001-83 Inscrição Estadual
Telefone (31)38813273 Fax (31)38813273

Ordem de Serviço / Compra 000482/2024	Número do Empenho 000856/2024	Ficha Orçamentária 00214	Setor Contabil CIMVALPI
--	----------------------------------	-----------------------------	----------------------------

Processo de Compra
070018/2024

Condição de Pagamento Pagamento Parcelado
Prazo de Entrega Durante a Vigência do Contrato
Garantia Material Não Possui Garantia
Assistência Técnica Pelo Próprio Fornecedor ou Por Concessionária

Fornecedor 001484 - PONTAL ENGENHARIA LTDA
Endereço Avenida Doutor Otávio Soares, 266 - Palmeiras
Ponte Nova, Minas Gerais, Brasil - C.E.P : 35.430-000
CNPJ 05.527.293/0001-83 Inscrição Estadual
Telefone Fax
Email
Conta p/ Pagamento..... Banco

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE AQUISIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
0001	00025371 - Prestação de serviços da pista de acessibilidade ao bairro Novo Horizonte a ser executada ao longo da saída do município de Santo Antônio do Gramma (perímetro urbano) até o portal da cidade.	Unidade	1,0000	137.946,6700	137.946,6700

VALOR TOTAL DA ORDEN DE FORNECIMENTO **137.946,67**

Valor R\$ 137.946,67 (Cento e Trinta e Sete Mil e Novecentos e Quarenta e Seis Reais e Sessenta e Sete Centavos)

As informações a seguir são referentes aos locais de entrega, os locais de origem dos pedidos, os números dos pedidos e quantidade de cada material especificado a ser entregue no local de entrega.

LOCAL DE ENTREGA

LOCAL DO PEDIDO A SER ATENDIDO NO LOCAL DE ENTREGA	NÚMERO DO PEDIDO
01 - Cimvalpi	070116/2024

OBSERVAÇÃO : CTP 0191 2024 - IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE ACESSIBILIDADE - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA
Favor Informar nas Notas Fiscais o Número do Processo de Compras, Ordem de Serviço / Compras e a Ordem de Fornecimento.

Ponte Nova-MG, 19 de Julho de 2024

Verônica Aparecida de Carvalho Lima
Chefe do Departamento de Compras
CIMVALPI

Básico 00001



Informações do Documento

ID do Documento: **8F3.2EE** - Tipo de Documento: **ORDEM DE FORNECIMENTO DIGITALIZADO.**

Juntado por **JÚLIO HENRIQUE DO CARMO FREITAS** CPF: 156.17*. **6-*3 , em **26/08/2024 - 09:10:55**

Código de Autenticidade deste Documento: 09X7.7E10.8556.855X.2747

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:

<https://zeropapel.cimvalpi.mg.gov.br/verdocumento>



 Município de Ponte Nova - MG Secretaria Municipal de Fazenda Rua Avenida Caetano Marinho, Centro, 306 - 35430000 - Ponte Nova - MG	NÚMERO DA NOTA FISCAL 2024/10 
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e	

Dados da NFS-e

Natureza da Operação: Tributação fora do município Nº RPS:	Código de Autenticidade: 66c78b2e Nº NFS-e: 2024/10	Data de Emissão: 22/08/2024 16:02:06 Data Emissão RPS:
---	--	---

Dados do Prestador

Razão Social: PONTAL ENGENHARIA LTDA
Nome Fantasia: PONTAL ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 05.527.293/0001-83 Inscrição Estadual: Inscrição Municipal: 78010886
Endereço: Avenida Doutor Otávio Soares, 266, , Palmeiras, Cep:35430229, PONTE NOVA - MG
Telefone: (31) 3881-2824 E-mail: pontal@pontal.eng.br
Incentivador Cultural: Não Simples Nacional: Não optante Regime Especial: Nenhum

Dados do Tomador

Razão Social: CIMVALPI - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA - 2. PONTO
CNPJ: 19.738.706/0001-83 Insc. Estadual: Insc. Municipal:
Endereço: R. JAIME PEREIRA, 127, PROGRESSO - CEP 35.430-186 - PONTE NOVA - MG Tel: (31) 9847-21333
E-mail:

Discriminação dos Serviços

CTP 0191 2024 - IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE ACESSIBILIDADE - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - BM 01

Processo de Compras 070018/2024, Ordem de Serviço 000482/2024, Empenho 00856/2024 e a Ordem de Fornecimento 00001/2024.

CTP 0191 2024 - IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE ACESSIBILIDADE - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - BM 01

Observações

- PARA FINS DE RETENÇÃO A SEGURIDADE SOCIAL:
PERCENTUAL DE MÃO DE OBRA 35% - R\$ 48.281,33
PERCENTUAL DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS FORNECIDOS 65% - R\$ 89.665,33.
-EMPRESA COM MÃO DE OBRA DESONERADA- ALÍQUOTA RETENÇÃO SEGURIDADE SOCIAL SOBRE O VALOR BRUTO DA NF:
3,5%. APROPRIAÇÃO E RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL): CNO 90.020.56642/77
-ALÍQUOTA ISSQN : 3,00% .

Código/Serviço - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

Código CNAE	ISSQN Retido Sim	Local Prestação dos Serviços 3160108 - SANTO ANTONIO DO GRAMA - MG	Local de Incidência ISSQN 3160108 - SANTO ANTONIO DO GRAMA - MG
-------------	---------------------	---	--

Retenções Federais

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 4.828,13	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	OUTRAS R\$ 0,00
-----------------	--------------------	----------------------	----------------	------------------	--------------------

Valores da NFS-e

Valor Total dos Serviços R\$ 137.946,66	Deduções R\$ 89.665,33	Desconto Incondicionado	Desconto Condicionado R\$ 0,00	Base de Calculo R\$ 48.281,33
--	---------------------------	-------------------------	-----------------------------------	----------------------------------



Alíquota 3.00	Valor do ISSQN R\$ 1.448,44	Valor Total R\$ 137.946,66	Valor Líquido R\$ 131.670,09
------------------	--------------------------------	-------------------------------	---------------------------------

Recebemos de PONTAL ENGENHARIA LTDA os serviços discriminados na nota fiscal eletrônica indicada ao lado.		NFS-e 2024/10
Data de recebimento	Assinatura e Documento do recebedor	



Informações do Documento

ID do Documento: **8F3.6EB** - Tipo de Documento: **NF - NOTA FISCAL**

Juntado por **JÚLIO HENRIQUE DO CARMO FREITAS** CPF: 156.17*. **6-*3 , em **26/08/2024 - 09:22:19**

Código de Autenticidade deste Documento: 09E0.7622.818R.1129.5725

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:

<https://zeropapel.cimvalpi.mg.gov.br/verdocumento>



	CIMVALPI - Consórcio Intermunicipal Multissetorial do Vale do Piranga Estado de Minas Gerais CONFORMIDADE DE LIQUIDAÇÃO	CONFORMIDADE LIQUIDAÇÃO 000001/2024		
Processo de Compra 070018/2024	Ordem de Serviço / Compra 000482/2024	Número do Empenho 000856/2024	Ficha Orçamentária 00214	Ordem de Fornecimento 000001/2024
DADOS DA ENTIDADE / ORGÃO Endereço: Rua Jaime Pereira, 127 - Progresso Ponte Nova, Minas Gerais, Brasil- C.E.P : 35430-000 C.N.P.J.: 19.738.706/0001-83 Inscrição Estadual Telefone: (31)38813273 Fax: (31)38813273				
Setor Contabil CIMVALPI				
Condição de Pagamento: Pagamento Parcelado Prazo de Entrega: Durante a Vigência do Contrato Garantia: Material Não Possui Garantia Assistência Técnica: Pelo Próprio Fornecedor ou Por Concessionária				
Fornecedor: 001484 - PONTAL ENGENHARIA LTDA Endereço: Avenida Doutor Otávio Soares, 266 - Palmeiras Ponte Nova, Minas Gerais, Brasil - C.E.P : 35.430-000 CNPJ: 05.527.293/0001-83 Inscrição Estadual: Telefone: Fax: Email: Conta p/ Pagamento.....: Banco:				
VALOR DA CONFORMIDADE DE LIQUIDAÇÃO				137.946,66
Valor: R\$ 137.946,66 (Cento e Trinta e Sete Mil e Novecentos e Quarenta e Seis Reais e Sessenta e Seis Centavos)				

Ponte Nova-MG, 26 de Agosto de 2024



Informações do Documento

ID do Documento: **8F3.DFA** - Tipo de Documento: **CONFORMIDADE DE LIQUIDAÇÃO.**

Juntado por **JÚLIO HENRIQUE DO CARMO FREITAS** CPF: 156.17*. **6-*3 , em **26/08/2024 - 09:33:24**

Código de Autenticidade deste Documento: 0936.2A33.124W.R47A.3860

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:

<https://zeropapel.cimvalpi.mg.gov.br/verdocumento>



MEMORANDO

Nº 4.199/2024

PONTE NOVA/MG, 22 de agosto de 2024.

Assunto: Taxa de remuneração de gestão referente às liquidações do contrato de programa 191/2024

Referência: Medições – Pavimentação – Santo Antônio do Grama

Referência	Valor BDI	Taxa	Taxa de remuneração
Medição 01- 19/08/2024 - Pavimentação - Implantação de Pista de Acessibilidade - Santo Antônio do Grama	R\$ 137.946,67	5,50	R\$ 7.587,07
TOTAL			R\$ 7.587,07

Ordens de serviço:

- 000482/2024 - Nº do empenho 000856/2024 – ordem de fornecimento: 000001/2024

Valor da taxa de remuneração de gestão: R\$ 7.587,07

Atenciosamente,

Yuri Andrade Costa Lins
Engenheiro Civil – CREA 233590/D
Fiscal do Contrato

Assinatura do Documento



Documento Assinado Eletronicamente por **YURI ANDRADE COSTA LINS**, CPF: 084.94*.**6-*2 em **22/08/2024 16:48:23**, Cód. Autenticidade da Assinatura: **1672.5948.7236.U03X.6643**, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Informações do Documento

ID do Documento: **8E0.06C** - Tipo de Documento: **MEMORANDO - Nº 4.199/2024**

Elaborado por **GILBERTO ARAUJO GOMIDES**, CPF: 069.58*.**6-*7, em **22/08/2024 13:48:36**, contendo 98 palavras.

Código de Autenticidade deste Documento: 13U8.7948.8362.H762.2720

A autenticidade do documento pode ser conferida no site: <https://zeropapel.cimvalpi.mg.gov.br/verdocumento>



 CIMVALPI - Consórcio Intermunicipal Multissetorial do Vale do Piranga ESTADO DE MINAS GERAIS		NOTA DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
		Exercício 2024	Fonte 1.869.000.0000	Número 06153
PROCESSO				Requisição de Compra Nº: EM:
Convênio.....: 00447 - ST. ANT. DO GRAMA - 191/2024 IMPLAN				Vencimento:
Centro de Custo.....: 00095 - TAXA DE SERVIÇOS				
NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA-SE QUE SEJA EXECUTADA, NESTE EXERCÍCIO, A DESPESA A SEGUIR ESPECIFICADA.				
ORDEM DE PAGAMENTO DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Taxa administrativa				
Favorecido: 000029 - CIMVALPI - Consórcio Intermunicipal Multissetorial do Vale do Piranga Endereço: Rua Jaime Pereira , 127 , 35.430-000 Cidade: Ponte Nova - MG Conta Bancária:				Telefone: (31) 3881-3273 CNPJ / CPF 19.738.706/0001-83
Especificação da Despesa	VALOR REFERE-SE A TAXA ADMINISTRATIVA. BM 01 - PAVIMENTAÇÃO - IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE ACESSIBILIDADE. CONFORME MEMORANDO 4.199/2024 ID 8E0.06C.			
Valor: R\$ 7.587,07 (Sete Mil e Quinhentos e Oitenta e Sete Reais e Sete Centavos)				
Data: 27 / 08 / 2024		Ordenador da Despesa: AMON COSMO GURGEL MOREIRA		
DEMONSTRAÇÃO				
CONTADOR	Detalhamento dos Descontos:		Despesa Bruta: 7.587,07	
TAYNARA PINTO TOMAZ CRC MG122692/O-5			Descontos: 0,00	
			Despesa Líquida: 7.587,07	
LIQUIDAÇÃO	ORDEM DE PAGAMENTO		CONTROLE INTERNO	
O MATERIAL OU SERVIÇO FOI ENTREGUE CONFORME SOLICITADO. / /	FACE À LIQUIDAÇÃO PROCESSADA DETERMINO O SEU PAGAMENTO. / /		EXAMINAMOS O PERCURSO DA DESPESA, EM CONFORMIDADE COM AS DISPOSIÇÕES LEGAIS QUE DISCIPLINAM O SEU PROCESSAMENTO.	
ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR YURI ANDRADE COSTA LINS	DIRETOR ADMINISTRATIVO JULIO CORREA GUIMARAES		ENGENHEIRO DE CONTROLE ANDRE LUIZ DE CARVALHO	
RECIBO				
Recebi o valor acima descrito referente a despesa com materiais e / ou serviços acima especificado, para a qual dou quitação, para um só efeito.			Documento: (Tipo / Número)	
Data: / /			Banco: _____	
Nome _____			Cheque: _____	
Assinatura _____			Conta: _____	
			Recursos: _____	





CIMVALPI
CONSORCIO INTERMUNICIPAL
MULTISETORIAL DO VALE DO PIRANGA

Assinaturas do Documento



Documento Assinado Eletronicamente por **JÚLIO CORREA GUIMARÃES -**
ORDENADOR DE PAGAMENTO, CPF: 012.04*. **6-*0 em **29/08/2024 09:55:54**, Cód.
Autenticidade da Assinatura: 0931.7255.0547.V00Z.6741, Com fundamento na Lei Nº
14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Documento Assinado Eletronicamente por **AMON COSMO GURGEL MOREIRA -**
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO, EXECUTIVO E OPERACIONAL, CPF: 112.15*. **6-
*0 em **29/08/2024 08:58:25**, Cód. Autenticidade da Assinatura:
0832.1U58.525A.U00X.4046, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de
2020.



Documento Assinado Eletronicamente por **ANDRÉ LUIZ DE CARVALHO**, CPF:
100.41*. **6-*4 em **27/08/2024 15:32:42**, Cód. Autenticidade da Assinatura:
15E3.0R32.1423.778H.4743, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de
2020.



Documento Assinado Eletronicamente por **TAYNARA PINTO TOMAZ - CONTADOR**,
CPF: 110.27*. **6-*9 em **27/08/2024 15:04:36**, Cód. Autenticidade da Assinatura:
1528.4404.3369.E266.5232, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de
2020.



Documento Assinado Eletronicamente por **YURI ANDRADE COSTA LINS**, CPF:
084.94*. **6-*2 em **27/08/2024 11:58:49**, Cód. Autenticidade da Assinatura:
1162.2258.3492.4314.5187, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de
2020.



Informações do Documento

ID do Documento: **906.24E** - Tipo de Documento: **EXTRA ORÇAMENTO.**

Elaborado por **RONALDO ADRIANO DA SILVEIRA RIBEIRO**, CPF: 992.49*. **6-*4 , em **27/08/2024 -**
08:58:13

Código de Autenticidade deste Documento: 08H8.0258.713H.8583.4336

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
<https://zeropapel.cimvalpi.mg.gov.br/verdocumento>



 CIMVALPI - Consórcio Intermunicipal Multissetorial do Vale do Piranga ESTADO DE MINAS GERAIS		SUBEMPENHO	
Exercício 2024		Ficha 00214	Sub-Empenho / Tipo 001/00856 / Estimativo
Convênio.....: 00447 - ST. ANT. DO GRAMA - 191/2024 IMPLAN			Emissão: 09 / 07 / 2024
Centro de Custo.....: 00111 - OBRAS E INSTALAÇÕES			Vencimento:
LICITAÇÃO			
Modalidade : Dispensa Número: 201 Data: 09 / 07 / 2024			
Nº Processo de Compra : 70018 Data : 09 / 07 / 2024		Ordem de Serviço : 482/2024	Contrato : 205/2024
Favorecido: 001484 - PONTAL ENGENHARIA LTDA			Telefone:
Endereço: Avenida Dr Otavio Soares , 266 , 35.430-000			CNPJ / CPF : 05.527.293/0001-83
Cidade: Ponte Nova - MG			
Conta Bancária:			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA E FONTE DE RECURSOS			
Órgão: 01 CIMVALPI - Consórcio Interm. Multisset. do Vale do Piranga			
Unidade: 01 CIMVALPI - Consórcio Interm. Multisset. do Vale do Piranga			
Subunidade: 07 Serviços e Obras Cíveis de Engenharia			
Função: 15 Urbanismo			
Subfunção: 451 Infra-Estrutura Urbana			
Programa: 0001 Apoio a Administração Pública			
Projeto/Atividade: 1.015 Obras e serviços auxiliares e/ou complementares da construção civil			
Natureza: 4.4.90.51.01 Obras e Instalações de Domínio Público			
Fonte de Recurso: 1.710.010.0000 Transferência Especial do Estado - Acordo Judicial de Reparação dos Impactos Socioeconômicos e Ambientais do Rompimento de Barragem em Brumadinho			
Especificação da Despesa	VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A EXECUÇÃO DO CTP 0191/2024 SANTO ANTÔNIO DO GRAMA IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE ACESSIBILIDADE. BM 01 - IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE ACESSIBILIDADE - CTP 191/2024 SANTO ANTÔNIO DO GRAMA.		
Valor	R\$ 137.946,66 (Cento e Trinta e Sete Mil e Novecentos e Quarenta e Seis Reais e Sessenta e Seis Centavos)		
DEMONSTRAÇÃO DO SALDO DA DOTAÇÃO			
Descontos: Imposto de Renda CTP 1.655,36 Inss 4.828,13 Iss 3.448,67		Saldo Anterior: 776.901,38 Despesa Empenhada...: 137.946,66 Saldo Disponível.....: 638.954,72	
Despesa Bruta.: 137.946,66		Descontos.: 9.932,16	
		Despesa Líquida.....: 128.014,50	
ORDENADOR DA DESPESA		CONTADOR	
Nos termos da legislação vigente e no uso competente das minhas atribuições de Ordenador da Despesa determina-se que seja processada a despesa acima especificada AMON COSMO GURGEL MOREIRA		TAYNARA PINTO TOMAZ MG122692/O-5	
LIQUIDAÇÃO	ORDEM DE PAGAMENTO	CONTROLE INTERNO	
O material ou serviço foi entregue conforme solicitado. Data: 27 / 08 / 2024 YURI ANDRADE COSTA LINS ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR	Face à liquidação processada determino o seu pagamento. Data: / / JULIO CORREA GUIMARAES DIRETOR ADMINISTRATIVO	Examinamos o percurso da despesa, em conformidade com as disposições legais que disciplinam o seu processamento. ANDRE LUIZ DE CARVALHO ENGENHEIRO DE CONTROLE	
RECIBO			
Recebi o valor acima descrito referente a despesa com materiais e / ou serviços acima especificado, para a qual dou quitação, para um só efeito. Data: / / Nome Assinatura		Documento de Identificação: Banco: Documento: Conta: Recursos:	





Assinaturas do Documento



Documento Assinado Eletronicamente por **JÚLIO CORREA GUIMARÃES -**
ORDENADOR DE PAGAMENTO, CPF: 012.04*. **6-*0 em **29/08/2024 09:55:54**, Cód.
Autenticidade da Assinatura: 09H8.2855.6543.324W.2485, Com fundamento na Lei Nº
14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Documento Assinado Eletronicamente por **AMON COSMO GURGEL MOREIRA -**
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO, EXECUTIVO E OPERACIONAL, CPF: 112.15*. **6-
*0 em **29/08/2024 08:58:25**, Cód. Autenticidade da Assinatura:
0832.2V58.025A.886A.5315, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de
2020.



Documento Assinado Eletronicamente por **ANDRÉ LUIZ DE CARVALHO**, CPF:
100.41*. **6-*4 em **27/08/2024 15:32:42**, Cód. Autenticidade da Assinatura:
15H0.6H32.042R.A03H.1456, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de
2020.



Documento Assinado Eletronicamente por **TAYNARA PINTO TOMAZ - CONTADOR**,
CPF: 110.27*. **6-*9 em **27/08/2024 15:04:36**, Cód. Autenticidade da Assinatura:
15E2.8R04.336H.6714.7530, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de
2020.



Documento Assinado Eletronicamente por **YURI ANDRADE COSTA LINS**, CPF:
084.94*. **6-*2 em **27/08/2024 11:58:15**, Cód. Autenticidade da Assinatura:
11U1.7R58.8156.X33U.8321, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de
2020.



Informações do Documento

ID do Documento: **906.2BE** - Tipo de Documento: **DL - DOCUMENTO DE LIQUIDAÇÃO**.

Elaborado por **RONALDO ADRIANO DA SILVEIRA RIBEIRO**, CPF: 992.49*. **6-*4 , em **27/08/2024 -**
08:58:14

Código de Autenticidade deste Documento: 08V3.4858.2137.U64E.5616

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
<https://zeropapel.cimvalpi.mg.gov.br/verdocumento>



 CIMVALPI - Consórcio Intermunicipal Multissetorial do Vale do Piranga ESTADO DE MINAS GERAIS		NOTA DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
Exercício 2024		Fonte 1.869.000.0000		Número 06154
PROCESSO				Requisição de Compra Nº: EM:
Convênio.....: 00447 - ST. ANT. DO GRAMA - 191/2024 IMPLAN				Vencimento:
Centro de Custo.....: 00113 - IMPOSTO DE RENDA				
NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA-SE QUE SEJA EXECUTADA, NESTE EXERCÍCIO, A DESPESA A SEGUIR ESPECIFICADA.				
ORDEM DE PAGAMENTO DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Imposto de Renda CTP				
Favorecido: 000104 - Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Grama Endereço: Rua Padre João Coutinho , 121 , 35.388-000 Cidade: Santo Antônio do Grama - MG Conta Bancária:				Telefone: (31) 3872-5005 CNPJ / CPF 18.836.973/0001-20
Especificação da Despesa	VALOR REFERE-SE AO REPASSE DA RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA DA NOTA FISCAL 011 DA PONTAL ENGENHARIA LTDA.			
Valor: R\$ 1.655,36 (Um Mil e Seiscentos e Cinquenta e Cinco Reais e Trinta e Seis Centavos)				
Data: 27 / 08 / 2024		Ordenador da Despesa: JOÃO PAULO FERREIRA		
DEMONSTRAÇÃO				
CONTADOR		Detalhamento dos Descontos:		
TAYNARA PINTO TOMAZ CRC MG122692/O-5		Despesa Bruta: 1.655,36		
		Descontos: 0,00		
		Despesa Líquida: 1.655,36		
LIQUIDAÇÃO		ORDEM DE PAGAMENTO		CONTROLE INTERNO
O MATERIAL OU SERVIÇO FOI ENTREGUE CONFORME SOLICITADO. / /		FACE À LIQUIDAÇÃO PROCESSADA DETERMINO O SEU PAGAMENTO. / /		EXAMINAMOS O PERCURSO DA DESPESA, EM CONFORMIDADE COM AS DISPOSIÇÕES LEGAIS QUE DISCIPLINAM O SEU PROCESSAMENTO.
GERENTE ADMINISTRATIVO JOÃO PAULO FERREIRA		DIRETOR ADMINISTRATIVO JULIO CORREA GUIMARAES		DIRETORA DE CONFORMIDADE E GOVERNA BRUNA DA SILVA LOPES
RECIBO				
Recebi o valor acima descrito referente a despesa com materiais e / ou serviços acima especificado, para a qual dou quitação, para um só efeito.			Documento: (Tipo / Número)	
Data: / /			Banco: _____	
Nome _____			Cheque: _____	
Assinatura _____			Conta: _____	
			Recursos: _____	





CIMVALPI
CONSORCIO INTERMUNICIPAL
MULTISETORIAL DO VALE DO PIRANGA

Assinaturas do Documento



Documento Assinado Eletronicamente por **BRUNA DA SILVA LOPES - DIRETOR DE CONFORMIDADE E GOVERNANÇA**, CPF: 135.78*. **6-*1 em 29/08/2024 10:06:25, Cód. Autenticidade da Assinatura: 10H0.5306.025V.R47Z.7574, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Documento Assinado Eletronicamente por **JÚLIO CORREA GUIMARÃES - ORDENADOR DE PAGAMENTO**, CPF: 012.04*. **6-*0 em 29/08/2024 09:55:54, Cód. Autenticidade da Assinatura: 09E6.3855.6542.R67E.6346, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Documento Assinado Eletronicamente por **TAYNARA PINTO TOMAZ - CONTADOR**, CPF: 110.27*. **6-*9 em 27/08/2024 15:04:36, Cód. Autenticidade da Assinatura: 1584.3304.2364.2623.3667, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Documento Assinado Eletronicamente por **JOAO PAULO FERREIRA - GERENTE ADMINISTRATIVO**, CPF: 052.42*. **6-*3 em 27/08/2024 09:02:23, Cód. Autenticidade da Assinatura: 0932.3H02.0237.783H.7547, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Informações do Documento

ID do Documento: **906.38F** - Tipo de Documento: **EXTRA ORÇAMENTO**.

Elaborado por **RONALDO ADRIANO DA SILVEIRA RIBEIRO**, CPF: 992.49*. **6-*4 , em 27/08/2024 - 08:59:51

Código de Autenticidade deste Documento: 08U2.7259.551W.Z58U.6274

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
<https://zeropapel.cimvalpi.mg.gov.br/verdocumento>



 CIMVALPI - Consórcio Intermunicipal Multissetorial do Vale do Piranga ESTADO DE MINAS GERAIS		NOTA DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
		Exercício 2024	Fonte 1.869.000.0000	Número 06156
PROCESSO				Requisição de Compra Nº: EM:
Convênio.....: 00447 - ST. ANT. DO GRAMA - 191/2024 IMPLAN				Vencimento:
Centro de Custo.....: 00019 - ISS				
NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA-SE QUE SEJA EXECUTADA, NESTE EXERCÍCIO, A DESPESA A SEGUIR ESPECIFICADA.				
ORDEM DE PAGAMENTO DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Iss				
Favorecido: 000104 - Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Grama Endereço: Rua Padre João Coutinho , 121 , 35.388-000 Cidade: Santo Antônio do Grama - MG Conta Bancária:				Telefone: (31) 3872-5005 CNPJ / CPF 18.836.973/0001-20
Especificação da Despesa	VALOR REFERE-SE AO REPASSE DA RETENÇÃO DE ISS DA NOTA FISCAL 011 DA PONTAL ENGENHARIA LTDA.			
Valor: R\$ 3.448,67 (Tres Mil e Quatrocentos e Quarenta e Oito Reais e Sessenta e Sete Centavos)				
Data: 27 / 08 / 2024		Ordenador da Despesa: JOÃO PAULO FERREIRA		
DEMONSTRAÇÃO				
CONTADOR		Detalhamento dos Descontos:		
TAYNARA PINTO TOMAZ CRC MG122692/O-5		Despesa Bruta		3.448,67
		Descontos		0,00
		Despesa Líquida		3.448,67
LIQUIDAÇÃO		ORDEM DE PAGAMENTO		CONTROLE INTERNO
O MATERIAL OU SERVIÇO FOI ENTREGUE CONFORME SOLICITADO. / /		FACE À LIQUIDAÇÃO PROCESSADA DETERMINO O SEU PAGAMENTO. / /		EXAMINAMOS O PERCURSO DA DESPESA, EM CONFORMIDADE COM AS DISPOSIÇÕES LEGAIS QUE DISCIPLINAM O SEU PROCESSAMENTO.
GERENTE ADMINISTRATIVO JOÃO PAULO FERREIRA		DIRETOR ADMINISTRATIVO JULIO CORREA GUIMARAES		DIRETORA DE CONFORMIDADE E GOVERNA BRUNA DA SILVA LOPES
RECIBO				
Recebi o valor acima descrito referente a despesa com materiais e / ou serviços acima especificado, para a qual dou quitação, para um só efeito.			Documento: (Tipo / Número)	
Data: / /			Banco	
Nome			Cheque	
Assinatura			Conta	
			Recursos	





CIMVALPI

CONSORCIO INTERMUNICIPAL
MULTISETORIAL DO VALE DO PIRANGA

Assinaturas do Documento



Documento Assinado Eletronicamente por **BRUNA DA SILVA LOPES - DIRETOR DE CONFORMIDADE E GOVERNANÇA**, CPF: 135.78*. **6-*1 em 29/08/2024 10:06:25, Cód. Autenticidade da Assinatura: 10A6.4206.125Z.A672.1814, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Documento Assinado Eletronicamente por **JÚLIO CORREA GUIMARÃES - ORDENADOR DE PAGAMENTO**, CPF: 012.04*. **6-*0 em 29/08/2024 09:55:55, Cód. Autenticidade da Assinatura: 09Z2.1655.554K.2106.6470, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Documento Assinado Eletronicamente por **TAYNARA PINTO TOMAZ - CONTADOR**, CPF: 110.27*. **6-*9 em 27/08/2024 15:04:36, Cód. Autenticidade da Assinatura: 1576.6A04.036X.Z612.1305, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Documento Assinado Eletronicamente por **JOAO PAULO FERREIRA - GERENTE ADMINISTRATIVO**, CPF: 052.42*. **6-*3 em 27/08/2024 09:02:23, Cód. Autenticidade da Assinatura: 09X5.8302.323X.V24V.7167, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Informações do Documento

ID do Documento: **906.3FD** - Tipo de Documento: **EXTRA ORÇAMENTO**.

Elaborado por **RONALDO ADRIANO DA SILVEIRA RIBEIRO**, CPF: 992.49*. **6-*4 , em 27/08/2024 - 08:59:52

Código de Autenticidade deste Documento: 08V5.3V59.2511.306W.1305

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:

<https://zeropapel.cimvalpi.mg.gov.br/verdocumento>



 CIMVALPI - Consórcio Intermunicipal Multissetorial do Vale do Piranga ESTADO DE MINAS GERAIS		NOTA DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
Exercício 2024		Fonte 1.869.000.0000	Número 06157	
PROCESSO			Requisição de Compra Nº: EM:	
Convênio.....: 00447 - ST. ANT. DO GRAMA - 191/2024 IMPLAN			Vencimento:	
Centro de Custo.....: 00006 - INSS				
NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA-SE QUE SEJA EXECUTADA, NESTE EXERCÍCIO, A DESPESA A SEGUIR ESPECIFICADA.				
ORDEM DE PAGAMENTO DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Inss				
Favorecido: 000005 - INSS			Telefone:	
Endereço: Rua ST Saus Quadra 02 Bloco O , 6 - Andar , 70.070-946			CNPJ / CPF 29.979.036/0001-40	
Cidade: Brasília - DF				
Conta Bancária:				
Especificação da Despesa	VALOR REFERE-SE AO REPASSE DA RETENÇÃO DE INSS DA NOTA FISCAL 011 DA PONTAL ENGENHARIA LTDA.			
Valor: R\$ 4.828,13 (Quatro Mil e Oitocentos e Vinte e Oito Reais e Treze Centavos)				
Data: 27 / 08 / 2024		Ordenador da Despesa: JOÃO PAULO FERREIRA		
DEMONSTRAÇÃO				
CONTADOR		Detalhamento dos Descontos:		Despesa Bruta: 4.828,13
TAYNARA PINTO TOMAZ CRC MG122692/O-5				Descontos: 0,00
				Despesa Líquida: 4.828,13
LIQUIDAÇÃO		ORDEM DE PAGAMENTO		CONTROLE INTERNO
O MATERIAL OU SERVIÇO FOI ENTREGUE CONFORME SOLICITADO. / /		FACE À LIQUIDAÇÃO PROCESSADA DETERMINO O SEU PAGAMENTO. / /		EXAMINAMOS O PERCURSO DA DESPESA, EM CONFORMIDADE COM AS DISPOSIÇÕES LEGAIS QUE DISCIPLINAM O SEU PROCESSAMENTO.
GERENTE ADMINISTRATIVO JOÃO PAULO FERREIRA		DIRETOR ADMINISTRATIVO JULIO CORREA GUIMARAES		DIRETORA DE CONFORMIDADE E GOVERNA BRUNA DA SILVA LOPES
RECIBO				
Recebi o valor acima descrito referente a despesa com materiais e / ou serviços acima especificado, para a qual dou quitação, para um só efeito.			Documento: (Tipo / Número)	
Data: / /			Banco: _____	
Nome _____			Cheque: _____	
Assinatura _____			Conta: _____	
			Recursos: _____	





CIMVALPI
CONSORCIO INTERMUNICIPAL
MULTISETORIAL DO VALE DO PIRANGA

Assinaturas do Documento



Documento Assinado Eletronicamente por **BRUNA DA SILVA LOPES - DIRETOR DE CONFORMIDADE E GOVERNANÇA**, CPF: 135.78*. **6- *1 em 29/08/2024 10:06:25, Cód. Autenticidade da Assinatura: 10A6.6906.6258.H13R.8202, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Documento Assinado Eletronicamente por **JÚLIO CORREA GUIMARÃES - ORDENADOR DE PAGAMENTO**, CPF: 012.04*. **6- *0 em 29/08/2024 09:55:55, Cód. Autenticidade da Assinatura: 0930.8455.7544.8318.8446, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Documento Assinado Eletronicamente por **TAYNARA PINTO TOMAZ - CONTADOR**, CPF: 110.27*. **6- *9 em 27/08/2024 15:04:36, Cód. Autenticidade da Assinatura: 15W5.4R04.336E.937V.0242, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Documento Assinado Eletronicamente por **JOAO PAULO FERREIRA - GERENTE ADMINISTRATIVO**, CPF: 052.42*. **6- *3 em 27/08/2024 09:02:23, Cód. Autenticidade da Assinatura: 0964.4U02.123Z.A667.0088, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Informações do Documento

ID do Documento: **906.459** - Tipo de Documento: **EXTRA ORÇAMENTO**.

Elaborado por **RONALDO ADRIANO DA SILVEIRA RIBEIRO**, CPF: 992.49*. **6- *4 , em 27/08/2024 - 08:59:53

Código de Autenticidade deste Documento: 0876.6X59.251K.306X.3545

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
<https://zeropapel.cimvalpi.mg.gov.br/verdocumento>



Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)

Num. Pendência: 717022
Transação: Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)
Cooperativa: 3164
Conta Corrente: 823708

Dados da Transação

Tipo da Transferência:	Titularidade/CPF diferente
Cooperativa de Débito:	3164
Conta de Débito:	82.370-8
Nome do Favorecido:	TAXA CIVIL
CPF/CNPJ do Favorecido:	19738706000183
Banco do Favorecido:	104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Agência do Favorecido:	146
Conta do Favorecido:	71.291-8 \ TAXA CIVIL
Modalidade da Conta:	Conta Corrente
Finalidade:	PAG.IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS
Valor da Transferência:	R\$ 7.587,07
Data da Transferência:	29/08/2024
Observação:	

Transação efetuada com sucesso por: VIVIANE APARECIDA SALGADO

Assinado por: SAMIRA GOMES PEREIRA DE FREITAS
VIVIANE APARECIDA SALGADO





CIMVALPI
CONSORCIO INTERMUNICIPAL
MULTISETORIAL DO VALE DO PIRANGA

Assinatura do Documento



Documento Assinado Eletronicamente por **VIVIANE APARECIDA SALGADO - CHEFE DO DEPARTAMENTO DE TESOUREARIA**, CPF: 064.80*. **6-*4 em 29/08/2024 11:44:12, Cód. Autenticidade da Assinatura: 1134.0X44.512H.X04A.4400, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Informações do Documento

ID do Documento: **923.2C3** - Tipo de Documento: **COMPROVANTE DE PAGAMENTO**.

Elaborado por **VIVIANE APARECIDA SALGADO**, CPF: 064.80*. **6-*4 , em 29/08/2024 - 11:44:12

Código de Autenticidade deste Documento: 1145.5944.312X.7636.6512

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
<https://zeropapel.cimvalpi.mg.gov.br/verdocumento>



29/08/2024

Detalhar Transação Pendente

11:40:38

Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)

Num. Pendência: 717023
Transação: Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)
Cooperativa: 3164
Conta Corrente: 823708

Dados da Transação

Tipo da Transferência: Titularidade/CPF diferente
Cooperativa de Débito: 3164
Conta de Débito: 82.370-8
Nome do Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO GRAMA
CPF/CNPJ do Favorecido: 18836973000120
Banco do Favorecido: 001 - BANCO DO BRASIL
Agência do Favorecido: 2538
Conta do Favorecido: 7.543-4 \ PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO GRAMA
Modalidade da Conta: Conta Corrente
Finalidade: PAG.IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS
Valor da Transferência: R\$ 1.655,36
Data da Transferência: 29/08/2024
Observação:

Transação efetuada com sucesso por: VIVIANE APARECIDA SALGADO

Assinado por: SAMIRA GOMES PEREIRA DE FREITAS
VIVIANE APARECIDA SALGADO





CIMVALPI

CONSORCIO INTERMUNICIPAL
MULTISETORIAL DO VALE DO PIRANGA

Assinatura do Documento



Documento Assinado Eletronicamente por **VIVIANE APARECIDA SALGADO - CHEFE DO DEPARTAMENTO DE TESOUREARIA**, CPF: 064.80*. **6-*4 em 29/08/2024 11:44:13, Cód. Autenticidade da Assinatura: 1194.2744.6122.X84E.1844, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Informações do Documento

ID do Documento: **923.306** - Tipo de Documento: **COMPROVANTE DE PAGAMENTO**.

Elaborado por **VIVIANE APARECIDA SALGADO**, CPF: 064.80*. **6-*4 , em 29/08/2024 - 11:44:13

Código de Autenticidade deste Documento: 11A5.4144.112Z.W879.7742

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
<https://zeropapel.cimvalpi.mg.gov.br/verdocumento>



SICCOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

29/08/2024

Detalhar Transação Pendente

11:39:04

Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)

Num. Pendência: 717035
Transação: Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)
Cooperativa: 3164
Conta Corrente: 823708

Dados da Transação

Tipo da Transferência: Titularidade/CPF diferente
Cooperativa de Débito: 3164
Conta de Débito: 82.370-8
Nome do Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO GRAMA
CPF/CNPJ do Favorecido: 18836973000120
Banco do Favorecido: 001 - BANCO DO BRASIL
Agência do Favorecido: 2538
Conta do Favorecido: 7.543-4 \ PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO GRAMA
Modalidade da Conta: Conta Corrente
Finalidade: PAG.IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS
Valor da Transferência: R\$ 3.448,67
Data da Transferência: 29/08/2024
Observação:

Transação efetuada com sucesso por: VIVIANE APARECIDA SALGADO

Assinado por: SAMIRA GOMES PEREIRA DE FREITAS
VIVIANE APARECIDA SALGADO





CIMVALPI

CONSORCIO INTERMUNICIPAL
MULTISETORIAL DO VALE DO PIRANGA

Assinatura do Documento



Documento Assinado Eletronicamente por **VIVIANE APARECIDA SALGADO - CHEFE DO DEPARTAMENTO DE TESOUREARIA**, CPF: 064.80*. **6-*4 em 29/08/2024 11:44:14, Cód. Autenticidade da Assinatura: 1167.4244.3128.A267.0767, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Informações do Documento

ID do Documento: **923.38F** - Tipo de Documento: **COMPROVANTE DE PAGAMENTO**.

Elaborado por **VIVIANE APARECIDA SALGADO**, CPF: 064.80*. **6-*4 , em 29/08/2024 - 11:44:14

Código de Autenticidade deste Documento: 1180.0E44.7128.K60H.7177

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
<https://zeropapel.cimvalpi.mg.gov.br/verdocumento>



Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)

Num. Pendência: 717036
Transação: Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)
Cooperativa: 3164
Conta Corrente: 823708

Dados da Transação

Tipo da Transferência:	Titularidade/CPF diferente
Cooperativa de Débito:	3164
Conta de Débito:	82.370-8
Nome do Favorecido:	EXPANSAO DE REDE
CPF/CNPJ do Favorecido:	19738706000183
Banco do Favorecido:	104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Agência do Favorecido:	146
Conta do Favorecido:	628-2 \ EXPANSAO DE REDE
Modalidade da Conta:	Conta Corrente
Finalidade:	PAG.IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS
Valor da Transferência:	R\$ 4.828,13
Data da Transferência:	29/08/2024
Observação:	

Transação efetuada com sucesso por: VIVIANE APARECIDA SALGADO

Assinado por: SAMIRA GOMES PEREIRA DE FREITAS
VIVIANE APARECIDA SALGADO





CIMVALPI

CONSORCIO INTERMUNICIPAL
MULTISETORIAL DO VALE DO PIRANGA

Assinatura do Documento



Documento Assinado Eletronicamente por **VIVIANE APARECIDA SALGADO - CHEFE DO DEPARTAMENTO DE TESOUREARIA**, CPF: 064.80*. **6-*4 em 29/08/2024 11:44:15, Cód. Autenticidade da Assinatura: 11Z6.6244.212W.811R.4047, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Informações do Documento

ID do Documento: **923.3D8** - Tipo de Documento: **COMPROVANTE DE PAGAMENTO**.

Elaborado por **VIVIANE APARECIDA SALGADO**, CPF: 064.80*. **6-*4 , em 29/08/2024 - 11:44:15

Código de Autenticidade deste Documento: 1114.5W44.8124.9077.0844



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
<https://zeropapel.cimvalpi.mg.gov.br/verdocumento>



Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)

Num. Pendência: 717021
Transação: Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)
Cooperativa: 3164
Conta Corrente: 823708

Dados da Transação

Tipo da Transferência:	Titularidade/CPF diferente
Cooperativa de Débito:	3164
Conta de Débito:	82.370-8
Nome do Favorecido:	PONTAL ENGENHARIA
CPF/CNPJ do Favorecido:	05527293000183
Banco do Favorecido:	748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI
Agência do Favorecido:	230
Conta do Favorecido:	14.083-4 \ PONTAL ENGENHARIA
Modalidade da Conta:	Conta Corrente
Finalidade:	PAG.IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS
Valor da Transferência:	R\$ 128.014,50
Data da Transferência:	29/08/2024
Observação:	

Transação efetuada com sucesso por: VIVIANE APARECIDA SALGADO

Assinado por: SAMIRA GOMES PEREIRA DE FREITAS
VIVIANE APARECIDA SALGADO





CIMVALPI
CONSORCIO INTERMUNICIPAL
MULTISETORIAL DO VALE DO PIRANGA

Assinatura do Documento



Documento Assinado Eletronicamente por **VIVIANE APARECIDA SALGADO - CHEFE DO DEPARTAMENTO DE TESOUREARIA**, CPF: 064.80*. **6-*4 em 29/08/2024 11:44:16, Cód. Autenticidade da Assinatura: 11W6.0W44.812V.R65W.7873, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Informações do Documento

ID do Documento: **923.436** - Tipo de Documento: **COMPROVANTE DE PAGAMENTO**.

Elaborado por **VIVIANE APARECIDA SALGADO**, CPF: 064.80*. **6-*4 , em 29/08/2024 - 11:44:16

Código de Autenticidade deste Documento: 1144.2644.212E.A03R.4383

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
<https://zeropapel.cimvalpi.mg.gov.br/verdocumento>



Pix - Pagamento

Num. Pendência: 720848
Transação: Pix - Pagamento
Cooperativa: 3164
Conta Corrente: 823708

Dados da Transação

Chave de Acesso: ui6737
Versão: 1
Cooperativa Cartão: 3164
CPF/CNPJ de efetivação: 12548752631
Canal: Sicoobnet Empresarial
Cooperativa: 3164
Valor Financeiro: 128014.50
Número do PAC: 26
Data de Processamento: 20240903
Data de Pagamento: 20240903
Valor Total: 128014.50
Conta Corrente: 823708
Id: E010603072024090312173icUVdxfYPR
Valor: 128014,50
ChavePix: d19d96f8-3fca-4f4c-81cb-425cb561a325
TipoChave: EVP

Origem

Ispb: 01060307
Agencia: 3164
Conta: 823708
Tipo Conta: CORRENTE
Cpf/Cnpj: 19738706000183
Favorecido: não
Nome: CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO

Destino

Ispb: 87733770
Agencia: 230
Conta: 146327
Tipo Conta: CORRENTE
Cpf/Cnpj: 05527293000183
Favorecido: não
Nome: PONTAL ENGENHARIA LTDA

Transação efetuada com sucesso por: VIVIANE APARECIDA SALGADO

Assinado por: SAMIRA GOMES PEREIRA DE FREITAS
VIVIANE APARECIDA SALGADO





CIMVALPI

CONSORCIO INTERMUNICIPAL
MULTISETORIAL DO VALE DO PIRANGA

Assinatura do Documento



Documento Assinado Eletronicamente por **VIVIANE APARECIDA SALGADO - CHEFE DO DEPARTAMENTO DE TESOUREARIA**, CPF: 064.80*. **6-*4 em **03/09/2024 09:59:50**, Cód. Autenticidade da Assinatura: **09U7.6759.050H.V457.4871**, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Informações do Documento

ID do Documento: **93D.404** - Tipo de Documento: **ERRATA**.

Elaborado por **VIVIANE APARECIDA SALGADO**, CPF: 064.80*. **6-*4 , em **03/09/2024 - 09:59:50**

Código de Autenticidade deste Documento: 09H2.7659.8508.R853.0071

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
<https://zeropapel.cimvalpi.mg.gov.br/verdocumento>





PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 09.0209-4.2024.15

UNIDADE ADMINISTRATIVA: PROG-LICI - PROGRAMA DE LICITAÇÕES, CONTRATAÇÕES E COMPRAS COMPARTILHADAS
PROCEDIMENTO: ADMINISTRATIVO - TIPO DE PROCESSO: PREPARATÓRIO LICITAÇÃO/CONTRATAÇÃO (FILHOTE) - EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATO DE PROGRAMAS E RATEIO
DEPARTAMENTO/PROGRAMA ATUAL: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SITUAÇÃO: ARQUIVADO - POSSUI PROCESSO FILHOTE:
OBJETO: CTP 0191 2024 - IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE ACESSIBILIDADE - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - BM 02 - NF 12
ABERTO EM: 03/10/2024 às 09:59:37

DOCUMENTOS JUNTADOS (18)

ID	TIPO DE DOCUMENTO	QTD PÁGS	JUNTADO EM
A16.9EC	TERMO DE ABERTURA	1	03/10/2024 às 09:59:37
9E0.B16	FORMULÁRIO DE MEDIÇÕES	21	25/09/2024 às 16:27:59
A1C.162	ORDEM DE FORNECIMENTO DIGITALIZADO	2	03/10/2024 às 15:17:20
A17.A2A	NF - NOTA FISCAL	3	03/10/2024 às 10:59:12
A1C.764	CONFORMIDADE DE LIQUIDAÇÃO	2	03/10/2024 às 15:31:09
A06.AD8	MEMORANDO	1	01/10/2024 às 10:16:35
A1D.527	EXTRA ORÇAMENTO	2	03/10/2024 às 16:25:11
A1D.551	DL - DOCUMENTO DE LIQUIDAÇÃO	2	03/10/2024 às 16:25:12
A1D.5FC	EXTRA ORÇAMENTO	2	03/10/2024 às 16:26:46
A1D.616	EXTRA ORÇAMENTO	2	03/10/2024 às 16:26:47
A1D.6C3	EXTRA ORÇAMENTO	2	03/10/2024 às 16:26:48
A49.B32	COMPROVANTE DE PAGAMENTO	2	09/10/2024 às 16:01:54
A49.C20	COMPROVANTE DE PAGAMENTO	2	09/10/2024 às 16:01:55
A49.C4D	COMPROVANTE DE PAGAMENTO	2	09/10/2024 às 16:01:56
A49.CE8	COMPROVANTE DE PAGAMENTO	2	09/10/2024 às 16:01:57
A49.D20	COMPROVANTE DE PAGAMENTO	2	09/10/2024 às 16:01:58
A63.2C4	COMPROVANTE DE PAGAMENTO	2	11/10/2024 às 12:03:27
A64.625	ERRATA	2	11/10/2024 às 14:10:55

PONTE NOVA - MG, 06 de novembro de 2025 às 11:34:52.

TERMO DE ABERTURA DE PROCESSO

Aos 03 dias do mês de outubro de 2024, procedemos a abertura do Processo Nº **209/2024**

Para constar, eu JÚLIO HENRIQUE DO CARMO FREITAS portador do CPF nº 156.178.896-13, lavro o presente TERMO DE ABERTURA que constará nos auto administrativos.

Assinatura do Documento



Documento Assinado Eletronicamente por **JÚLIO HENRIQUE DO CARMO FREITAS - AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO**, CPF: 156.17*.**6-*3 em **03/10/2024 09:59:37**, Cód. Autenticidade da Assinatura: 0968.4V59.437U.Z62W.6823, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Informações do Documento

ID do Documento: **A16.9EC** - Tipo de Documento: **TERMO DE ABERTURA**.

Elaborado por **JÚLIO HENRIQUE DO CARMO FREITAS** CPF: 156.17*.**6-*3, em **03/10/2024 09:59:37**, contendo 40 palavras.

Código de Autenticidade deste Documento: 09W4.7859.037E.104Z.4127

A autenticidade do documento pode ser conferida no site: <https://zeropapel.cimvalpi.mg.gov.br/verdocumento>





FORMULÁRIO DE MEDIÇÕES

RELATÓRIO PARCIAL (SITUAÇÃO: APROVADA PELO CONSÓRCIO)

Enviado por ANTONIO CARLOS MARTINS BRANDAO em 20/09/2024 - 12:05

Registro: 20/09/2024							2ª MEDIÇÃO						
Obra: CTP 0191/2024 - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE ACESSIBILIDADE							Período de 20/08/2024 a 19/09/2024						
Local: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA													
OBSERVAÇÕES													
Enviada por ANTONIO CARLOS MARTINS BRANDAO (FORNECEDOR) em 20/09/2024 às 12:05													
							QUANTIDADE MEDIDA				VALOR MEDIDO		
ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	NESTA MEDIÇÃO	ACUMULADA	VALOR PREVISTO (BDI)	NESTA MEDIÇÃO (BDI)	ACUMULADA (BDI)	SALDO (BDI)	
01	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO												
01.01	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA - para obras que exigem a utilização de grande quantidade de equipamentos e são executadas em centros urbanos ou próximos de centros urbanos. Obs.: Não se aplica aos serviços de Tapa Buracos.												
01.01.01	OBRAS ATÉ O VALOR DE R\$ 1.000.000,00 - MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA PAVIMENTAÇÃO, EXCLUSIVE PARA TAPA-BURACOS	%	0.5	R\$ 25,00	R\$ 31,62	R\$ 15,81	0.5	1	R\$ 15,81	R\$ 354,57	R\$ 998,68	R\$ -982,87	
02	INSTALAÇÕES DA OBRA												
02.05	BANHEIRO QUIMICO												
02.05.01	BANHEIRO QUIMICO 110 cm x 120 cm x 230 cm COM MANUTENÇÃO	mês	5	R\$ 628,10	R\$ 797,37	R\$ 3.986,85	1	2	R\$ 3.986,85	R\$ 797,37	R\$ 1.594,74	R\$ 2.392,11	
02.07	TAPUME / ISOLAMENTOS												
02.07.03	CERCA DE 5 FIOS DE ARAME FARPA DO E MOURÕES DE EUCALIPTO	M	200	R\$ 33,36	R\$ 42,34	R\$ 8.468,00	200	200	R\$ 8.468,00	R\$ 8.468,00	R\$ 8.468,00	R\$ 0,00	
07	OBRAS CIVIS (PONTES, PASSARELAS, CORTINAS E GABIÕES)												
07.03	EXECUÇÃO DE FORMA												
07.03.04	FORMA, ESCORAMENTO, DESFORMA E LIMPEZA - ESTRUTURA, DE COMPENSADO	m²	132	R\$ 63,34	R\$ 80,36	R\$ 10.607,52	46.08	46.08	R\$ 10.607,52	R\$ 3.702,99	R\$ 3.702,99	R\$ 6.904,53	

	RESINADO ESPESSURA >= 12MM											
07.04	ARMAÇÃO INCLUINDO CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO											
07.04.13*	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR	KG	2251.82	R\$ 11,97	R\$ 13,41	R\$ 30.196,91	691.82	691.82	R\$ 30.196,91	R\$ 9.277,31	R\$ 9.277,31	R\$ 20.919,60
07.05	FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO											
07.05.01	PREPARADO EM OBRA											
07.05.01.05	CONCRETO CONVENCIONAL B1,B2 LANÇADO EM FUNDAÇÃO, FCK >= 20 MPA, BRITA CALCÁRIA, PREPARADO EM OBRA E LANÇADO EM FUNDAÇÃO	m³	29.96	R\$ 574,52	R\$ 728,79	R\$ 21.834,55	4.46	4.46	R\$ 21.834,55	R\$ 3.250,40	R\$ 3.250,40	R\$ 18.584,15
09	URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES											
09.01	MEIO FIO PADRÃO SUDECAP											
09.01.02	MEIO FIO EM CONCRETO PRE-MOLDADO FCK>=20MPA, PADRÃO SUDECAP TIPO B, 40 X 15/12 (H X L1/L2), COMPRIMENTO 80CM	m	1980	R\$ 35,45	R\$ 45,01	R\$ 89.119,80	830	1255	R\$ 89.119,80	R\$ 37.358,30	R\$ 56.487,55	R\$ 32.632,25
15	ADMINISTRAÇÃO LOCAL											
15.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - % BASEADA ACÓRDÃO 2.622/2013 DO TCU SOBRE SOMA DOS ITENS 1 A 14	%	7.55	R\$ 329,17	R\$ 416,25	R\$ 3.142,69	6.55	13.1	R\$ 3.142,69	R\$ 4.668,04	R\$ 13.148,10	R\$ -10.005,41
16*	SERVIÇOS COMPLEMENTARES											
16.01*	LAJE PRÉ-MOLDADA INIDIRECIONAL COM ENCHIMENTO EM EPS, CAPEAMENTO DE 4CM, SOBRECARGA DE 200KG/M², ALTURA TOTAL DE 11CM E VÃO LIVRE MÁXIMO DE 3M, INCLUSIVE CONCRETO ESTRUTURAL USINADO BOMBEADO COM FCK DE 20MPA, EXCLUSIVE TELA ARMADA E CIMBRAMENTO	M²	30	R\$ 127,04	R\$ 161,28	R\$ 4.838,40	30	30	R\$ 4.838,40	R\$ 4.838,40	R\$ 4.838,40	R\$ 0,00
16.02*	CIMBRAMENTO PARA LAJE PRÉ-MOLDADA COM ESCORAMENTO METÁLICO, TIPO "A", ALTURA DE (200 ATÉ 310)CM, INCLUSIVE DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM E CARGA	M² X MES	150	R\$ 16,91	R\$ 21,47	R\$ 3.220,50	150	150	R\$ 3.220,50	R\$ 3.220,50	R\$ 3.220,50	R\$ 0,00
TOTAL:										R\$ 75.935,88	R\$ 213.882,55	

YURI ANDRADE COSTA LINS
Fiscal de Obras - CIMVALPI
CREA 233590/D
Aprovação: 25/09/2024

PEDRO MARTINO ZEFERINO
Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA
CREA 137.103/D

ANTÔNIO CARLOS MARTINS BRANDÃO
RT de Execução - PONTAL ENGENHARIA LTDA
CREA 45.957/D



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº 0030	OBRA: CTP 0191/2024 - SANTO ANTONIO DO GRAMA - IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE ACESSIBILIDADE	CONTRATO:	RESP. TÉCNICO: ANTONIO CARLOS MARTINS BRANDÃO
ENDEREÇO: TRECHO DA RODOVIA DE ACESSO A SANTO ANTONIO DO GRAMA, BAIRRO NOVO HORIZONTE.	INÍCIO: 01/07/2024	Nº CREA-MG: 45957/D	
CIDDE:	PRAZO: 31/12/2024	Nº DA ART:	
DISTRITO: SANTO ANTONIO DO GRAMA	UF:	COORDENADAS:	
DATA: 02/09/2024	SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA ☔
MANHÃ	✓		IMPRATICÁVEL ☔
TARDE	✓		
QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
1	ENCARREGADO DE OBRAS	2	PEDREIRO
6	AJUDANTE		
QTDE	EQUIPAMENTO		
2	CAVADEIRA RETA		
3	PÁ		
3	CHIBANCA		
3	ENXADA		
3	CARRINHO DE MÃO		
TAREFAS REALIZADAS			
NÚMERO DE T.R.	DESCRICAÇÃO	OBSERVAÇÕES	
1	ESCAVAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE MEIO FIO E SARJETA		
2	INSTALAÇÃO DE MEIO FIO PREMOLDADO		

REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)





OCORRÊNCIAS		
NÚMERO DE OC	TIPO DE OCORRÊNCIA	DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA
CONFERÊNCIA		
MUNICÍPIO	CONSÓRCIO (Aprovado em 04/09/2024 - 13:54)	
Obs.:	Obs.:	
ASSINATURAS		
YURI ANDRADE COSTA LINS Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 233590/D	PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA CREA 137.103/D	ANTÔNIO CARLOS MARTINS BRANDÃO RT de Execução - PONTAL ENGENHARIA LTDA CREA 45.957/D



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº 0029		OBRA: CTP 0191/2024 - SANTO ANTONÍO DO GRAMA - IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE ACESSIBILIDADE		CONTRATO:		RESP. TÉCNICO: ANTONIO CARLOS MARTINS BRANDÃO	
ENDEREÇO: TRECHO DA RODOVIA DE ACESSO A SANTO ANTONIO DO GRAMA, BAIRRO NOVO HORIZONTE.				INÍCIO: 01/07/2024		Nº CREA-MG: 45957/D	
CIDDE:				PRAZO: 31/12/2024		Nº DA ART:	
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA				UF:		COORDENADAS:	
DATA: 30/08/2024		SOL ☀		NUBLADO ☁		CHUVA ☔	
MANHÃ				✓			
TARDE		✓					
QTDE		MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO				QTDE	
1		ENCARREGADO DE OBRAS				2	
6		AJUDANTE				PEDREIRO	
QTDE		EQUIPAMENTO					
2		CAVADEIRA RETA					
1		ROLO LISO					
1		DAMPER					
3		PÁ					
3		ENXADA					
2		CARRINHO DE MÃO					
TAREFAS REALIZADAS							
NÚMERO DE T.R.		DESCRICAÇÃO				OBSERVAÇÕES	
1		COMPACTAÇÃO DE BASE ÁREA DE CALÇAMENTO					
2		INSTALAÇÃO DE MEIO FIO PREMOLDADO					
3		EXECUÇÃO DE FORMA DE MADEIRA				BALDRAME DA PASSAGEM DE PEDESTRE	
4		CONCRETAGEM DE BALDRAME DA PASSAGEM DE PEDESTRE					
5		ESCAVAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE MEIO FIO E SARJETA					
REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)							





Data não informada



Data não informada



Data não informada

OCORRÊNCIAS		
NÚMERO DE OC	TIPO DE OCORRÊNCIA	DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA
CONFERÊNCIA		
MUNICÍPIO	CONSÓRCIO (Aprovado em 02/09/2024 - 13:08)	
Obs.:	Obs.:	
ASSINATURAS		
YURI ANDRADE COSTA LINS Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 233590/D	PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA CREA 137.103/D	ANTÔNIO CARLOS MARTINS BRANDÃO RT de Execução - PONTAL ENGENHARIA LTDA CREA 45.957/D



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº 0028	OBRA: CTP 0191/2024 - SANTO ANTONIO DO GRAMA - IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE ACESSIBILIDADE	CONTRATO:		RESP. TÉCNICO: ANTONIO CARLOS MARTINS BRANDÃO
ENDEREÇO: TRECHO DA RODOVIA DE ACESSO A SANTO ANTONIO DO GRAMA, BAIRRO NOVO HORIZONTE.		INÍCIO: 01/07/2024		Nº CREA-MG: 45957/D
CIDDE:		PRAZO: 31/12/2024		Nº DA ART:
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA		UF:		COORDENADAS:
DATA: 28/08/2024	SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA ☔	IMPRATICÁVEL ☔
MANHÃ		✓		
TARDE		✓		
QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO		QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
1	ENCARREGADO DE OBRAS		2	PEDREIRO
6	AJUDANTE			
QTDE	EQUIPAMENTO			
2	CAVADEIRA RETA			
1	DAMPER			
3	PÁ			
3	CHIBANCA			
3	ENXADA			
3	CARRINHO DE MÃO			
1	SERRA CIRCULAR			
1	BETONEIRA			
TAREFAS REALIZADAS				
NÚMERO DE T.R.	DESCRICAO		OBSERVAÇÕES	
1	INSTALAÇÃO DE MEIO FIO PREMOLDADO			
2	CONCRETAGEM DE SARJETA			
3	CONCRETAGEM DE BALDRAME DA PASSAGEM DE PEDESTRES			
4	ARMADURA E FORMA DAS VIGAS BALDRAMES		PARA FUNDAÇÕES DA PASSAGEM DE PEDESTRE.	
5	ESCAVAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE MEIO FIO E SARJETA			
REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)				



Data não informada



Data não informada



Data não informada



Data não informada

OCORRÊNCIAS		
NÚMERO DE OC	TIPO DE OCORRÊNCIA	DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA
CONFERÊNCIA		
MUNICÍPIO	CONSÓRCIO (Aprovado em 29/08/2024 - 08:02)	
Obs.:	Obs.:	
ASSINATURAS		
YURI ANDRADE COSTA LINS Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 233590/D	PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA CREA 137.103/D	ANTÔNIO CARLOS MARTINS BRANDÃO RT de Execução - PONTAL ENGENHARIA LTDA CREA 45.957/D



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº 0027	OBRA: CTP 0191/2024 - SANTO ANTONÍO DO GRAMA - IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE ACESSIBILIDADE	CONTRATO:		RESP. TÉCNICO: ANTONIO CARLOS MARTINS BRANDÃO
ENDEREÇO: TRECHO DA RODOVIA DE ACESSO A SANTO ANTONIO DO GRAMA, BAIRRO NOVO HORIZONTE.		INÍCIO: 01/07/2024		Nº CREA-MG: 45957/D
CIDDE:		PRAZO: 31/12/2024		Nº DA ART:
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA		UF:		COORDENADAS:
DATA: 27/08/2024	SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA ☔	IMPRATICÁVEL ☁
MANHÃ		✓		
TARDE		✓		
QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO		QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
1	ENCARREGADO DE OBRAS		2	PEDREIRO
6	AJUDANTE			
QTDE	EQUIPAMENTO			
2	CAVADEIRA RETA			
1	TAIADEIRA			
1	DAMPER			
3	PÁ			
1	MARRETA			
3	CHIBANCA			
3	ENXADA			
3	CARRINHO DE MÃO			
1	BETONEIRA			
TAREFAS REALIZADAS				
NÚMERO DE T.R.	DESCRICAO		OBSERVAÇÕES	
1	CONCRETAGEM DE SARJETA			
2	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO		PARA MONTAGEM DA FORMA DA VIGA BALDRAME DA PASSAGEM DE PEDESTRE.	
3	INSTALAÇÃO DE MEIO FIO PREMOLDADO			
4	ESCAVAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE MEIO FIO E SARJETA			
REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)				



Data não informada



Data não informada



27 de ago. de 2024 13:24:38
594 Rua Doutor Vicente Bretas Cupertino
Santo Antonio Do Grama
Santo Antônio do Grama
Minas Gerais

Data não informada



27 de ago. de 2024 17:13:39
651 Rua Doutor Vicente Bretas Cupertino
Santo Antonio Do Grama
Santo Antônio do Grama
Minas Gerais

Data não informada



27 de ago. de 2024 17:13:26
651 Rua Doutor Vicente Bretas Cupertino
Santo Antonio Do Grama
Santo Antônio do Grama
Minas Gerais

Data não informada

OCORRÊNCIAS		
NÚMERO DE OC	TIPO DE OCORRÊNCIA	DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA
CONFERÊNCIA		
MUNICÍPIO	CONSÓRCIO (Aprovado em 29/08/2024 - 08:02)	
Obs.:	Obs.:	
ASSINATURAS		
YURI ANDRADE COSTA LINS Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 233590/D	PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA CREA 137.103/D	ANTÔNIO CARLOS MARTINS BRANDÃO RT de Execução - PONTAL ENGENHARIA LTDA CREA 45.957/D



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº 0026	OBRA: CTP 0191/2024 - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE ACESSIBILIDADE	CONTRATO:		RESP. TÉCNICO: ANTONIO CARLOS MARTINS BRANDÃO
ENDEREÇO: TRECHO DA RODOVIA DE ACESSO A SANTO ANTONIO DO GRAMA, BAIRRO NOVO HORIZONTE.		INÍCIO: 01/07/2024		Nº CREA-MG: 45957/D
CIDDE:		PRAZO: 31/12/2024		Nº DA ART:
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA		UF:		COORDENADAS:
DATA: 26/08/2024	SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA ☔	IMPRATICÁVEL ☔
MANHÃ		✓		
TARDE		✓		
QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO		QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
1	ENCARREGADO DE OBRAS		2	PEDREIRO
6	AJUDANTE			
QTDE	EQUIPAMENTO			
2	CAVADEIRA RETA			
1	DAMPER			
3	PÁ			
4	ENXADA			
3	CARRINHO DE MÃO			
1	BETONEIRA			
TAREFAS REALIZADAS				
NÚMERO DE T.R.	DESCRIÇÃO		OBSERVAÇÕES	
1	CONCRETAGEM DE SARJETA			
2	INSTALAÇÃO DE MEIO FIO PREMOLDADO			
3	CONCRETAGEM DE ESTACAS DA PASSAGEM DE PEDESTRES			
4	ESCAVAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE MEIO FIO E SARJETA			
REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)				

REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)



Data não informada



Data não informada



Data não informada



Data não informada



Data não informada

OCORRÊNCIAS		
NÚMERO DE OC	TIPO DE OCORRÊNCIA	DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA
CONFERÊNCIA		
MUNICÍPIO	CONSÓRCIO (Aprovado em 29/08/2024 - 08:01)	
Obs.:	Obs.:	
ASSINATURAS		
YURI ANDRADE COSTA LINS Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 233590/D	PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA CREA 137.103/D	ANTÔNIO CARLOS MARTINS BRANDÃO RT de Execução - PONTAL ENGENHARIA LTDA CREA 45.957/D



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº 0025	OBRA: CTP 0191/2024 - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE ACESSIBILIDADE	CONTRATO:		RESP. TÉCNICO: ANTONIO CARLOS MARTINS BRANDÃO
ENDEREÇO: TRECHO DA RODOVIA DE ACESSO A SANTO ANTÔNIO DO GRAMA, BAIRRO NOVO HORIZONTE.		INÍCIO: 01/07/2024		Nº CREA-MG: 45957/D
CIDDE:		PRAZO: 31/12/2024		Nº DA ART:
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA		UF:		COORDENADAS:
DATA: 23/08/2024	SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA ☔	IMPRATICÁVEL ☁☔
MANHÃ	✓			
TARDE	✓			
QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO		QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
1	ENCARREGADO DE OBRAS		2	PEDREIRO
5	AJUDANTE			
QTDE	EQUIPAMENTO			
1	DAMPER			
3	PÁ			
2	CHIBANCA			
3	ENXADA			
3	CARRINHO DE MÃO			
1	BETONEIRA			
TAREFAS REALIZADAS				
NÚMERO DE T.R.	DESCRICAO		OBSERVAÇÕES	
1	INSTALAÇÃO DE MEIO FIO PREMOLDADO			
2	ESCAVAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE MEIO FIO E SARJETA			
3	CONCRETAGEM DE SARJETA			

REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)





OCORRÊNCIAS		
NÚMERO DE OC	TIPO DE OCORRÊNCIA	DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA
CONFERÊNCIA		
MUNICÍPIO	CONSÓRCIO (Aprovado em 26/08/2024 - 09:21)	
Obs.:	Obs.:	
ASSINATURAS		
YURI ANDRADE COSTA LINS Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 233590/D	PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA CREA 137.103/D	ANTÔNIO CARLOS MARTINS BRANDÃO RT de Execução - PONTAL ENGENHARIA LTDA CREA 45.957/D



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº 0024	OBRA: CTP 0191/2024 - SANTO ANTONIO DO GRAMA - IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE ACESSIBILIDADE		CONTRATO:		RESP. TÉCNICO: ANTONIO CARLOS MARTINS BRANDÃO	
ENDEREÇO: TRECHO DA RODOVIA DE ACESSO A SANTO ANTONIO DO GRAMA, BAIRRO NOVO HORIZONTE.			INÍCIO: 01/07/2024		Nº CREA-MG: 45957/D	
CIDDE:			PRAZO: 31/12/2024		Nº DA ART:	
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA			UF:		COORDENADAS:	
DATA: 23/08/2024	SOL ☀		NUBLADO ☁		CHUVA ☔	IMPRATICÁVEL ☁
MANHÃ	✓					
TARDE	✓					
QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO			QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	
1	ENCARREGADO DE OBRAS			2	PEDREIRO	
5	AJUDANTE					
QTDE						EQUIPAMENTO
2	CAVADEIRA RETA					
3	PÁ					
3	CHIBANCA					
4	ENXADA					
3	CARRINHO DE MÃO					
TAREFAS REALIZADAS						
NÚMERO DE T.R.	DESCRICAO				OBSERVAÇÕES	
1	INSTALAÇÃO DE MEIO FIO PREMOLDADO					
	ESCAVAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE MEIO FIO					
REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)						

REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)





OCORRÊNCIAS		
NÚMERO DE OC	TIPO DE OCORRÊNCIA	DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA
OBSERVAÇÕES		
DATA 22/09/2024 QUINTA FEIRA. LANÇAMENTO DE INFORMAÇÕES EM ATRAZO POR DIFICULDADES DE TRANSMISSÃO DO MATERIAL FOTOGRÁFICO DO DIA.		
CONFERÊNCIA		
MUNICÍPIO	CONSÓRCIO (Aprovado em 26/08/2024 - 09:21)	
Obs.:	Obs.:	
ASSINATURAS		
YURI ANDRADE COSTA LINS Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 233590/D	PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA CREA 137.103/D	ANTÔNIO CARLOS MARTINS BRANDÃO RT de Execução - PONTAL ENGENHARIA LTDA CREA 45.957/D



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº 0023	OBRA: CTP 0191/2024 - SANTO ANTONIO DO GRAMA - IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE ACESSIBILIDADE	CONTRATO:	RESP. TÉCNICO: ANTONIO CARLOS MARTINS BRANDÃO
ENDEREÇO: TRECHO DA RODOVIA DE ACESSO A SANTO ANTONIO DO GRAMA, BAIRRO NOVO HORIZONTE.	INÍCIO: 01/07/2024	Nº CREA-MG: 45957/D	
CIDDE:	PRAZO: 31/12/2024	Nº DA ART:	
DISTRITO: SANTO ANTONIO DO GRAMA	UF:	COORDENADAS:	
DATA: 21/08/2024	SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA ☔
MANHÃ	✓		IMPRATICÁVEL ☔
TARDE	✓		
QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
1	ENCARREGADO DE OBRAS	2	PEDREIRO
5	AJUDANTE		
QTDE	EQUIPAMENTO		
2	CAVADEIRA RETA		
3	PÁ		
3	CHIBANCA		
4	ENXADA		
3	CARRINHO DE MÃO		
TAREFAS REALIZADAS			
NÚMERO DE T.R.	DESCRIÇÃO	OBSERVAÇÕES	
1	INSTALAÇÃO DE MEIO FIO PREMOLDADO		
2	DESCARGA DE MATERIAIS NA OBRA	MEIO FIO PREMOLDADO	
3	ESCAVAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE MEIO FIO		

REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)





21 de ago. de 2024 16:32:08
-20°19'18.459"S -42°36'40.998"W
640, Rua Doutor Vicente Bretas Cupertino
Santo Antônio Do Grama
Santo Antônio do Grama
Minas Gerais
21/08/2024
-20.321794166667, -42.611388333333

OCORRÊNCIAS		
NÚMERO DE OC	TIPO DE OCORRÊNCIA	DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA
CONFERÊNCIA		
MUNICÍPIO	CONSÓRCIO (Aprovado em 26/08/2024 - 09:21)	
Obs.:	Obs.:	
ASSINATURAS		
YURI ANDRADE COSTA LINS Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 233590/D	PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA CREA 137.103/D	ANTÔNIO CARLOS MARTINS BRANDÃO RT de Execução - PONTAL ENGENHARIA LTDA CREA 45.957/D



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº 0022	OBRA: CTP 0191/2024 - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE ACESSIBILIDADE	CONTRATO:		RESP. TÉCNICO: ANTONIO CARLOS MARTINS BRANDÃO	
ENDEREÇO: TRECHO DA RODOVIA DE ACESSO A SANTO ANTONIO DO GRAMA, BAIRRO NOVO HORIZONTE.		INÍCIO: 01/07/2024		Nº CREA-MG: 45957/D	
CIDDE:		PRAZO: 31/12/2024		Nº DA ART:	
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA		UF:		COORDENADAS:	
DATA: 20/08/2024	SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA ☔	IMPRATICÁVEL ☔	
MANHÃ	✓				
TARDE	✓				
QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO		QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	
1	ENCARREGADO DE DRENAGEM		2	PEDREIRO	
6	AJUDANTE				
QTDE	EQUIPAMENTO				
2	CAVADEIRA RETA				
3	PÁ				
2	CHIBANCA				
3	ENXADA				
2	CARRINHO DE MÃO				
TAREFAS REALIZADAS					
NÚMERO DE T.R.	DESCRICAO			OBSERVAÇÕES	
1	ESCAVAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE MEIO FIO				
2	INSTALAÇÃO DE MEIO FIO PREMOLDADO				
REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)					

REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)





Data não informada

OCORRÊNCIAS		
NÚMERO DE OC	TIPO DE OCORRÊNCIA	DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA
CONFERÊNCIA		
MUNICÍPIO	CONSÓRCIO (Aprovado em 26/08/2024 - 09:21)	
Obs.:	Obs.:	
ASSINATURAS		
YURI ANDRADE COSTA LINS Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 233590/D	PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA CREA 137.103/D	ANTÔNIO CARLOS MARTINS BRANDÃO RT de Execução - PONTAL ENGENHARIA LTDA CREA 45.957/D





Assinaturas do Documento



Documento Assinado Eletronicamente por **ANTONIO CARLOS MARTINS BRANDÃO**,
CPF: 385.06*. **6- *4 em **25/09/2024 16:49:07**, Cód. Autenticidade da Assinatura:
1624.4V49.007Z.U663.1104, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de
2020.



Documento Assinado Eletronicamente por **YURI ANDRADE COSTA LINS**, CPF:
084.94*. **6- *2 em **25/09/2024 16:45:26**, Cód. Autenticidade da Assinatura:
16E8.6E45.3263.8677.4077, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de
2020.



Informações do Documento

ID do Documento: **9E0.B16** - Tipo de Documento: **FORMULÁRIO DE MEDIÇÕES**.

Elaborado por **GILBERTO ARAUJO GOMIDES**, CPF: 069.58*. **6- *7 , em **25/09/2024 - 16:27:59**

Código de Autenticidade deste Documento: 16K6.0327.359H.A132.6300

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
<https://zeropapel.cimvalpi.mg.gov.br/verdocumento>





CIMVALPI - Consórcio Intermunicipal Multissetorial do Vale do Piranga
Estado de Minas Gerais
ORDEM DE FORNECIMENTO

ORDEM DE FORNECIMENTO
000002/2024



DADOS DA ENTIDADE / ORGÃO

Endereço: Rua Jaime Pereira, 127 - Progresso
 Ponte Nova, Minas Gerais, Brasil- C.E.P : 35430-000
 C.N.P.J.: 19.738.706/0001-83 Inscrição Estadual
 Telefone: (31)38813273 Fax: (31)38813273

Ordem de Serviço / Compra 000482/2024	Número do Empenho 000856/2024	Ficha Orçamentária 00214	Setor Contabil CIMVALPI
---	---	------------------------------------	-----------------------------------

Processo de Compra
070018/2024

Condição de Pagamento: Pagamento Parcelado
 Prazo de Entrega: Durante a Vigência do Contrato
 Garantia: Material Não Possui Garantia
 Assistência Técnica: Pelo Próprio Fornecedor ou Por Concessionária

Fornecedor: **001484 - PONTAL ENGENHARIA LTDA**
 Endereço: Avenida Doutor Otávio Soares, 266 - Palmeiras
 Ponte Nova, Minas Gerais, Brasil - C.E.P : 35.430-000
 CNPJ: 05.527.293/0001-83 Inscrição Estadual
 Telefone: Fax
 Email: Banco
 Conta p/ Pagamento.....:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE AQUISIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
0001	00025371 - Prestação de serviços da pista de acessibilidade ao bairro Novo Horizonte a ser executada ao longo da saída do município de Santo Antônio do Grama (perímetro urbano) até o portal da cidade.	Unidade	1,0000	75.935,8800	75.935,8800
VALOR TOTAL DA ORDEM DE FORNECIMENTO					75.935,88

Valor: **R\$ 75.935,88** (Setenta e Cinco Mil e Novecentos e Trinta e Cinco Reals e Oitenta e Oito Centavos)

As informações a seguir são referentes aos locais de entrega, os locais de origem dos pedidos, os números dos pedidos e quantidade de cada material especificado a ser entregue no local de entrega.

LOCAL DE ENTREGA

LOCAL DO PEDIDO A SER ATENDIDO NO LOCAL DE ENTREGA	NÚMERO DO PEDIDO
01 - Cimvalpi	070116/2024

OBSERVAÇÃO : CTP 0191 2024 - IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE ACESSIBILIDADE - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA
 Favor Informar nas Notas Fiscais o Número do Processo de Compras, Ordem de Serviço / Compras e a Ordem de Fornecimento.

Ponte Nova-MG, 11 de Agosto de 2024

Verônica Aparecida de Carvalho Lima
 Chefe do Departamento de Compras
 CIMVALPI



CIMVALPI
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL
MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA

Informações do Documento

ID do Documento: **A1C.162** - Tipo de Documento: **ORDEM DE FORNECIMENTO DIGITALIZADO.**

Juntado por **JÚLIO HENRIQUE DO CARMO FREITAS** CPF: 156.17*. **6-*3 , em **03/10/2024 - 15:17:20**

Código de Autenticidade deste Documento: 15V1.0R17.6207.U46U.2061

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:

<https://zeropapel.cimvalpi.mg.gov.br/verdocumento>



 Município de Ponte Nova - MG Secretaria Municipal de Fazenda Rua Avenida Caetano Marinho, Centro, 306 - 35430000 - Ponte Nova - MG	NÚMERO DA NOTA FISCAL 2024/12 
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e	

Dados da NFS-e

Natureza da Operação: Tributação fora do município Nº RPS:	Código de Autenticidade: 66fbf2c6 Nº NFS-e: 2024/12	Data de Emissão: 01/10/2024 10:01:58 Data Emissão RPS:
---	--	---

Dados do Prestador

Razão Social: PONTAL ENGENHARIA LTDA
Nome Fantasia: PONTAL ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 05.527.293/0001-83 **Inscrição Estadual:** **Inscrição Municipal:** 78010886
Endereço: Avenida Doutor Otávio Soares, 266, , Palmeiras, Cep:35430229, PONTE NOVA - MG
Telefone: (31) 3881-2824 **E-mail:** pontal@pontal.eng.br
Incentivador Cultural: Não **Simples Nacional:** Não optante **Regime Especial:** Nenhum

Dados do Tomador

Razão Social: CIMVALPI - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA - 2. PONTO
CNPJ: 19.738.706/0001-83 **Insc. Estadual:** **Insc. Municipal:**
Endereço: R. JAIME PEREIRA, 127, PROGRESSO - CEP 35.430-186 - PONTE NOVA - MG **Tel:** (31) 9847-21333
E-mail:

Discriminação dos Serviços

CTP 0191 2024 - IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE ACESSIBILIDADE - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - BM 02
Processo de Compras 070018/2024, Ordem de Serviço 000482/2024, Empenho 00856/2024 e a Ordem de Fornecimento 00002/2024.

Observações

- APENAS PARA FINS DE RETENÇÃO A SEGURIDADE SOCIAL:
PERCENTUAL DE MÃO DE OBRA 35% - R\$ 26.577,56
PERCENTUAL DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS FORNECIDOS 65% - R\$ 49.358,32.
-EMPRESA COM MÃO DE OBRA DESONERADA- ALIQUOTA RETENÇÃO SEGURIDADE SOCIAL SOBRE O VALOR BRUTO DA NF: 3,5%.
APROPRIAÇÃO E RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL): CNO 90.020.56642/77
- ALIQUOTA RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA: 1,2%, CONFORME ANEXO 1 DA IN RFB Nº 1234 DE 11/01/2012 ALTERADA PELA IN RFB 2145 DE 26/06/2023.
- OPÇÃO PELO ARTIGO 4º DO DECRETO MUNICIPAL Nº32 DE 05/08/2015, ESTANDO A APLICAÇÃO DE MATERIAIS LIMITADO A 50% DO VALOR INTEGRAL DA NOTA FISCAL PARA FINS DE APURAÇÃO DE BASE DE CÁLCULO DO ISSQN.
ALÍQUOTA ISSQN CONFORME ITEM 7.02, TABELA 2, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL STO ANTONIO DO GRAMA - 5,00% .
DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO: SICRED COOPERATIVA 748, AGENCIA 0230 CONTA CORRENTE 14.083-4.

Código/Serviço - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

Código CNAE 4120400	ISSQN Retido Sim	Local Prestação dos Serviços 3160108 - SANTO ANTONIO DO GRAMA - MG	Local de Incidência ISSQN 3160108 - SANTO ANTONIO DO GRAMA - MG
------------------------	---------------------	---	--

Retenções Federais

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 2.657,76	IR R\$ 911,23	CSLL R\$ 0,00	OUTRAS R\$ 0,00
-----------------	--------------------	----------------------	------------------	------------------	--------------------

Valores da NFS-e

Valor Total dos Serviços R\$ 75.935,88	Deduções R\$ 37.967,94	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Desconto Condicionado R\$ 0,00	Base de Calculo R\$ 37.967,94
---	---------------------------	-------------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------



Alíquota 5.00	Valor do ISSQN R\$ 1.898,40	Valor Total R\$ 75.935,88	Valor Líquido R\$ 70.468,49
------------------	--------------------------------	------------------------------	--------------------------------

Recebemos de PONTAL ENGENHARIA LTDA os serviços discriminados na nota fiscal eletrônica indicada ao lado.		NFS-e 2024/12
Data de recebimento	Assinatura e Documento do recebedor	





CIMVALPI
CONSORCIO INTERMUNICIPAL
MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA

Informações do Documento

ID do Documento: **A17.A2A** - Tipo de Documento: **NF - NOTA FISCAL**

Juntado por **JÚLIO HENRIQUE DO CARMO FREITAS** CPF: 156.17*. **6-*3 , em **03/10/2024 - 10:59:12**

Código de Autenticidade deste Documento: 1078.3H59.812Z.336E.0365

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:

<https://zeropapel.cimvalpi.mg.gov.br/verdocumento>





CIMVALPI - Consórcio Intermunicipal Multissetorial do Vale do Piranga
Estado de Minas Gerais
CONFORMIDADE DE LIQUIDAÇÃO

CONFORMIDADE
LIQUIDAÇÃO
000001/2024

Processo de Compra
070018/2024

Ordem de Serviço / Compra
000482/2024

Número do Empenho
000856/2024

Ficha Orçamentária
00214

Ordem de Fornecimento
000002/2024

DADOS DA ENTIDADE / ORGÃO

Endereço: Rua Jaime Pereira, 127 - Progresso
Ponte Nova, Minas Gerais, Brasil- C.E.P : 35430-000
C.N.P.J.: 19.738.706/0001-83 Inscrição Estadual:
Telefone: (31)38813273 Fax: (31)38813273

Setor Contabil
CIMVALPI

Condição de Pagamento: Pagamento Parcelado
Prazo de Entrega: Durante a Vigência do Contrato
Garantia: Material Não Possui Garantia
Assistência Técnica: Pelo Próprio Fornecedor ou Por Concessionária

Fornecedor: 001484 - PONTAL ENGENHARIA LTDA
Endereço: Avenida Doutor Otávio Soares, 266 - Palmeiras
Ponte Nova, Minas Gerais, Brasil - C.E.P : 35.430-000
CNPJ: 05.527.293/0001-83 Inscrição Estadual:
Telefone: Fax:
Email:
Conta p/ Pagamento.....: Banco:

VALOR DA CONFORMIDADE DE LIQUIDAÇÃO

75.935,88

Valor.....: **R\$ 75.935,88** (Setenta e Cinco Mil e Novecentos e Trinta e Cinco Reais e Oitenta e Oito Centavos)

Ponte Nova-MG, 03 de Outubro de 2024





CIMVALPI

CONSORCIO INTERMUNICIPAL
MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA

Informações do Documento

ID do Documento: **A1C.764** - Tipo de Documento: **CONFORMIDADE DE LIQUIDAÇÃO**.

Juntado por **JÚLIO HENRIQUE DO CARMO FREITAS** CPF: 156.17*. **6-*3 , em **03/10/2024 - 15:31:09**

Código de Autenticidade deste Documento: 15H5.3K31.0099.6336.3882

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:

<https://zeropapel.cimvalpi.mg.gov.br/verdocumento>



MEMORANDO

Nº 4.821/2024

PONTE NOVA/MG, 01 de outubro de 2024.

Assunto: Taxa de remuneração de gestão referente às liquidações do contrato de programa 191/2024

Referência: Medições – Pavimentação – Santo Antônio do Grama

Referência	Valor BDI	Taxa	Taxa de remuneração
Medição 02 - 20/09/2024 - Pavimentação - Implantação de Pista de Acessibilidade	R\$ 75.935,88	5,50	R\$ 4.176,47
TOTAL			R\$ 4.176,47

Ordens de serviço:

- 000482/2024 - Nº do empenho 000856/2024 – ordem de fornecimento: 000002/2024

Valor da taxa de remuneração de gestão: R\$ 4.176,47

Atenciosamente,

Yuri Andrade Costa Lins
Engenheiro Civil – CREA 233590/D
Fiscal do Contrato

Assinatura do Documento



Documento Assinado Eletronicamente por **YURI ANDRADE COSTA LINS**, CPF: 084.94*.**6-*2 em **01/10/2024 16:17:11**, Cód. Autenticidade da Assinatura: **16X1.0917.3117.375V.8527**, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Informações do Documento

ID do Documento: **A06.AD8** - Tipo de Documento: **MEMORANDO** - Nº **4.821/2024**

Elaborado por **GILBERTO ARAUJO GOMIDES**, CPF: 069.58*.**6-*7, em **01/10/2024 10:16:35**, contendo 94 palavras.

Código de Autenticidade deste Documento: 10W8.2116.2352.3184.8351

A autenticidade do documento pode ser conferida no site: <https://zeropapel.cimvalpi.mg.gov.br/verdocumento>



Cod. de Autenticidade do Doc.: 16W4.2825.811R.9471.8821 - ZeroPapel - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA - MG

Proc. Adm: 09.0209-4.2024.15

 CIMVALPI - Consórcio Intermunicipal Multissetorial do Vale do Piranga ESTADO DE MINAS GERAIS		NOTA DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
		Exercício 2024	Fonte 1.869.000.0000	Número 07615
PROCESSO				Requisição de Compra Nº: EM:
Convênio.....: 00447 - ST. ANT. DO GRAMA - 191/2024 IMPLAN				Vencimento:
Centro de Custo.....: 00095 - TAXA DE SERVIÇOS				
NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA-SE QUE SEJA EXECUTADA, NESTE EXERCÍCIO, A DESPESA A SEGUIR ESPECIFICADA.				
ORDEN DE PAGAMENTO DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Taxa administrativa				
Favorecido: 000029 - CIMVALPI - Consórcio Intermunicipal Multissetorial do Vale do Piranga Endereço: Rua Jaime Pereira , 127 , 35.430-000 Cidade: Ponte Nova - MG Conta Bancária:				Telefone: (31) 3881-3273 CNPJ / CPF 19.738.706/0001-83
Especificação da Despesa	VALOR REFERE-SE A TAXA ADMINISTRATIVA. BM 02 - PAVIMENTAÇÃO - IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE ACESSIBILIDADE. CONFORME MEMORANDO 4.821/2024 ID A06.AD8.			
Valor: R\$ 4.176,47 (Quatro Mil e Cento e Setenta e Seis Reais e Quarenta e Sete Centavos)				
Data: 03 / 10 / 2024		Ordenador da Despesa: AMON COSMO GURGEL MOREIRA		
DEMONSTRAÇÃO				
CONTADOR		Detalhamento dos Descontos:		
TAYNARA PINTO TOMAZ CRC MG122692/O-5		Despesa Bruta: 4.176,47		
		Descontos: 0,00		
		Despesa Líquida: 4.176,47		
LIQUIDAÇÃO		ORDEN DE PAGAMENTO		CONTROLE INTERNO
O MATERIAL OU SERVIÇO FOI ENTREGUE CONFORME SOLICITADO. / /		FACE À LIQUIDAÇÃO PROCESSADA DETERMINO O SEU PAGAMENTO. / /		EXAMINAMOS O PERCURSO DA DESPESA, EM CONFORMIDADE COM AS DISPOSIÇÕES LEGAIS QUE DISCIPLINAM O SEU PROCESSAMENTO.
ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR YURI ANDRADE COSTA LINS		DIRETOR ADMINISTRATIVO JULIO CORREA GUIMARAES		ENGENHEIRO DE CONTROLE ANDRE LUIZ DE CARVALHO
RECIBO				
Recebi o valor acima descrito referente a despesa com materiais e / ou serviços acima especificado, para a qual dou quitação, para um só efeito.			Documento: (Tipo / Número)	
Data: / /			Banco: _____	
Nome _____			Cheque: _____	
Assinatura _____			Conta: _____	
			Recursos: _____	



Pág.: 1 / 2 - ID. do Doc.: AID.527 - 03/10/2024 - 16:25:11 - ASSINADO POR(5): CPF:012.04*.*6*0 CPF:100.41*.*6*4 CPF:112.15*.*6*0 CPF:110.27*.*6*2 CPF:084.94*.*6*2



Assinaturas do Documento



Documento Assinado Eletronicamente por **JÚLIO CORREA GUIMARÃES -
ORDENADOR DE PAGAMENTO**, CPF: 012.04*. **6-*0 em **09/10/2024 14:35:12**, Cód.
Autenticidade da Assinatura: **14X0.5R35.1124.211K.5517**, Com fundamento na Lei Nº
14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Documento Assinado Eletronicamente por **ANDRÉ LUIZ DE CARVALHO**, CPF:
100.41*. **6-*4 em **09/10/2024 14:27:50**, Cód. Autenticidade da Assinatura:
14R7.6K27.050X.K02E.4806, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de
2020.



Documento Assinado Eletronicamente por **AMON COSMO GURGEL MOREIRA -
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO, EXECUTIVO E OPERACIONAL**, CPF: 112.15*. **6-
*0 em **09/10/2024 10:52:24**, Cód. Autenticidade da Assinatura:
10W3.0H52.324W.H72W.3162, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro
de 2020.



Documento Assinado Eletronicamente por **TAYNARA PINTO TOMAZ - CONTADOR**,
CPF: 110.27*. **6-*9 em **04/10/2024 09:01:13**, Cód. Autenticidade da Assinatura:
09V3.0E01.812K.A22Z.1102, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de
2020.



Documento Assinado Eletronicamente por **YURI ANDRADE COSTA LINS**, CPF:
084.94*. **6-*2 em **04/10/2024 08:20:22**, Cód. Autenticidade da Assinatura:
08R1.3920.822Z.3004.5277, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de
2020.



Informações do Documento

ID do Documento: **A1D.527** - Tipo de Documento: **EXTRA ORÇAMENTO.**

Elaborado por **RONALDO ADRIANO DA SILVEIRA RIBEIRO**, CPF: 992.49*. **6-*4 , em **03/10/2024 -
16:25:11**

Código de Autenticidade deste Documento: 16W4.2825.811R.9471.8821


A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
<https://zeropapel.cimvalpi.mg.gov.br/verdocumento>



Cod. de Autenticidade do Doc.: 16Z1.7225.3116.238X.0050 - ZeroPapel - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA - MG

Proc. Adm: 09.0209-4.2024.15

 CIMVALPI - Consórcio Intermunicipal Multissetorial do Vale do Piranga ESTADO DE MINAS GERAIS		SUBEMPENHO		
Exercício 2024		Ficha 00214	Sub-Empenho / Tipo 002/00856 / Estimativo	
Convênio.....: 00447 - ST. ANT. DO GRAMA - 191/2024 IMPLAN			Emissão: 09 / 07 / 2024	
Centro de Custo.....: 00111 - OBRAS E INSTALAÇÕES			Vencimento:	
LICITAÇÃO				
Modalidade : Dispensa Número: 201 Data: 09 / 07 / 2024				
Nº Processo de Compra : 70018		Data : 09 / 07 / 2024	Ordem de Serviço : 482/2024	Contrato : 205/2024
Favorecido: 001484 - PONTAL ENGENHARIA LTDA			Telefone:	
Endereço: Avenida Dr Otavio Soares , 266 , 35.430-000			CNPJ / CPF :	
Cidade: Ponte Nova - MG			05.527.293/0001-83	
Conta Bancária:				
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA E FONTE DE RECURSOS				
Órgão: 01 CIMVALPI - Consórcio Interm. Multisset. do Vale do Piranga				
Unidade: 01 CIMVALPI - Consórcio Interm. Multisset. do Vale do Piranga				
Subunidade: 07 Serviços e Obras Cíveis de Engenharia				
Função: 15 Urbanismo				
Subfunção: 451 Infra-Estrutura Urbana				
Programa: 0001 Apoio a Administração Pública				
Projeto/Atividade: 1.015 Obras e serviços auxiliares e/ou complementares da construção civil				
Natureza: 4.4.90.51.01 Obras e Instalações de Domínio Público				
Fonte de Recurso: 1.710.010.0000 Transferência Especial do Estado - Acordo Judicial de Reparação dos Impactos Socioeconômicos e Ambientais do Rompimento de Barragem em Brumadinho				
Especificação da Despesa	VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A EXECUÇÃO DO CTP 0191/2024 SANTO ANTÔNIO DO GRAMA IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE ACESSIBILIDADE. BM 02 - IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE ACESSIBILIDADE - CTP 191/2024 SANTO ANTÔNIO DO GRAMA.			
Valor	R\$ 75.935,88 (Setenta e Cinco Mil e Novecentos e Trinta e Cinco Reais e Oitenta e Oito Centavos)			
DEMONSTRAÇÃO DO SALDO DA DOTAÇÃO				
Descontos:		Saldo Anterior		638.954,72
Imposto de Renda CTP		Despesa Empenhada..:		75.935,88
Iss		Saldo Disponível		563.018,84
Despesa Bruta.: 75.935,88		Descontos.: 5.467,39		Despesa Líquida.....: 70.468,49
ORDENADOR DA DESPESA			CONTADOR	
Nos termos da legislação vigente e no uso competente das minhas atribuições de Ordenador da Despesa determina-se que seja processada a despesa acima especificada				
AMON COSMO GURGEL MOREIRA			TAYNARA PINTO TOMAZ MG122692/O-5	
LIQUIDACÃO		ORDEM DE PAGAMENTO		CONTROLE INTERNO
O material ou serviço foi entregue conforme solicitado.		Face à liquidação processada determino o seu pagamento.		Examinamos o percurso da despesa, em conformidade com as disposições legais que disciplinam o seu processamento.
Data: 03 / 10 / 2024		Data: / /		
YURI ANDRADE COSTA LINS ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR		JULIO CORREA GUIMARAES DIRETOR ADMINISTRATIVO		ANDRE LUIZ DE CARVALHO ENGENHEIRO DE CONTROLE
RECIBO				
Recebi o valor acima descrito referente a despesa com materiais e / ou serviços acima especificado, para a qual dou quitação, para um só efeito.			Documento de Identificação:	
Data: / /			Banco	
Nome			Documento	
Assinatura			Conta	
			Recursos	



Pág.: 1 / 2 - ID. do Doc.: AID:551 - 03/10/2024 - 16:25:12 - ASSINADO POR(5): CPF:012.04*.*6*0 CPF:100.41*.*6*4 CPF:112.15*.*6*0 CPF:110.27*.*6*9 CPF:084.94*.*6*2



Assinaturas do Documento



Documento Assinado Eletronicamente por **JÚLIO CORREA GUIMARÃES - ORDENADOR DE PAGAMENTO**, CPF: 012.04*. **6-*0 em **09/10/2024 14:35:12**, Cód. Autenticidade da Assinatura: **14H0.7435.6122.858K.2706**, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Documento Assinado Eletronicamente por **ANDRÉ LUIZ DE CARVALHO**, CPF: 100.41*. **6-*4 em **09/10/2024 14:27:50**, Cód. Autenticidade da Assinatura: **14A4.2727.6508.252H.2624**, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Documento Assinado Eletronicamente por **AMON COSMO GURGEL MOREIRA - SUPERVISOR ADMINISTRATIVO, EXECUTIVO E OPERACIONAL**, CPF: 112.15*. **6-*0 em **09/10/2024 10:52:24**, Cód. Autenticidade da Assinatura: **1041.5E52.324V.E522.4705**, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Documento Assinado Eletronicamente por **TAYNARA PINTO TOMAZ - CONTADOR**, CPF: 110.27*. **6-*9 em **04/10/2024 09:01:13**, Cód. Autenticidade da Assinatura: **0937.5K01.112E.8228.7004**, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Documento Assinado Eletronicamente por **YURI ANDRADE COSTA LINS**, CPF: 084.94*. **6-*2 em **04/10/2024 08:20:08**, Cód. Autenticidade da Assinatura: **0896.8W20.608H.Z876.8763**, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Informações do Documento

ID do Documento: **A1D.551** - Tipo de Documento: **DL - DOCUMENTO DE LIQUIDAÇÃO**

Elaborado por **RONALDO ADRIANO DA SILVEIRA RIBEIRO**, CPF: 992.49*. **6-*4 , em **03/10/2024 - 16:25:12**

Código de Autenticidade deste Documento: **16Z1.7225.3116.238X.0050**

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
<https://zeropapel.cimvalpi.mg.gov.br/verdocumento>



Cod. de Autenticidade do Doc.: 1696.5R26.6462.U18H.3657 - ZeroPapel - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA - MG

Proc. Adm: 09.0209-4.2024.15

 CIMVALPI - Consórcio Intermunicipal Multissetorial do Vale do Piranga ESTADO DE MINAS GERAIS		NOTA DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA <table><tr><td>Exercício 2024</td><td>Fonte 1.869.000.0000</td><td colspan="2">Número 07616</td></tr></table>			Exercício 2024	Fonte 1.869.000.0000	Número 07616	
Exercício 2024	Fonte 1.869.000.0000	Número 07616						
PROCESSO		Requisição de Compra Nº: EM:						
Convênio.....: 00447 - ST. ANT. DO GRAMA - 191/2024 IMPLAN		Vencimento:						
Centro de Custo.....: 00113 - IMPOSTO DE RENDA								
NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA-SE QUE SEJA EXECUTADA, NESTE EXERCÍCIO, A DESPESA A SEGUIR ESPECIFICADA.								
ORDEN DE PAGAMENTO DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Imposto de Renda CTP								
Favorecido: 000104 - Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Grama		Telefone: (31) 3872-5005						
Endereço: Rua Padre João Coutinho , 121 , 35.388-000								
Cidade: Santo Antônio do Grama - MG		CNPJ / CPF 18.836.973/0001-20						
Conta Bancária								
Especificação da Despesa	VALOR REFERE-SE AO REPASSE DA RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA DA NOTA FISCAL 012 DA PONTAL ENGENHARIA LTDA.							
Valor: R\$ 911,23 (Novecentos e Onze Reais e Vinte e Tres Centavos)								
Data: 03 / 10 / 2024		Ordenador da Despesa: JOÃO PAULO FERREIRA						
DEMONSTRAÇÃO								
CONTADOR	Detalhamento dos Descontos:		Despesa Bruta: 911,23					
TAYNARA PINTO TOMAZ CRC MG122692/O-5			Descontos: 0,00					
			Despesa Líquida: 911,23					
LIQUIDAÇÃO	ORDEM DE PAGAMENTO		CONTROLE INTERNO					
O MATERIAL OU SERVIÇO FOI ENTREGUE CONFORME SOLICITADO. / /	FACE À LIQUIDAÇÃO PROCESSADA DETERMINO O SEU PAGAMENTO. / /		EXAMINAMOS O PERCURSO DA DESPESA, EM CONFORMIDADE COM AS DISPOSIÇÕES LEGAIS QUE DISCIPLINAM O SEU PROCESSAMENTO.					
GERENTE ADMINISTRATIVO JOÃO PAULO FERREIRA	DIRETOR ADMINISTRATIVO JULIO CORREA GUIMARAES		ANALISTA DE CONFORMIDADE VITOR CORTEZÃO ANGELO GOMES					
RECIBO								
Recebi o valor acima descrito referente a despesa com materiais e / ou serviços acima especificado, para a qual dou quitação, para um só efeito.		Documento: (Tipo / Número)						
Data: / /		Banco: _____						
Nome _____		Cheque: _____						
Assinatura _____		Conta: _____						
		Recursos: _____						



Pág.: 1 / 2 - ID. do Doc.: AID:5FC - 03/10/2024 - 16:26:46 - ASSINADO POR(4): CPF:016.50*.**6.*2 CPF:110.27*.**6.*9 CPF:052.42*.**6.*3



Assinaturas do Documento



Documento Assinado Eletronicamente por **JÚLIO CORREA GUIMARÃES -
ORDENADOR DE PAGAMENTO**, CPF: 012.04*. **6-*0 em **07/10/2024 08:25:36**, Cód.
Autenticidade da Assinatura: 08E0.1A25.6366.W433.5067, Com fundamento na Lei Nº
14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Documento Assinado Eletronicamente por **VITOR CORTEZÃO ANGELO GOMES -
ANALISTA DE CONFORMIDADE**, CPF: 016.50*. **6-*2 em **04/10/2024 09:04:40**, Cód.
Autenticidade da Assinatura: 0925.5704.640X.E223.7186, Com fundamento na Lei Nº
14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Documento Assinado Eletronicamente por **TAYNARA PINTO TOMAZ - CONTADOR**,
CPF: 110.27*. **6-*9 em **04/10/2024 09:01:13**, Cód. Autenticidade da Assinatura:
09K6.1601.712X.U77U.7885, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de
2020.



Documento Assinado Eletronicamente por **JOAO PAULO FERREIRA - GERENTE
ADMINISTRATIVO**, CPF: 052.42*. **6-*3 em **03/10/2024 16:46:24**, Cód. Autenticidade da
Assinatura: 16K5.8X46.2246.Z74U.8786, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de
Setembro de 2020.



Informações do Documento

ID do Documento: **A1D.5FC** - Tipo de Documento: **EXTRA ORÇAMENTO**.

Elaborado por **RONALDO ADRIANO DA SILVEIRA RIBEIRO**, CPF: 992.49*. **6-*4 , em **03/10/2024 -
16:26:46**

Código de Autenticidade deste Documento: 1696.5R26.6462.U18H.3657

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
<https://zeropapel.cimvalpi.mg.gov.br/verdocumento>



 CIMVALPI - Consórcio Intermunicipal Multissetorial do Vale do Piranga ESTADO DE MINAS GERAIS		NOTA DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
Exercício 2024		Fonte 1.869.000.0000	Número 07617	
PROCESSO			Requisição de Compra Nº: EM:	
Convênio.....: 00447 - ST. ANT. DO GRAMA - 191/2024 IMPLAN			Vencimento:	
Centro de Custo.....: 00019 - ISS				
NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA-SE QUE SEJA EXECUTADA, NESTE EXERCÍCIO, A DESPESA A SEGUIR ESPECIFICADA.				
ORDEM DE PAGAMENTO DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Iss				
Favorecido: 000104 - Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Grama Endereço: Rua Padre João Coutinho , 121 , 35.388-000 Cidade: Santo Antônio do Grama - MG Conta Bancária			Telefone: (31) 3872-5005 CNPJ / CPF 18.836.973/0001-20	
Especificação da Despesa	VALOR REFERE-SE AO REPASSE DA RETENÇÃO DE ISS DA NOTA FISCAL 012 DA PONTAL ENGENHARIA LTDA.			
Valor: R\$ 1.898,40 (Um Mil e Oitocentos e Noventa e Oito Reais e Quarenta Centavos)				
Data: 03 / 10 / 2024		Ordenador da Despesa: JOÃO PAULO FERREIRA		
DEMONSTRAÇÃO				
CONTADOR	Detalhamento dos Descontos:		Despesa Bruta: 1.898,40	
TAYNARA PINTO TOMAZ CRC MG122692/O-5			Descontos: 0,00	
			Despesa Líquida: 1.898,40	
LIQUIDAÇÃO	ORDEM DE PAGAMENTO		CONTROLE INTERNO	
O MATERIAL OU SERVIÇO FOI ENTREGUE CONFORME SOLICITADO. / /	FACE À LIQUIDAÇÃO PROCESSADA DETERMINO O SEU PAGAMENTO. / /		EXAMINAMOS O PERCURSO DA DESPESA, EM CONFORMIDADE COM AS DISPOSIÇÕES LEGAIS QUE DISCIPLINAM O SEU PROCESSAMENTO.	
GERENTE ADMINISTRATIVO JOÃO PAULO FERREIRA	DIRETOR ADMINISTRATIVO JULIO CORREA GUIMARAES		ANALISTA DE CONFORMIDADE VITOR CORTEZÃO ANGELO GOMES	
RECIBO				
Recebi o valor acima descrito referente a despesa com materiais e / ou serviços acima especificado, para a qual dou quitação, para um só efeito.			Documento: (Tipo / Número)	
Data: / /			Banco: _____	
Nome _____			Cheque: _____	
Assinatura _____			Conta: _____	
			Recursos: _____	





CIMVALPI
CONSORCIO INTERMUNICIPAL
MULTISETORIAL DO VALE DO PIRANGA

Assinaturas do Documento



Documento Assinado Eletronicamente por **JÚLIO CORREA GUIMARÃES -**
ORDENADOR DE PAGAMENTO, CPF: 012.04*. **6-*0 em **07/10/2024 08:25:36**, Cód.
Autenticidade da Assinatura: **08K2.4825.836U.218V.7300**, Com fundamento na Lei Nº
14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Documento Assinado Eletronicamente por **VITOR CORTEZÃO ANGELO GOMES -**
ANALISTA DE CONFORMIDADE, CPF: 016.50*. **6-*2 em **04/10/2024 09:05:36**, Cód.
Autenticidade da Assinatura: **09U4.8E05.236X.9827.8085**, Com fundamento na Lei Nº
14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Documento Assinado Eletronicamente por **TAYNARA PINTO TOMAZ - CONTADOR**,
CPF: 110.27*. **6-*9 em **04/10/2024 09:01:13**, Cód. Autenticidade da Assinatura:
09H3.8R01.712W.U778.0781, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de
2020.



Documento Assinado Eletronicamente por **JOAO PAULO FERREIRA - GERENTE**
ADMINISTRATIVO, CPF: 052.42*. **6-*3 em **03/10/2024 16:46:24**, Cód. Autenticidade da
Assinatura: **16E4.8346.6244.R126.7517**, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de
Setembro de 2020.



Informações do Documento

ID do Documento: **A1D.616** - Tipo de Documento: **EXTRA ORÇAMENTO**.

Elaborado por **RONALDO ADRIANO DA SILVEIRA RIBEIRO**, CPF: 992.49*. **6-*4 , em **03/10/2024 -**
16:26:47

Código de Autenticidade deste Documento: 1695.2226.1467.H72A.6024

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
<https://zeropapel.cimvalpi.mg.gov.br/verdocumento>



 CIMVALPI - Consórcio Intermunicipal Multissetorial do Vale do Piranga ESTADO DE MINAS GERAIS		NOTA DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA <table><tr><td>Exercício 2024</td><td>Fonte 1.869.000.0000</td><td colspan="2">Número 07618</td></tr></table>			Exercício 2024	Fonte 1.869.000.0000	Número 07618	
Exercício 2024	Fonte 1.869.000.0000	Número 07618						
PROCESSO								
			Requisição de Compra Nº: EM:					
Convênio.....: 00447 - ST. ANT. DO GRAMA - 191/2024 IMPLAN			Vencimento:					
Centro de Custo.....: 00006 - INSS								
NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA-SE QUE SEJA EXECUTADA, NESTE EXERCÍCIO, A DESPESA A SEGUIR ESPECIFICADA.								
ORDEN DE PAGAMENTO DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Inss								
Favorecido: 000005 - INSS Endereço: Rua ST Saus Quadra 02 Bloco O , 6 - Andar , 70.070-946 Cidade: Brasília - DF Conta Bancária:			Telefone: CNPJ / CPF 29.979.036/0001-40					
Especificação da Despesa	VALOR REFERE-SE AO REPASSE DA RETENÇÃO DE INSS DA NOTA FISCAL 012 DA PONTAL ENGENHARIA LTDA.							
Valor: R\$ 2.657,76 (Dois Mil e Seiscentos e Cinquenta e Sete Reais e Setenta e Seis Centavos)								
Data: 03 / 10 / 2024	Ordenador da Despesa: JOÃO PAULO FERREIRA							
DEMONSTRAÇÃO								
CONTADOR	Detalhamento dos Descontos:	Despesa Bruta: 2.657,76						
TAYNARA PINTO TOMAZ CRC MG122692/O-5		Descontos: 0,00						
		Despesa Líquida: 2.657,76						
LIQUIDAÇÃO	ORDEM DE PAGAMENTO	CONTROLE INTERNO						
O MATERIAL OU SERVIÇO FOI ENTREGUE CONFORME SOLICITADO. / /	FACE À LIQUIDAÇÃO PROCESSADA DETERMINO O SEU PAGAMENTO. / /	EXAMINAMOS O PERCURSO DA DESPESA, EM CONFORMIDADE COM AS DISPOSIÇÕES LEGAIS QUE DISCIPLINAM O SEU PROCESSAMENTO.						
GERENTE ADMINISTRATIVO JOÃO PAULO FERREIRA	DIRETOR ADMINISTRATIVO JULIO CORREA GUIMARAES	ANALISTA DE CONFORMIDADE VITOR CORTEZÃO ANGELO GOMES						
RECIBO								
Recebi o valor acima descrito referente a despesa com materiais e / ou serviços acima especificado, para a qual dou quitação, para um só efeito.		Documento: (Tipo / Número)						
Data: / /		Banco: _____						
Nome _____		Cheque: _____						
Assinatura _____		Conta: _____						
		Recursos: _____						





Assinaturas do Documento



Documento Assinado Eletronicamente por **JÚLIO CORREA GUIMARÃES - ORDENADOR DE PAGAMENTO**, CPF: 012.04*. **6-*0 em **07/10/2024 08:25:36**, Cód. Autenticidade da Assinatura: 0825.3625.236K.963K.2068, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Documento Assinado Eletronicamente por **VITOR CORTEZÃO ANGELO GOMES - ANALISTA DE CONFORMIDADE**, CPF: 016.50*. **6-*2 em **04/10/2024 09:06:00**, Cód. Autenticidade da Assinatura: 09Z5.0Z06.7003.710X.1447, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Documento Assinado Eletronicamente por **TAYNARA PINTO TOMAZ - CONTADOR**, CPF: 110.27*. **6-*9 em **04/10/2024 09:01:13**, Cód. Autenticidade da Assinatura: 09X2.7K01.412W.E108.3727, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Documento Assinado Eletronicamente por **JOAO PAULO FERREIRA - GERENTE ADMINISTRATIVO**, CPF: 052.42*. **6-*3 em **03/10/2024 16:46:24**, Cód. Autenticidade da Assinatura: 16U5.1946.2243.V642.1706, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Informações do Documento

ID do Documento: **A1D.6C3** - Tipo de Documento: **EXTRA ORÇAMENTO**.

Elaborado por **RONALDO ADRIANO DA SILVEIRA RIBEIRO**, CPF: 992.49*. **6-*4 , em **03/10/2024 - 16:26:48**

Código de Autenticidade deste Documento: 16W0.8826.7463.X81H.6034

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
<https://zeropapel.cimvalpi.mg.gov.br/verdocumento>



15:58:37

Conta Corrente: 823708

Assinado por: SAMIRA GOMES PEREIRA DE FREITAS
VIVIANE APARECIDA SALGADO



Assinatura do Documento



Documento Assinado Eletronicamente por **VIVIANE APARECIDA SALGADO - CHEFE DO DEPARTAMENTO DE TESOUREARIA**, CPF: 064.80*. **6-*4 em 09/10/2024 16:01:54, Cód. Autenticidade da Assinatura: 16K5.7A01.8548.V506.7623, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Informações do Documento

ID do Documento: **A49.B32** - Tipo de Documento: **COMPROVANTE DE PAGAMENTO**.

Elaborado por **VIVIANE APARECIDA SALGADO**, CPF: 064.80*. **6-*4 , em 09/10/2024 - 16:01:54

Código de Autenticidade deste Documento: 1636.3401.154E.E751.7464

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
<https://zeropapel.cimvalpi.mg.gov.br/verdocumento>



09/10/2024

Detalhar Transação Pendente

15:58:09

Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)

Num. Pendência: 755909
Transação: Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)
Cooperativa: 3164
Conta Corrente: 823708

Dados da Transação

Tipo da Transferência: Titularidade/CPF diferente
Cooperativa de Débito: 3164
Conta de Débito: 82.370-8
Nome do Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO GRAMA
CPF/CNPJ do Favorecido: 18836973000120
Banco do Favorecido: 001 - BANCO DO BRASIL
Agência do Favorecido: 2538
Conta do Favorecido: 7.543-4 \ PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO GRAMA
Modalidade da Conta: Conta Corrente
Finalidade: PAG.IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS
Valor da Transferência: R\$ 911,23
Data da Transferência: 09/10/2024
Observação:

Transação efetuada com sucesso por: VIVIANE APARECIDA SALGADO

Assinado por: SAMIRA GOMES PEREIRA DE FREITAS
VIVIANE APARECIDA SALGADO





CIMVALPI

CONSORCIO INTERMUNICIPAL
MULTISETORIAL DO VALE DO PIRANGA

Assinatura do Documento



Documento Assinado Eletronicamente por **VIVIANE APARECIDA SALGADO - CHEFE DO DEPARTAMENTO DE TESOUREARIA**, CPF: 064.80*. **6-*4 em 09/10/2024 16:01:55, Cód. Autenticidade da Assinatura: 1661.7H01.054R.R852.7813, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Informações do Documento

ID do Documento: **A49.C20** - Tipo de Documento: **COMPROVANTE DE PAGAMENTO**.

Elaborado por **VIVIANE APARECIDA SALGADO**, CPF: 064.80*. **6-*4 , em 09/10/2024 - 16:01:55

Código de Autenticidade deste Documento: 16V1.3U01.3548.A304.4433

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:

<https://zeropapel.cimvalpi.mg.gov.br/verdocumento>



09/10/2024

Detalhar Transação Pendente

15:58:54

Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)

Num. Pendência: 755910
Transação: Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)
Cooperativa: 3164
Conta Corrente: 823708

Dados da Transação

Tipo da Transferência: Titularidade/CPF diferente
Cooperativa de Débito: 3164
Conta de Débito: 82.370-8
Nome do Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO GRAMA
CPF/CNPJ do Favorecido: 18836973000120
Banco do Favorecido: 001 - BANCO DO BRASIL
Agência do Favorecido: 2538
Conta do Favorecido: 7.543-4 \ PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO GRAMA
Modalidade da Conta: Conta Corrente
Finalidade: PAG.IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS
Valor da Transferência: R\$ 1.898,40
Data da Transferência: 09/10/2024
Observação:

Transação efetuada com sucesso por: VIVIANE APARECIDA SALGADO

Assinado por: SAMIRA GOMES PEREIRA DE FREITAS
VIVIANE APARECIDA SALGADO





CIMVALPI
CONSORCIO INTERMUNICIPAL
MULTISETORIAL DO VALE DO PIRANGA

Assinatura do Documento



Documento Assinado Eletronicamente por **VIVIANE APARECIDA SALGADO - CHEFE DO DEPARTAMENTO DE TESOUREARIA**, CPF: 064.80*.**6-*4 em 09/10/2024 16:01:56, Cód. Autenticidade da Assinatura: 16H6.7W01.254V.E06K.3252, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Informações do Documento

ID do Documento: **A49.C4D** - Tipo de Documento: **COMPROVANTE DE PAGAMENTO**.

Elaborado por **VIVIANE APARECIDA SALGADO**, CPF: 064.80*.**6-*4 , em 09/10/2024 - 16:01:56

Código de Autenticidade deste Documento: 16R6.5701.0548.735V.8726

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
<https://zeropapel.cimvalpi.mg.gov.br/verdocumento>



Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)

Num. Pendência: 755911
Transação: Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)
Cooperativa: 3164
Conta Corrente: 823708

Dados da Transação

Tipo da Transferência: Mesma titularidade/CPF
Cooperativa de Débito: 3164
Conta de Débito: 82.370-8
Banco do Favorecido: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Agência do Favorecido: 146
Conta do Favorecido: 628-2 \ EXPANSAO DE REDE
Modalidade da Conta: Conta Corrente
Finalidade: PAG.IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS
Valor da Transferência: R\$ 2.657,76
Data da Transferência: 09/10/2024
Observação:

Transação efetuada com sucesso por: VIVIANE APARECIDA SALGADO

Assinado por: SAMIRA GOMES PEREIRA DE FREITAS
VIVIANE APARECIDA SALGADO





CIMVALPI

CONSORCIO INTERMUNICIPAL
MULTISETORIAL DO VALE DO PIRANGA

Assinatura do Documento



Documento Assinado Eletronicamente por **VIVIANE APARECIDA SALGADO - CHEFE DO DEPARTAMENTO DE TESOUREARIA**, CPF: 064.80*. **6-*4 em 09/10/2024 16:01:57, Cód. Autenticidade da Assinatura: 16H6.8301.854H.V03K.5854, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Informações do Documento

ID do Documento: **A49.CE8** - Tipo de Documento: **COMPROVANTE DE PAGAMENTO**.

Elaborado por **VIVIANE APARECIDA SALGADO**, CPF: 064.80*. **6-*4 , em 09/10/2024 - 16:01:57

Código de Autenticidade deste Documento: 1634.3801.754R.327V.3535

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:

<https://zeropapel.cimvalpi.mg.gov.br/verdocumento>





CIMVALPI

CONSORCIO INTERMUNICIPAL
MULTISETORIAL DO VALE DO PIRANGA

Assinatura do Documento



Documento Assinado Eletronicamente por **VIVIANE APARECIDA SALGADO - CHEFE DO DEPARTAMENTO DE TESOUREARIA**, CPF: 064.80*.**6-*4 em 09/10/2024 16:01:58, Cód. Autenticidade da Assinatura: 1675.7201.554A.E724.3425, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Informações do Documento

ID do Documento: **A49.D20** - Tipo de Documento: **COMPROVANTE DE PAGAMENTO**.

Elaborado por **VIVIANE APARECIDA SALGADO**, CPF: 064.80*.**6-*4, em 09/10/2024 - 16:01:58

Código de Autenticidade deste Documento: 1622.7A01.254H.W879.4838

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:

<https://zeropapel.cimvalpi.mg.gov.br/verdocumento>



Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)

Num. Pendência: 758011
Transação: Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)
Cooperativa: 3164
Conta Corrente: 823708

Dados da Transação

Tipo da Transferência: Titularidade/CPF diferente
Cooperativa de Débito: 3164
Conta de Débito: 82.370-8
Nome do Favorecido: PONTAL ENGENHARIA
CPF/CNPJ do Favorecido: 05527293000183
Banco do Favorecido: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI
Agência do Favorecido: 50
Conta do Favorecido: 14.083-4 \ PONTAL ENGENHARIA
Modalidade da Conta: Conta Corrente
Finalidade: PAG.IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS
Valor da Transferência: R\$ 70.468,49
Data da Transferência: 11/10/2024
Observação:

Transação efetuada com sucesso por: JOAO PAULO FERREIRA

Assinado por: VIVIANE APARECIDA SALGADO
JOAO PAULO FERREIRA





CIMVALPI

CONSORCIO INTERMUNICIPAL
MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA

Assinatura do Documento



Documento Assinado Eletronicamente por **JOAO PAULO FERREIRA - GERENTE ADMINISTRATIVO**, CPF: 052.42*. **6-*3 em 11/10/2024 12:03:27, Cód. Autenticidade da Assinatura: 12V4.5803.227R.R153.0724, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Informações do Documento

ID do Documento: **A63.2C4** - Tipo de Documento: **COMPROVANTE DE PAGAMENTO**.

Elaborado por **JOAO PAULO FERREIRA**, CPF: 052.42*. **6-*3 , em 11/10/2024 - 12:03:27

Código de Autenticidade deste Documento: 1211.0A03.427X.E47Z.7201

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:

<https://zeropapel.cimvalpi.mg.gov.br/verdocumento>



Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)

Num. Pendência: 758195
Transação: Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)
Cooperativa: 3164
Conta Corrente: 823708

Dados da Transação

Tipo da Transferência: Titularidade/CPF diferente
Cooperativa de Débito: 3164
Conta de Débito: 82.370-8
Nome do Favorecido: PONTAL ENGENHARIA
CPF/CNPJ do Favorecido: 05527293000183
Banco do Favorecido: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Agência do Favorecido: 146
Conta do Favorecido: 578.554.574-4 \ PONTAL ENGENHARIA
Modalidade da Conta: Conta Corrente
Finalidade: PAG.IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS
Valor da Transferência: R\$ 70.468,49
Data da Transferência: 11/10/2024
Observação:

Transação efetuada com sucesso por: JOAO PAULO FERREIRA

Assinado por: VIVIANE APARECIDA SALGADO
JOAO PAULO FERREIRA





CIMVALPI

CONSORCIO INTERMUNICIPAL
MULTISETORIAL DO VALE DO PIRANGA

Assinatura do Documento



Documento Assinado Eletronicamente por **JOAO PAULO FERREIRA - GERENTE ADMINISTRATIVO**, CPF: 052.42*. **6-*3 em 11/10/2024 14:10:55, Cód. Autenticidade da Assinatura: 14W2.0E10.6557.X263.1284, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Informações do Documento

ID do Documento: **A64.625** - Tipo de Documento: **ERRATA**.

Elaborado por **JOAO PAULO FERREIRA**, CPF: 052.42*. **6-*3 , em 11/10/2024 - 14:10:55

Código de Autenticidade deste Documento: 1484.4H10.855W.1324.4448

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
<https://zeropapel.cimvalpi.mg.gov.br/verdocumento>

