

FORMULÁRIO DE MEDIÇÕES

RELATÓRIO PARCIAL (SITUAÇÃO: APROVADA PELO CONSÓRCIO)

Enviado por ANTONIO CARLOS MARTINS BRANDAO em 21/10/2024 - 10:35

Registro: 21/10/2024			3ª MEDIÇÃO									
Obra: CTP 0191/2024 - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE ACESSIBILIDADE			Período de 20/09/2024 a 20/10/2024									
Local: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA												
OBSERVAÇÕES												
Enviada por ANTONIO CARLOS MARTINS BRANDAO (FORNECEDOR) em 21/10/2024 às 10:35												
ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	QUANTIDADE MEDIDA	VALOR MEDIDO	SALDO (BDI)			
01	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO											
01.01	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA - para obras que exigem a utilização de grande quantidade de equipamentos e são executadas em centros urbanos ou próximos de centros urbanos. Obs.: Não se aplica aos serviços deTapa Buracos.											
01.01.01	OBRAS ATÉ O VALOR DE R\$ 1.000.000,00 - MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA PAVIMENTAÇÃO, EXCLUSIVE PARA TAPA-BURACOS	%	1	R\$ 25,00	R\$ 31,62	R\$ 31,62	0.5	1.5	R\$ 31,62	R\$ 593,82	R\$ 1.592,50	R\$ -1.560,88
06	PAVIMENTAÇÃO											
06.19	PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO DE CONCRETO											
06.19.01	PISO INTERTRAVADO 10X20CM E= 6,0CM 35MPA C/ COLCHAO AREIA	m²	2918.34	R\$ 85,13	R\$ 108,08	R\$ 315.414,19	1013.06	1013.06	R\$ 315.414,19	R\$ 109.491,52	R\$ 109.491,52	R\$ 205.922,67
09	URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES											
09.01	MEIO FIO PADRÃO SUDECAP											
09.01.02	MEIO FIO EM CONCRETO PRE-MOLDADO FCK>=20MPA, PADRÃO SUDECAP TIPO B, 40 X 15/12 (H X L1/L2), COMPRIMENTO 80CM	m	1980	R\$ 35,45	R\$ 45,01	R\$ 89.119,80	206	1461	R\$ 89.119,80	R\$ 9.272,06	R\$ 65.759,61	R\$ 23.360,19
15	ADMINISTRAÇÃO LOCAL											



15.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - % BASEADA ACÓRDÃO 2.622/2013 DO TCU SOBRE SOMA DOS ITENS 1 A 14	%	15.1	R\$ 329,17	R\$ 416,25	R\$ 6.285,38	6.55	19.65	R\$ 6.285,38	R\$ 7.817,91	R\$ 20.966,01	R\$ -14.680,64
						TOTAL:			R\$ 127.175,31	R\$ 341.057,86		

YURI ANDRADE COSTA LINS
Fiscal de Obras - CIMVALPI
CREA 233590/D
Aprovação: 22/10/2024

PEDRO MARTINO ZEFERINO
Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA
CREA 137.103/D

ANTÔNIO CARLOS MARTINS BRANDÃO
RT de Execução - PONTAL ENGENHARIA LTDA
CREA 45.957/D



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº 0062	OBRA: CTP 0191/2024 - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE ACESSIBILIDADE		CONTRATO:	RESP. TÉCNICO: ANTONIO CARLOS MARTINS BRANDÃO
ENDEREÇO: TRECHO DA RODOVIA DE ACESSO A SANTO ANTONIO DO GRAMA, BAIRRO NOVO HORIZONTE.		INÍCIO: 01/07/2024		Nº CREA-MG: 45957/D
CIDDE:		PRAZO: 31/12/2024		Nº DA ART:
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA		UF:		COORDENADAS:
DATA: 15/10/2024	SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA ☔	IMPRATICÁVEL ☔
MANHÃ		✓		
TARDE		✓		
QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO		QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
1	ENCARREGADO DE OBRAS		3	PEDREIRO
4	AJUDANTE			
QTDE	EQUIPAMENTO			
1	CAVADEIRA RETA			
1	CAMINHÃO 3/4			
3	PÁ			
1	EMPILHADEIRA			
3	MARRETA			
1	CHIBANCA			
3	ENXADA			
TAREFAS REALIZADAS				
NÚMERO DE T.R.	DESCRICAO			OBSERVAÇÕES
1	CARGA E DESCARGA DE PAVERS			
2	PAVIMENTAÇÃO EM PAVER DE CONCRETO			
3	ESPALHAMENTO DE AREIA NA PISTA PARA BERÇO			
4	DESCARGA DE AREIA PARA BERÇO NA OBRA			
REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)				





15 de out. de 2024 08:11:06
Rua Vicente Bretas Cupertino
Santo Antônio do Grama
Minas Gerais
Data não informada



15 de out. de 2024 08:10:29
Rua Vicente Bretas Cupertino
Santo Antônio do Grama
Minas Gerais
Data não informada



15 de out. de 2024 16:27:07
Santo Antônio do Grama
Minas Gerais
Data não informada

OCORRÊNCIAS		
NÚMERO DE OC	TIPO DE OCORRÊNCIA	DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA
CONFERÊNCIA		
MUNICÍPIO	CONSÓRCIO (Aprovado em 17/10/2024 - 14:34)	
Obs.:	Obs.:	
ASSINATURAS		
YURI ANDRADE COSTA LINS Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 233590/D	PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA CREA 137.103/D	ANTÔNIO CARLOS MARTINS BRANDÃO RT de Execução - PONTAL ENGENHARIA LTDA CREA 45.957/D



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº 0061	OBRA: CTP 0191/2024 - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE ACESSIBILIDADE	CONTRATO:		RESP. TÉCNICO: ANTONIO CARLOS MARTINS BRANDÃO	
ENDEREÇO: TRECHO DA RODOVIA DE ACESSO A SANTO ANTONIO DO GRAMA, BAIRRO NOVO HORIZONTE.		INÍCIO: 01/07/2024		Nº CREA-MG: 45957/D	
CIDDE:		PRAZO: 31/12/2024		Nº DA ART:	
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA		UF:		COORDENADAS:	
DATA: 14/10/2024	SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA ☔	IMPRATICÁVEL ☁	
MANHÃ		✓			
TARDE		✓			
QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO		QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	
1	ENCARREGADO DE OBRAS		3	PEDREIRO	
4	AJUDANTE				
QTDE	EQUIPAMENTO				
1	CAVADEIRA RETA				
1	CAMINHÃO 3/4				
3	PÁ				
2	CHIBANCA				
3	ENXADA				
3	CARRINHO DE MÃO				
TAREFAS REALIZADAS					
NÚMERO DE T.R.	DESCRIÇÃO			OBSERVAÇÕES	
1	CARGA / DESCARGA DE MEIO FIOS NA OBRA				
2	ESPALHAMENTO DE AREIA PARA BERÇO				
3	PAVIMENTAÇÃO EM PAVER DE CONCRETO				
REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)					

REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATORIOS)





14 de out. de 2024 16:23:31
190 Rua Vicente Bretas Cupertino
Santo Antônio do Grama
Minas Gerais
Data não informada



14 de out. de 2024 16:38:06
824 Rua Doutor Vicente Bretas Cupertino
Santo Antônio do Grama
Santo Antônio do Grama
Minas Gerais
Data não informada

OCORRÊNCIAS		
NÚMERO DE OC	TIPO DE OCORRÊNCIA	DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA
CONFERÊNCIA		
MUNICÍPIO	CONSÓRCIO (Aprovado em 17/10/2024 - 14:34)	
Obs.:	Obs.:	
ASSINATURAS		
YURI ANDRADE COSTA LINS Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 233590/D	PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA CREA 137.103/D	ANTÔNIO CARLOS MARTINS BRANDÃO RT de Execução - PONTAL ENGENHARIA LTDA CREA 45.957/D



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº 0060		OBRA: CTP 0191/2024 - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE ACESSIBILIDADE		CONTRATO:		RESP. TÉCNICO: ANTONIO CARLOS MARTINS BRANDÃO	
ENDEREÇO: TRECHO DA RODOVIA DE ACESSO A SANTO ANTONIO DO GRAMA, BAIRRO NOVO HORIZONTE.				INÍCIO: 01/07/2024		Nº CREA-MG: 45957/D	
CIDDE:				PRAZO: 31/12/2024		Nº DA ART:	
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA				UF:		COORDENADAS:	
DATA: 11/10/2024		SOL ☀		NUBLADO ☁		CHUVA ☔	
MANHÃ				✓			
TARDE				✓			
QTDE		MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO				QTDE	
1		ENCARREGADO DE OBRAS				1	
3		PEDREIRO				4	
QTDE		EQUIPAMENTO					
1		CAMINHÃO 3/4					
1		EMPILHADEIRA					
3		PÁ					
3		MARRETA					
2		CHIBANCA					
3		ENXADA					
3		CARRINHO DE MÃO					
TAREFAS REALIZADAS							
NÚMERO DE T.R.		DESCRICAO				OBSERVAÇÕES	
1		TRANSPORTE, ESPALHAMENTO E NIVELAMENTO DE AREIA				BERÇO DE AREIA PARA PAVIMENTAÇÃO	
2		CARGA E DESCARGA DE PAVERS PARA PAVIMENTAÇÃO					
3		TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO DE PAVERS				SOBRE BERÇO DE AREIA	
REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)							





OCORRÊNCIAS		
NÚMERO DE OC	TIPO DE OCORRÊNCIA	DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA
CONFERÊNCIA		
MUNICÍPIO	CONSÓRCIO (Aprovado em 14/10/2024 - 08:40)	
Obs.:	Obs.:	
ASSINATURAS		
YURI ANDRADE COSTA LINS Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 233590/D	PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA CREA 137.103/D	ANTÔNIO CARLOS MARTINS BRANDÃO RT de Execução - PONTAL ENGENHARIA LTDA CREA 45.957/D





CIMVALPI

CONSORCIO INTERMUNICIPAL
MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº 0059	OBRA: CTP 0191/2024 - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE ACESSIBILIDADE	CONTRATO:	RESP. TÉCNICO: ANTONIO CARLOS MARTINS BRANDÃO
ENDEREÇO: TRECHO DA RODOVIA DE ACESSO A SANTO ANTONIO DO GRAMA, BAIRRO NOVO HORIZONTE.		INÍCIO: 01/07/2024	Nº CREA-MG: 45957/D
CIDDE:		PRAZO: 31/12/2024	Nº DA ART:
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA		UF:	COORDENADAS:
DATA: 10/10/2024	SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA ☔
MANHÃ		✓	IMPRATICÁVEL ☔
TARDE			✓
QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
1	ENCARREGADO DE OBRAS	3	PEDREIRO
4	AJUDANTE		
QTDE	EQUIPAMENTO		
1	CAMINHÃO 3/4		
2	PÁ		
3	MARRETA		
2	CHIBANCA		
2	ENXADA		
2	CARRINHO DE MÃO		
TAREFAS REALIZADAS			
NÚMERO DE T.R.	DESCRICAO	OBSERVAÇÕES	
1	PAVIMENTAÇÃO EM PAVER DE CONCRETO		
2	TRANSPORTE E ESPALHAMENTO DE AREIA PARA BERÇO		
REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)			
 10 de out. de 2024 16:32:59 32 Praça Padre Antônio Ribeiro de Pinto Santo Antônio do Grama Minas Gerais Data não informada  10 de out. de 2024 16:33:27 190 Rua Vicente Bretas Cupertino Santo Antônio do Grama Minas Gerais Data não informada			



Pág.: 9 / 48 - ID. do Doc.: AA2.8F3 - 22/10/2024 - 11:56:05 - ASSINADO POR(2): CPF:084.94*.**6.*2 CPF:385.06*.**6.*4



OCORRÊNCIAS		
NÚMERO DE OC	TIPO DE OCORRÊNCIA	DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA
1		A CHUVA NO TURNO DA TARDE INVIABILIZOU A CONTINUIDADE DOS TRABALHOS
CONFERÊNCIA		
MUNICÍPIO	CONSÓRCIO (Aprovado em 11/10/2024 - 11:44)	
Obs.:	Obs.:	
ASSINATURAS		
YURI ANDRADE COSTA LINS Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 233590/D	PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA CREA 137.103/D	ANTÔNIO CARLOS MARTINS BRANDÃO RT de Execução - PONTAL ENGENHARIA LTDA CREA 45.957/D





CIMVALPI
CONSORCIO INTERMUNICIPAL
MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA


RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº 0058	OBRA: CTP 0191/2024 - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE ACESSIBILIDADE	CONTRATO:	RESP. TÉCNICO: ANTONIO CARLOS MARTINS BRANDÃO
ENDEREÇO: TRECHO DA RODOVIA DE ACESSO A SANTO ANTONIO DO GRAMA, BAIRRO NOVO HORIZONTE.		INÍCIO: 01/07/2024	Nº CREA-MG: 45957/D
CIDDE:		PRAZO: 31/12/2024	Nº DA ART:
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA		UF:	COORDENADAS:
DATA: 09/10/2024	SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA ☔
MANHÃ	✓		IMPRATICÁVEL ☔
TARDE		✓	
QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
1	ENCARREGADO DE OBRAS	3	PEDREIRO
4	AJUDANTE		
QTDE	EQUIPAMENTO		
2	CAVADEIRA RETA		
1	CAMINHÃO 3/4		
3	PÁ		
3	CHIBANCA		
3	ENXADA		
3	CARRINHO DE MÃO		
TAREFAS REALIZADAS			
NÚMERO DE T.R.	DESCRIÇÃO	OBSERVAÇÕES	
1	CARGA E DESCARGA DE PAVERS		
2	PAVIMENTAÇÃO EM PAVER SOBRE BERÇOS DE AREIA		
3	ESPALHAMENTO E NIVELAMENTO DE AREIA NA PISTA		
4	DESCARGA DE AREIA PARA BERÇO NA OBRA		
REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)			
 Data não informada		 9 de out. de 2024 16:56:23 32 Praça Padre Antônio Ribeiro de Pinto Santo Antônio do Grama Minas Gerais Data não informada	





Data não informada

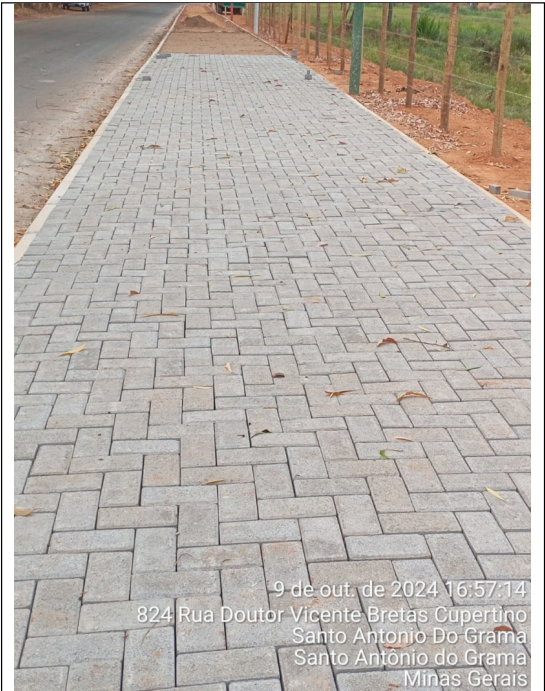

Data não informada

OCORRÊNCIAS		
NÚMERO DE OC	TIPO DE OCORRÊNCIA	DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA
CONFERÊNCIA		
MUNICÍPIO	CONSÓRCIO (Aprovado em 10/10/2024 - 10:08)	
Obs.:	Obs.:	
ASSINATURAS		
YURI ANDRADE COSTA LINS Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 233590/D	PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA CREA 137.103/D	ANTÔNIO CARLOS MARTINS BRANDÃO RT de Execução - PONTAL ENGENHARIA LTDA CREA 45.957/D





CIMVALPI
CONSORCIO INTERMUNICIPAL
MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº 0057	OBRA: CTP 0191/2024 - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE ACESSIBILIDADE	CONTRATO:	RESP. TÉCNICO: ANTONIO CARLOS MARTINS BRANDÃO
ENDEREÇO: TRECHO DA RODOVIA DE ACESSO A SANTO ANTONIO DO GRAMA, BAIRRO NOVO HORIZONTE.		INÍCIO: 01/07/2024	Nº CREA-MG: 45957/D
CIDDE:		PRAZO: 31/12/2024	Nº DA ART:
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA		UF:	COORDENADAS:
DATA: 08/10/2024	SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA ☔
MANHÃ			IMPRATICÁVEL ☔
TARDE	✓	✓	
QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
1	ENCARREGADO DE OBRAS	3	PEDREIRO
4	AJUDANTE		
QTDE	EQUIPAMENTO		
2	CAVADEIRA RETA		
1	CAMINHÃO 3/4		
3	PÁ		
3	CHIBANCA		
3	ENXADA		
3	CARRINHO DE MÃO		
TAREFAS REALIZADAS			
NÚMERO DE T.R.	DESCRIÇÃO	OBSERVAÇÕES	
1	RECEBIMENTO E DESCARGA DE PAVER NA OBRA		
2	ESCAVAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE MEIO FIO E SARJETA		
3	INSTALAÇÃO DE MEIO FIO PREMOLDADO		
4	COCRETAGEM E ACABAMENTO DE SARJETAS		
REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)			
 8 de out. de 2024 16:35:50 Santo Antônio do Grama Minas Gerais Data não informada  8 de out. de 2024 16:35:23 Santo Antônio do Grama Minas Gerais Data não informada			





OCORRÊNCIAS		
NÚMERO DE OC	TIPO DE OCORRÊNCIA	DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA
CONFERÊNCIA		
MUNICÍPIO	CONSÓRCIO (Aprovado em 09/10/2024 - 16:51)	
Obs.:	Obs.:	
ASSINATURAS		
YURI ANDRADE COSTA LINS Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 233590/D	PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA CREA 137.103/D	ANTÔNIO CARLOS MARTINS BRANDÃO RT de Execução - PONTAL ENGENHARIA LTDA CREA 45.957/D





CIMVALPI

CONSORCIO INTERMUNICIPAL
MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº 0056	OBRA: CTP 0191/2024 - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE ACESSIBILIDADE	CONTRATO:	RESP. TÉCNICO: ANTONIO CARLOS MARTINS BRANDÃO
ENDEREÇO: TRECHO DA RODOVIA DE ACESSO A SANTO ANTONIO DO GRAMA, BAIRRO NOVO HORIZONTE.		INÍCIO: 01/07/2024	Nº CREA-MG: 45957/D
CIDDE:	PRAZO: 31/12/2024	Nº DA ART:	
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA	UF:	COORDENADAS:	
DATA: 04/10/2024	SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA ☔
MANHÃ	✓		IMPRATICÁVEL ☔
TARDE	✓		
QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
1	ENCARREGADO DE OBRAS	3	PEDREIRO
5	AJUDANTE		
QTDE	EQUIPAMENTO		
2	CAVADEIRA RETA		
1	DAMPER		
3	PÁ		
2	CHIBANCA		
3	ENXADA		
2	CARRINHO DE MÃO		
TAREFAS REALIZADAS			
NÚMERO DE T.R.	DESCRICAO	OBSERVAÇÕES	
1	REJUNTAMENTO DE MEIO FIO PREMOLDADO		
2	CONCRETAGEM DE SARJETA		
3	ESCAVAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE MEIO FIO E SARJETA		
4	INSTALAÇÃO DE MEIO FIO PREMOLDADO		
REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)			
 4 de out. de 2024 15:11:59 Santo Antônio do Grama Minas Gerais Data não informada		 4 de out. de 2024 10:50:50 Santo Antônio do Grama Minas Gerais Data não informada	





OCORRÊNCIAS		
NÚMERO DE OC	TIPO DE OCORRÊNCIA	DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA
CONFERÊNCIA		
MUNICÍPIO	CONSÓRCIO (Aprovado em 04/10/2024 - 16:51)	
Obs.:	Obs.:	
ASSINATURAS		
YURI ANDRADE COSTA LINS Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 233590/D	PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA CREA 137.103/D	ANTÔNIO CARLOS MARTINS BRANDÃO RT de Execução - PONTAL ENGENHARIA LTDA CREA 45.957/D



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº 0055	OBRA: CTP 0191/2024 - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE ACESSIBILIDADE	CONTRATO:		RESP. TÉCNICO: ANTONIO CARLOS MARTINS BRANDÃO
ENDEREÇO: TRECHO DA RODOVIA DE ACESSO A SANTO ANTONIO DO GRAMA, BAIRRO NOVO HORIZONTE.		INÍCIO: 01/07/2024		Nº CREA-MG: 45957/D
CIDDE:		PRAZO: 31/12/2024		Nº DA ART:
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA		UF:		COORDENADAS:
DATA: 03/10/2024	SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA ☔	IMPRATICÁVEL ☁
MANHÃ	✓			
TARDE	✓			
QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO		QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
1	ENCARREGADO DE OBRAS		3	PEDREIRO
5	AJUDANTE			
QTDE	EQUIPAMENTO			
2	CAVADEIRA RETA			
1	DAMPER			
3	PÁ			
1	EMPILHADEIRA			
2	CHIBANCA			
3	ENXADA			
2	CARRINHO DE MÃO			
TAREFAS REALIZADAS				
NÚMERO DE T.R.	DESCRIÇÃO		OBSERVAÇÕES	
1	CONCRETAGEM DE SARJETA			
2	ESCAVAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE MEIO FIO E SARJETA			
3	INSTALAÇÃO DE MEIO FIO PREMOLDADO			
4	RECEBIMENTO E DESCARGA DE PEYVER PREMOLDADO			
REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)				

REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)





OCORRÊNCIAS		
NÚMERO DE OC	TIPO DE OCORRÊNCIA	DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA
CONFERÊNCIA		
MUNICÍPIO	CONSÓRCIO (Aprovado em 04/10/2024 - 16:51)	
Obs.:	Obs.:	
ASSINATURAS		
YURI ANDRADE COSTA LINS Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 233590/D	PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA CREA 137.103/D	ANTÔNIO CARLOS MARTINS BRANDÃO RT de Execução - PONTAL ENGENHARIA LTDA CREA 45.957/D






CIMVALPI
CONSORCIO INTERMUNICIPAL
MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº 0054	OBRA: CTP 0191/2024 - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE ACESSIBILIDADE	CONTRATO:	RESP. TÉCNICO: ANTONIO CARLOS MARTINS BRANDÃO	
ENDEREÇO: TRECHO DA RODOVIA DE ACESSO A SANTO ANTONIO DO GRAMA, BAIRRO NOVO HORIZONTE.		INÍCIO: 01/07/2024	Nº CREA-MG: 45957/D	
CIDDE:		PRAZO: 31/12/2024	Nº DA ART:	
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA		UF:	COORDENADAS:	
DATA: 02/10/2024	SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA ☔	IMPRATICÁVEL 🌧
MANHÃ	✓			
TARDE	✓			
QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	
1	ENCARREGADO DE OBRAS	3	PEDREIRO	
5	AJUDANTE			
QTDE	EQUIPAMENTO			
2	CAVADEIRA RETA			
3	PÁ			
2	CHIBANCA			
3	ENXADA			
2	CARRINHO DE MÃO			
TAREFAS REALIZADAS				
NÚMERO DE T.R.	DESCRICAO	OBSERVAÇÕES		
1	REJUNTAMENTO DE MEIO FIO PREMOLDADO			
2	ESCAVAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE MEIO FIO E SARJETA			
3	INSTALAÇÃO DE MEIO FIO PREMOLDADO			
REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)				
 2 de out. de 2024 16:28:56 Rua Vicente Bretas Cupertinoio Santo Antônio do Grama Minas Gerais Data não informada  2 de out. de 2024 16:27:28 Santo Antônio do Grama Minas Gerais Data não informada				



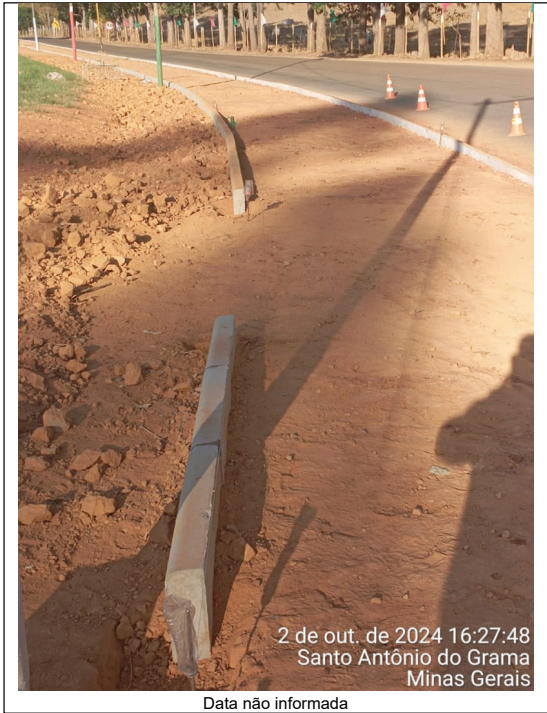

Data não informada



Data não informada

OCORRÊNCIAS		
NÚMERO DE OC	TIPO DE OCORRÊNCIA	DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA
CONFERÊNCIA		
MUNICÍPIO	CONSÓRCIO (Aprovado em 03/10/2024 - 15:58)	
Obs.:	Obs.:	
ASSINATURAS		
YURI ANDRADE COSTA LINS Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 233590/D	PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA CREA 137.103/D	ANTÔNIO CARLOS MARTINS BRANDÃO RT de Execução - PONTAL ENGENHARIA LTDA CREA 45.957/D





CIMVALPI

CONSORCIO INTERMUNICIPAL
MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº 0053	OBRA: CTP 0191/2024 - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE ACESSIBILIDADE	CONTRATO:	RESP. TÉCNICO: ANTONIO CARLOS MARTINS BRANDÃO
ENDEREÇO: TRECHO DA RODOVIA DE ACESSO A SANTO ANTONIO DO GRAMA, BAIRRO NOVO HORIZONTE.		INÍCIO: 01/07/2024	Nº CREA-MG: 45957/D
CIDDE:	PRAZO: 31/12/2024	Nº DA ART:	
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA	UF:	COORDENADAS:	
DATA: 01/10/2024	SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA ☔
MANHÃ	✓		IMPRATICÁVEL ☔
TARDE	✓		
QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
1	ENCARREGADO DE OBRAS	3	PEDREIRO
5	AJUDANTE		
QTDE	EQUIPAMENTO		
2	CAVADEIRA RETA		
3	PÁ		
2	CHIBANCA		
3	ENXADA		
2	CARRINHO DE MÃO		
TAREFAS REALIZADAS			
NÚMERO DE T.R.	DESCRICAO	OBSERVAÇÕES	
1	INSTALAÇÃO DE MEIO FIO PREMOLDADO		
2	ACERTO E NIVELAMENTO MANUAL DE PISTA		
3	ESCAVAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE MEIO FIO E SARGETA		
REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)			



1 de out. de 2024 16:29:47

Estrada sem nome

Santo Antônio do Grama

Minas Gerais

Data não informada



1 de out. de 2024 16:32:27

Rua Vicente Bretas Cupertino

Santo Antônio do Grama

Minas Gerais

Data não informada





OCORRÊNCIAS		
NÚMERO DE OC	TIPO DE OCORRÊNCIA	DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA
CONFERÊNCIA		
MUNICÍPIO	CONSÓRCIO (Aprovado em 03/10/2024 - 15:58)	
Obs.:	Obs.:	
ASSINATURAS		
YURI ANDRADE COSTA LINS Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 233590/D	PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA CREA 137.103/D	ANTÔNIO CARLOS MARTINS BRANDÃO RT de Execução - PONTAL ENGENHARIA LTDA CREA 45.957/D



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº 0052	OBRA: CTP 0191/2024 - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE ACESSIBILIDADE	CONTRATO:		RESP. TÉCNICO: ANTONIO CARLOS MARTINS BRANDÃO
ENDEREÇO: TRECHO DA RODOVIA DE ACESSO A SANTO ANTONIO DO GRAMA, BAIRRO NOVO HORIZONTE.		INÍCIO: 01/07/2024		Nº CREA-MG: 45957/D
CIDDE:		PRAZO: 31/12/2024		Nº DA ART:
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA		UF:		COORDENADAS:
DATA: 30/09/2024	SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA ☔	IMPRATICÁVEL ☔
MANHÃ	✓			
TARDE	✓			
QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO		QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
1	ENCARREGADO DE OBRAS		3	PEDREIRO
5	AJUDANTE			
QTDE	EQUIPAMENTO			
2	CAVADEIRA RETA			
1	DAMPER			
3	PÁ			
2	CHIBANCA			
3	ENXADA			
2	CARRINHO DE MÃO			
TAREFAS REALIZADAS				
NÚMERO DE T.R.	DESCRICAÇÃO		OBSERVAÇÕES	
1	ESCAVAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE MEIO FIO E SARJETA			
2	INSTALAÇÃO DE MEIO FIO PREMOLDADO			
3	REBOCO DE ARESTAS		PISTA DE PASSAGEM DE PEDRESTRE	
REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)				

REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATORIOS)






Data não informada



Data não informada

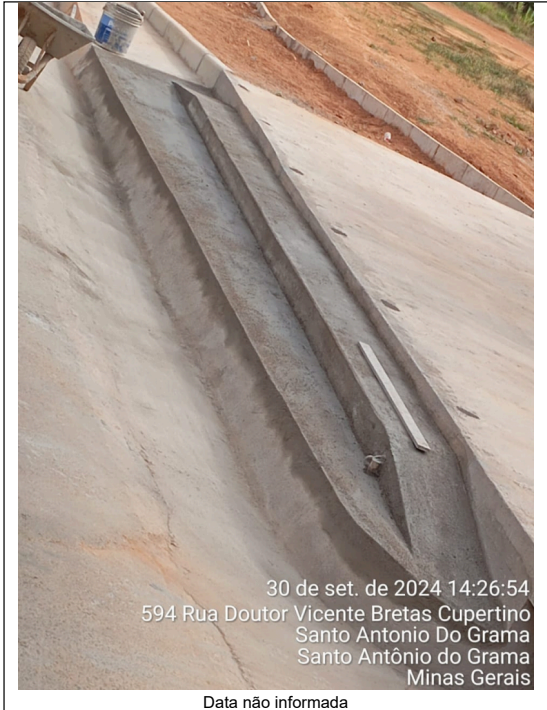

Data não informada



Data não informada

OCORRÊNCIAS		
NÚMERO DE OC	TIPO DE OCORRÊNCIA	DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA
CONFERÊNCIA		
MUNICÍPIO	CONSÓRCIO (Aprovado em 03/10/2024 - 15:57)	
Obs.:	Obs.:	
ASSINATURAS		
YURI ANDRADE COSTA LINS Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 233590/D	PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA CREA 137.103/D	ANTÔNIO CARLOS MARTINS BRANDÃO RT de Execução - PONTAL ENGENHARIA LTDA CREA 45.957/D





CIMVALPI
CONSORCIO INTERMUNICIPAL
MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº 0051	OBRA: CTP 0191/2024 - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE ACESSIBILIDADE	CONTRATO:	RESP. TÉCNICO: ANTONIO CARLOS MARTINS BRANDÃO
ENDEREÇO: TRECHO DA RODOVIA DE ACESSO A SANTO ANTONIO DO GRAMA, BAIRRO NOVO HORIZONTE.		INÍCIO: 01/07/2024	Nº CREA-MG: 45957/D
CIDDE:		PRAZO: 31/12/2024	Nº DA ART:
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA		UF:	COORDENADAS:
DATA: 27/09/2024	SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA ☔
MANHÃ	✓		IMPRATICÁVEL ☔
TARDE	✓		
QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
1	ENCARREGADO DE OBRAS	3	PEDREIRO
5	AJUDANTE		
QTDE	EQUIPAMENTO		
2	CAVADEIRA RETA		
1	DAMPER		
3	PÁ		
2	CHIBANCA		
3	ENXADA		
2	CARRINHO DE MÃO		
TAREFAS REALIZADAS			
NÚMERO DE T.R.	DESCRIÇÃO	OBSERVAÇÕES	
1	CONCRETAGEM DE SARJETA		
2	INSTALAÇÃO DE MEIO FIO PREMOLDADO		
3	REBOCO DE ARESTAS	PISTA DE PASSAGEM DE PEDRESTRE	
4	ESCAVAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE MEIO FIO E SARJETA		
REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)			
 27 de set. de 2024 15:18:25 594 Rua Doutor Vicente Bretas Cupertino Santo Antonio Do Grama Santo Antônio do Grama Minas Gerais Data não informada  27 de set. de 2024 09:34:29 Rua Vicente Bretas Cupertino Santo Antônio do Grama Minas Gerais Data não informada			





Data não informada



Data não informada



Data não informada



Data não informada

OCORRÊNCIAS		
NÚMERO DE OC	TIPO DE OCORRÊNCIA	DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA
CONFERÊNCIA		
MUNICÍPIO	CONSÓRCIO (Aprovado em 30/09/2024 - 16:16)	
Obs.:	Obs.:	
ASSINATURAS		
YURI ANDRADE COSTA LINS Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 233590/D PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA CREA 137.103/D ANTÔNIO CARLOS MARTINS BRANDÃO RT de Execução - PONTAL ENGENHARIA LTDA CREA 45.957/D		






CIMVALPI

CONSORCIO INTERMUNICIPAL
MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº 0050	OBRA: CTP 0191/2024 - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE ACESSIBILIDADE	CONTRATO:	RESP. TÉCNICO: ANTONIO CARLOS MARTINS BRANDÃO
ENDEREÇO: TRECHO DA RODOVIA DE ACESSO A SANTO ANTONIO DO GRAMA, BAIRRO NOVO HORIZONTE.		INÍCIO: 01/07/2024	Nº CREA-MG: 45957/D
CIDDE:		PRAZO: 31/12/2024	Nº DA ART:
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA		UF:	COORDENADAS:
DATA: 26/09/2024	SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA ☔
MANHÃ	✓		IMPRATICÁVEL ☔
TARDE	✓		
QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
1	ENCARREGADO DE OBRAS	3	PEDREIRO
5	AJUDANTE		
QTDE	EQUIPAMENTO		
2	CAVADEIRA RETA		
3	PÁ		
2	CHIBANCA		
3	ENXADA		
2	CARRINHO DE MÃO		
TAREFAS REALIZADAS			
NÚMERO DE T.R.	DESCRICAO	OBSERVAÇÕES	
1	ESCAVAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE MEIO FIO E SARJETA		
2	REJUNTAMENTO DE MEIO FIO PREMOLDADO		
3	INSTALAÇÃO DE MEIO FIO PREMOLDADO		
REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)			
 26 de set. de 2024 16:28:52 Rua Vicente Bretas Cupertinoio Santo Antonio do Grama Minas Gerais Data não informada  26 de set. de 2024 16:28:01 Rua Vicente Bretas Cupertinoio Santo Antonio do Grama Minas Gerais Data não informada			



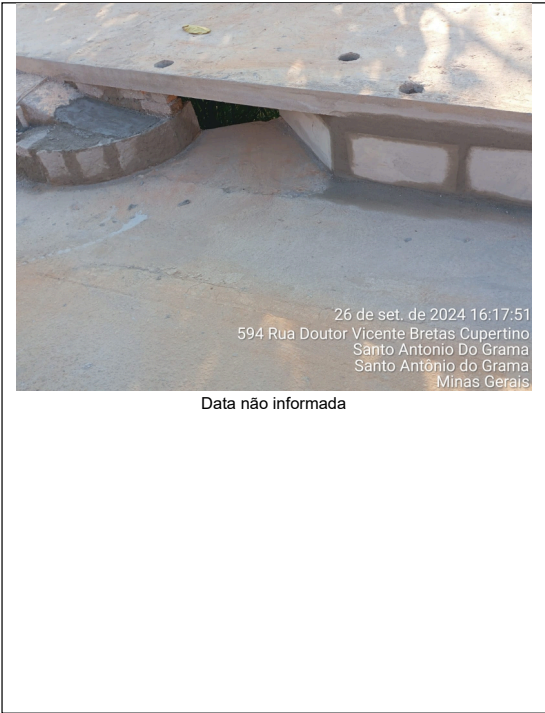

OCORRÊNCIAS		
NÚMERO DE OC	TIPO DE OCORRÊNCIA	DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA
CONFERÊNCIA		
MUNICÍPIO	CONSÓRCIO (Aprovado em 27/09/2024 - 15:33)	
Obs.:	Obs.:	
ASSINATURAS		
YURI ANDRADE COSTA LINS Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 233590/D	PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA CREA 137.103/D	ANTÔNIO CARLOS MARTINS BRANDÃO RT de Execução - PONTAL ENGENHARIA LTDA CREA 45.957/D



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº 0049		OBRA: CTP 0191/2024 - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE ACESSIBILIDADE		CONTRATO:		RESP. TÉCNICO: ANTONIO CARLOS MARTINS BRANDÃO	
ENDEREÇO: TRECHO DA RODOVIA DE ACESSO A SANTO ANTONIO DO GRAMA, BAIRRO NOVO HORIZONTE.				INÍCIO: 01/07/2024		Nº CREA-MG: 45957/D	
CIDDE:				PRAZO: 31/12/2024		Nº DA ART:	
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA				UF:		COORDENADAS:	
DATA: 25/09/2024		SOL ☀		NUBLADO ☁		CHUVA ☔	
MANHÃ		✓				IMPRATICÁVEL ☔	
TARDE		✓					
QTDE		MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO				QTDE	
1		ENCARREGADO DE OBRAS				3	
5		AJUDANTE					
QTDE		EQUIPAMENTO					
2		CAVADEIRA RETA					
3		PÁ					
2		CHIBANCA					
3		ENXADA					
2		CARRINHO DE MÃO					
TAREFAS REALIZADAS							
NÚMERO DE T.R.		DESCRIÇÃO				OBSERVAÇÕES	
1		ESCAVAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE MEIO FIO E SARJETA					
2		INSTALAÇÃO DE MEIO FIO PREMOLDADO					
REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)							

REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)





OCORRÊNCIAS		
NÚMERO DE OC	TIPO DE OCORRÊNCIA	DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA
CONFERÊNCIA		
MUNICÍPIO	CONSÓRCIO (Aprovado em 27/09/2024 - 15:33)	
Obs.:	Obs.:	
ASSINATURAS		
YURI ANDRADE COSTA LINS Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 233590/D PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA CREA 137.103/D ANTÔNIO CARLOS MARTINS BRANDÃO RT de Execução - PONTAL ENGENHARIA LTDA CREA 45.957/D		





CIMVALPI
CONSORCIO INTERMUNICIPAL
MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº 0048	OBRA: CTP 0191/2024 - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE ACESSIBILIDADE	CONTRATO:	RESP. TÉCNICO: ANTONIO CARLOS MARTINS BRANDÃO
ENDEREÇO: TRECHO DA RODOVIA DE ACESSO A SANTO ANTONIO DO GRAMA, BAIRRO NOVO HORIZONTE.		INÍCIO: 01/07/2024	Nº CREA-MG: 45957/D
CIDDE:		PRAZO: 31/12/2024	Nº DA ART:
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA		UF:	COORDENADAS:
DATA: 24/09/2024	SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA ☔
MANHÃ	✓		IMPRATICÁVEL ☔
TARDE	✓		
QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
1	ENCARREGADO DE OBRAS	3	PEDREIRO
5	AJUDANTE		
QTDE	EQUIPAMENTO		
2	CAVADEIRA RETA		
1	DAMPER		
3	PÁ		
2	CHIBANCA		
3	ENXADA		
2	CARRINHO DE MÃO		
TAREFAS REALIZADAS			
NÚMERO DE T.R.	DESCRIÇÃO	OBSERVAÇÕES	
1	REJUNTE DE MEIO FIO PREMOLDADO		
2	INSTALAÇÃO DE MEIO FIO PREMOLDADO		
3	CONCRETAGEM DE SARJETA		
4	ESCAVAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE MEIO FIO E SARJETA		
5	REBOCO DE ARESTAS	PISTA DE PASSAGEM DE PEDRESTRE	
REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATORIOS)			
 24 de set. de 2024 16:19:33 594 Rua Doutor Vicente Bretas Cupertino Santo Antonio Do Grama Santo Antônio do Grama Minas Gerais Data não informada  24 de set. de 2024 16:20:20 640 Rua Doutor Vicente Bretas Cupertino Santo Antonio Do Grama Santo Antônio do Grama Minas Gerais Data não informada			



Pág.: 31 / 48 - ID. do Doc.: AA2.8F3 - 22/10/2024 - 11:56:05 - ASSINADO POR(2): CPF:084.94*.**6.*2 CPF:385.06*.**6.*4



Data não informada



Data não informada



Data não informada



Data não informada

OCORRÊNCIAS		
NÚMERO DE OC	TIPO DE OCORRÊNCIA	DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA
CONFERÊNCIA		
MUNICÍPIO	CONSÓRCIO (Aprovado em 27/09/2024 - 15:32)	
Obs.:	Obs.:	
ASSINATURAS		
YURI ANDRADE COSTA LINS Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 233590/D PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA CREA 137.103/D ANTÔNIO CARLOS MARTINS BRANDÃO RT de Execução - PONTAL ENGENHARIA LTDA CREA 45.957/D		





CIMVALPI
CONSORCIO INTERMUNICIPAL
MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº 0047	OBRA: CTP 0191/2024 - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE ACESSIBILIDADE	CONTRATO:	RESP. TÉCNICO: ANTONIO CARLOS MARTINS BRANDÃO	
ENDEREÇO: TRECHO DA RODOVIA DE ACESSO A SANTO ANTONIO DO GRAMA, BAIRRO NOVO HORIZONTE.		INÍCIO: 01/07/2024	Nº CREA-MG: 45957/D	
CIDDE:		PRAZO: 31/12/2024	Nº DA ART:	
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA		UF:	COORDENADAS:	
DATA: 23/09/2024	SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA ☔	IMPRATICÁVEL 🌧
MANHÃ	✓			
TARDE	✓			
QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	
1	ENCARREGADO DE OBRAS	3	PEDREIRO	
5	AJUDANTE			
QTDE	EQUIPAMENTO			
2	CAVADEIRA RETA			
1	DAMPER			
3	PÁ			
2	CHIBANCA			
3	ENXADA			
2	CARRINHO DE MÃO			
TAREFAS REALIZADAS				
NÚMERO DE T.R.	DESCRICAÇÃO	OBSERVAÇÕES		
1	CONCRETAGEM DE SARJETA			
2	INSTALAÇÃO DE MEIO FIO PREMOLDADO			
3	ESCAVAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE MEIO FIO E SARJETA			
4	CONCRETAGEM DE PASSEIO			
REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)				
 23 de set. de 2024 16:41:12 594 Rua Doutor Vicente Bretas Cupertino Santo Antonio Do Grama Santo Antônio do Grama Minas Gerais Data não informada  23 de set. de 2024 16:40:21 640 Rua Doutor Vicente Bretas Cupertino Santo Antonio Do Grama Santo Antônio do Grama Minas Gerais Data não informada				





Data não informada



Data não informada



Data não informada



Data não informada

OCORRÊNCIAS		
NÚMERO DE OC	TIPO DE OCORRÊNCIA	DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA
CONFERÊNCIA		
MUNICÍPIO	CONSÓRCIO (Aprovado em 24/09/2024 - 09:19)	
Obs.:	Obs.:	
ASSINATURAS		
YURI ANDRADE COSTA LINS Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 233590/D	PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA CREA 137.103/D	ANTÔNIO CARLOS MARTINS BRANDÃO RT de Execução - PONTAL ENGENHARIA LTDA CREA 45.957/D




RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº 0046	OBRA: CTP 0191/2024 - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE ACESSIBILIDADE	CONTRATO:	RESP. TÉCNICO: ANTONIO CARLOS MARTINS BRANDÃO
ENDEREÇO: TRECHO DA RODOVIA DE ACESSO A SANTO ANTONIO DO GRAMA, BAIRRO NOVO HORIZONTE.		INÍCIO: 01/07/2024	Nº CREA-MG: 45957/D
CIDDE:	PRAZO: 31/12/2024	Nº DA ART:	
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA	UF:	COORDENADAS:	
DATA: 21/09/2024	SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA ☔
MANHÃ	✓		IMPRATICÁVEL ☔
TARDE	✓		
QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
1	ENCARREGADO DE OBRAS	3	PEDREIRO
5	AJUDANTE		
QTDE	EQUIPAMENTO		
2	CAVADEIRA RETA		
1	DAMPER		
3	PÁ		
2	CHIBANCA		
3	ENXADA		
3	CARRINHO DE MÃO		
1	BETONEIRA		
TAREFAS REALIZADAS			
NÚMERO DE T.R.	DESCRICAO	OBSERVAÇÕES	
1	CONCRETAGEM DE ARRIMO DA RAMPA DE ACESSO.	PASSAGEM DE PEDESTRE	
2	INSTALAÇÃO DE MEIO FIO PREMOLDADO		
3	ESCAVAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DE ARRIMO	PASSAGEM DE PEDESTRE	
4	CONCRETAGEM DE SARGETA E PASSEIO		

REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)



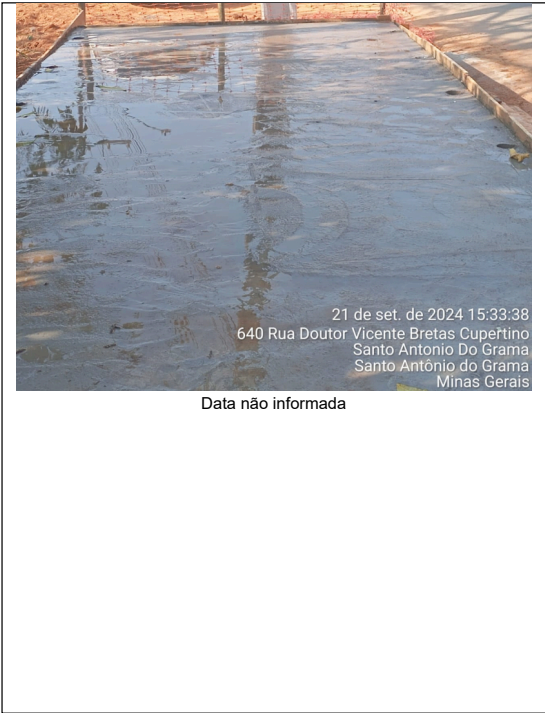

OCORRÊNCIAS		
NÚMERO DE OC	TIPO DE OCORRÊNCIA	DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA
CONFERÊNCIA		
MUNICÍPIO	CONSÓRCIO (Aprovado em 23/09/2024 - 11:16)	
Obs.:	Obs.:	
ASSINATURAS		
YURI ANDRADE COSTA LINS Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 233590/D	PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA CREA 137.103/D	ANTÔNIO CARLOS MARTINS BRANDÃO RT de Execução - PONTAL ENGENHARIA LTDA CREA 45.957/D



 CIMVALPI CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO		
Nº 0045		OBRA: CTP 0191/2024 - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE ACESSIBILIDADE	CONTRATO:	RESP. TÉCNICO: ANTONIO CARLOS MARTINS BRANDÃO
ENDEREÇO: TRECHO DA RODOVIA DE ACESSO A SANTO ANTONIO DO GRAMA, BAIRRO NOVO HORIZONTE.		INÍCIO: 01/07/2024		Nº CREA-MG: 45957/D
CIDDE:		PRAZO: 31/12/2024		Nº DA ART:
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA		UF:		COORDENADAS:
DATA: 20/09/2024	SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA ☔	IMPRATICÁVEL 🌧
MANHÃ	✓			
TARDE	✓			
QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO		QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
1	ENCARREGADO DE OBRAS		3	PEDREIRO
5	AJUDANTE			
QTDE	EQUIPAMENTO			
1	DAMPER			
3	PÁ			
3	ENXADA			
2	CARRINHO DE MÃO			
TAREFAS REALIZADAS				
NÚMERO DE T.R.	DESCRICAO		OBSERVAÇÕES	
1	CONCRETAGEM DE PISTA DE PASAGEM DE PEDRESTRE			
2	CONCRETAGEM DE SARJETA			
REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)				
 20 de set. de 2024 16:29:23 Santo Antônio do Grama Minas Gerais Data não informada  20 de set. de 2024 14:37:39 594 Rua Doutor Vicente Bretas Cupertino Santo Antonio Do Grama Santo Antônio do Grama Minas Gerais Data não informada				





OCORRÊNCIAS		
NÚMERO DE OC	TIPO DE OCORRÊNCIA	DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA
CONFERÊNCIA		
MUNICÍPIO	CONSÓRCIO (Aprovado em 20/09/2024 - 16:57)	
Obs.:	Obs.:	
ASSINATURAS		
YURI ANDRADE COSTA LINS Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 233590/D	PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA CREA 137.103/D	ANTÔNIO CARLOS MARTINS BRANDÃO RT de Execução - PONTAL ENGENHARIA LTDA CREA 45.957/D



**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS -****RDO**

Nº 0063	OBRA: CTP 0191/2024 - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE ACESSIBILIDADE	CONTRATO:	RESP. TÉCNICO: ANTONIO CARLOS MARTINS BRANDÃO
ENDEREÇO: TRECHO DA RODOVIA DE ACESSO A SANTO ANTONIO DO GRAMA, BAIRRO NOVO HORIZONTE.		INÍCIO: 01/07/2024	Nº CREA-MG: 45957/D
CIDDE:		PRAZO: 31/12/2024	Nº DA ART:
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA		UF:	COORDENADAS:
DATA: 16/10/2024	SOL ☀️	NUBLADO ☁️	CHUVA ☔
MANHÃ	✓		IMPRATICÁVEL ☔
TARDE	✓		
QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
1	ENCARREGADO DE OBRAS	3	PEDREIRO
4	AJUDANTE		
QTDE	EQUIPAMENTO		
1	CAMINHÃO 3/4		
2	PÁ		
1	EMPILHADEIRA		
3	MARRETA		
3	ENXADA		
3	CARRINHO DE MÃO		
TAREFAS REALIZADAS			
NÚMERO DE T.R.	DESCRICAÇÃO	OBSERVAÇÕES	
1	ESPALHAMENTO DE AREIA PARA BERÇO NA PISTA		
2	DESCARGA DE AREIA PARA BERÇO NA OBRA		
3	RECEBIMENTO E DESCARREGAMENTO DE PAVER NA OBRA		
4	RECEBIMENTO E DESCARREGAMENTO DE MEIO FIO NA OBRA		
5	PAVIMENTAÇÃO EM PAVER DE CONCRETO		
6	CAGA, DESCARGA DE PAVER ENTRE O DEPOSITO E A PISTA		
REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)			



16 de out. de 2024 16:48:11
824 Rua Doutor Vicente Bretas Cupertino
Santo Antonio Do Gramma
Santo Antônio do Gramma
Minas Gerais



16 de out. de 2024 16:41:26
Rua Vicente Bretas Cupertinoio
Santo Antônio do Gramma
Minas Gerais

OCORRÊNCIAS		
NÚMERO DE OC	TIPO DE OCORRÊNCIA	DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA
OBSERVAÇÕES		
CONFERÊNCIA		

MUNICÍPIO		CONSÓRCIO (Aprovado em 17/10/2024 - 14:35)
Obs.:		Obs.:
ASSINATURAS		
YURI ANDRADE COSTA LINS Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 233590/D	PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA CREA 137.103/D	ANTÔNIO CARLOS MARTINS BRANDÃO RT de Execução - PONTAL ENGENHARIA LTDA CREA 45.957/D






CIMVALPI
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL
MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS -

RDO

Nº 0064	OBRA: CTP 0191/2024 - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE ACESSIBILIDADE	CONTRATO:	RESP. TÉCNICO: ANTONIO CARLOS MARTINS BRANDÃO
ENDEREÇO: TRECHO DA RODOVIA DE ACESSO A SANTO ANTONIO DO GRAMA, BAIRRO NOVO HORIZONTE.		INÍCIO: 01/07/2024	Nº CREA-MG: 45957/D
CIDDE:		PRAZO: 31/12/2024	Nº DA ART:
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA		UF:	COORDENADAS:
DATA: 17/10/2024	SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA ☔
MANHÃ		✓	
TARDE	✓		
QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
1	ENCARREGADO DE OBRAS	3	PEDREIRO
5	AJUDANTE		
QTDE	EQUIPAMENTO		
1	CAMINHÃO 3/4		
1	EMPILHADEIRA		
3	PÁ		
2	CHIBANCA		
3	ENXADA		
3	CARRINHO DE MÃO		
TAREFAS REALIZADAS			
NÚMERO DE T.R.	DESCRICAO	OBSERVAÇÕES	
1	ESPALHAMENTO DE AREIA PARA BERÇO NA PISTA		
2	PAVIMENTAÇÃO EM PAVER DE CONCRETO		
3	CARGA E DESCARGA DE PAVERS		
REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)			



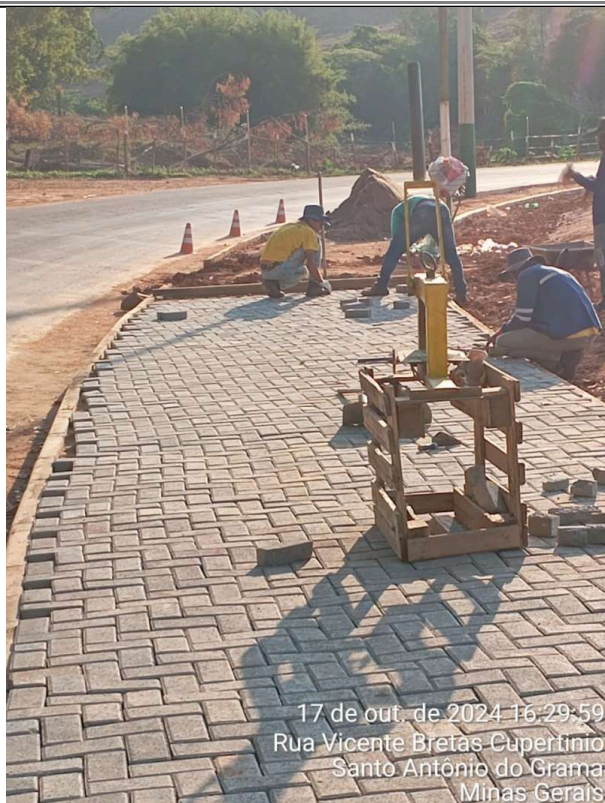

Data não informada



Data não informada		Data não informada	
 17 de out. de 2024 16:28:57 824 Rua Doutor Vicente Bretas Cupertino Santo Antonio Do Grama Santo Antônio do Grama Minas Gerais			
Data não informada			
OCORRÊNCIAS			
NÚMERO DE OC	TIPO DE OCORRÊNCIA	DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA	
OBSERVAÇÕES			
CONFERÊNCIA			
MUNICÍPIO		CONSÓRCIO (Aprovado em 22/10/2024 - 09:01)	
Obs.:		Obs.: O CIMVALPI orienta refazer o assentamento do paiver onde o mesmo ficou desalinhado	
ASSINATURAS			
YURI ANDRADE COSTA LINS Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 233590/D		PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA CREA 137.103/D	
		ANTÔNIO CARLOS MARTINS BRANDÃO RT de Execução - PONTAL ENGENHARIA LTDA CREA 45.957/D	



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS -

RDO

Nº 0065	OBRA: CTP 0191/2024 - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE ACESSIBILIDADE	CONTRATO:	RESP. TÉCNICO: ANTONIO CARLOS MARTINS BRANDÃO
ENDEREÇO: TRECHO DA RODOVIA DE ACESSO A SANTO ANTONIO DO GRAMA, BAIRRO NOVO HORIZONTE.		INÍCIO: 01/07/2024	Nº CREA-MG: 45957/D
CIDDE:		PRAZO: 31/12/2024	Nº DA ART:
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA		UF:	COORDENADAS:
DATA: 18/10/2024	SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA ☔
MANHÃ	✓		IMPRATICÁVEL ☁
TARDE	✓		
QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
1	ENCARREGADO DE OBRAS	3	PEDREIRO
5	AJUDANTE		
QTDE	EQUIPAMENTO		
1	CORTADOR DE PEYVER		
3	PÁ		
1	CAMINHÃO CARROCERIA		
1	EMPILHADEIRA		
3	ENXADA		
2	CARRINHO DE MÃO		
TAREFAS REALIZADAS			
NÚMERO DE T.R.	DESCRICAÇÃO	OBSERVAÇÕES	
1	ESPALHAMENTO DE AREIA PARA BERÇO NA PISTA		
2	PAVIMENTAÇÃO EM PEYVER DE CONCRETO		
3	RECEBIMENTO E DESCARGA DE PEYVER		
REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)			





Data não informada



Data não informada



Data não informada



Data não informada



Data não informada

OCORRÊNCIAS		
NÚMERO DE OC	TIPO DE OCORRÊNCIA	DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA
OBSERVAÇÕES		
CONFERÊNCIA		
MUNICÍPIO	CONSÓRCIO (Aprovado em 22/10/2024 - 09:02)	
Obs.:	Obs.: Alinhamento do paiver corrigido conforme orientação	
ASSINATURAS		
YURI ANDRADE COSTA LINS Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 233590/D	PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA CREA 137.103/D	ANTÔNIO CARLOS MARTINS BRANDÃO RT de Execução - PONTAL ENGENHARIA LTDA CREA 45.957/D



CIMVALPI

CONSORCIO INTERMUNICIPAL
MULTISETORIAL DO VALE DO PIRANGA

Assinaturas do Documento



Documento Assinado Eletronicamente por **YURI ANDRADE COSTA LINS**, CPF: 084.94*. **6- *2 em **22/10/2024 13:24:17**, Cód. Autenticidade da Assinatura: **1334.7924.1172.U119.0546**, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Documento Assinado Eletronicamente por **ANTONIO CARLOS MARTINS BRANDÃO**, CPF: 385.06*. **6- *4 em **22/10/2024 11:59:28**, Cód. Autenticidade da Assinatura: **11E6.4459.7282.E273.4762**, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Informações do Documento

ID do Documento: **AA2.8F3** - Tipo de Documento: **FORMULÁRIO DE MEDIÇÕES.**

Elaborado por **GILBERTO ARAUJO GOMIDES**, CPF: 069.58*. **6- *7, em **22/10/2024 - 11:56:05**

Código de Autenticidade deste Documento: 1140.0456.5051.9031.2137

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
<https://zeropapel.cimvalpi.mg.gov.br/verdocumento>

