



FORMULÁRIO DE MEDIÇÕES

RELATÓRIO PARCIAL (SITUAÇÃO: APROVADA PELO CONSÓRCIO)

Enviado por ANTONIO CARLOS MARTINS BRANDAO em 25/11/2024 - 08:48

Registro: 25/11/2024			4ª MEDIÇÃO									
Obra: CTP 0191/2024 - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE ACESSIBILIDADE			Período de 21/10/2024 a 20/11/2024									
Local: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA												
OBSERVAÇÕES												
Enviada por ANTONIO CARLOS MARTINS BRANDAO (FORNECEDOR) em 25/11/2024 às 08:48												
ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	QUANTIDADE MEDIDA	VALOR MEDIDO	SALDO (BDI)			
01	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO											
01.01	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA - para obras que exigem a utilização de grande quantidade de equipamentos e são executadas em centros urbanos ou próximos de centros urbanos. Obs.: Não se aplica aos serviços deTapa Buracos.											
01.01.01	OBRAS ATÉ O VALOR DE R\$ 1.000.000,00 - MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA PAVIMENTAÇÃO, EXCLUSIVE PARA TAPA-BURACOS	%	1	R\$ 25,00	R\$ 31,62	R\$ 31,62	0.5	2	R\$ 31,62	R\$ 706,41	R\$ 2.298,91	R\$ -2.267,29
02	INSTALAÇÕES DA OBRA											
02.05	BANHEIRO QUIMICO											
02.05.01	BANHEIRO QUIMICO 110 cm x 120 cm x 230 cm COM MANUTENÇÃO	mês	5	R\$ 628,10	R\$ 797,37	R\$ 3.986,85	2	4	R\$ 3.986,85	R\$ 1.594,74	R\$ 3.189,48	R\$ 797,37
06	PAVIMENTAÇÃO											
06.19	PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO DE CONCRETO											
06.19.01	PISO INTERTRAVADO 10X20CM E= 6,0CM 35MPA C/ COLCHAO AREIA	m²	2918.34	R\$ 85,13	R\$ 108,08	R\$ 315.414,19	1190	2203.06	R\$ 315.414,19	R\$ 128.615,20	R\$ 238.106,72	R\$ 77.307,47
09	URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES											
09.01	MEIO FIO PADRÃO SUDECAP											



09.01.02	MEIO FIO EM CONCRETO PRE-MOLDADO FCK>=20MPA, PADRÃO SUDECAP TIPO B, 40 X 15/12 (H X L1/L2), COMPRIMENTO 80CM	m	1980	R\$ 35,45	R\$ 45,01	R\$ 89.119,80	246	1707	R\$ 89.119,80	R\$ 11.072,46	R\$ 76.832,07	R\$ 12.287,73
15	ADMINISTRAÇÃO LOCAL											
15.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - % BASEADA ACÓRDÃO 2.622/2013 DO TCU SOBRE SOMA DOS ITENS 1 A 14	%	15.1	R\$ 329,17	R\$ 416,25	R\$ 6.285,38	6.55	26.2	R\$ 6.285,38	R\$ 9.300,27	R\$ 30.266,28	R\$ -23.980,91
						TOTAL:				R\$ 151.289,08	R\$ 492.346,94	

YURI ANDRADE COSTA LINS
Fiscal de Obras - CIMVALPI
CREA 233590/D
Aprovação: 25/11/2024


PEDRO MARTINO ZEFERINO
Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA
CREA 137.103/D


ANTÔNIO CARLOS MARTINS BRANDÃO
RT de Execução - PONTAL ENGENHARIA LTDA
CREA 45.957/D



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº 0086	OBRA: CTP 0191/2024 - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE ACESSIBILIDADE		CONTRATO:		RESP. TÉCNICO: ANTONIO CARLOS MARTINS BRANDÃO	
ENDEREÇO: TRECHO DA RODOVIA DE ACESSO A SANTO ANTONIO DO GRAMA, BAIRRO NOVO HORIZONTE.			INÍCIO: 01/07/2024		Nº CREA-MG: 45957/D	
CIDDE:			PRAZO: 31/12/2024		Nº DA ART:	
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA			UF:		COORDENADAS:	
DATA: 19/11/2024	SOL ☀		NUBLADO ☁		CHUVA ☔	IMPRATICÁVEL ☔
MANHÃ	✓					
TARDE	✓					
QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO				QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
1	ENCARREGADO DE OBRAS				3	PEDREIRO
5	AJUDANTE					
QTDE	EQUIPAMENTO					
1	EMPILHadeira					
3	PÁ					
1	CAMINHÃO CARROCERIA					
1	ROLO COMPACTADOR					
2	CHIBANCA					
3	ENXADA					
4	CARRINHO DE MÃO					
1	SERRA DE BANCADA					
TAREFAS REALIZADAS						
NÚMERO DE T.R.	DESCRICAÇÃO				OBSERVAÇÕES	
1	PAVIMENTAÇÃO EM PEYVER DE CONCRETO					
2	ESPALHAMENTO DE AREIA PARA BERÇO NA PISTA					
3	TRANSPORTE DE PEYVER PARA PROXIMO DO CANTEIRO					
4	RECEBIMENTO E DESCARGA DE MEIO FIO NA OBRA					
5	COMPACTAÇÃO DE CALCAMENTO EM PEYVER					
REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)						

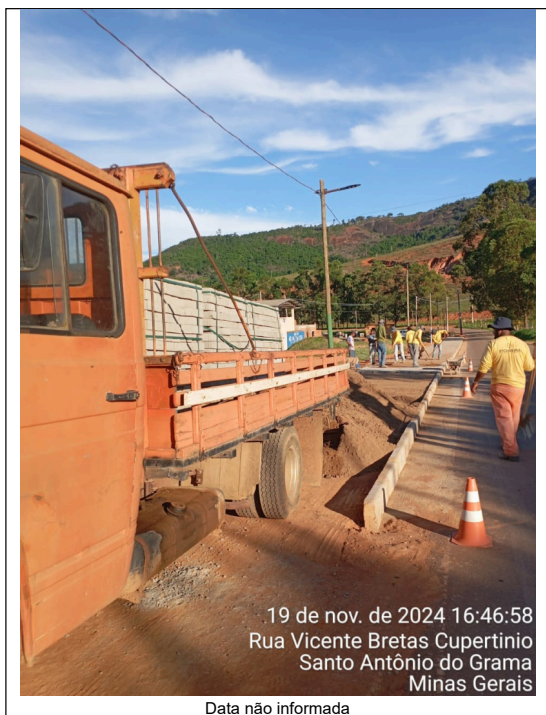

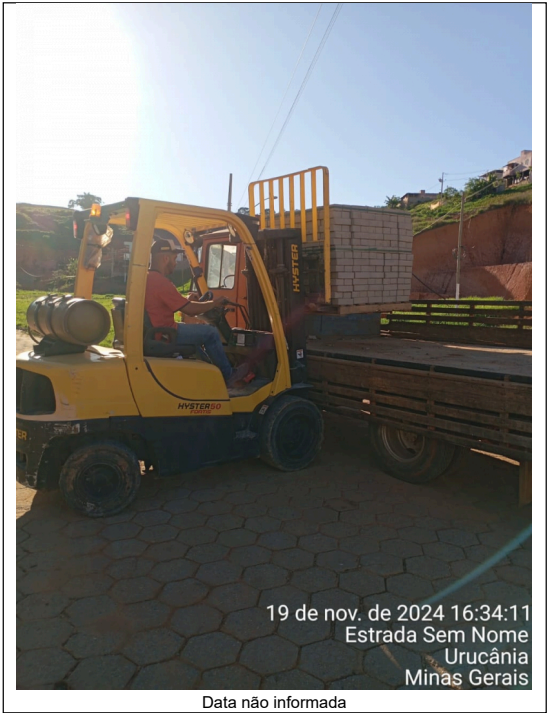

Ocorrências		
NÚMERO DE OC	TIPO DE OCORRÊNCIA	DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA
CONFERÊNCIA		
MUNICÍPIO	CONSÓRCIO (Aprovado em 25/11/2024 - 13:24)	
Obs.:	Obs.:	
ASSINATURAS		
YURI ANDRADE COSTA LINS Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 233590/D	PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTONIO DO GRAMA CREA 137.103/D	ANTÔNIO CARLOS MARTINS BRANDÃO RT de Execução - PONTAL ENGENHARIA LTDA CREA 45.957/D





CIMVALPI
CONSORCIO INTERMUNICIPAL
MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº 0085	OBRA: CTP 0191/2024 - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE ACESSIBILIDADE	CONTRATO:	RESP. TÉCNICO: ANTONIO CARLOS MARTINS BRANDÃO
ENDEREÇO: TRECHO DA RODOVIA DE ACESSO A SANTO ANTONIO DO GRAMA, BAIRRO NOVO HORIZONTE.		INÍCIO: 01/07/2024	Nº CREA-MG: 45957/D
CIDDE:		PRAZO: 31/12/2024	Nº DA ART:
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA		UF:	COORDENADAS:
DATA: 18/11/2024	SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA ☔
MANHÃ		✓	IMPRATICÁVEL ☔
TARDE	✓		
QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
1	ENCARREGADO DE OBRAS	3	PEDREIRO
5	AJUDANTE		
QTDE	EQUIPAMENTO		
1	DAMPER		
3	PÁ		
3	ENXADA		
5	CARRINHO DE MÃO		
1	BETONEIRA		
TAREFAS REALIZADAS			
NÚMERO DE T.R.	DESCRICAÇÃO	OBSERVAÇÕES	
1	PAVIMENTAÇÃO EM PEYVER DE CONCRETO		
2	CONCRETAGEM DE SARGETA		
3	ESPALHAMENTO DE AREIA PARA BERÇO NA PISTA		
REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)			



18 de nov. de 2024 13:05:44
Santo Antônio do Grama
Minas Gerais

Data não informada



18 de nov. de 2024 16:18:03
Rua Vicente Bretas Cupertino
Santo Antônio do Grama
Minas Gerais

Data não informada





Data não informada



Data não informada



Data não informada



Data não informada





18 de nov. de 2024 16:22:26
Estrada Sem Nome
Santo Antônio do Grama
Minas Gerais

Data não informada

OCORRÊNCIAS		
NÚMERO DE OC	TIPO DE OCORRÊNCIA	DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA
CONFERÊNCIA		
MUNICÍPIO	CONSÓRCIO (Aprovado em 25/11/2024 - 13:24)	
Obs.:	Obs.:	
ASSINATURAS		
YURI ANDRADE COSTA LINS Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 233590/D	PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA CREA 137.103/D	ANTÔNIO CARLOS MARTINS BRANDÃO RT de Execução - PONTAL ENGENHARIA LTDA CREA 45.957/D



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº 0084	OBRA: CTP 0191/2024 - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE ACESSIBILIDADE	CONTRATO:	RESP. TÉCNICO: ANTONIO CARLOS MARTINS BRANDÃO
ENDEREÇO: TRECHO DA RODOVIA DE ACESSO A SANTO ANTONIO DO GRAMA, BAIRRO NOVO HORIZONTE.	INÍCIO: 01/07/2024	Nº CREA-MG: 45957/D	
CIDDE:	PRAZO: 31/12/2024	Nº DA ART:	
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA	UF:	COORDENADAS:	
DATA: 14/11/2024	SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA ☔
MANHÃ	✓		IMPRATICÁVEL ☔
TARDE	✓		
QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
1	ENCARREGADO DE OBRAS	3	PEDREIRO
5	AJUDANTE		
QTDE	EQUIPAMENTO		
2	CAVADEIRA RETA		
1	DAMPER		
3	PÁ		
1	CAMINHÃO CARROCERIA		
1	ROLO COMPACTADOR		
2	CHIBANCA		
3	ENXADA		
4	CARRINHO DE MÃO		
1	SERRA DE BANCADA		
TAREFAS REALIZADAS			
NÚMERO DE T.R.	DESCRIÇÃO	OBSERVAÇÕES	
1	CONCRETAGEM DE SARGETA		
2	COMPACTAÇÃO DE CALCAMENTO EM PEYVER		
3	ESPALHAMENTO DE AREIA PARA BERÇO NA PISTA		
4	ESCAVAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE MEIO FIO E SARJETA		
5	INSTALAÇÃO DE MEIO FIO PREMOLDADO		
6	PAVIMENTAÇÃO EM PEYVER DE CONCRETO		
7	TRANSPORTE DE PEYVER PARA PROXIMO DO CANTEIRO		

REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)







Data não informada

OCORRÊNCIAS		
NÚMERO DE OC	TIPO DE OCORRÊNCIA	DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA
CONFERÊNCIA		
MUNICÍPIO	CONSÓRCIO (Aprovado em 25/11/2024 - 13:23)	
Obs.:	Obs.:	
ASSINATURAS		
YURI ANDRADE COSTA LINS Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 233590/D	PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA CREA 137.103/D	ANTÔNIO CARLOS MARTINS BRANDÃO RT de Execução - PONTAL ENGENHARIA LTDA CREA 45.957/D





CIMVALPI

CONSORCIO INTERMUNICIPAL
MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº 0083	OBRA: CTP 0191/2024 - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE ACESSIBILIDADE	CONTRATO:	RESP. TÉCNICO: ANTONIO CARLOS MARTINS BRANDÃO
ENDEREÇO: TRECHO DA RODOVIA DE ACESSO A SANTO ANTONIO DO GRAMA, BAIRRO NOVO HORIZONTE.		INÍCIO: 01/07/2024	Nº CREA-MG: 45957/D
CIDDE:		PRAZO: 31/12/2024	Nº DA ART:
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA		UF:	COORDENADAS:
DATA: 13/11/2024	SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA ☔
MANHÃ		✓	IMPRATICÁVEL ☔
TARDE		✓	
QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
1	ENCARREGADO DE OBRAS	3	PEDREIRO
5	AJUDANTE		
QTDE	EQUIPAMENTO		
2	CAVADEIRA RETA		
3	PÁ		
1	ROLO COMPACTADOR		
3	ENXADA		
4	CARRINHO DE MÃO		
1	SERRA DE BANCADA		
TAREFAS REALIZADAS			
NÚMERO DE T.R.	DESCRICAO	OBSERVAÇÕES	
1	ESPALHAMENTO DE AREIA PARA BERÇO NA PISTA		
2	PAVIMENTAÇÃO EM PEYVER DE CONCRETO		
3	COMPACTAÇÃO DE CALCAMENTO EM PEYVER		
4	RECEBIMENTO E DESCARGA DE MEIO FIO NA OBRA		
REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)			
 13 de nov. de 2024 12:15:29 Rua Vicente Bretas Cupertino Santo Antônio do Grama Minas Gerais Data não informada  13 de nov. de 2024 12:14:03 Rua Vicente Bretas Cupertino Santo Antônio do Grama Minas Gerais  13 de nov. de 2024 12:15:32 Rua Vicente Bretas Cupertino Santo Antônio do Grama Minas Gerais Data não informada 			



Pág.: 11 / 50 - ID. do Doc.: B6E.276 - 25/11/2024 - 14:22:59 - ASSINADO POR(2): CPF:385.06*.**6-4 CPF:084.94*.**6-2

Data não informada		
OCORRÊNCIAS		
NÚMERO DE OC	TIPO DE OCORRÊNCIA	DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA
CONFERÊNCIA		
MUNICÍPIO	CONSÓRCIO (Aprovado em 14/11/2024 - 11:52)	
Obs.:	Obs.:	
ASSINATURAS		
YURI ANDRADE COSTA LINS Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 233590/D	PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA CREA 137.103/D	ANTÔNIO CARLOS MARTINS BRANDÃO RT de Execução - PONTAL ENGENHARIA LTDA CREA 45.957/D



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº 0082		OBRA: CTP 0191/2024 - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE ACESSIBILIDADE		CONTRATO:		RESP. TÉCNICO: ANTONIO CARLOS MARTINS BRANDÃO	
ENDEREÇO: TRECHO DA RODOVIA DE ACESSO A SANTO ANTONIO DO GRAMA, BAIRRO NOVO HORIZONTE.				INÍCIO: 01/07/2024		Nº CREA-MG: 45957/D	
CIDDE:				PRAZO: 31/12/2024		Nº DA ART:	
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA				UF:		COORDENADAS:	
DATA: 12/11/2024		SOL ☀		NUBLADO ☁		CHUVA ☔	
MANHÃ		✓				IMPRATICÁVEL ☔	
TARDE		✓					
QTDE		MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO				QTDE	
1		ENCARREGADO DE OBRAS				3	
5		AJUDANTE				PEDREIRO	
QTDE		EQUIPAMENTO					
2		CAVADEIRA RETA					
3		PÁ					
1		CAMINHÃO CARROCERIA					
1		ROLO COMPACTADOR					
2		CHIBANCA					
3		ENXADA					
4		CARRINHO DE MÃO					
1		SERRA DE BANCADA					
TAREFAS REALIZADAS							
NÚMERO DE T.R.		DESCRICAÇÃO				OBSERVAÇÕES	
1		REJUNTAMENTO DE MEIO FIO PREMOLDADO					
2		LIMPEZA DE SARGETA					
3		PAVIMENTAÇÃO EM PEYVER DE CONCRETO					
4		ESPALHAMENTO DE AREIA PARA BERÇO NA PISTA					
5		DESCARGA DE AREIA PARA BERÇO NA OBRA					
6		COMPACTAÇÃO DE CALÇAMENTO EM PEYVER					
7		RECEBIMENTO E DESCARGA DE MEIO FIO NA OBRA					
REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)							

REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)





Data não informada



Data não informada



Data não informada



Data não informada

OCORRÊNCIAS		
NÚMERO DE OC	TIPO DE OCORRÊNCIA	DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA
CONFERÊNCIA		
MUNICÍPIO	CONSÓRCIO (Aprovado em 14/11/2024 - 11:51)	
Obs.:	Obs.:	
ASSINATURAS		

YURI ANDRADE COSTA LINS

PEDRO MARTINO ZEFERINO

ANTÔNIO CARLOS MARTINS BRANDÃO



Fiscal de Obras - CIMVALPI
CREA 233590/D

Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA
CREA 137.103/D

RT de Execução - PONTAL ENGENHARIA LTDA
CREA 45.957/D



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº 0081		OBRA: CTP 0191/2024 - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE ACESSIBILIDADE		CONTRATO:		RESP. TÉCNICO: ANTONIO CARLOS MARTINS BRANDÃO	
ENDEREÇO: TRECHO DA RODOVIA DE ACESSO A SANTO ANTONIO DO GRAMA, BAIRRO NOVO HORIZONTE.				INÍCIO: 01/07/2024		Nº CREA-MG: 45957/D	
CIDDE:				PRAZO: 31/12/2024		Nº DA ART:	
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA				UF:		COORDENADAS:	
DATA: 11/11/2024		SOL ☀		NUBLADO ☁		CHUVA ☔	
MANHÃ		✓		✓		IMPRATICÁVEL ☁	
TARDE		✓					
QTDE		MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO				QTDE	
1		ENCARREGADO DE OBRAS				3	
5		AJUDANTE				PEDREIRO	
QTDE		EQUIPAMENTO					
3		PÁ					
1		CAMINHÃO CARROCERIA					
1		ROLO COMPACTADOR					
3		ENXADA					
4		CARRINHO DE MÃO					
1		SERRA DE BANCADA					
TAREFAS REALIZADAS							
NÚMERO DE T.R.		DESCRICAÇÃO				OBSERVAÇÕES	
1		COMPACTAÇÃO DE CALÇAMENTO EM PEYVER					
2		RECEBIMENTO E DESCARGA DE CIMENTO					
3		ESPALHAMENTO DE AREIA PARA BERÇO NA PISTA					
4		PAVIMENTAÇÃO EM PEYVER DE CONCRETO					
5		TRANSPORTE DE PEYVER PARA PROXIMO DO CANTEIRO					
REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)							





OCORRÊNCIAS		
NÚMERO DE OC	TIPO DE OCORRÊNCIA	DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA
CONFERÊNCIA		
MUNICÍPIO	CONSÓRCIO (Aprovado em 14/11/2024 - 11:51)	
Obs.:	Obs.:	
ASSINATURAS		
YURI ANDRADE COSTA LINS Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 233590/D	PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTONIO DO GRAMA CREA 137.103/D	ANTÔNIO CARLOS MARTINS BRANDÃO RT de Execução - PONTAL ENGENHARIA LTDA CREA 45.957/D





CIMVALPI
CONSORCIO INTERMUNICIPAL
MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº 0080	OBRA: CTP 0191/2024 - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE ACESSIBILIDADE	CONTRATO:	RESP. TÉCNICO: ANTONIO CARLOS MARTINS BRANDÃO
ENDEREÇO: TRECHO DA RODOVIA DE ACESSO A SANTO ANTONIO DO GRAMA, BAIRRO NOVO HORIZONTE.		INÍCIO: 01/07/2024	Nº CREA-MG: 45957/D
CIDDE:		PRAZO: 31/12/2024	Nº DA ART:
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA		UF:	COORDENADAS:
DATA: 08/11/2024	SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA ☔
MANHÃ	✓		IMPRATICÁVEL ☔
TARDE		✓	
QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
1	ENCARREGADO DE OBRAS	3	PINTOR
5	AJUDANTE		
QTDE	EQUIPAMENTO		
1	CORTADOR DE PEYVER		
3	PÁ		
1	CAMINHÃO CARROCERIA		
2	CHIBANCA		
3	ENXADA		
4	CARRINHO DE MÃO		
TAREFAS REALIZADAS			
NÚMERO DE T.R.	DESCRICAO	OBSERVAÇÕES	
1	TRANSPORTE DE PEYVER PARA PROXIMO DO CANTEIRO		
2	ESPALHAMENTO DE AREIA NA PISTA PARA BERÇO		
3	PAVIMENTAÇÃO EM PEYVER DE CONCRETO		
4	ACERTO E NIVELAMENTO DE PISTA MANUAL		
REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)			
 8 de nov. de 2024 09:37:26 Santo Antônio do Grama Minas Gerais Data não informada  8 de nov. de 2024 16:17:26 Rua Vicente Bretas Cupertino Santo Antônio do Grama Minas Gerais Data não informada			





Data não informada



Data não informada



Data não informada

OCORRÊNCIAS		
NÚMERO DE OC	TIPO DE OCORRÊNCIA	DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA
CONFERÊNCIA		
MUNICÍPIO	CONSÓRCIO (Aprovado em 08/11/2024 - 16:43)	
Obs.:	Obs.:	
ASSINATURAS		
YURI ANDRADE COSTA LINS Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 233590/D	PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTONIO DO GRAMA CREA 137.103/D	ANTÔNIO CARLOS MARTINS BRANDÃO RT de Execução - PONTAL ENGENHARIA LTDA CREA 45.957/D



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº 0079	OBRA: CTP 0191/2024 - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE ACESSIBILIDADE	CONTRATO:	RESP. TÉCNICO: ANTONIO CARLOS MARTINS BRANDÃO
ENDEREÇO: TRECHO DA RODOVIA DE ACESSO A SANTO ANTONIO DO GRAMA, BAIRRO NOVO HORIZONTE.	INÍCIO: 01/07/2024	Nº CREA-MG: 45957/D	
CIDDE:	PRAZO: 31/12/2024	Nº DA ART:	
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA	UF:	COORDENADAS:	
DATA: 07/11/2024	SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA ☔
MANHÃ	✓		IMPRATICÁVEL ☔
TARDE	✓		
QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
1	ENCARREGADO DE OBRAS	3	PEDREIRO
5	AJUDANTE		
QTDE	EQUIPAMENTO		
1	CORTADOR DE PEYVER		
3	PÁ		
2	MARRETA		
1	ROLO COMPACTADOR		
2	CHIBANCA		
3	ENXADA		
4	CARRINHO DE MÃO		
	TAREFAS REALIZADAS		
NÚMERO DE T.R.	DESCRIÇÃO	OBSERVAÇÕES	
1	CONSTRUÇÃO DE RAMPA DE ACESSO A PISTA DE ACESSIBIL		
2	PAVIMENTAÇÃO EM PEYVER DE CONCRETO		
3	REBAIXAMENTO DE SARGETA PARA ESCOAMENTO DE AGUA		
4	COMPACTAÇÃO DE PISTA COM ROLO		

REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)





OCORRÊNCIAS		
NÚMERO DE OC	TIPO DE OCORRÊNCIA	DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA
CONFERÊNCIA		
MUNICÍPIO	CONSÓRCIO (Aprovado em 08/11/2024 - 11:39)	
Obs.:	Obs.:	
ASSINATURAS		
YURI ANDRADE COSTA LINS Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 233590/D	PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTONIO DO GRAMA CREA 137.103/D	ANTÔNIO CARLOS MARTINS BRANDÃO RT de Execução - PONTAL ENGENHARIA LTDA CREA 45.957/D



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº 0078	OBRA: CTP 0191/2024 - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE ACESSIBILIDADE	CONTRATO:	
ENDEREÇO: TRECHO DA RODOVIA DE ACESSO A SANTO ANTONIO DO GRAMA, BAIRRO NOVO HORIZONTE.		RESP. TÉCNICO: ANTONIO CARLOS MARTINS BRANDÃO	
CIDDE:		INÍCIO: 01/07/2024	Nº CREA-MG: 45957/D
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA		PRAZO: 31/12/2024	Nº DA ART:
		UF:	COORDENADAS:
DATA: 06/11/2024	SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA ☔
MANHÃ	✓		IMPRATICÁVEL ☔
TARDE	✓		
QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
1	ENCARREGADO DE OBRAS	3	PEDREIRO
5	AJUDANTE		
QTDE	EQUIPAMENTO		
1	CORTADOR DE PEYVER		
3	PÁ		
1	CAMINHÃO CARROCERIA		
1	EMPILHADEIRA		
2	CHIBANCA		
3	ENXADA		
5	CARRINHO DE MÃO		
TAREFAS REALIZADAS			
NÚMERO DE T.R.	DESCRICAO	OBSERVAÇÕES	
1	ACERTO E NIVELAMENTO DE PISTA MANUAL		
2	COMPACTAÇÃO DE CALCAMENTO EM PEYVER		
3	ESPALHAMENTO DE AREIA PARA BERÇO NA PISTA		
4	TRANSPORTE DE PEYVER PARA PROXIMO DO CANTEIRO		
5	PAVIMENTAÇÃO EM PEYVER DE CONCRETO		
REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)			

REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATORIOS)





OCORRÊNCIAS		
NÚMERO DE OC	TIPO DE OCORRÊNCIA	DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA
CONFERÊNCIA		
MUNICÍPIO	CONSÓRCIO (Aprovado em 07/11/2024 - 15:38)	
Obs.:	Obs.:	
ASSINATURAS		

YURI ANDRADE COSTA LINS

PEDRO MARTINO ZEFERINO

ANTÔNIO CARLOS MARTINS BRANDÃO



Fiscal de Obras - CIMVALPI
CREA 233590/D

Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA
CREA 137.103/D

RT de Execução - PONTAL ENGENHARIA LTDA
CREA 45.957/D



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº 0077		OBRA: CTP 0191/2024 - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE ACESSIBILIDADE		CONTRATO:		RESP. TÉCNICO: ANTONIO CARLOS MARTINS BRANDÃO	
ENDEREÇO: TRECHO DA RODOVIA DE ACESSO A SANTO ANTONIO DO GRAMA, BAIRRO NOVO HORIZONTE.				INÍCIO: 01/07/2024		Nº CREA-MG: 45957/D	
CIDDE:				PRAZO: 31/12/2024		Nº DA ART:	
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA				UF:		COORDENADAS:	
DATA: 05/11/2024		SOL ☀		NUBLADO ☁		CHUVA ☔	
MANHÃ				✓			
TARDE						✓	
QTDE		MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO				QTDE	
1		ENCARREGADO DE OBRAS				3	
5		AJUDANTE					
QTDE		EQUIPAMENTO					
1		CORTADOR DE PEYVER					
3		PÁ					
1		CAMINHÃO CARROCERIA					
1		EMPILHADEIRA					
1		ROLO COMPACTADOR					
2		CHIBANCA					
3		ENXADA					
5		CARRINHO DE MÃO					
TAREFAS REALIZADAS							
NÚMERO DE T.R.		DESCRICAÇÃO				OBSERVAÇÕES	
1		PAVIMENTAÇÃO EM PEYVER DE CONCRETO					
2		COMPACTAÇÃO DE CALCAMENTO EM PEYVER					
3		ACERTO E NIVELAMENTO DE PISTA MANUAL					
4		ESPALHAMENTO DE AREIA PARA BERÇO NA PISTA					
5		RECEBIMENTO E DESCARGA DE PEYVER PREMOLDADO					
6		TRANSPORTE DE PEYVER PARA PROXIMO DO CANTEIRO					
REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)							







5 de nov. de 2024 10:10:07
Rua Vicente Bretas Cupertino
Santo Antônio do Grama
Minas Gerais

Data não informada

OCORRÊNCIAS		
NÚMERO DE OC	TIPO DE OCORRÊNCIA	DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA
CONFERÊNCIA		
MUNICÍPIO	CONSÓRCIO (Aprovado em 06/11/2024 - 11:47)	
Obs.:	Obs.:	
ASSINATURAS		
YURI ANDRADE COSTA LINS Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 233590/D	PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA CREA 137.103/D	ANTÔNIO CARLOS MARTINS BRANDÃO RT de Execução - PONTAL ENGENHARIA LTDA CREA 45.957/D



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº 0076	OBRA: CTP 0191/2024 - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE ACESSIBILIDADE		CONTRATO:	RESP. TÉCNICO: ANTONIO CARLOS MARTINS BRANDÃO	
ENDEREÇO: TRECHO DA RODOVIA DE ACESSO A SANTO ANTONIO DO GRAMA, BAIRRO NOVO HORIZONTE.			INÍCIO: 01/07/2024		Nº CREA-MG: 45957/D
CIDDE:			PRAZO: 31/12/2024		Nº DA ART:
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA			UF:		COORDENADAS:
DATA: 04/11/2024	SOL ☀		NUBLADO ☁	CHUVA ☔	IMPRATICÁVEL ☔
MANHÃ				✓	
TARDE			✓		
QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO			QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
1	ENCARREGADO DE OBRAS			3	PEDREIRO
5	AJUDANTE				
QTDE	EQUIPAMENTO				
1	CORTADOR DE PEYVER				
3	PÁ				
1	CAMINHÃO CARROCERIA				
1	ROLO COMPACTADOR				
2	CHIBANCA				
3	ENXADA				
3	CARRINHO DE MÃO				
TAREFAS REALIZADAS					
NÚMERO DE T.R.	DESCRICAO			OBSERVAÇÕES	
1	COMPACTAÇÃO DE CALCAMENTO EM PEYVER				
2	PAVIMENTAÇÃO EM PEYVER DE CONCRETO				
3	TRANSPORTE DE PEYVER PARA PROXIMO DO CANTEIRO				
4	ESPALHAMENTO DE AREIA PARA BERÇO NA PISTA				
REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)					





OCORRÊNCIAS		
NÚMERO DE OC	TIPO DE OCORRÊNCIA	DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA
CONFERÊNCIA		
MUNICÍPIO	CONSÓRCIO (Aprovado em 06/11/2024 - 11:47)	
Obs.:	Obs.:	
ASSINATURAS		
YURI ANDRADE COSTA LINS Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 233590/D	PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTONIO DO GRAMA CREA 137.103/D	ANTÔNIO CARLOS MARTINS BRANDÃO RT de Execução - PONTAL ENGENHARIA LTDA CREA 45.957/D





CIMVALPI

CONSORCIO INTERMUNICIPAL
MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº 0075	OBRA: CTP 0191/2024 - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE ACESSIBILIDADE	CONTRATO:	RESP. TÉCNICO: ANTONIO CARLOS MARTINS BRANDÃO
ENDEREÇO: TRECHO DA RODOVIA DE ACESSO A SANTO ANTONIO DO GRAMA, BAIRRO NOVO HORIZONTE.		INÍCIO: 01/07/2024	Nº CREA-MG: 45957/D
CIDDE:		PRAZO: 31/12/2024	Nº DA ART:
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA		UF:	COORDENADAS:
DATA: 01/11/2024	SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA ☔
MANHÃ	✓		IMPRATICÁVEL ☔
TARDE	✓		
QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
1	ENCARREGADO DE OBRAS	3	PEDREIRO
5	AJUDANTE		
QTDE	EQUIPAMENTO		
3	PÁ		
1	ROLO COMPACTADOR		
3	ENXADA		
3	CARRINHO DE MÃO		
TAREFAS REALIZADAS			
NÚMERO DE T.R.	DESCRICAO	OBSERVAÇÕES	
1	REJUNTAMENTO DA PISTA COM AREIA		
2	LIMPEZA DE SARGETA		
3	COMPACTAÇÃO DE PISTA COM ROLO		
REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)			
 1 de nov. de 2024 10:04:41 824 Rua Doutor Vicente Bretas Cupertino Santo Antonio Do Grama Santo Antônio do Grama Minas Gerais Data não informada  1 de nov. de 2024 15:46:20 Santo Antônio do Grama Minas Gerais Data não informada			





Data não informada



Data não informada



Data não informada



Data não informada





Data não informada

OCORRÊNCIAS		
NÚMERO DE OC	TIPO DE OCORRÊNCIA	DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA
CONFERÊNCIA		
MUNICÍPIO	CONSÓRCIO (Aprovado em 04/11/2024 - 08:41)	
Obs.:	Obs.: O CIMVALPI confirma as atividades descritas.	
ASSINATURAS		
YURI ANDRADE COSTA LINS Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 233590/D	PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA CREA 137.103/D	ANTÔNIO CARLOS MARTINS BRANDÃO RT de Execução - PONTAL ENGENHARIA LTDA CREA 45.957/D





CIMVALPI

CONSORCIO INTERMUNICIPAL
MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº 0074	OBRA: CTP 0191/2024 - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE ACESSIBILIDADE	CONTRATO:	RESP. TÉCNICO: ANTONIO CARLOS MARTINS BRANDÃO
ENDEREÇO: TRECHO DA RODOVIA DE ACESSO A SANTO ANTONIO DO GRAMA, BAIRRO NOVO HORIZONTE.		INÍCIO: 01/07/2024	Nº CREA-MG: 45957/D
CIDDE:		PRAZO: 31/12/2024	Nº DA ART:
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA		UF:	COORDENADAS:
DATA: 31/10/2024	SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA ☔
MANHÃ	✓		IMPRATICÁVEL ☔
TARDE	✓		
QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
1	ENCARREGADO DE OBRAS	3	PEDREIRO
5	AJUDANTE		
QTDE	EQUIPAMENTO		
2	CAVADEIRA RETA		
1	DAMPER		
3	PÁ		
2	CHIBANCA		
3	ENXADA		
2	CARRINHO DE MÃO		
1	BETONEIRA		
TAREFAS REALIZADAS			
NÚMERO DE T.R.	DESCRICAO	OBSERVAÇÕES	
1	CONCRETAGEM DE SARJETA		
2	INSTALAÇÃO DE MEIO FIO PREMOLDADO		
3	ESCAVAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE MEIO FIO E SARJETA		
REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)			
 31 de out. de 2024 16:17:46 Data não informada		 31 de out. de 2024 16:18:33 Rua Vicente Bretas, Cupertínio Santo Antônio do Grama Minas Gerais Data não informada	





31 de out. de 2024 16:17:54
Data não informada



31 de out. de 2024 16:33:48
Rua Vicente Bretas Cupertino
Santo Antônio do Grama
Minas Gerais
Data não informada



31 de out. de 2024 16:18:05
Data não informada



31 de out. de 2024 16:18:58
Rua Vicente Bretas Cupertino
Santo Antônio do Grama
Minas Gerais
Data não informada

OCORRÊNCIAS		
NÚMERO DE OC	TIPO DE OCORRÊNCIA	DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA
CONFERÊNCIA		
MUNICÍPIO	CONSÓRCIO (Aprovado em 01/11/2024 - 09:17)	
Obs.:	Obs.:	
ASSINATURAS		
YURI ANDRADE COSTA LINS Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 233590/D	PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTONIO DO GRAMA CREA 137.103/D	ANTÔNIO CARLOS MARTINS BRANDÃO RT de Execução - PONTAL ENGENHARIA LTDA CREA 45.957/D





CIMVALPI
CONSORCIO INTERMUNICIPAL
MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº 0073	OBRA: CTP 0191/2024 - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE ACESSIBILIDADE	CONTRATO:	RESP. TÉCNICO: ANTONIO CARLOS MARTINS BRANDÃO
ENDEREÇO: TRECHO DA RODOVIA DE ACESSO A SANTO ANTONIO DO GRAMA, BAIRRO NOVO HORIZONTE.		INÍCIO: 01/07/2024	Nº CREA-MG: 45957/D
CIDDE:		PRAZO: 31/12/2024	Nº DA ART:
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA		UF:	COORDENADAS:
DATA: 31/10/2024	SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA ☔
MANHÃ		✓	IMPRATICÁVEL ☔
TARDE		✓	
QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
1	ENCARREGADO DE OBRAS	3	PEDREIRO
5	AJUDANTE		
QTDE	EQUIPAMENTO		
2	CAVADEIRA RETA		
1	DAMPER		
3	PÁ		
2	CHIBANCA		
3	ENXADA		
2	CARRINHO DE MÃO		
TAREFAS REALIZADAS			
NÚMERO DE T.R.	DESCRICAO	OBSERVAÇÕES	
1	CONCRETAGEM DE SARJETA		
2	INSTALAÇÃO DE MEIO FIO PREMOLDADO		
3	ESCAVAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE MEIO FIO E SARJETA		
REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)			
 30 de out. de 2024 15:13:57 Santo Antônio do Grama Minas Gerais Data não informada  30 de out. de 2024 16:38:11 Santo Antônio do Grama Minas Gerais Data não informada			



Pág.: 35 / 50 - ID. do Doc.: B6E.276 - 25/11/2024 - 14:22:59 - ASSINADO POR(2): CPF:385.06* **6-*4 CPF:084.94* **6-*2



Data não informada



Data não informada



Data não informada



Data não informada

OCORRÊNCIAS		
NÚMERO DE OC	TIPO DE OCORRÊNCIA	DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA
OBSERVAÇÕES		
RDO REFERENTE AO DIA 30/10/2024, FEITO EM ATRASO, POIS NAO HOUE EXPEDIENTE NO ESCRITORIO		
CONFERÊNCIA		
MUNICÍPIO	CONSÓRCIO (Aprovado em 01/11/2024 - 09:17)	
Obs.:	Obs.:	
ASSINATURAS		
YURI ANDRADE COSTA LINS Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 233590/D	PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA CREA 137.103/D	ANTÔNIO CARLOS MARTINS BRANDÃO RT de Execução - PONTAL ENGENHARIA LTDA CREA 45.957/D





CIMVALPI
CONSORCIO INTERMUNICIPAL
MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº 0072	OBRA: CTP 0191/2024 - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE ACESSIBILIDADE	CONTRATO:	RESP. TÉCNICO: ANTONIO CARLOS MARTINS BRANDÃO
ENDEREÇO: TRECHO DA RODOVIA DE ACESSO A SANTO ANTONIO DO GRAMA, BAIRRO NOVO HORIZONTE.		INÍCIO: 01/07/2024	Nº CREA-MG: 45957/D
CIDDE:		PRAZO: 31/12/2024	Nº DA ART:
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA		UF:	COORDENADAS:
DATA: 29/10/2024	SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA ☔
MANHÃ		✓	IMPRATICÁVEL ☔
TARDE		✓	
QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
1	ENCARREGADO DE OBRAS	3	PEDREIRO
5	AJUDANTE		
QTDE	EQUIPAMENTO		
2	CAVADEIRA RETA		
3	PÁ		
2	CHIBANCA		
3	ENXADA		
2	CARRINHO DE MÃO		
TAREFAS REALIZADAS			
NÚMERO DE T.R.	DESCRIÇÃO	OBSERVAÇÕES	
1	INSTALAÇÃO DE MEIO FIO PREMOLDADO		
2	ESCAVAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE MEIO FIO E SARJETA		
REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATORIOS)			
 29 de out. de 2024 16:23:28 Santo Antônio do Grama Minas Gerais Data não informada		 29 de out. de 2024 16:23:51 Santo Antônio do Grama Minas Gerais Data não informada	





OCORRÊNCIAS		
NÚMERO DE OC	TIPO DE OCORRÊNCIA	DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA
CONFERÊNCIA		
MUNICÍPIO	CONSÓRCIO (Aprovado em 01/11/2024 - 09:17)	
Obs.:	Obs.:	
ASSINATURAS		
YURI ANDRADE COSTA LINS Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 233590/D	PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTONIO DO GRAMA CREA 137.103/D	ANTÔNIO CARLOS MARTINS BRANDÃO RT de Execução - PONTAL ENGENHARIA LTDA CREA 45.957/D





RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº 0071	OBRA: CTP 0191/2024 - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE ACESSIBILIDADE	CONTRATO:	RESP. TÉCNICO: ANTONIO CARLOS MARTINS BRANDÃO
ENDEREÇO: TRECHO DA RODOVIA DE ACESSO A SANTO ANTONIO DO GRAMA, BAIRRO NOVO HORIZONTE.		INÍCIO: 01/07/2024	Nº CREA-MG: 45957/D
CIDDE:		PRAZO: 31/12/2024	Nº DA ART:
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA		UF:	COORDENADAS:
DATA: 28/10/2024	SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA ☔
MANHÃ		✓	IMPRATICÁVEL ☔
TARDE		✓	
QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
1	ENCARREGADO DE OBRAS	3	PEDREIRO
5	AJUDANTE		
QTDE	EQUIPAMENTO		
TAREFAS REALIZADAS			
NÚMERO DE T.R.	DESCRIÇÃO	OBSERVAÇÕES	
1	SEM TAREFA REALIZADA	MOTIVO - CHUVA EXCESSIVA	
REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)			
OCORRÊNCIAS			
NÚMERO DE OC	TIPO DE OCORRÊNCIA	DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA	
OBSERVAÇÕES			
NAO HOUVE ATIVIDADE DEVIDO CHUVA EXCESSIVA			
CONFERÊNCIA			
MUNICÍPIO	CONSÓRCIO (Aprovado em 29/10/2024 - 08:17)		
Obs.:	Obs.: Atividade inexecuível devido às chuvas.		
ASSINATURAS			
YURI ANDRADE COSTA LINS Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 233590/D		PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA CREA 137.103/D	
		ANTÔNIO CARLOS MARTINS BRANDÃO RT de Execução - PONTAL ENGENHARIA LTDA CREA 45.957/D	



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº 0070	OBRA: CTP 0191/2024 - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE ACESSIBILIDADE	CONTRATO:	
ENDEREÇO: TRECHO DA RODOVIA DE ACESSO A SANTO ANTONIO DO GRAMA, BAIRRO NOVO HORIZONTE.		RESP. TÉCNICO: ANTONIO CARLOS MARTINS BRANDÃO	
CIDDE:		INÍCIO: 01/07/2024	Nº CREA-MG: 45957/D
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA		PRAZO: 31/12/2024	Nº DA ART:
		UF:	COORDENADAS:
DATA: 25/10/2024	SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA ☔
MANHÃ		✓	IMPRATICÁVEL ☔
TARDE		✓	
QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO		QTDE
1	ENCARREGADO DE OBRAS		3
5	AJUDANTE		PEDREIRO
QTDE	EQUIPAMENTO		
1	CORTADOR DE PEYVER		
3	PÁ		
1	CAMINHÃO CARROCERIA		
1	EMPILHADEIRA		
1	ROLO COMPACTADOR		
3	ENXADA		
2	CARRINHO DE MÃO		
TAREFAS REALIZADAS			
NÚMERO DE T.R.	DESCRICAÇÃO	OBSERVAÇÕES	
1	ESPALHAMENTO DE AREIA PARA BERÇO NA PISTA		
2	RECEBIMENTO E DESCARGA DE ROLO COMPACTADOR		
3	TRANSPORTE DE PEYVER PARA PROXIMO DO CANTEIRO		
4	COMPACTAÇÃO DE CALÇAMENTO EM PEYVER		
5	PAVIMENTAÇÃO EM PEYVER DE CONCRETO		
REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)			

REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATORIOS)



Data não informada



Data não informada



25 de out. de 2024 16:36:04
798 Rua Doutor Vicente Bretas Cupertino
Santo Antônio Do Grama
Santo Antônio do Grama
Minas Gerais

Data não informada



25 de out. de 2024 09:30:26
Rua Vicente Bretas Cupertino
Santo Antônio do Grama
Minas Gerais

Data não informada



25 de out. de 2024 16:35:30
798 Rua Doutor Vicente Bretas Cupertino
Santo Antônio Do Grama
Santo Antônio do Grama
Minas Gerais

Data não informada

OCORRÊNCIAS		
NÚMERO DE OC	TIPO DE OCORRÊNCIA	DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA
CONFERÊNCIA		
MUNICÍPIO	CONSÓRCIO (Aprovado em 28/10/2024 - 08:33)	
Obs.:	Obs.:	
ASSINATURAS		
YURI ANDRADE COSTA LINS Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 233590/D	PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTONIO DO GRAMA CREA 137.103/D	ANTÔNIO CARLOS MARTINS BRANDÃO RT de Execução - PONTAL ENGENHARIA LTDA CREA 45.957/D



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº 0069	OBRA: CTP 0191/2024 - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE ACESSIBILIDADE		CONTRATO:		RESP. TÉCNICO: ANTONIO CARLOS MARTINS BRANDÃO	
ENDEREÇO: TRECHO DA RODOVIA DE ACESSO A SANTO ANTONIO DO GRAMA, BAIRRO NOVO HORIZONTE.			INÍCIO: 01/07/2024		Nº CREA-MG: 45957/D	
CIDDE:			PRAZO: 31/12/2024		Nº DA ART:	
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA			UF:		COORDENADAS:	
DATA: 24/10/2024	SOL ☀		NUBLADO ☁		CHUVA ☔	IMPRATICÁVEL ☔
MANHÃ	✓					
TARDE	✓					
QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO				QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
1	ENCARREGADO DE OBRAS				3	PEDREIRO
5	AJUDANTE					
QTDE	EQUIPAMENTO					
3	PÁ					
1	CAMINHÃO CARROCERIA					
1	EMPLILHADEIRA					
3	ENXADA					
2	CARRINHO DE MÃO					
TAREFAS REALIZADAS						
NÚMERO DE T.R.	DESCRICAÇÃO				OBSERVAÇÕES	
1	TRANSPORTE DE PEYVER PARA PROXIMO DO CANTEIRO					
2	PAVIMENTAÇÃO EM PEYVER DE CONCRETO					
3	ESPALHAMENTO DE AREIA PARA BERÇO NA PISTA					
REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)						






OCORRÊNCIAS		
NÚMERO DE OC	TIPO DE OCORRÊNCIA	DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA
CONFERÊNCIA		
MUNICÍPIO	CONSÓRCIO (Aprovado em 28/10/2024 - 08:33)	
Obs.:	Obs.:	
ASSINATURAS		
YURI ANDRADE COSTA LINS Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 233590/D	PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTONIO DO GRAMA CREA 137.103/D	ANTÔNIO CARLOS MARTINS BRANDÃO RT de Execução - PONTAL ENGENHARIA LTDA CREA 45.957/D



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº 0068	OBRA: CTP 0191/2024 - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE ACESSIBILIDADE	CONTRATO:	RESP. TÉCNICO: ANTONIO CARLOS MARTINS BRANDÃO
ENDEREÇO: TRECHO DA RODOVIA DE ACESSO A SANTO ANTONIO DO GRAMA, BAIRRO NOVO HORIZONTE.		INÍCIO: 01/07/2024	Nº CREA-MG: 45957/D
CIDDE:		PRAZO: 31/12/2024	Nº DA ART:
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA		UF:	COORDENADAS:
DATA: 23/10/2024	SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA ☔
MANHÃ	✓		IMPRATICÁVEL ☔
TARDE	✓		
QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
1	ENCARREGADO DE OBRAS	3	PEDREIRO
5	AJUDANTE		
QTDE	EQUIPAMENTO		
1	CORTADOR DE PEYVER		
3	PÁ		
1	CAMINHÃO CARROCERIA		
1	EMPILHADEIRA		
3	CHIBANCA		
2	ENXADA		
2	CARRINHO DE MÃO		
TAREFAS REALIZADAS			
NÚMERO DE T.R.	DESCRICAIO	OBSERVAÇÕES	
1	PAVIMENTAÇÃO EM PEYVER DE CONCRETO		
2	ESPALHAMENTO DE AREIA PARA BERÇO NA PISTA		
3	TRANSPORTE DE PEYVER PARA PROXIMO DO CANTEIRO		
4	ACERTO E NIVELAMENTO DE PISTA MANUAL		
REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)			

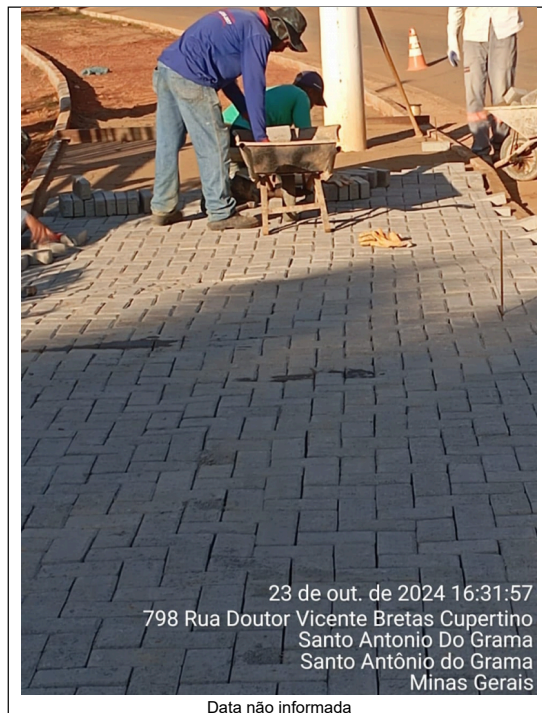



OCORRÊNCIAS		
NÚMERO DE OC	TIPO DE OCORRÊNCIA	DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA
CONFERÊNCIA		
MUNICÍPIO	CONSÓRCIO (Aprovado em 24/10/2024 - 13:43)	
Obs.:	Obs.:	
ASSINATURAS		
YURI ANDRADE COSTA LINS Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 233590/D	PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTONIO DO GRAMA CREA 137.103/D	ANTÔNIO CARLOS MARTINS BRANDÃO RT de Execução - PONTAL ENGENHARIA LTDA CREA 45.957/D





CIMVALPI

CONSORCIO INTERMUNICIPAL
MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº 0067	OBRA: CTP 0191/2024 - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE ACESSIBILIDADE	CONTRATO:	RESP. TÉCNICO: ANTONIO CARLOS MARTINS BRANDÃO
ENDEREÇO: TRECHO DA RODOVIA DE ACESSO A SANTO ANTONIO DO GRAMA, BAIRRO NOVO HORIZONTE.		INÍCIO: 01/07/2024	Nº CREA-MG: 45957/D
CIDDE:		PRAZO: 31/12/2024	Nº DA ART:
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA		UF:	COORDENADAS:
DATA: 22/10/2024	SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA ☔
MANHÃ		✓	IMPRATICÁVEL ☔
TARDE		✓	
QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
1	ENCARREGADO DE OBRAS	3	PEDREIRO
5	AJUDANTE		
QTDE	EQUIPAMENTO		
2	CAVADEIRA RETA		
1	CORTADOR DE PEYVER		
3	PÁ		
3	CHIBANCA		
3	ENXADA		
2	CARRINHO DE MÃO		
TAREFAS REALIZADAS			
NÚMERO DE T.R.	DESCRICAO	OBSERVAÇÕES	
1	ESPALHAMENTO DE AREIA PARA BERÇO NA PISTA		
2	PAVIMENTAÇÃO EM PEYVER DE CONCRETO		
3	ACERTO E NIVELAMENTO DE PISTA MANUAL		
REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATORIOS)			
 22 de out. de 2024 16:35:07 824 Rua Doutor Vicente Bretas Cupertino Santo Antonio Do Grama Santo Antônio do Grama Minas Gerais Data não informada  22 de out. de 2024 16:33:58 824 Rua Doutor Vicente Bretas Cupertino Santo Antonio Do Grama Santo Antônio do Grama Minas Gerais Data não informada			

Pág.: 46 / 50 - ID. do Doc.: B6E.276 - 25/11/2024 - 14:22:59 - ASSINADO POR(2): CPF:385.06*.**6-*4 CPF:084.94*.**6-*2



OCORRÊNCIAS		
NÚMERO DE OC	TIPO DE OCORRÊNCIA	DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA
CONFERÊNCIA		
MUNICÍPIO	CONSÓRCIO (Aprovado em 23/10/2024 - 14:31)	
Obs.:	Obs.:	
ASSINATURAS		
YURI ANDRADE COSTA LINS Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 233590/D	PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTONIO DO GRAMA CREA 137.103/D	ANTÔNIO CARLOS MARTINS BRANDÃO RT de Execução - PONTAL ENGENHARIA LTDA CREA 45.957/D



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº 0066		OBRA: CTP 0191/2024 - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE ACESSIBILIDADE		CONTRATO:		RESP. TÉCNICO: ANTONIO CARLOS MARTINS BRANDÃO	
ENDEREÇO: TRECHO DA RODOVIA DE ACESSO A SANTO ANTONIO DO GRAMA, BAIRRO NOVO HORIZONTE.				INÍCIO: 01/07/2024		Nº CREA-MG: 45957/D	
CIDDE:				PRAZO: 31/12/2024		Nº DA ART:	
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA				UF:		COORDENADAS:	
DATA: 21/10/2024		SOL ☀		NUBLADO ☁		CHUVA ☔	
MANHÃ		✓				IMPRATICÁVEL ☔	
TARDE		✓					
QTDE		MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO				QTDE	
1		ENCARREGADO DE OBRAS				3	
5		AJUDANTE				PEDREIRO	
QTDE		EQUIPAMENTO					
1		CAMINHÃO 3/4					
3		PÁ					
1		EMPILHADEIRA					
3		MARRETA					
1		CHIBANCA					
3		ENXADA					
3		CARRINHO DE MÃO					
TAREFAS REALIZADAS							
NÚMERO DE T.R.		DESCRIÇÃO				OBSERVAÇÕES	
1		ESPALHAMENTO DE AREIA NA PISTA PARA PAVIMENTAÇÃO					
2		TRANSPORTE DE PAVER E AREIA PARA OBRA					
3		CARGA E DESCARGA DE PAVERS					
4		PAVIMENTAÇÃO EM PAVER DE CONCRETO PREMOLDADO					
REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)							

REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)





21 de out. de 2024 16:36:08
798 Rua Doutor Vicente Bretas Cupertino
Santo Antonio Do Grama
Santo Antônio do Grama
Minas Gerais

Data não informada



21 de out. de 2024 16:37:46
824 Rua Doutor Vicente Bretas Cupertino
Santo Antonio Do Grama
Santo Antônio do Grama
Minas Gerais

Data não informada

OCORRÊNCIAS		
NÚMERO DE OC	TIPO DE OCORRÊNCIA	DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA
CONFERÊNCIA		
MUNICÍPIO	CONSÓRCIO (Aprovado em 22/10/2024 - 09:03)	
Obs.:	Obs.:	
ASSINATURAS		
YURI ANDRADE COSTA LINS Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 233590/D	PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA CREA 137.103/D	ANTÔNIO CARLOS MARTINS BRANDÃO RT de Execução - PONTAL ENGENHARIA LTDA CREA 45.957/D





CIMVALPI
CONSORCIO INTERMUNICIPAL
MULTISETORIAL DO VALE DO PIRANGA

Assinaturas do Documento



Documento Assinado Eletronicamente por **ANTONIO CARLOS MARTINS BRANDÃO**,
CPF: 385.06*. **6- *4 em **26/11/2024 09:01:18**, Cód. Autenticidade da Assinatura:
09W6.3V01.418X.R813.2031, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de
2020.



Documento Assinado Eletronicamente por **YURI ANDRADE COSTA LINS**, CPF:
084.94*. **6- *2 em **25/11/2024 16:48:39**, Cód. Autenticidade da Assinatura:
16E8.5648.4397.X18E.6148, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de
2020.



Informações do Documento

ID do Documento: **B6E.276** - Tipo de Documento: **FORMULÁRIO DE MEDIÇÕES.**

Elaborado por **GILBERTO ARAUJO GOMIDES**, CPF: 069.58*. **6- *7 , em **25/11/2024 - 14:22:59**

Código de Autenticidade deste Documento: 14W3.0V22.359H.763R.4505

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
<https://zeropapel.cimvalpi.mg.gov.br/verdocumento>

