

RELATÓRIO PARCIAL (SITUAÇÃO: APROVADA PELO CONSÓRCIO)

Enviado por ANTONIO CARLOS MARTINS BRANDAO em 13/12/2024 - 10:02

Registro: 13/12/2024				5ª MEDIÇÃO									
Obra: CTP 0191/2024 - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE ACESSIBILIDADE				Período de 21/11/2024 a 13/12/2024									
Local: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA													
OBSERVAÇÕES													
Enviada por ANTONIO CARLOS MARTINS BRANDAO (FORNECEDOR) em 13/12/2024 às 10:02													
							QUANTIDADE MEDIDA			VALOR MEDIDO			
ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	NESTA MEDIÇÃO	ACUMULADA	VALOR PREVISTO (BDI)	NESTA MEDIÇÃO (BDI)	ACUMULADA (BDI)	SALDO (BDI)	
01	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO												
01.01	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA - para obras que exigem a utilização de grande quantidade de equipamentos e são executadas em centros urbanos ou próximos de centros urbanos. Obs.: Não se aplica aos serviços deTapa Buracos.												
01.01.01	OBRAS ATÉ O VALOR DE R\$ 1.000.000,00 - MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA PAVIMENTAÇÃO, EXCLUSIVE PARA TAPA-BURACOS	%	1	R\$ 25,00	R\$ 31,62	R\$ 31,62	0.5	2.5	R\$ 31,62	R\$ 250,13	R\$ 2.549,04	R\$ -2.517,42	
02	INSTALAÇÕES DA OBRA												
02.05	BANHEIRO QUIMICO												
02.05.01	BANHEIRO QUIMICO 110 cm x 120 cm x 230 cm COM MANUTENÇÃO	mês	5	R\$ 628,10	R\$ 797,37	R\$ 3.986,85	1	5	R\$ 3.986,85	R\$ 797,37	R\$ 3.986,85	R\$ 0,00	
06	PAVIMENTAÇÃO												
06.19	PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO DE CONCRETO												
06.19.01	PISO INTERTRAVADO 10X20CM E= 6,0CM 35MPA C/ COLCHAO AREIA	m²	2918.34	R\$ 85,13	R\$ 108,08	R\$ 315.414,19	296.8	2499.86	R\$ 315.414,19	R\$ 32.078,14	R\$ 270.184,86	R\$ 45.229,33	
06.19.02	PISO INTERTRAVADO 10X20CM E= 8,0CM 35MPA C/ COLCHAO AREIA	m²	150	R\$ 90,06	R\$ 114,34	R\$ 17.151,00	150	150	R\$ 17.151,00	R\$ 17.151,00	R\$ 17.151,00	R\$ 0,00	
15	ADMINISTRAÇÃO LOCAL												



15.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - % BASEADA ACÓRDÃO 2.622/2013 DO TCU SOBRE SOMA DOS ITENS 1 A 14	%	15.1	R\$ 329,17	R\$ 416,25	R\$ 6.285,38	6.55	32.75	R\$ 6.285,38	R\$ 3.293,12	R\$ 33.559,40	R\$ -27.274,03
						TOTAL:				R\$ 53.569,76	R\$ 545.916,70	

YURI ANDRADE COSTA LINS
Fiscal de Obras - CIMVALPI
CREA 233590/D
Aprovação: 17/12/2024

PEDRO MARTINO ZEFERINO
Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA
CREA 137.103/D

ANTÔNIO CARLOS MARTINS BRANDÃO
RT de Execução - PONTAL ENGENHARIA LTDA
CREA 45.957/D



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº 0098	OBRA: CTP 0191/2024 - SANTO ANTONIO DO GRAMA - IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE ACESSIBILIDADE	CONTRATO:		RESP. TÉCNICO: ANTONIO CARLOS MARTINS BRANDÃO
ENDEREÇO: TRECHO DA RODOVIA DE ACESSO A SANTO ANTONIO DO GRAMA, BAIRRO NOVO HORIZONTE.		INÍCIO: 01/07/2024		Nº CREA-MG: 45957/D
CIDDE:		PRAZO: 31/12/2024		Nº DA ART:
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA		UF:		COORDENADAS:
DATA: 05/12/2024	SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA ☔	IMPRATICÁVEL ☔
MANHÃ	✓			
TARDE	✓			
QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO		QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
1	ENCARREGADO DE OBRAS		3	PEDREIRO
5	AJUDANTE			
QTDE	EQUIPAMENTO			
2	CAVADEIRA RETA			
1	DAMPER			
3	PÁ			
3	CHIBANCA			
3	ENXADA			
2	CARRINHO DE MÃO			
TAREFAS REALIZADAS				
NÚMERO DE T.R.	DESCRIÇÃO		OBSERVAÇÕES	
1	ESCAVAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE MEIO FIO E SARJETA			
2	RECEBIMENTO DE PEDRA MARROADA			
3	CONCRETAGEM DE SARGETA			
4	INSTALAÇÃO DE MEIO FIO PREMOLDADO			

REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)





Data não informada

OCORRÊNCIAS		
NÚMERO DE OC	TIPO DE OCORRÊNCIA	DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA
CONFERÊNCIA		
MUNICÍPIO	CONSÓRCIO (Aprovado em 09/12/2024 - 10:04)	
Obs.:	Obs.:	
ASSINATURAS		
YURI ANDRADE COSTA LINS Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 233590/D	PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA CREA 137.103/D	ANTÔNIO CARLOS MARTINS BRANDÃO RT de Execução - PONTAL ENGENHARIA LTDA CREA 45.957/D






CIMVALPI
CONSORCIO INTERMUNICIPAL
MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº 0097	OBRA: CTP 0191/2024 - SANTO ANTONIO DO GRAMA - IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE ACESSIBILIDADE	CONTRATO:	RESP. TÉCNICO: ANTONIO CARLOS MARTINS BRANDÃO
ENDEREÇO: TRECHO DA RODOVIA DE ACESSO A SANTO ANTONIO DO GRAMA, BAIRRO NOVO HORIZONTE.		INÍCIO: 01/07/2024	Nº CREA-MG: 45957/D
CIDDE:	PRAZO: 31/12/2024	Nº DA ART:	
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA	UF:	COORDENADAS:	
DATA: 04/12/2024	SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA ☔
MANHÃ	✓		IMPRATICÁVEL ☁
TARDE	✓		
QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
1	ENCARREGADO DE OBRAS	3	PEDREIRO
5	AJUDANTE		
QTDE	EQUIPAMENTO		
3	PÁ		
1	ROLO COMPACTADOR		
3	ENXADA		
4	CARRINHO DE MÃO		
1	RETROESCAVADEIRA		
1	SERRA DE BANCADA		
TAREFAS REALIZADAS			
NÚMERO DE T.R.	DESCRICAO	OBSERVAÇÕES	
1	ESPALHAMENTO DE AREIA PARA BERÇO NA PISTA		
2	PAVIMENTAÇÃO EM PEYVER DE CONCRETO		
3	COMPACTAÇÃO DE CALCAMENTO EM PEYVER		
4	ACERTO E NIVELAMENTO DE PISTA		
5	COMPACTAÇÃO DE PISTA COM ROLO		
REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATORIOS)			
 Data não informada  Data não informada			



Pág.: 5 / 29 - ID. do Doc.: C38.71F - 18/12/2024 - 08:26:58 - ASSINADO POR(2): CPF:084.94*.**6.*2 CPF:385.06*.**6.*4

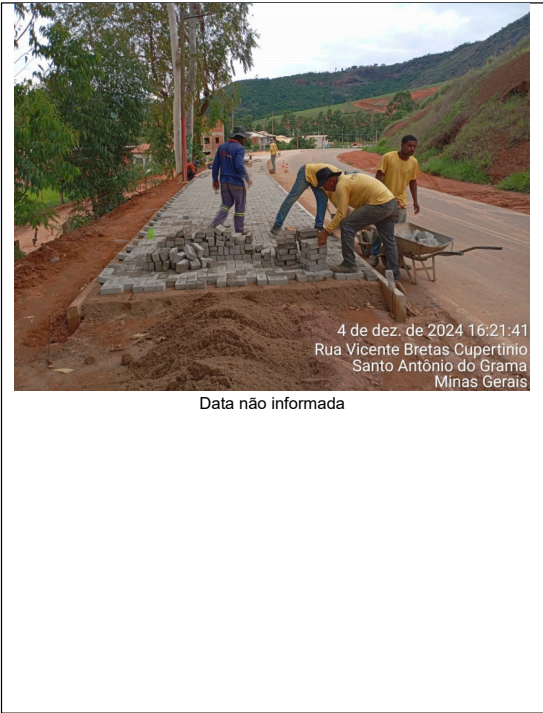


OCORRÊNCIAS		
NÚMERO DE OC	TIPO DE OCORRÊNCIA	DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA
CONFERÊNCIA		
MUNICÍPIO	CONSÓRCIO (Aprovado em 09/12/2024 - 10:04)	
Obs.:	Obs.:	
ASSINATURAS		
YURI ANDRADE COSTA LINS Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 233590/D	PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA CREA 137.103/D	ANTÔNIO CARLOS MARTINS BRANDÃO RT de Execução - PONTAL ENGENHARIA LTDA CREA 45.957/D



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº 0096	OBRA: CTP 0191/2024 - SANTO ANTONIO DO GRAMA - IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE ACESSIBILIDADE	CONTRATO:	RESP. TÉCNICO: ANTONIO CARLOS MARTINS BRANDÃO
ENDEREÇO: TRECHO DA RODOVIA DE ACESSO A SANTO ANTONIO DO GRAMA, BAIRRO NOVO HORIZONTE.	INÍCIO: 01/07/2024	Nº CREA-MG: 45957/D	
CIDDE:	PRAZO: 31/12/2024	Nº DA ART:	
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA	UF:	COORDENADAS:	
DATA: 03/12/2024	SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA ☔
MANHÃ	✓		IMPRATICÁVEL ☁
TARDE	✓		
QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
1	ENCARREGADO DE OBRAS	3	PEDREIRO
5	AJUDANTE		
QTDE	EQUIPAMENTO		
1	DAMPER		
3	PÁ		
3	ENXADA		
4	CARRINHO DE MÃO		
1	SERRA DE BANCADA		
TAREFAS REALIZADAS			
NÚMERO DE T.R.	DESCRICAÇÃO	OBSERVAÇÕES	
1	CONCRETAGEM DE SARGETA		
2	ESPALHAMENTO DE AREIA PARA BERÇO NA PISTA		
3	PAVIMENTAÇÃO EM PEYVER DE CONCRETO		

REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)

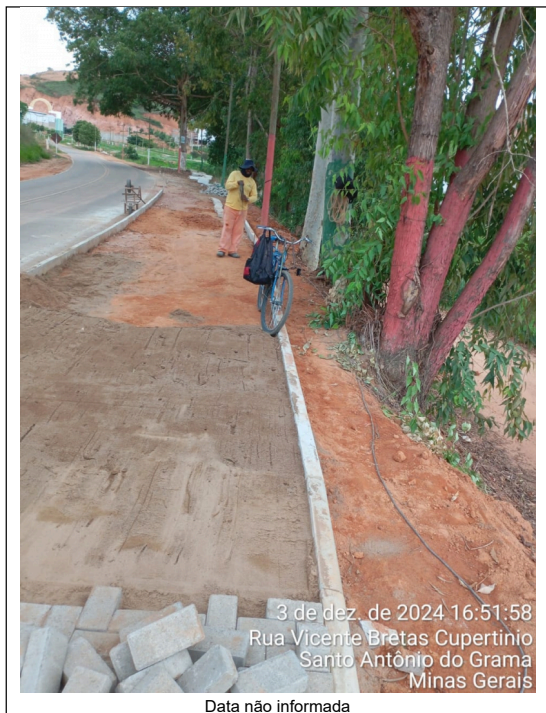



OCORRÊNCIAS		
NÚMERO DE OC	TIPO DE OCORRÊNCIA	DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA
CONFERÊNCIA		
MUNICÍPIO	CONSÓRCIO (Aprovado em 09/12/2024 - 10:02)	
Obs.:	Obs.:	
ASSINATURAS		
YURI ANDRADE COSTA LINS Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 233590/D	PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA CREA 137.103/D	ANTÔNIO CARLOS MARTINS BRANDÃO RT de Execução - PONTAL ENGENHARIA LTDA CREA 45.957/D



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº 0095	OBRA: CTP 0191/2024 - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE ACESSIBILIDADE	CONTRATO:		RESP. TÉCNICO: ANTONIO CARLOS MARTINS BRANDÃO
ENDEREÇO: TRECHO DA RODOVIA DE ACESSO A SANTO ANTONIO DO GRAMA, BAIRRO NOVO HORIZONTE.		INÍCIO: 01/07/2024		Nº CREA-MG: 45957/D
CIDDE:		PRAZO: 31/12/2024		Nº DA ART:
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA		UF:		COORDENADAS:
DATA: 02/12/2024	SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA ☔	IMPRATICÁVEL ☔
MANHÃ		✓		
TARDE		✓		
QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO		QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
1	ENCARREGADO DE OBRAS		3	PEDREIRO
5	AJUDANTE			
QTDE	EQUIPAMENTO			
2	CAVADEIRA RETA			
1	DAMPER			
3	PÁ			
1	CAMINHÃO CARROCERIA			
3	CHIBANCA			
3	ENXADA			
4	CARRINHO DE MÃO			
1	RETROESCAVADEIRA			
1	SERRA DE BANCADA			
TAREFAS REALIZADAS				
NÚMERO DE T.R.	DESCRIÇÃO		OBSERVAÇÕES	
1	TRANSPORTE DE PEYVER PARA PROXIMO DO CANTEIRO			
2	RECEBIMENTO E DESCARGA DE MANILHA			
3	CONCRETAGEM DE MEIO FIO PREMOLDADO			
4	PAVIMENTAÇÃO EM PEYVER DE CONCRETO			
5	INSTALAÇÃO DE MEIO FIO PREMOLDADO			
6	ESPALHAMENTO DE AREIA PARA BERÇO NA PISTA			
7	ACERTO E NIVELAMENTO DE PISTA			
8	ESCAVAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE MEIO FIO E SARGETA			

REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)





Data não informada



Data não informada



Data não informada



Data não informada



Data não informada	
OCORRÊNCIAS	
NÚMERO DE OC	TIPO DE OCORRÊNCIA
CONFERÊNCIA	
MUNICÍPIO	CONSÓRCIO (Aprovado em 09/12/2024 - 10:01)
Obs.:	Obs.:
ASSINATURAS	
YURI ANDRADE COSTA LINS Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 233590/D	PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA CREA 137.103/D
ANTÔNIO CARLOS MARTINS BRANDÃO RT de Execução - PONTAL ENGENHARIA LTDA CREA 45.957/D	



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº 0094		OBRA: CTP 0191/2024 - SANTO ANTONIO DO GRAMA - IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE ACESSIBILIDADE		CONTRATO:		RESP. TÉCNICO: ANTONIO CARLOS MARTINS BRANDÃO	
ENDEREÇO: TRECHO DA RODOVIA DE ACESSO A SANTO ANTONIO DO GRAMA, BAIRRO NOVO HORIZONTE.				INÍCIO: 01/07/2024		Nº CREA-MG: 45957/D	
CIDDE:				PRAZO: 31/12/2024		Nº DA ART:	
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA				UF:		COORDENADAS:	
DATA: 29/11/2024		SOL ☀		NUBLADO ☁		CHUVA ☔	
MANHÃ		✓					
TARDE		✓					
QTDE		MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO				QTDE	
1		ENCARREGADO DE OBRAS				3	
5		AJUDANTE				PEDREIRO	
QTDE		EQUIPAMENTO					
2		CAVADEIRA RETA					
1		DAMPER					
3		PÁ					
3		CHIBANCA					
3		ENXADA					
4		CARRINHO DE MÃO					
TAREFAS REALIZADAS							
NÚMERO DE T.R.		DESCRIÇÃO				OBSERVAÇÕES	
1		ESCAVAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE MEIO FIO E SARJETA					
2		INSTALAÇÃO DE MEIO FIO PREMOLDADO					
3		CONCRETAGEM DE MEIO FIO PREMOLDADO					
4		REJUNTAMENTO DE MEIO FIO PREMOLDADO					
REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)							





29 de nov. de 2024 15:21:34
Rua Vicente Bretas Cupertino
Santo Antônio do Grama
Minas Gerais
Data não informada



29 de nov. de 2024 15:21:50
Rua Vicente Bretas Cupertino
Santo Antônio do Grama
Minas Gerais
Data não informada


OCORRÊNCIAS		
NÚMERO DE OC	TIPO DE OCORRÊNCIA	DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA
CONFERÊNCIA		
MUNICÍPIO	CONSÓRCIO (Aprovado em 09/12/2024 - 10:00)	
Obs.:	Obs.:	
ASSINATURAS		
YURI ANDRADE COSTA LINS Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 233590/D	PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA CREA 137.103/D	ANTÔNIO CARLOS MARTINS BRANDÃO RT de Execução - PONTAL ENGENHARIA LTDA CREA 45.957/D



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº 0093	OBRA: CTP 0191/2024 - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE ACESSIBILIDADE		CONTRATO:	RESP. TÉCNICO: ANTONIO CARLOS MARTINS BRANDÃO	
ENDEREÇO: TRECHO DA RODOVIA DE ACESSO A SANTO ANTONIO DO GRAMA, BAIRRO NOVO HORIZONTE.			INÍCIO: 01/07/2024		Nº CREA-MG: 45957/D
CIDDE:			PRAZO: 31/12/2024		Nº DA ART:
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA			UF:		COORDENADAS:
DATA: 28/11/2024	SOL ☀		NUBLADO ☁	CHUVA ☔	IMPRATICÁVEL ☁☔
MANHÃ	✓				
TARDE	✓				
QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO			QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
1	ENCARREGADO DE OBRAS			3	PEDREIRO
5	AJUDANTE				
QTDE	EQUIPAMENTO				
3	PÁ				
1	ROLO COMPACTADOR				
3	ENXADA				
4	CARRINHO DE MÃO				
1	SERRA DE BANCADA				
TAREFAS REALIZADAS					
NÚMERO DE T.R.	DESCRIÇÃO			OBSERVAÇÕES	
1	ESPALHAMENTO DE AREIA PARA BERÇO NA PISTA				
2	PAVIMENTAÇÃO EM PEYVER DE CONCRETO				
3	COMPACTAÇÃO DE CALCAMENTO EM PEYVER				
REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)					



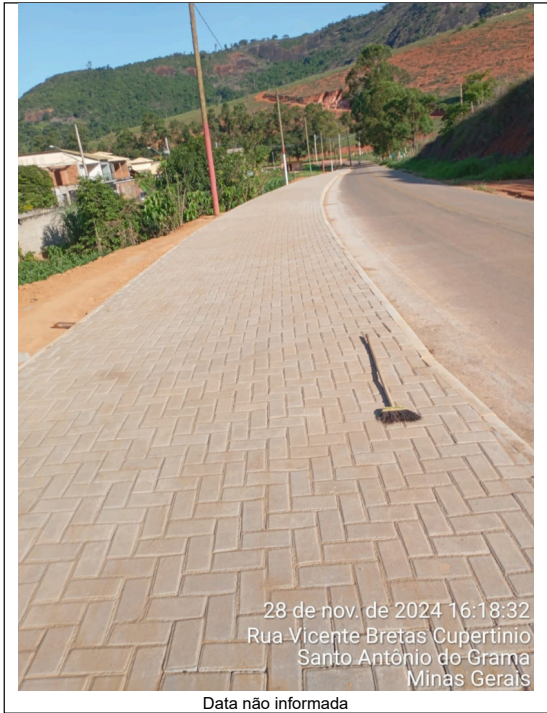

Data não informada



Data não informada

OCORRÊNCIAS		
NÚMERO DE OC	TIPO DE OCORRÊNCIA	DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA
CONFERÊNCIA		
MUNICÍPIO	CONSÓRCIO (Aprovado em 29/11/2024 - 08:47)	
Obs.:	Obs.:	
ASSINATURAS		
YURI ANDRADE COSTA LINS Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 233590/D	PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA CREA 137.103/D	ANTÔNIO CARLOS MARTINS BRANDÃO RT de Execução - PONTAL ENGENHARIA LTDA CREA 45.957/D



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº 0092	OBRA: CTP 0191/2024 - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE ACESSIBILIDADE	CONTRATO:		RESP. TÉCNICO: ANTONIO CARLOS MARTINS BRANDÃO
ENDEREÇO: TRECHO DA RODOVIA DE ACESSO A SANTO ANTONIO DO GRAMA, BAIRRO NOVO HORIZONTE.		INÍCIO: 01/07/2024		Nº CREA-MG: 45957/D
CIDDE:		PRAZO: 31/12/2024		Nº DA ART:
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA		UF:		COORDENADAS:
DATA: 27/11/2024	SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA ☔	IMPRATICÁVEL ☁
MANHÃ	✓			
TARDE	✓			
QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO		QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
1	ENCARREGADO DE OBRAS		3	PEDREIRO
5	AJUDANTE			
QTDE	EQUIPAMENTO			
2	CAVADEIRA RETA			
1	DAMPER			
3	PÁ			
3	CHIBANCA			
3	ENXADA			
4	CARRINHO DE MÃO			
1	SERRA DE BANCADA			
TAREFAS REALIZADAS				
NÚMERO DE T.R.	DESCRIÇÃO		OBSERVAÇÕES	
1	ESPALHAMENTO DE AREIA PARA BERÇO NA PISTA			
2	ESCAVAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE MEIO FIO E SARJETA			
3	CONCRETAGEM DE SARGETA			
4	INSTALAÇÃO DE MEIO FIO PREMOLDADO			
5	PAVIMENTAÇÃO EM PEYVER DE CONCRETO			

REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)






Data não informada



Data não informada

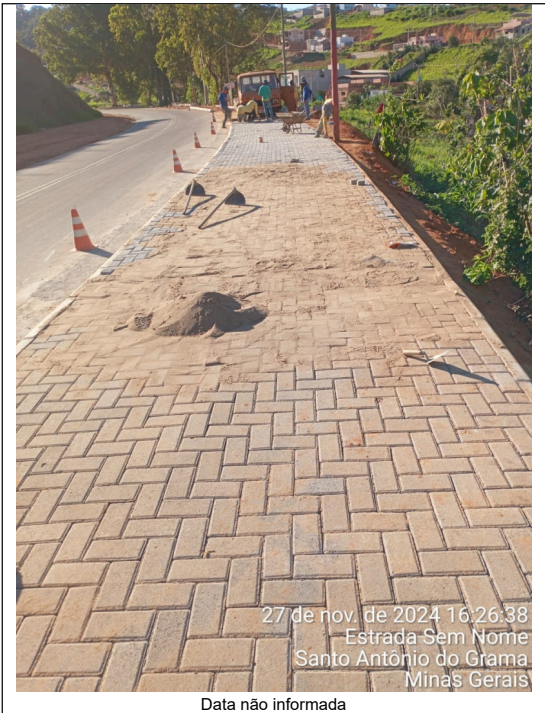

Data não informada



Data não informada

OCORRÊNCIAS		
NÚMERO DE OC	TIPO DE OCORRÊNCIA	DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA
CONFERÊNCIA		
MUNICÍPIO	CONSÓRCIO (Aprovado em 28/11/2024 - 08:52)	
Obs.:	Obs.:	
ASSINATURAS		
YURI ANDRADE COSTA LINS Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 233590/D	PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA CREA 137.103/D	ANTÔNIO CARLOS MARTINS BRANDÃO RT de Execução - PONTAL ENGENHARIA LTDA CREA 45.957/D



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº 0091	OBRA: CTP 0191/2024 - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE ACESSIBILIDADE	CONTRATO:		RESP. TÉCNICO: ANTONIO CARLOS MARTINS BRANDÃO
ENDEREÇO: TRECHO DA RODOVIA DE ACESSO A SANTO ANTONIO DO GRAMA, BAIRRO NOVO HORIZONTE.		INÍCIO: 01/07/2024		Nº CREA-MG: 45957/D
CIDDE:		PRAZO: 31/12/2024		Nº DA ART:
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA		UF:		COORDENADAS:
DATA: 26/11/2024	SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA ☔	IMPRATICÁVEL ☁
MANHÃ	✓			
TARDE	✓			
QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO		QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
1	ENCARREGADO DE OBRAS		3	PEDREIRO
5	AJUDANTE			
QTDE	EQUIPAMENTO			
2	CAVADEIRA RETA			
3	PÁ			
3	CHIBANCA			
3	ENXADA			
4	CARRINHO DE MÃO			
1	SERRA DE BANCADA			
TAREFAS REALIZADAS				
NÚMERO DE T.R.	DESCRIÇÃO		OBSERVAÇÕES	
1	ESPALHAMENTO DE AREIA PARA BERÇO NA PISTA			
2	PAVIMENTAÇÃO EM PEYVER DE CONCRETO			
3	ACERTO E NIVELAMENTO DE PISTA MANUAL			
4	INSTALAÇÃO DE MEIO FIO PREMOLDADO			
5	ESCAVAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DE MEIO FIO E SARGETA			
REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)				

REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATORIOS)





26 de nov. de 2024 10:52:41
Data não informada



26 de nov. de 2024 16:41:33
Rua Vicente Bretas Cupertino
Santo Antônio do Grama
Minas Gerais
Data não informada



26 de nov. de 2024 16:41:47
Rua Vicente Bretas Cupertino
Santo Antônio do Grama
Minas Gerais
Data não informada



26 de nov. de 2024 16:44:30
Rua Vicente Bretas Cupertino
Santo Antônio do Grama
Minas Gerais
Data não informada

OCORRÊNCIAS		
NÚMERO DE OC	TIPO DE OCORRÊNCIA	DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA
CONFERÊNCIA		
MUNICÍPIO	CONSÓRCIO (Aprovado em 28/11/2024 - 08:48)	
Obs.:	Obs.:	
ASSINATURAS		
YURI ANDRADE COSTA LINS Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 233590/D	PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA CREA 137.103/D	ANTÔNIO CARLOS MARTINS BRANDÃO RT de Execução - PONTAL ENGENHARIA LTDA CREA 45.957/D






CIMVALPI
CONSORCIO INTERMUNICIPAL
MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº 0090	OBRA: CTP 0191/2024 - SANTO ANTONIO DO GRAMA - IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE ACESSIBILIDADE	CONTRATO:	RESP. TÉCNICO: ANTONIO CARLOS MARTINS BRANDÃO
ENDEREÇO: TRECHO DA RODOVIA DE ACESSO A SANTO ANTONIO DO GRAMA, BAIRRO NOVO HORIZONTE.		INÍCIO: 01/07/2024	Nº CREA-MG: 45957/D
CIDDE:		PRAZO: 31/12/2024	Nº DA ART:
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA		UF:	COORDENADAS:
DATA: 25/11/2024	SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA ☔
MANHÃ	✓		IMPRATICÁVEL ☔
TARDE	✓		
QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
1	ENCARREGADO DE OBRAS	3	PEDREIRO
5	AJUDANTE		
QTDE	EQUIPAMENTO		
2	CAVADEIRA RETA		
1	DAMPER		
3	PÁ		
1	ROLO COMPACTADOR		
3	CHIBANCA		
3	ENXADA		
4	CARRINHO DE MÃO		
TAREFAS REALIZADAS			
NÚMERO DE T.R.	DESCRIÇÃO	OBSERVAÇÕES	
1	CONCRETAGEM DE SARGETA		
2	COMPACTAÇÃO DE CALÇAMENTO EM PEYVER		
3	INSTALAÇÃO DE MEIO FIO PREMOLDADO		
4	ESCAVAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE MEIO FIO E SARJETA		
REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATORIOS)			
 25 de nov. de 2024 16:40:08 Estrada Sem Nome Santo Antônio do Grama Minas Gerais Data não informada  25 de nov. de 2024 16:40:59 Rua Vicente Bretas Cupertino Santo Antônio do Grama Minas Gerais Data não informada			



Pág.: 20 / 29 - ID. do Doc.: C38.71F - 18/12/2024 - 08:26:58 - ASSINADO POR(2): CPF:084.941.*6.*2 CPF:385.06.*6.*4

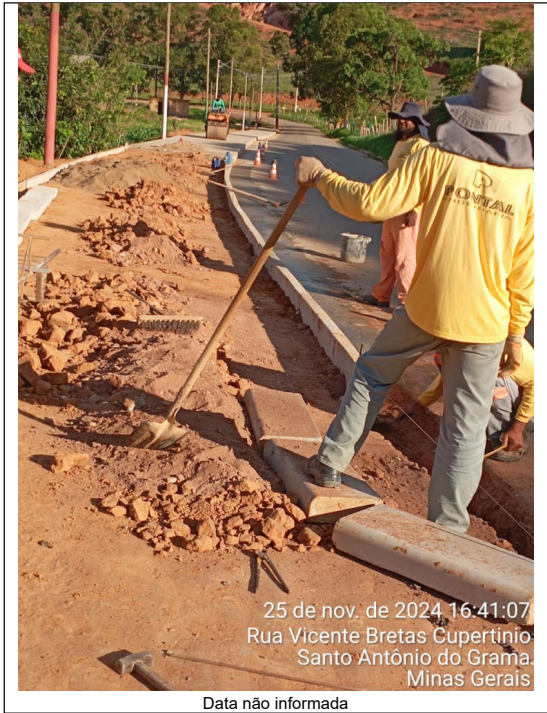

Data não informada

OCORRÊNCIAS		
NÚMERO DE OC	TIPO DE OCORRÊNCIA	DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA
CONFERÊNCIA		
MUNICÍPIO	CONSÓRCIO (Aprovado em 28/11/2024 - 08:47)	
Obs.:	Obs.:	
ASSINATURAS		
YURI ANDRADE COSTA LINS Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 233590/D	PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA CREA 137.103/D	ANTÔNIO CARLOS MARTINS BRANDÃO RT de Execução - PONTAL ENGENHARIA LTDA CREA 45.957/D



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº 0089		OBRA: CTP 0191/2024 - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE ACESSIBILIDADE		CONTRATO:		RESP. TÉCNICO: ANTONIO CARLOS MARTINS BRANDÃO	
ENDEREÇO: TRECHO DA RODOVIA DE ACESSO A SANTO ANTONIO DO GRAMA, BAIRRO NOVO HORIZONTE.				INÍCIO: 01/07/2024		Nº CREA-MG: 45957/D	
CIDDE:				PRAZO: 31/12/2024		Nº DA ART:	
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA				UF:		COORDENADAS:	
DATA: 22/11/2024		SOL ☀		NUBLADO ☁		CHUVA ☔	
MANHÃ		✓					
TARDE				✓			
QTDE		MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO				QTDE	
1		ENCARREGADO DE OBRAS				3	
5		AJUDANTE					
QTDE		EQUIPAMENTO					
1		EMPILHADEIRA					
1		DAMPER					
3		PÁ					
1		CAMINHÃO CARROCERIA					
3		ENXADA					
4		CARRINHO DE MÃO					
1		SERRA DE BANCADA					
TAREFAS REALIZADAS							
NÚMERO DE T.R.		DESCRIÇÃO				OBSERVAÇÕES	
1		CONCRETAGEM DE SARGETA					
2		PAVIMENTAÇÃO EM PEYVER DE CONCRETO					
3		TRANSPORTE DE PEYVER PARA PROXIMO DO CANTEIRO					
4		ESPALHAMENTO DE AREIA PARA BERÇO NA PISTA					
REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)							

REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATORIOS)





Data não informada



Data não informada



Data não informada



Data não informada





22 de nov. de 2024 13:07:51
Rua Vicente Bretas Cupertino
Santo Antônio do Grama
Minas Gerais

Data não informada

OCORRÊNCIAS		
NÚMERO DE OC	TIPO DE OCORRÊNCIA	DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA
CONFERÊNCIA		
MUNICÍPIO	CONSÓRCIO (Aprovado em 25/11/2024 - 13:29)	
Obs.:	Obs.:	
ASSINATURAS		
YURI ANDRADE COSTA LINS Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 233590/D	PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA CREA 137.103/D	ANTÔNIO CARLOS MARTINS BRANDÃO RT de Execução - PONTAL ENGENHARIA LTDA CREA 45.957/D



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO


Nº 0088		OBRA: CTP 0191/2024 - SANTO ANTONÍO DO GRAMA - IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE ACESSIBILIDADE		CONTRATO:		RESP. TÉCNICO: ANTONIO CARLOS MARTINS BRANDÃO	
ENDEREÇO: TRECHO DA RODOVIA DE ACESSO A SANTO ANTONIO DO GRAMA, BAIRRO NOVO HORIZONTE.				INÍCIO: 01/07/2024		Nº CREA-MG: 45957/D	
CIDDE:				PRAZO: 31/12/2024		Nº DA ART:	
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA				UF:		COORDENADAS:	
DATA: 21/11/2024		SOL ☀		NUBLADO ☁		CHUVA ☔	
MANHÃ		✓				IMPRATICÁVEL ☔	
TARDE						✓	
QTDE		MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO				QTDE	
1		ENCARREGADO DE OBRAS				3	
5		AJUDANTE				PEDREIRO	
QTDE		EQUIPAMENTO					
2		CAVADEIRA RETA					
3		PÁ					
2		CHIBANCA					
3		ENXADA					
4		CARRINHO DE MÃO					
TAREFAS REALIZADAS							
NÚMERO DE T.R.		DESCRIÇÃO				OBSERVAÇÕES	
1		RECEBIMENTO E DESCARGA DE MEIO FIO NA OBRA					
2		ESCAVAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE MEIO FIO E SARJETA					
3		INSTALAÇÃO DE MEIO FIO PREMOLDADO					
REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)							





21 de nov. de 2024 16:19:17
824 Rua Doutor Vicente Bretas Cupertino
Santo Antônio do Gramma
Santo Antônio do Gramma
Minas Gerais

Data não informada

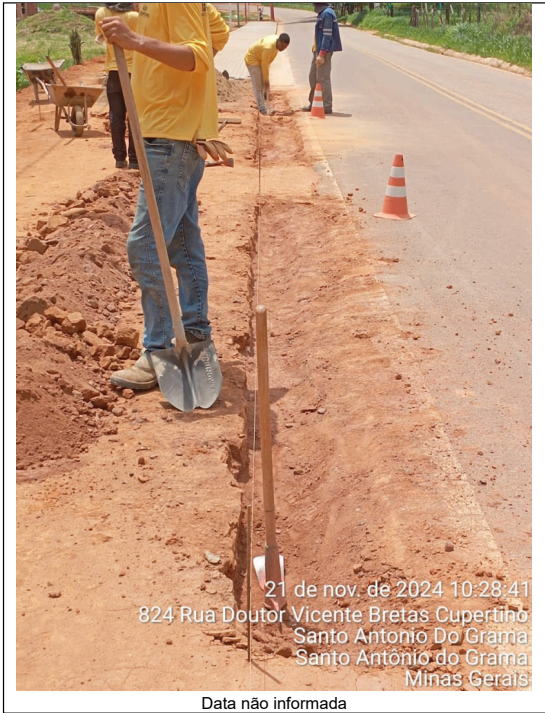

21 de nov. de 2024 10:28:41
824 Rua Doutor Vicente Bretas Cupertino
Santo Antônio do Gramma
Santo Antônio do Gramma
Minas Gerais

Data não informada



21 de nov. de 2024 07:10:26
Rua Vicente Bretas Cupertino
Santo Antônio do Gramma
Minas Gerais

Data não informada

OCORRÊNCIAS		
NÚMERO DE OC	TIPO DE OCORRÊNCIA	DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA
CONFERÊNCIA		
MUNICÍPIO	CONSÓRCIO (Aprovado em 25/11/2024 - 13:28)	
Obs.:	Obs.:	
ASSINATURAS		
YURI ANDRADE COSTA LINS Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 233590/D	PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA CREA 137.103/D	ANTÔNIO CARLOS MARTINS BRANDÃO RT de Execução - PONTAL ENGENHARIA LTDA CREA 45.957/D





CIMVALPI

CONSORCIO INTERMUNICIPAL
MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº 0087	OBRA: CTP 0191/2024 - SANTO ANTONIO DO GRAMA - IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE ACESSIBILIDADE	CONTRATO:	RESP. TÉCNICO: ANTONIO CARLOS MARTINS BRANDÃO
ENDEREÇO: TRECHO DA RODOVIA DE ACESSO A SANTO ANTONIO DO GRAMA, BAIRRO NOVO HORIZONTE.		INÍCIO: 01/07/2024	Nº CREA-MG: 45957/D
CIDDE:		PRAZO: 31/12/2024	Nº DA ART:
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA		UF:	COORDENADAS:
DATA: 21/11/2024	SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA ☔
MANHÃ	✓		IMPRATICÁVEL ☔
TARDE	✓		
QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
1	ENCARREGADO DE OBRAS	3	PEDREIRO
5	AJUDANTE		
QTDE	EQUIPAMENTO		
3	PÁ		
1	ROLO COMPACTADOR		
3	ENXADA		
4	CARRINHO DE MÃO		
1	SERRA DE BANCADA		
TAREFAS REALIZADAS			
NÚMERO DE T.R.	DESCRICAÇÃO	OBSERVAÇÕES	
1	REJUNTAMENTO DE MEIO FIO PREMOLDADO		
2	PAVIMENTAÇÃO EM PEYVER DE CONCRETO		
3	COMPACTAÇÃO DE CALCAMENTO EM PEYVER		
4	ESPALHAMENTO DE AREIA PARA BERÇO NA PISTA		
REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)			
 20 de nov. de 2024 14:23:45 Rua Vicente Bretas Cupertinoio Santo Antônio do Grama Minas Gerais Data não informada  20 de nov. de 2024 14:24:16 Rua Vicente Bretas Cupertinoio Santo Antônio do Grama Minas Gerais Data não informada			





Data não informada

OCORRÊNCIAS		
NÚMERO DE OC	TIPO DE OCORRÊNCIA	DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA
OBSERVAÇÕES		
RDO REFERENTE AO DIA 20/11/2024, FEITO EM ATRASO, POIS NAO HOUVE EXPEDIENTE NO ESCRITORIO		
CONFERÊNCIA		
MUNICÍPIO	CONSÓRCIO (Aprovado em 25/11/2024 - 13:26)	
Obs.:	Obs.:	
ASSINATURAS		
YURI ANDRADE COSTA LINS Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 233590/D	PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA CREA 137.103/D	ANTÔNIO CARLOS MARTINS BRANDÃO RT de Execução - PONTAL ENGENHARIA LTDA CREA 45.957/D





CIMVALPI

CONSORCIO INTERMUNICIPAL
MULTISETORIAL DO VALE DO PIRANGA

Assinaturas do Documento



Documento Assinado Eletronicamente por **YURI ANDRADE COSTA LINS**, CPF: 084.94*. **6- *2 em **18/12/2024 10:59:26**, Cód. Autenticidade da Assinatura: **10H1.2Z59.126R.H03A.6754**, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Documento Assinado Eletronicamente por **ANTONIO CARLOS MARTINS BRANDÃO**, CPF: 385.06*. **6- *4 em **18/12/2024 09:33:16**, Cód. Autenticidade da Assinatura: **0966.5333.6168.R573.0640**, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Informações do Documento

ID do Documento: **C38.71F** - Tipo de Documento: **FORMULÁRIO DE MEDIÇÕES**.

Elaborado por **GILBERTO ARAUJO GOMIDES**, CPF: 069.58*. **6- *7, em **18/12/2024 - 08:26:58**

Código de Autenticidade deste Documento: 0844.2V26.6581.E43R.3312

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
<https://zeropapel.cimvalpi.mg.gov.br/verdocumento>

