

FORMULÁRIO DE MEDIÇÕES

RELATÓRIO PARCIAL (SITUAÇÃO: APROVADA PELO CONSÓRCIO)

Enviado por ANTONIO CARLOS MARTINS BRANDAO em 21/01/2025 - 13:45

Registro: 21/01/2025	6ª MEDIÇÃO
Obra: 635.1 - CTP 0191/2024 - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE ACESSIBILIDADE	Período de 14/12/2024 a 20/01/2025
Ordens de Serviço: 482/2024	Local: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA

OBSERVAÇÕES

Enviada por ANTONIO CARLOS MARTINS BRANDAO (FORNECEDOR) em 21/01/2025 às 13:45

							QUANTIDADE MEDIDA		VALOR MEDIDO			
ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	NESTA MEDIÇÃO	ACUMULADA	VALOR PREVISTO (BDI)	NESTA MEDIÇÃO (BDI)	ACUMULADA (BDI)	SALDO (BDI)
01	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO											
01.01	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA - para obras que exigem a utilização de grande quantidade de equipamentos e são executadas em centros urbanos ou próximos de centros urbanos. Obs.: Não se aplica aos serviços de Tapa Buracos.											
01.01.01	OBRAS ATÉ O VALOR DE R\$ 1.000.000,00 - MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA PAVIMENTAÇÃO, EXCLUSIVE PARA TAPA-BURACOS	%	1	R\$ 25,00	R\$ 31,62	R\$ 31,62	0.5	3	R\$ 31,62	R\$ 265,58	R\$ 2.814,62	R\$ -2.783,00
06	PAVIMENTAÇÃO											
06.19	PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO DE CONCRETO											
06.19.01	PISO INTERTRAVADO 10X20CM E= 6,0CM 35MPA C/ COLCHAO AREIA	m²	2918.34	R\$ 85,13	R\$ 108,08	R\$ 315.414,19	332.2	2832.06	R\$ 315.414,19	R\$ 35.904,18	R\$ 306.089,04	R\$ 9.325,15
07	OBRAS CIVIS (PONTES, PASSARELAS, CORTINAS E GABIÕES)											
07.05	FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO											
07.05.01	PREPARADO EM OBRA											
07.05.01.05	CONCRETO CONVENCIONAL B1,B2 LANÇADO EM FUNDAÇÃO, FCK >= 20 MPA, BRITA CALCÁRIA, PREPARADO EM OBRA E LANÇADO EM FUNDAÇÃO	m³	9.92	R\$ 1.149,04	R\$ 1.457,58	R\$ 14.459,19	0.5	4.96	R\$ 14.459,19	R\$ 364,40	R\$ 3.614,80	R\$ 10.844,40



09	URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES											
09.01	MEIO FIO PADRÃO SUDECAP											
09.01.02	MEIO FIO EM CONCRETO PRE-MOLDADO FCK>=20MPA, PADRÃO SUDECAP TIPO B, 40 X 15/12 (H X L1/L2), COMPRIMENTO 80CM	m	1980	R\$ 35,45	R\$ 45,01	R\$ 89.119,80	273	1980	R\$ 89.119,80	R\$ 12.287,73	R\$ 89.119,80	R\$ 0,00
15	ADMINISTRAÇÃO LOCAL											
15.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - % BASEADA ACÓRDÃO 2.622/2013 DO TCU SOBRE SOMA DOS ITENS 1 A 14	%	15.1	R\$ 329,17	R\$ 416,25	R\$ 6.285,38	6.55	39.3	R\$ 6.285,38	R\$ 3.128,20	R\$ 36.687,60	R\$ -30.402,23
16*	SERVIÇOS COMPLEMENTARES											
16.04*	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO COM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK 15MPA , ÉSP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO SEDS)	M²	40	R\$ 359,14	R\$ 455,92	R\$ 18.236,80	20	20	R\$ 18.236,80	R\$ 4.559,20	R\$ 4.559,20	R\$ 13.677,60
							TOTAL:			R\$ 56.509,28	R\$ 602.425,98	

YURI ANDRADE COSTA LINS
Fiscal de Obras - CIMVALPI
CREA 233590/D
Aprovação: 24/01/2025

PEDRO MARTINO ZEFERINO
Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA
CREA 137.103/D

ANTÔNIO CARLOS MARTINS BRANDÃO
RT de Execução - PONTAL ENGENHARIA LTDA
CREA 45.957/D



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº 0126	OBRA: CTP 0191/2024 - SANTO ANTONÍO DO GRAMA - IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE ACESSIBILIDADE	CONTRATO:		RESP. TÉCNICO: ANTONIO CARLOS MARTINS BRANDÃO
ENDEREÇO: TRECHO DA RODOVIA DE ACESSO A SANTO ANTONIO DO GRAMA, BAIRRO NOVO HORIZONTE.		INÍCIO: 01/07/2024		Nº CREA-MG: 45957/D
CIDDE:		PRAZO: 31/12/2024		Nº DA ART:
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA		UF:		COORDENADAS:
DATA: 17/01/2025	SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA ☔	IMPRATICÁVEL ☁
MANHÃ	✓			
TARDE	✓			
QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO		QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
1	ENCARREGADO DE OBRAS		3	PEDREIRO
5	AJUDANTE			
QTDE	EQUIPAMENTO			
2	CAVADEIRA RETA			
1	DAMPER			
3	PÁ			
2	CHIBANCA			
3	ENXADA			
4	CARRINHO DE MÃO			
TAREFAS REALIZADAS				
NÚMERO DE T.R.	DESCRICAÇÃO		OBSERVAÇÕES	
1	CONCRETAGEM DE SARJETA			
2	INSTALAÇÃO DE MEIO FIO PREMOLDADO			
3	ESCAVAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DE MEIO FIO E SARGETA			
4	REBOCO DE ARESTAS			
5	ACERTO E NIVELAMENTO DE PISTA MANUAL			
REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)				

REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)





OCORRÊNCIAS		
NÚMERO DE OC	TIPO DE OCORRÊNCIA	DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA
CONFERÊNCIA		
MUNICÍPIO	CONSÓRCIO (Aprovado em 21/01/2025 - 11:29)	
Obs.:	Obs.:	
ASSINATURAS		
YURI ANDRADE COSTA LINS Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 233590/D	PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA CREA 137.103/D	ANTÔNIO CARLOS MARTINS BRANDÃO RT de Execução - PONTAL ENGENHARIA LTDA CREA 45.957/D



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº 0125		OBRA: CTP 0191/2024 - SANTO ANTONIO DO GRAMA - IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE ACESSIBILIDADE		CONTRATO:		RESP. TÉCNICO: ANTONIO CARLOS MARTINS BRANDÃO	
ENDEREÇO: TRECHO DA RODOVIA DE ACESSO A SANTO ANTONIO DO GRAMA, BAIRRO NOVO HORIZONTE.				INÍCIO: 01/07/2024		Nº CREA-MG: 45957/D	
CIDDE:				PRAZO: 31/12/2024		Nº DA ART:	
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA				UF:		COORDENADAS:	
DATA: 16/01/2025		SOL ☀		NUBLADO ☁		CHUVA ☔	
MANHÃ				✓			
TARDE		✓					
QTDE		MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO				QTDE	
1		ENCARREGADO DE OBRAS				3	
5		AJUDANTE				PEDREIRO	
QTDE		EQUIPAMENTO					
2		CAVADEIRA RETA					
1		DAMPER					
3		PÁ					
3		CHIBANCA					
3		ENXADA					
4		CARRINHO DE MÃO					
TAREFAS REALIZADAS							
NÚMERO DE T.R.		DESCRIÇÃO				OBSERVAÇÕES	
1		CONCRETAGEM DE SARJETA					
2		ESCAVAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE MEIO FIO E SARJETA					
3		INSTALAÇÃO DE MEIO FIO PREMOLDADO					

REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)





OCORRÊNCIAS		
NÚMERO DE OC	TIPO DE OCORRÊNCIA	DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA
CONFERÊNCIA		
MUNICÍPIO	CONSÓRCIO (Aprovado em 21/01/2025 - 11:29)	
Obs.:	Obs.:	
ASSINATURAS		
YURI ANDRADE COSTA LINS Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 233590/D	PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA CREA 137.103/D	ANTÔNIO CARLOS MARTINS BRANDÃO RT de Execução - PONTAL ENGENHARIA LTDA CREA 45.957/D



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº 0124		OBRA: CTP 0191/2024 - SANTO ANTONÍO DO GRAMA - IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE ACESSIBILIDADE		CONTRATO:		RESP. TÉCNICO: ANTONIO CARLOS MARTINS BRANDÃO	
ENDEREÇO: TRECHO DA RODOVIA DE ACESSO A SANTO ANTONIO DO GRAMA, BAIRRO NOVO HORIZONTE.				INÍCIO: 01/07/2024		Nº CREA-MG: 45957/D	
CIDDE:				PRAZO: 31/12/2024		Nº DA ART:	
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA				UF:		COORDENADAS:	
DATA: 15/01/2025		SOL ☀		NUBLADO ☁		CHUVA ☔	
MANHÃ						IMPRATICÁVEL ☁	
TARDE				✓			
QTDE		MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO				QTDE	
1		ENCARREGADO DE OBRAS				4	
4		AJUDANTE				PEDREIRO	
QTDE		EQUIPAMENTO					
1		CAVADEIRA RETA					
2		PÁ					
2		CHIBANCA					
2		ENXADA					
2		CARRINHO DE MÃO					
TAREFAS REALIZADAS							
NÚMERO DE T.R.		DESCRICAÇÃO				OBSERVAÇÕES	
1		INSTALAÇÃO DE MEIO FIO PREMOLDADO					
2		ESCAVAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE MEIO FIO E SARJETA					
3		TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA DE PAVIMENTO					
REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATORÍOS)							

REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATORIOS)





OCORRÊNCIAS		
NÚMERO DE OC	TIPO DE OCORRÊNCIA	DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA
CONFERÊNCIA		
MUNICÍPIO	CONSÓRCIO (Aprovado em 16/01/2025 - 10:11)	
Obs.:	Obs.:	
ASSINATURAS		
YURI ANDRADE COSTA LINS Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 233590/D	PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA CREA 137.103/D	ANTÔNIO CARLOS MARTINS BRANDÃO RT de Execução - PONTAL ENGENHARIA LTDA CREA 45.957/D





CIMVALPI
CONSORCIO INTERMUNICIPAL
MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº 0123	OBRA: CTP 0191/2024 - SANTO ANTONIO DO GRAMA - IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE ACESSIBILIDADE	CONTRATO:	RESP. TÉCNICO: ANTONIO CARLOS MARTINS BRANDÃO
ENDEREÇO: TRECHO DA RODOVIA DE ACESSO A SANTO ANTONIO DO GRAMA, BAIRRO NOVO HORIZONTE.		INÍCIO: 01/07/2024	Nº CREA-MG: 45957/D
CIDDE:		PRAZO: 31/12/2024	Nº DA ART:
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA		UF:	COORDENADAS:
DATA: 14/01/2025	SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA ☔
MANHÃ		✓	IMPRATICÁVEL ☔
TARDE			
QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
1	ENCARREGADO DE OBRAS	1	OPERADOR DE MOTONIVELADORA
4	PEDREIRO	4	AJUDANTE
QTDE	EQUIPAMENTO		
2	PÁ		
1	CAVADEIRA DE BOCA		
2	ENXADA		
1	MOTONIVELADORA		
TAREFAS REALIZADAS			
NÚMERO DE T.R.	DESCRICAO	OBSERVAÇÕES	
1	COSNTRUÇÃO DE CERCA		
2	ACERTO E NIVELAMENTO MECANICO DE PISTA		
REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)			
 14 de jan. de 2025 16:21:42 Data não informada		 14 de jan. de 2025 16:22:23 798 Rua Doutor Vicente Bretas Cupertino Santo Antonio Do Grama Santo Antônio do Grama Minas Gerais Data não informada	





14 de jan. de 2025 07:36:40
Estrada Sem Nome
Urucânia
Minas Gerais

Data não informada



14 de jan. de 2025 16:43:07

Data não informada

OCORRÊNCIAS	
NÚMERO DE OC	TIPO DE OCORRÊNCIA
CONFERÊNCIA	
MUNICÍPIO	CONSÓRCIO (Aprovado em 15/01/2025 - 08:53)
Obs.:	Obs.:
ASSINATURAS	
YURI ANDRADE COSTA LINS Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 233590/D	PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA CREA 137.103/D
ANTÔNIO CARLOS MARTINS BRANDÃO RT de Execução - PONTAL ENGENHARIA LTDA CREA 45.957/D	



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº 0122	OBRA: CTP 0191/2024 - SANTO ANTONIO DO GRAMA - IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE ACESSIBILIDADE	CONTRATO:	RESP. TÉCNICO: ANTONIO CARLOS MARTINS BRANDÃO
ENDEREÇO: TRECHO DA RODOVIA DE ACESSO A SANTO ANTONIO DO GRAMA, BAIRRO NOVO HORIZONTE.	INÍCIO: 01/07/2024	Nº CREA-MG: 45957/D	
CIDDE:	PRAZO: 31/12/2024	Nº DA ART:	
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA	UF:	COORDENADAS:	
DATA: 13/01/2025	SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA ☔
MANHÃ			IMPRATICÁVEL ☔
TARDE		✓	✓
QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
1	ENCARREGADO DE OBRAS	3	PEDREIRO
5	AJUDANTE		
QTDE	EQUIPAMENTO		
2	CAVADEIRA RETA		
2	CARRINHO DE MÃO		
TAREFAS REALIZADAS			
NÚMERO DE T.R.	DESCRICAÇÃO	OBSERVAÇÕES	
1	INSTALAÇÃO DE TELA DE AÇO EM MOUROES DE EUCALIPTO		

REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)





OCORRÊNCIAS		
NÚMERO DE OC	TIPO DE OCORRÊNCIA	DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA
CONFERÊNCIA		
MUNICÍPIO	CONSÓRCIO (Aprovado em 14/01/2025 - 16:35)	
Obs.:	Obs.:	
ASSINATURAS		
YURI ANDRADE COSTA LINS Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 233590/D	PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA CREA 137.103/D	ANTÔNIO CARLOS MARTINS BRANDÃO RT de Execução - PONTAL ENGENHARIA LTDA CREA 45.957/D



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº 0121	OBRA: CTP 0191/2024 - SANTO ANTONIO DO GRAMA - IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE ACESSIBILIDADE	CONTRATO:	RESP. TÉCNICO: ANTONIO CARLOS MARTINS BRANDÃO
ENDEREÇO: TRECHO DA RODOVIA DE ACESSO A SANTO ANTONIO DO GRAMA, BAIRRO NOVO HORIZONTE.		INÍCIO: 01/07/2024	Nº CREA-MG: 45957/D
CIDDE:		PRAZO: 31/12/2024	Nº DA ART:
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA		UF:	COORDENADAS:
DATA: 10/01/2025	SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA ☔
MANHÃ		✓	IMPRATICÁVEL ☁
TARDE		✓	
QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
1	ENCARREGADO DE OBRAS	3	PEDREIRO
3	AJUDANTE		
QTDE	EQUIPAMENTO		
2	CAVADEIRA RETA		
2	PÁ		
2	CAVADEIRA DE BOCA		
2	MARTELO		
TAREFAS REALIZADAS			
NÚMERO DE T.R.	DESCRICAÇÃO	OBSERVAÇÕES	
1	CONSTRUÇÃO DE CERCA EM MOUROES DE EUCALÍPITO		
2	LIMPEZA GERAL DA OBRA		

REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)



OCORRÊNCIAS		
NÚMERO DE OC	TIPO DE OCORRÊNCIA	DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA
CONFERÊNCIA		
MUNICÍPIO	CONSÓRCIO (Aprovado em 13/01/2025 - 11:12)	
Obs.:	Obs.:	
ASSINATURAS		
YURI ANDRADE COSTA LINS Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 233590/D	PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA CREA 137.103/D	ANTÔNIO CARLOS MARTINS BRANDÃO RT de Execução - PONTAL ENGENHARIA LTDA CREA 45.957/D

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº 0120	OBRA: CTP 0191/2024 - SANTO ANTONIO DO GRAMA - IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE ACESSIBILIDADE	CONTRATO:	RESP. TÉCNICO: ANTONIO CARLOS MARTINS BRANDÃO
ENDEREÇO: TRECHO DA RODOVIA DE ACESSO A SANTO ANTONIO DO GRAMA, BAIRRO NOVO HORIZONTE.	INÍCIO: 01/07/2024	Nº CREA-MG: 45957/D	
CIDDE:	PRAZO: 31/12/2024	Nº DA ART:	
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA	UF:	COORDENADAS:	
DATA: 09/01/2025	SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA ☔
MANHÃ	✓		IMPRATICÁVEL ☔
TARDE		✓	
QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
1	ENCARREGADO DE OBRAS	3	PEDREIRO
5	AJUDANTE		
QTDE	EQUIPAMENTO		
3	CAVADEIRA RETA		
3	CAVADEIRA DE BOCA		
2	ENXADA		
4	CARRINHO DE MÃO		
TAREFAS REALIZADAS			
NÚMERO DE T.R.	DESCRICAÇÃO	OBSERVAÇÕES	
1	INSTALAÇÃO DE MOUROES PARA RECEBER TELA GALVANIZAD		
2	ESCAVAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE MOUROES DE EUCALIPTO		

REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)





OCORRÊNCIAS		
NÚMERO DE OC	TIPO DE OCORRÊNCIA	DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA
CONFERÊNCIA		
MUNICÍPIO	CONSÓRCIO (Aprovado em 13/01/2025 - 11:12)	
Obs.:	Obs.:	
ASSINATURAS		
YURI ANDRADE COSTA LINS Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 233590/D PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA CREA 137.103/D ANTÔNIO CARLOS MARTINS BRANDÃO RT de Execução - PONTAL ENGENHARIA LTDA CREA 45.957/D		



 CIMVALPI CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO	
Nº 0119		OBRA: CTP 0191/2024 - SANTO ANTONIO DO GRAMA - IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE ACESSIBILIDADE	
CONTRATO:		RESP. TÉCNICO: ANTONIO CARLOS MARTINS BRANDÃO	
ENDEREÇO: TRECHO DA RODOVIA DE ACESSO A SANTO ANTONIO DO GRAMA, BAIRRO NOVO HORIZONTE.		INÍCIO: 01/07/2024	
CIDDE:		Nº CREA-MG: 45957/D	
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA		PRAZO: 31/12/2024	
DATA: 08/01/2025		Nº DA ART:	
SOL ☀		CHUVA ☁	
NUBLADO ☁		IMPRATICÁVEL ☔	
MANHÃ		TARDE	
✓		✓	
QTDE		MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	
1		ENCARREGADO DE OBRAS	
5		AJUDANTE	
QTDE		QTDE	
1		3	
DAMPER		PEDREIRO	
3		PÁ	
1		ROLO COMPACTADOR	
3		ENXADA	
4		CARRINHO DE MÃO	
TAREFAS REALIZADAS			
NÚMERO DE T.R.		DESCRICAÇÃO	
1		REJUNTAMENTO DE MEIO FIO PREMOLDADO	
2		ARREMATE DE ARESTAS	
3		COMPACTAÇÃO DE CALCAMENTO EM PEYVER	
4		CONCRETAGEM DE RAMPA DE ACESSO A PISTA DE ACESSIBI	
REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)			
 8 de jan. de 2025 16:07:17 Estrada Sem Nome Urucânia Minas Gerais Data não informada		 8 de jan. de 2025 16:08:32 Rua Vicente Bretas Cupertino Santo Antonio do Grama Minas Gerais Data não informada	





Data não informada



Data não informada



Data não informada



Data não informada

OCORRÊNCIAS		
NÚMERO DE OC	TIPO DE OCORRÊNCIA	DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA
CONFERÊNCIA		
MUNICÍPIO	CONSÓRCIO (Aprovado em 13/01/2025 - 11:11)	
Obs.:		Obs.:
ASSINATURAS		
YURI ANDRADE COSTA LINS Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 233590/D	PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA CREA 137.103/D	ANTÔNIO CARLOS MARTINS BRANDÃO RT de Execução - PONTAL ENGENHARIA LTDA CREA 45.957/D



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº 0118	OBRA: CTP 0191/2024 - SANTO ANTONIO DO GRAMA - IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE ACESSIBILIDADE	CONTRATO:	RESP. TÉCNICO: ANTONIO CARLOS MARTINS BRANDÃO
ENDEREÇO: TRECHO DA RODOVIA DE ACESSO A SANTO ANTONIO DO GRAMA, BAIRRO NOVO HORIZONTE.	INÍCIO: 01/07/2024	Nº CREA-MG: 45957/D	
CIDDE:	PRAZO: 31/12/2024	Nº DA ART:	
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA	UF:	COORDENADAS:	
DATA: 07/01/2025	SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA ☔
MANHÃ	✓		IMPRATICÁVEL ☔
TARDE		✓	
QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
1	ENCARREGADO DE OBRAS	3	PEDREIRO
5	AJUDANTE		
QTDE	EQUIPAMENTO		
3	PÁ		
3	ENXADA		
4	CARRINHO DE MÃO		
1	SERRA DE BANCADA		
TAREFAS REALIZADAS			
NÚMERO DE T.R.	DESCRICAÇÃO	OBSERVAÇÕES	
1	REFORMA DE CALÇAMENTO DANIFICADO PELA CHUVA		
2	ESPALHAMENTO DE AREIA PARA BERÇO NA PISTA		
3	PAVIMENTAÇÃO EM PEYVER DE CONCRETO		

REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)





OCORRÊNCIAS		
NÚMERO DE OC	TIPO DE OCORRÊNCIA	DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA
CONFERÊNCIA		
MUNICÍPIO	CONSÓRCIO (Aprovado em 13/01/2025 - 11:11)	
Obs.:	Obs.:	
ASSINATURAS		
YURI ANDRADE COSTA LINS Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 233590/D	PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA CREA 137.103/D	ANTÔNIO CARLOS MARTINS BRANDÃO RT de Execução - PONTAL ENGENHARIA LTDA CREA 45.957/D



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº 0117		OBRA: CTP 0191/2024 - SANTO ANTONÍO DO GRAMA - IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE ACESSIBILIDADE		CONTRATO:		RESP. TÉCNICO: ANTONIO CARLOS MARTINS BRANDÃO	
ENDEREÇO: TRECHO DA RODOVIA DE ACESSO A SANTO ANTONIO DO GRAMA, BAIRRO NOVO HORIZONTE.				INÍCIO: 01/07/2024		Nº CREA-MG: 45957/D	
CIDDE:				PRAZO: 31/12/2024		Nº DA ART:	
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA				UF:		COORDENADAS:	
DATA: 06/01/2025		SOL ☀		NUBLADO ☁		CHUVA ☔	
MANHÃ		✓				IMPRATICÁVEL ☔	
TARDE				✓			
QTDE		MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO				QTDE	
1		ENCARREGADO DE OBRAS				4	
4		AJUDANTE					
QTDE		EQUIPAMENTO					
1		ROLO LISO					
3		PÁ					
2		ENXADA					
3		CARRINHO DE MÃO					
TAREFAS REALIZADAS							
NÚMERO DE T.R.		DESCRICAÇÃO				OBSERVAÇÕES	
1		ESPALHAMENTO DE AREIA PARA BERÇO					
2		COMPACTAÇÃO DE PAVIMENTO COM ROLO LISO					
3		PAVIMENTAÇÃO EM PAVER PREMOLDADO					
REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)							





Data não informada



Data não informada



Data não informada



Data não informada

OCORRÊNCIAS		
NÚMERO DE OC	TIPO DE OCORRÊNCIA	DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA
CONFERÊNCIA		
MUNICÍPIO	CONSÓRCIO (Aprovado em 07/01/2025 - 09:00)	
Obs.:	Obs.:	
ASSINATURAS		
YURI ANDRADE COSTA LINS Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 233590/D	PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA CREA 137.103/D	ANTÔNIO CARLOS MARTINS BRANDÃO RT de Execução - PONTAL ENGENHARIA LTDA CREA 45.957/D



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO


Nº 0116	OBRA: CTP 0191/2024 - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE ACESSIBILIDADE	CONTRATO:		RESP. TÉCNICO: ANTONIO CARLOS MARTINS BRANDÃO
ENDEREÇO: TRECHO DA RODOVIA DE ACESSO A SANTO ANTONIO DO GRAMA, BAIRRO NOVO HORIZONTE.		INÍCIO: 01/07/2024		Nº CREA-MG: 45957/D
CIDDE:		PRAZO: 31/12/2024		Nº DA ART:
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA		UF:		COORDENADAS:
DATA: 04/01/2025	SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA ☔	IMPRATICÁVEL ☁
MANHÃ		✓		
TARDE		✓		
QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO		QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
1	ENCARREGADO DE OBRAS		4	PEDREIRO
4	AJUDANTE			
QTDE	EQUIPAMENTO			
1	ROLO LISO			
1	DAMPER			
3	PÁ			
2	CHIBANCA			
3	ENXADA			
3	CARRINHO DE MÃO			
1	BETONEIRA			
TAREFAS REALIZADAS				
NÚMERO DE T.R.	DESCRIÇÃO		OBSERVAÇÕES	
1	INSTALAÇÃO DE MEIO FIO PREMOLDADO			
2	COMPACTAÇÃO DE BASE ÁREA DE CALÇAMENTO			
3	CONCRETAGEM DE SARJETAS			
4	ESCAVAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DE MEIO FIO			
5	ACERTO E NIVELAMENTO DE PISTA			
REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)				



Data não informada



Data não informada

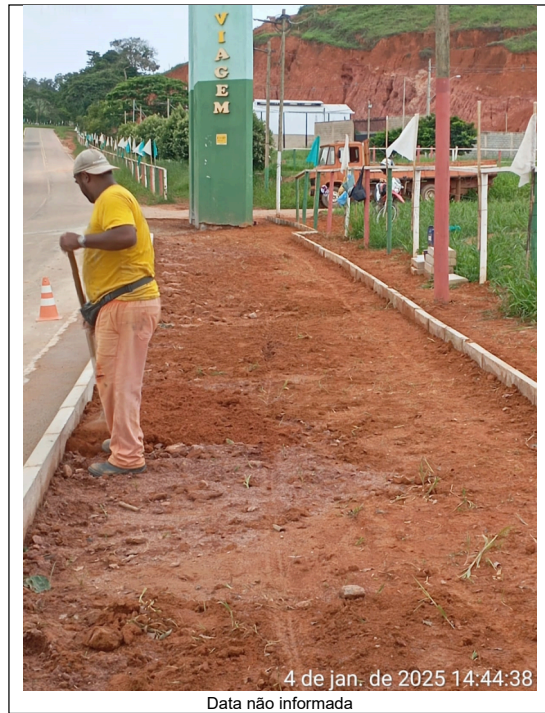



Data não informada

OCORRÊNCIAS		
NÚMERO DE OC	TIPO DE OCORRÊNCIA	DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA
CONFERÊNCIA		
MUNICÍPIO	CONSÓRCIO (Aprovado em 06/01/2025 - 08:40)	
Obs.:	Obs.:	
ASSINATURAS		
YURI ANDRADE COSTA LINS Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 233590/D	PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA CREA 137.103/D	ANTÔNIO CARLOS MARTINS BRANDÃO RT de Execução - PONTAL ENGENHARIA LTDA CREA 45.957/D





CIMVALPI
CONSORCIO INTERMUNICIPAL
MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº 0115	OBRA: CTP 0191/2024 - SANTO ANTONIO DO GRAMA - IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE ACESSIBILIDADE	CONTRATO:	RESP. TÉCNICO: ANTONIO CARLOS MARTINS BRANDÃO	
ENDEREÇO: TRECHO DA RODOVIA DE ACESSO A SANTO ANTONIO DO GRAMA, BAIRRO NOVO HORIZONTE.		INÍCIO: 01/07/2024		Nº CREA-MG: 45957/D
CIDDE:		PRAZO: 31/12/2024		Nº DA ART:
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA		UF:		COORDENADAS:
DATA: 03/01/2025	SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA ☔	IMPRATICÁVEL 🌧
MANHÃ	✓			
TARDE			✓	
QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	
1	ENCARREGADO DE OBRAS	4	PEDREIRO	
4	AJUDANTE			
QTDE	EQUIPAMENTO			
1	CAVADEIRA RETA			
3	PÁ			
3	CHIBANCA			
3	ENXADA			
3	CARRINHO DE MÃO			
TAREFAS REALIZADAS				
NÚMERO DE T.R.	DESCRICAÇÃO	OBSERVAÇÕES		
1	ESPALHAMENTO DE AREIA NA PISTA PARA BERÇO			
2	ESCAVAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE MEIO FIO E SARJETA			
3	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO EXISTENTE EM CONCRETO			
4	PAVIMENTAÇÃO EM PAVER PREMOLDADO			
5	INSTALAÇÃO DE MEIO FIO PREMOLDADO			
REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)				
 3 de jan. de 2025 15:33:57 Rua Vicente Bretas Cupertinoio Santo Antônio do Grama Minas Gerais Data não informada  3 de jan. de 2025 15:33:40 Rua Vicente Bretas Cupertinoio Santo Antônio do Grama Minas Gerais Data não informada				





OCORRÊNCIAS		
NÚMERO DE OC	TIPO DE OCORRÊNCIA	DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA
CONFERÊNCIA		
MUNICÍPIO	CONSÓRCIO (Aprovado em 06/01/2025 - 08:40)	
Obs.:	Obs.:	
ASSINATURAS		
YURI ANDRADE COSTA LINS Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 233590/D	PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA CREA 137.103/D	ANTÔNIO CARLOS MARTINS BRANDÃO RT de Execução - PONTAL ENGENHARIA LTDA CREA 45.957/D





CIMVALPI
CONSORCIO INTERMUNICIPAL
MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº 0114	OBRA: CTP 0191/2024 - SANTO ANTONIO DO GRAMA - IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE ACESSIBILIDADE	CONTRATO:	RESP. TÉCNICO: ANTONIO CARLOS MARTINS BRANDÃO
ENDEREÇO: TRECHO DA RODOVIA DE ACESSO A SANTO ANTONIO DO GRAMA, BAIRRO NOVO HORIZONTE.		INÍCIO: 01/07/2024	Nº CREA-MG: 45957/D
CIDDE:		PRAZO: 31/12/2024	Nº DA ART:
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA		UF:	COORDENADAS:
DATA: 31/12/2024	SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA ☔
MANHÃ		✓	IMPRATICÁVEL ☂
TARDE		✓	
QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
1	ENCARREGADO DE OBRAS	3	PEDREIRO
4	AJUDANTE		
QTDE	EQUIPAMENTO		
1	CAMINHÃO 3/4		
1	ROLO LISO		
3	PÁ		
3	ENXADA		
3	CARRINHO DE MÃO		
TAREFAS REALIZADAS			
NÚMERO DE T.R.	DESCRICAO	OBSERVAÇÕES	
1	CALÇAMENTO EM PAVER E ESPALHAMENTO DE AREIA		
2	COMPACTAÇÃO DE PAVIMENTO COM ROLO LISO		
3	DESCARREGAMENTO DE PAVERS NA OBRA		
4	ACERTO E NIVELAMENTO DE PISTA		
REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)			
 31 de dez. de 2024 11:17:17 Estrada Sem Nome Urucânia Minas Gerais Data não informada  31 de dez. de 2024 09:07:21 Data não informada			





Data não informada



Data não informada



Data não informada

OCORRÊNCIAS		
NÚMERO DE OC	TIPO DE OCORRÊNCIA	DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA
CONFERÊNCIA		
MUNICÍPIO	CONSÓRCIO (Aprovado em 06/01/2025 - 08:40)	
Obs.:	Obs.:	
ASSINATURAS		
YURI ANDRADE COSTA LINS Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 233590/D	PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA CREA 137.103/D	ANTÔNIO CARLOS MARTINS BRANDÃO RT de Execução - PONTAL ENGENHARIA LTDA CREA 45.957/D



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº 0113		OBRA: CTP 0191/2024 - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE ACESSIBILIDADE		CONTRATO:		RESP. TÉCNICO: ANTONIO CARLOS MARTINS BRANDÃO	
ENDEREÇO: TRECHO DA RODOVIA DE ACESSO A SANTO ANTONIO DO GRAMA, BAIRRO NOVO HORIZONTE.				INÍCIO: 01/07/2024		Nº CREA-MG: 45957/D	
CIDDE:				PRAZO: 31/12/2024		Nº DA ART:	
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA				UF:		COORDENADAS:	
DATA: 30/12/2024		SOL ☀		NUBLADO ☁		CHUVA ☔	
MANHÃ				✓			
TARDE				✓			
QTDE		MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO				QTDE	
1		ENCARREGADO DE OBRAS				4	
4		AJUDANTE				PEDREIRO	
QTDE		EQUIPAMENTO					
3		PÁ					
2		CHIBANCA					
1		CAMINHÃO CAÇAMBA - TOCO - CAP. 6M³					
3		ENXADA					
1		CARRINHO DE MÃO					
1		BETONEIRA					
TAREFAS REALIZADAS							
NÚMERO DE T.R.		DESCRICAÇÃO				OBSERVAÇÕES	
1		ESCAVAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE SARJETA E MEIO FIO					
2		DESCARREGAMENTO DE AREIA NA OBRA					
3		CONCRETAGEM E ACABAMENTO DE SARJETA					
4		ASSENTAMENTO DE MEIO FIO PREMOLDADE					
5		ACERTO E NIVELAMENTO DE ÁREA PARA PAVIMENTAÇÃO					
6		ESPALHAMENTO DE AREIA PARA BERÇO					
REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)							



Data não informada



Data não informada



Data não informada

OCORRÊNCIAS		
NÚMERO DE OC	TIPO DE OCORRÊNCIA	DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA
CONFERÊNCIA		
MUNICÍPIO	CONSÓRCIO (Aprovado em 06/01/2025 - 08:41)	
Obs.:	Obs.:	
ASSINATURAS		
YURI ANDRADE COSTA LINS Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 233590/D	PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA CREA 137.103/D	ANTÔNIO CARLOS MARTINS BRANDÃO RT de Execução - PONTAL ENGENHARIA LTDA CREA 45.957/D



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº 0112	OBRA: CTP 0191/2024 - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE ACESSIBILIDADE	CONTRATO:	RESP. TÉCNICO: ANTONIO CARLOS MARTINS BRANDÃO
ENDEREÇO: TRECHO DA RODOVIA DE ACESSO A SANTO ANTONIO DO GRAMA, BAIRRO NOVO HORIZONTE.		INÍCIO: 01/07/2024	Nº CREA-MG: 45957/D
CIDDE:		PRAZO: 31/12/2024	Nº DA ART:
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA		UF:	COORDENADAS:
DATA: 27/12/2024	SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA ☔
MANHÃ		✓	IMPRATICÁVEL ☁
TARDE			✓
QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
1	ENCARREGADO DE OBRAS	3	PEDREIRO
4	AJUDANTE		
QTDE	EQUIPAMENTO		
1	ROLO LISO		
2	PÁ		
2	ENXADA		
2	CARRINHO DE MÃO		
TAREFAS REALIZADAS			
NÚMERO DE T.R.	DESCRICAÇÃO	OBSERVAÇÕES	
1	ESPALHAMENTO DE AREIA PARA BERÇO		
2	PAVIMENTAÇÃO EM PAVER PREMOLDADO		
3	COMPACTAÇÃO DE PAVIMENTO COM ROLO LISO		
REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)			






OCORRÊNCIAS		
NÚMERO DE OC	TIPO DE OCORRÊNCIA	DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA
CONFERÊNCIA		
MUNICÍPIO	CONSÓRCIO (Aprovado em 30/12/2024 - 08:06)	
Obs.:	Obs.:	
ASSINATURAS		
YURI ANDRADE COSTA LINS Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 233590/D	PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA CREA 137.103/D	ANTÔNIO CARLOS MARTINS BRANDÃO RT de Execução - PONTAL ENGENHARIA LTDA CREA 45.957/D



 CIMVALPI CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO	
Nº 0111		OBRA: CTP 0191/2024 - SANTO ANTONIO DO GRAMA - IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE ACESSIBILIDADE	
CONTRATO:		RESP. TÉCNICO: ANTONIO CARLOS MARTINS BRANDÃO	
ENDEREÇO: TRECHO DA RODOVIA DE ACESSO A SANTO ANTONIO DO GRAMA, BAIRRO NOVO HORIZONTE.		Nº CREA-MG: 45957/D	
CIDDE:		Nº DA ART:	
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA		COORDENADAS:	
DATA: 26/12/2024	SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA ☔
MANHÃ	✓		
TARDE	✓		
QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
1	ENCARREGADO DE OBRAS	4	PEDREIRO
4	AJUDANTE		
QTDE	EQUIPAMENTO		
2	CAVADEIRA RETA		
2	PÁ		
2	CHIBANCA		
3	ENXADA		
3	BETONEIRA		
TAREFAS REALIZADAS			
NÚMERO DE T.R.	DESCRICAÇÃO	OBSERVAÇÕES	
1	CONCRETAGEM DE SARJETA		
2	INSTALAÇÃO DE MEIO FIO PREMOLDADO		
3	ACERTO E NIVELAMENTO DE PISTA		
4	ESPALHAMENTO DE AREIA PARA BERÇO NA PISTA		
5	DESCARREGAMENTO DE PAVERS NA OBRA		
REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATORIOS)			
 26 de dez. de 2024 14:25:02 Rua Vicente Bretas Cupertino Santo Antônio do Grama Minas Gerais Data não informada		 26 de dez. de 2024 14:24:46 Rua Vicente Bretas Cupertino Santo Antônio do Grama Minas Gerais Data não informada	



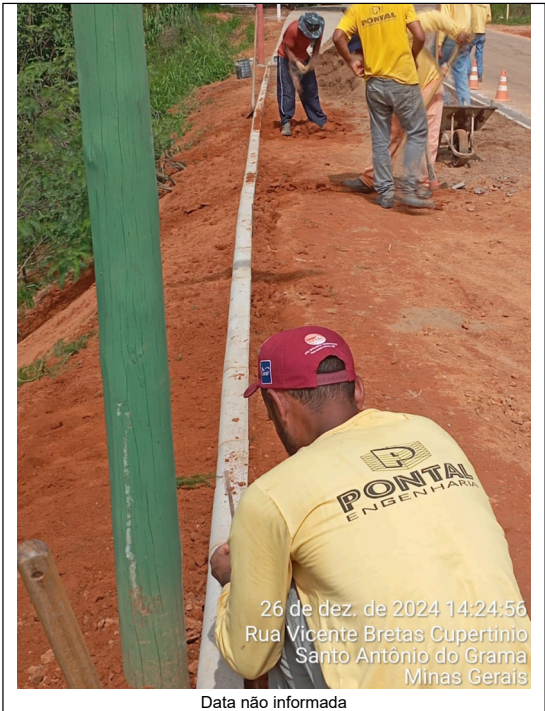



Data não informada

OCORRÊNCIAS		
NÚMERO DE OC	TIPO DE OCORRÊNCIA	DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA
CONFERÊNCIA		
MUNICÍPIO	CONSÓRCIO (Aprovado em 27/12/2024 - 09:18)	
Obs.:	Obs.:	
ASSINATURAS		
YURI ANDRADE COSTA LINS Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 233590/D	PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA CREA 137.103/D	ANTÔNIO CARLOS MARTINS BRANDÃO RT de Execução - PONTAL ENGENHARIA LTDA CREA 45.957/D



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº 0110	OBRA: CTP 0191/2024 - SANTO ANTONIO DO GRAMA - IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE ACESSIBILIDADE	CONTRATO:	RESP. TÉCNICO: ANTONIO CARLOS MARTINS BRANDÃO
ENDEREÇO: TRECHO DA RODOVIA DE ACESSO A SANTO ANTONIO DO GRAMA, BAIRRO NOVO HORIZONTE.	INÍCIO: 01/07/2024	Nº CREA-MG: 45957/D	
CIDDE:	PRAZO: 31/12/2024	Nº DA ART:	
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA	UF:	COORDENADAS:	
DATA: 24/12/2024	SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA ☔
MANHÃ	✓		IMPRATICÁVEL ☔
QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
1	ENCARREGADO DE OBRAS	3	PEDREIRO
4	AJUDANTE		
QTDE	EQUIPAMENTO		
1	ROLO LISO		
2	PÁ		
2	CHIBANCA		
2	ENXADA		
3	CARRINHO DE MÃO		
TAREFAS REALIZADAS			
NÚMERO DE T.R.	DESCRICAÇÃO	OBSERVAÇÕES	
1	PAVIMENTAÇÃO E NIVELAMENTO DE CALÇAMENTO COM ROLO		
2	DESFORMA MURO ARRIMO		
3	PAVIMENTAÇÃO EM PAVER PREMOLDADO		
4	DESCARREGAMENTO DE AREIA NA OBRA		
5	REJUNTAMENTO DE PAVIMENTO COM AREIA		

REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATORIOS)





OCORRÊNCIAS		
NÚMERO DE OC	TIPO DE OCORRÊNCIA	DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA
CONFERÊNCIA		
MUNICÍPIO	CONSÓRCIO (Aprovado em 26/12/2024 - 10:56)	
Obs.:	Obs.:	
ASSINATURAS		
YURI ANDRADE COSTA LINS Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 233590/D	PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA CREA 137.103/D	ANTÔNIO CARLOS MARTINS BRANDÃO RT de Execução - PONTAL ENGENHARIA LTDA CREA 45.957/D



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO


Nº 0109	OBRA: CTP 0191/2024 - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE ACESSIBILIDADE	CONTRATO:		RESP. TÉCNICO: ANTONIO CARLOS MARTINS BRANDÃO
ENDEREÇO: TRECHO DA RODOVIA DE ACESSO A SANTO ANTONIO DO GRAMA, BAIRRO NOVO HORIZONTE.		INÍCIO: 01/07/2024		Nº CREA-MG: 45957/D
CIDDE:		PRAZO: 31/12/2024		Nº DA ART:
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA		UF:		COORDENADAS:
DATA: 23/12/2024	SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA ☔	IMPRATICÁVEL ☔
MANHÃ	✓			
TARDE	✓			
QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO		QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
1	ENCARREGADO DE OBRAS		4	PEDREIRO
4	AJUDANTE			
QTDE	EQUIPAMENTO			
2	CAVADEIRA RETA			
1	DAMPER			
3	PÁ			
2	CHIBANCA			
3	ENXADA			
3	CARRINHO DE MÃO			
TAREFAS REALIZADAS				
NÚMERO DE T.R.	DESCRIÇÃO		OBSERVAÇÕES	
1	ASSENTAMENTO DE MEIO FIO PREMOLDADO			
2	PAVIMENTAÇÃO EM PAVER PREMOLDADO			
3	ACERTO E NIVELAMENTO DE PISTA			
4	ESPALHAMENTO DE AREIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PAVER			
5	ESCAVAÇÃO PARA ASSENTAMENTO DE MEIO FIO E SARJETA			
REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)				



Data não informada



Data não informada

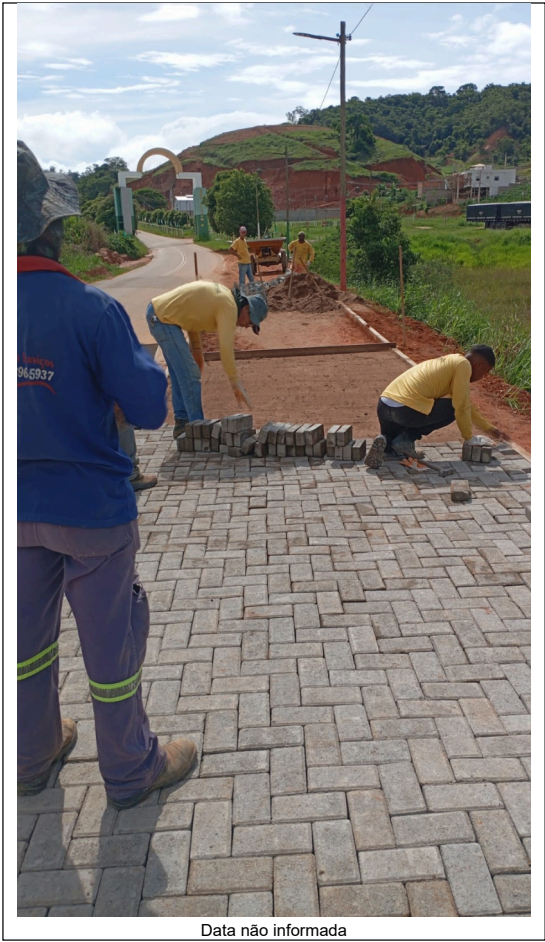

OCORRÊNCIAS		
NÚMERO DE OC	TIPO DE OCORRÊNCIA	DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA
CONFERÊNCIA		
MUNICÍPIO	CONSÓRCIO (Aprovado em 26/12/2024 - 10:56)	
Obs.:	Obs.:	
ASSINATURAS		

YURI ANDRADE COSTA LINS

PEDRO MARTINO ZEFERINO

ANTÔNIO CARLOS MARTINS BRANDÃO



Fiscal de Obras - CIMVALPI
CREA 233590/D

Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA
CREA 137.103/D

RT de Execução - PONTAL ENGENHARIA LTDA
CREA 45.957/D





CIMVALPI
CONSORCIO INTERMUNICIPAL
MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº 0108	OBRA: CTP 0191/2024 - SANTO ANTONIO DO GRAMA - IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE ACESSIBILIDADE	CONTRATO:	RESP. TÉCNICO: ANTONIO CARLOS MARTINS BRANDÃO
ENDEREÇO: TRECHO DA RODOVIA DE ACESSO A SANTO ANTONIO DO GRAMA, BAIRRO NOVO HORIZONTE.		INÍCIO: 01/07/2024	Nº CREA-MG: 45957/D
CIDDE:		PRAZO: 31/12/2024	Nº DA ART:
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA		UF:	COORDENADAS:
DATA: 22/12/2024	SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA ☔
MANHÃ		✓	IMPRATICÁVEL ☔
TARDE	✓		
QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
1	ENCARREGADO DE OBRAS	4	PEDREIRO
4	AJUDANTE		
QTDE	EQUIPAMENTO		
1	MARTELETE		
1	DAMPER		
2	PÁ		
3	CHIBANCA		
3	ENXADA		
3	CARRINHO DE MÃO		
1	BETONEIRA		
TAREFAS REALIZADAS			
NÚMERO DE T.R.	DESCRICAO	OBSERVAÇÕES	
1	REJUNTAMENTO DE MEIO FIOS		
2	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SOB PASSAGEM DE PEDESTRE		
3	ACERTO E NIVELAMENTO DE ÁREA	PARA CONSTRUÇÃO DE VARIANTE	
4	CONCRETAGEM DE MURO DE CONTENÇÃO		
REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)			
 20 de dez. de 2024 13:13:31 Data não informada  20 de dez. de 2024 13:45:25 Data não informada			



Pág.: 41 / 52 - ID. do Doc.: D41.D2C - 24/01/2025 - 16:32:49 - ASSINADO POR(2): CPF:385.06*.**6*.4 CPF:084.94*.**6*.2



Data não informada

OCORRÊNCIAS	
NÚMERO DE OC	TIPO DE OCORRÊNCIA
DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA	
OBSERVAÇÕES	
REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS EM 20/12/2024.	
CONFERÊNCIA	
MUNICÍPIO	CONSÓRCIO (Aprovado em 23/12/2024 - 08:48)
Obs.:	Obs.:
ASSINATURAS	
YURI ANDRADE COSTA LINS Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 233590/D	PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA CREA 137.103/D
ANTÔNIO CARLOS MARTINS BRANDÃO RT de Execução - PONTAL ENGENHARIA LTDA CREA 45.957/D	



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº 0107	OBRA: CTP 0191/2024 - SANTO ANTONIO DO GRAMA - IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE ACESSIBILIDADE	CONTRATO:	RESP. TÉCNICO: ANTONIO CARLOS MARTINS BRANDÃO
ENDEREÇO: TRECHO DA RODOVIA DE ACESSO A SANTO ANTONIO DO GRAMA, BAIRRO NOVO HORIZONTE.	INÍCIO: 01/07/2024	Nº CREA-MG: 45957/D	
CIDDE:	PRAZO: 31/12/2024	Nº DA ART:	
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA	UF:	COORDENADAS:	
DATA: 19/12/2024	SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA ☔
MANHÃ	✓		IMPRATICÁVEL ☔
TARDE	✓		
QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
1	ENCARREGADO DE OBRAS	3	PEDREIRO
4	AJUDANTE		
QTDE	EQUIPAMENTO		
1	DAMPER		
3	PÁ		
3	CHIBANCA		
3	ENXADA		
3	CARRINHO DE MÃO		
1	BETONEIRA		
TAREFAS REALIZADAS			
NÚMERO DE T.R.	DESCRICAO	OBSERVAÇÕES	
1	INSTALAÇÃO DE MEIO FIO PREMOLDADO		
2	CONCRETAGEM DE CONTENÇÃO EM CONCRETO CICLOPE		
3	CONCRETAGEM DE SARJETA		
4	ESCAVAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE MEIO FIO E SARJETA		
5	ESCAVAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DE ARRIMO		

REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)





OCORRÊNCIAS		
NÚMERO DE OC	TIPO DE OCORRÊNCIA	DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA
CONFERÊNCIA		
MUNICÍPIO	CONSÓRCIO (Aprovado em 20/12/2024 - 15:30)	
Obs.:	Obs.:	
ASSINATURAS		
YURI ANDRADE COSTA LINS Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 233590/D	PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA CREA 137.103/D	ANTÔNIO CARLOS MARTINS BRANDÃO RT de Execução - PONTAL ENGENHARIA LTDA CREA 45.957/D





CIMVALPI
CONSORCIO INTERMUNICIPAL
MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº 0106	OBRA: CTP 0191/2024 - SANTO ANTONIO DO GRAMA - IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE ACESSIBILIDADE	CONTRATO:	RESP. TÉCNICO: ANTONIO CARLOS MARTINS BRANDÃO	
ENDEREÇO: TRECHO DA RODOVIA DE ACESSO A SANTO ANTONIO DO GRAMA, BAIRRO NOVO HORIZONTE.		INÍCIO: 01/07/2024		Nº CREA-MG: 45957/D
CIDDE:		PRAZO: 31/12/2024		Nº DA ART:
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA		UF:		COORDENADAS:
DATA: 18/12/2024	SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA ☔	IMPRATICÁVEL 🌧
MANHÃ	✓			
TARDE	✓			
QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	
1	ENCARREGADO DE OBRAS	4	PEDREIRO	
4	AJUDANTE			
QTDE	EQUIPAMENTO			
2	CAVADEIRA RETA			
3	PÁ			
3	CHIBANCA			
2	ENXADA			
3	CARRINHO DE MÃO			
TAREFAS REALIZADAS				
NÚMERO DE T.R.	DESCRICAÇÃO	OBSERVAÇÕES		
1	ESCAVAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE MEIO FIO E SARGETA			
2	ACERTO E NIVELAMENTO DE PISTA			
3	ESCAVAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DE ARRIMO			
4	INSTALAÇÃO DE MEIO FIO PREMOLDADO			
5	PAVIMENTAÇÃO EM PAVER PREMOLDADO			
REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)				
 18 de dez. de 2024 16:20:34 Rua Vicente Bretas Cupertino Santo Antônio do Grama Minas Gerais Data não informada  18 de dez. de 2024 16:39:04 Rua Vicente Bretas Cupertino Santo Antônio do Grama Minas Gerais Data não informada				







OCORRÊNCIAS		
NÚMERO DE OC	TIPO DE OCORRÊNCIA	DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA
CONFERÊNCIA		
MUNICÍPIO	CONSÓRCIO (Aprovado em 20/12/2024 - 15:30)	
Obs.:	Obs.:	
ASSINATURAS		
YURI ANDRADE COSTA LINS Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 233590/D	PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA CREA 137.103/D	ANTÔNIO CARLOS MARTINS BRANDÃO RT de Execução - PONTAL ENGENHARIA LTDA CREA 45.957/D



 CIMVALPI CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSECTORIAL DO VALE DO PIRANGA		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO	
Nº 0105		OBRA: CTP 0191/2024 - SANTO ANTONIO DO GRAMA - IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE ACESSIBILIDADE	
CONTRATO:		RESP. TÉCNICO: ANTONIO CARLOS MARTINS BRANDÃO	
ENDEREÇO: TRECHO DA RODOVIA DE ACESSO A SANTO ANTONIO DO GRAMA, BAIRRO NOVO HORIZONTE.		INÍCIO: 01/07/2024	
Nº CREA-MG: 45957/D		PRAZO: 31/12/2024	
CIDDE:		Nº DA ART:	
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA		UF:	
COORDENADAS:			
DATA: 17/12/2024	SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA ☔
IMPRATICÁVEL ☔			
MANHÃ			
TARDE			
QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
1	ENCARREGADO DE OBRAS	3	PEDREIRO
4	AJUDANTE		
QTDE	EQUIPAMENTO		
1	CAVADEIRA RETA		
1	ROLO LISO		
2	PÁ		
1	CAVADEIRA DE BOCA		
3	CHIBANCA		
3	ENXADA		
3	CARRINHO DE MÃO		
TAREFAS REALIZADAS			
NÚMERO DE T.R.	DESCRICAÇÃO	OBSERVAÇÕES	
1	DESCARREGAMENTO DE PAVERS NA OBRA		
2	PAVIMENTAÇÃO EM PAVER PREMOLDADO		
3	ESCAVAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DE CONTENÇÃO	AO LADO DA PISTA DE ACESSIBILIDADE	
4	COMPACTAÇÃO DE PISTA COM ROLO		
REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)			
 17 de dez. de 2024 12:32:44 Data não informada		 17 de dez. de 2024 13:10:40 Estrada Sem Nome Uruçânia Minas Gerais Data não informada	





OCORRÊNCIAS		
NÚMERO DE OC	TIPO DE OCORRÊNCIA	DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA
CONFERÊNCIA		
MUNICÍPIO	CONSÓRCIO (Aprovado em 18/12/2024 - 11:18)	
Obs.:	Obs.:	
ASSINATURAS		
YURI ANDRADE COSTA LINS Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 233590/D PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA CREA 137.103/D ANTÔNIO CARLOS MARTINS BRANDÃO RT de Execução - PONTAL ENGENHARIA LTDA CREA 45.957/D		



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº 0104	OBRA: CTP 0191/2024 - SANTO ANTONIO DO GRAMA - IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE ACESSIBILIDADE	CONTRATO:	RESP. TÉCNICO: ANTONIO CARLOS MARTINS BRANDÃO
ENDEREÇO: TRECHO DA RODOVIA DE ACESSO A SANTO ANTONIO DO GRAMA, BAIRRO NOVO HORIZONTE.		INÍCIO: 01/07/2024	Nº CREA-MG: 45957/D
CIDDE:		PRAZO: 31/12/2024	Nº DA ART:
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA		UF:	COORDENADAS:
DATA: 16/12/2024	SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA ☔
MANHÃ	✓		IMPRATICÁVEL ☔
TARDE	✓		
QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
1	ENCARREGADO DE OBRAS	3	PEDREIRO
4	AJUDANTE		
QTDE	EQUIPAMENTO		
3	PÁ		
2	CHIBANCA		
3	ENXADA		
3	CARRINHO DE MÃO		
2	CAVADEIRA MANUAL		
TAREFAS REALIZADAS			
NÚMERO DE T.R.	DESCRIÇÃO	OBSERVAÇÕES	
1	ESPALHAMENTO DE AREIA NA PISTA PARA BERÇO		
2	CALÇAMENTO EM PAVER E ESPALHAMENTO DE AREIA		
3	ESCAVAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE MEIO FIO E SARJETA		
4	INSTALAÇÃO DE MEIO FIO PREMOLDADO		
5	DESCARGA DE MATERIAIS NA OBRA	MEIO FIO PREMOLDADO	

REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATORIOS)





Data não informada



Data não informada



Data não informada

OCORRÊNCIAS		
NÚMERO DE OC	TIPO DE OCORRÊNCIA	DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA
CONFERÊNCIA		
MUNICÍPIO	CONSÓRCIO (Aprovado em 17/12/2024 - 08:34)	
Obs.:	Obs.:	
ASSINATURAS		
YURI ANDRADE COSTA LINS Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 233590/D	PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA CREA 137.103/D	ANTÔNIO CARLOS MARTINS BRANDÃO RT de Execução - PONTAL ENGENHARIA LTDA CREA 45.957/D





CIMVALPI

CONSORCIO INTERMUNICIPAL
MULTISETORIAL DO VALE DO PIRANGA

Assinaturas do Documento



Documento Assinado Eletronicamente por **ANTONIO CARLOS MARTINS BRANDÃO**,
CPF: 385.06*. **6- *4 em **24/01/2025 17:16:40**, Cód. Autenticidade da Assinatura:
1794.2H16.740H.Z16V.8347, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de
2020.



Documento Assinado Eletronicamente por **YURI ANDRADE COSTA LINS -**
ENGENHEIRO CIVIL JÚNIOR, CPF: 084.94*. **6- *2 em **24/01/2025 16:42:01**, Cód.
Autenticidade da Assinatura: **16U1.0742.401Z.216U.1730**, Com fundamento na Lei Nº
14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Informações do Documento

ID do Documento: **D41.D2C** - Tipo de Documento: **FORMULÁRIO DE MEDIÇÕES.**

Elaborado por **GILBERTO ARAUJO GOMIDES**, CPF: 069.58*. **6- *7 , em **24/01/2025 - 16:32:49**

Código de Autenticidade deste Documento: 1635.6232.2497.153H.8771

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
<https://zeropapel.cimvalpi.mg.gov.br/verdocumento>

