

FORMULÁRIO DE MEDIÇÕES

RELATÓRIO PARCIAL (SITUAÇÃO: APROVADA PELO CONSÓRCIO)

Enviado por ANTONIO CARLOS MARTINS BRANDAO em 19/02/2025 - 13:49

Registro: 19/02/2025				7ª MEDIÇÃO									
Obra: 635.1 - CTP 0191/2024 - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE ACESSIBILIDADE				Período de 21/01/2025 a 20/02/2025									
Ordens de Serviço: 482/2024				Local: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA									
OBSERVAÇÕES													
Enviada por ANTONIO CARLOS MARTINS BRANDAO (FORNECEDOR) em 19/02/2025 às 13:49													
							QUANTIDADE MEDIDA			VALOR MEDIDO			
ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	NESTA MEDIÇÃO	ACUMULADA	VALOR PREVISTO (BDI)	NESTA MEDIÇÃO (BDI)	ACUMULADA (BDI)	SALDO (BDI)	
01	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO												
01.01	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA - para obras que exigem a utilização de grande quantidade de equipamentos e são executadas em centros urbanos ou próximos de centros urbanos. Obs.: Não se aplica aos serviços deTapa Buracos.												
01.01.01	OBRAS ATÉ O VALOR DE R\$ 1.000.000,00 - MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA PAVIMENTAÇÃO, EXCLUSIVE PARA TAPA-BURACOS	%	1	R\$ 25,00	R\$ 31,62	R\$ 31,62	0.5	3.5	R\$ 31,62	R\$ 216,79	R\$ 3.031,41	R\$ -2.999,79	
04	TRABALHOS EM TERRA												
04.08	ESCAVAÇÃO MECANICA DE VALAS COM DESCARGA LATERAL												
04.08.02	1.5 M < H <= 3.0 M	m³	263.4	R\$ 5,29	R\$ 6,73	R\$ 1.772,68	130.72	130.72	R\$ 1.772,68	R\$ 879,75	R\$ 879,75	R\$ 892,93	
05	DRENAGEM URBANA												
05.08	BUEIRO TUBULAR												
05.08.20*	TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA1, DIÂMETRO 600MM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO	M	180	R\$ 232,29	R\$ 294,90	R\$ 53.082,00	62	62	R\$ 53.082,00	R\$ 18.283,80	R\$ 18.283,80	R\$ 34.798,20	
05.10	CAIXA DE CAPTAÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL												



05.10.01	CAIXA DE CAPTAÇÃO E DRENAGEM TIPO A (100 X 100 X 120 CM), D = 500 MM A 1500MM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA FORA	un	12	R\$ 2.582,14	R\$ 3.278,04	R\$ 39.336,48	4	4	R\$ 39.336,48	R\$ 6.556,08	R\$ 6.556,08	R\$ 32.780,40
06	PAVIMENTAÇÃO											
06.19	PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO DE CONCRETO											
06.19.01	PISO INTERTRAVADO 10X20CM E= 6,0CM 35MPA C/ COLCHAO AREIA	m²	2918.34	R\$ 85,13	R\$ 108,08	R\$ 315.414,19	50.4	2882.46	R\$ 315.414,19	R\$ 5.447,23	R\$ 311.536,27	R\$ 3.877,92
15	ADMINISTRAÇÃO LOCAL											
15.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - % BASEADA ACÓRDÃO 2.622/2013 DO TCU SOBRE SOMA DOS ITENS 1 A 14	%	15.1	R\$ 329,17	R\$ 416,25	R\$ 6.285,38	6.55	45.85	R\$ 6.285,38	R\$ 2.854,14	R\$ 39.541,74	R\$ -33.256,37
16*	SERVIÇOS COMPLEMENTARES											
16.03*	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2 , GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS	M	24	R\$ 400,12	R\$ 507,96	R\$ 12.191,04	24	24	R\$ 12.191,04	R\$ 12.191,04	R\$ 12.191,04	R\$ 0,00
									TOTAL:	R\$ 46.428,83	R\$ 648.854,81	

YURI ANDRADE COSTA LINS
Fiscal de Obras - CIMVALPI
CREA 233590/D
Aprovação: 24/02/2025

PEDRO MARTINO ZEFERINO
Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA
CREA 137.103/D

ANTÔNIO CARLOS MARTINS BRANDÃO
RT de Execução - PONTAL ENGENHARIA LTDA
CREA 45.957/D



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº 0151		OBRA: CTP 0191/2024 - SANTO ANTONÍO DO GRAMA - IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE ACESSIBILIDADE		CONTRATO:		RESP. TÉCNICO: ANTONIO CARLOS MARTINS BRANDÃO	
ENDEREÇO: TRECHO DA RODOVIA DE ACESSO A SANTO ANTONIO DO GRAMA, BAIRRO NOVO HORIZONTE.				INÍCIO: 01/07/2024		Nº CREA-MG: 45957/D	
CIDDE:				PRAZO: 31/12/2024		Nº DA ART:	
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA				UF:		COORDENADAS:	
DATA: 21/02/2025		SOL ☀		NUBLADO ☁		CHUVA ☔	
MANHÃ		✓					
TARDE		✓					
QTDE		MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO				QTDE	
1		ENCARREGADO				3	
3		AJUDANTE				PEDREIRO	
QTDE		EQUIPAMENTO					
2		PÁ					
2		ENXADA					
2		CARRINHO DE MÃO					
TAREFAS REALIZADAS							
NÚMERO DE T.R.		DESCRICAO				OBSERVAÇÕES	
1		FIXAÇÃO E PINTURA DE GUARDA CORPO					
2		CONCRETAGEM DE CAIXA DE PASSAGEM					
3		LIMPEZA DE OBRA					
4		CONSTRUÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM					
REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)							





OCORRÊNCIAS		
NÚMERO DE OC	TIPO DE OCORRÊNCIA	DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA
CONFERÊNCIA		
MUNICÍPIO	CONSÓRCIO (Aprovado em 24/02/2025 - 08:45)	
Obs.:	Obs.:	
ASSINATURAS		
YURI ANDRADE COSTA LINS Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 233590/D	PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA CREA 137.103/D	ANTÔNIO CARLOS MARTINS BRANDÃO RT de Execução - PONTAL ENGENHARIA LTDA CREA 45.957/D



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº 0150		OBRA: CTP 0191/2024 - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE ACESSIBILIDADE		CONTRATO:		RESP. TÉCNICO: ANTONIO CARLOS MARTINS BRANDÃO	
ENDEREÇO: TRECHO DA RODOVIA DE ACESSO A SANTO ANTONIO DO GRAMA, BAIRRO NOVO HORIZONTE.				INÍCIO: 01/07/2024		Nº CREA-MG: 45957/D	
CIDDE:				PRAZO: 31/12/2024		Nº DA ART:	
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA				UF:		COORDENADAS:	
DATA: 20/02/2025		SOL ☀		NUBLADO ☁		CHUVA ☔	
MANHÃ		✓				IMPRATICÁVEL ☔	
TARDE		✓					
QTDE		MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO				QTDE	
1		ENCARREGADO DE OBRAS				1	
3		PEDREIRO				3	
QTDE		EQUIPAMENTO					
1		ESCAVADEIRA					
2		PÁ					
2		CHIBANCA					
2		ENXADA					
3		CARRINHO DE MÃO					
TAREFAS REALIZADAS							
NÚMERO DE T.R.		DESCRIÇÃO				OBSERVAÇÕES	
1		ENRONCAMENTO DE FUNDO DE VALA					
2		INSTALAÇÃO DE ENSECADEIRA COM TUBO DE DRENAGEM					
3		ESCAVAÇÃO MECANICA DE VALAS				PARA IMPLANTAÇÃO DE REDE PLUVIAL	
REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)							





OCORRÊNCIAS		
NÚMERO DE OC	TIPO DE OCORRÊNCIA	DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA
CONFERÊNCIA		
MUNICÍPIO	CONSÓRCIO (Aprovado em 21/02/2025 - 08:33)	
Obs.:	Obs.:	
ASSINATURAS		
YURI ANDRADE COSTA LINS Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 233590/D	PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA CREA 137.103/D	ANTÔNIO CARLOS MARTINS BRANDÃO RT de Execução - PONTAL ENGENHARIA LTDA CREA 45.957/D



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº 0149	OBRA: CTP 0191/2024 - SANTO ANTONIO DO GRAMA - IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE ACESSIBILIDADE	CONTRATO:	RESP. TÉCNICO: ANTONIO CARLOS MARTINS BRANDÃO
ENDEREÇO: TRECHO DA RODOVIA DE ACESSO A SANTO ANTONIO DO GRAMA, BAIRRO NOVO HORIZONTE.		INÍCIO: 01/07/2024	Nº CREA-MG: 45957/D
CIDDE:		PRAZO: 31/12/2024	Nº DA ART:
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA		UF:	COORDENADAS:
DATA: 19/02/2025	SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA ☔
MANHÃ	✓		IMPRATICÁVEL ☔
TARDE	✓		
QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
1	ENCARREGADO DE OBRAS	3	AJUDANTE
3	RASTELEIRO		
QTDE	EQUIPAMENTO		
1	DAMPER		
3	PÁ		
3	ENXADA		
4	CARRINHO DE MÃO		
1	BETONEIRA		
TAREFAS REALIZADAS			
NÚMERO DE T.R.	DESCRICAÇÃO	OBSERVAÇÕES	
1	REJUNTAMENTO DE MANILHAS		
2	LIMPEZA E CAPINA		
3	CONCRETAGEM DE ACESSO À MANILHA		


REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATORIOS)



Data não informada



Data não informada

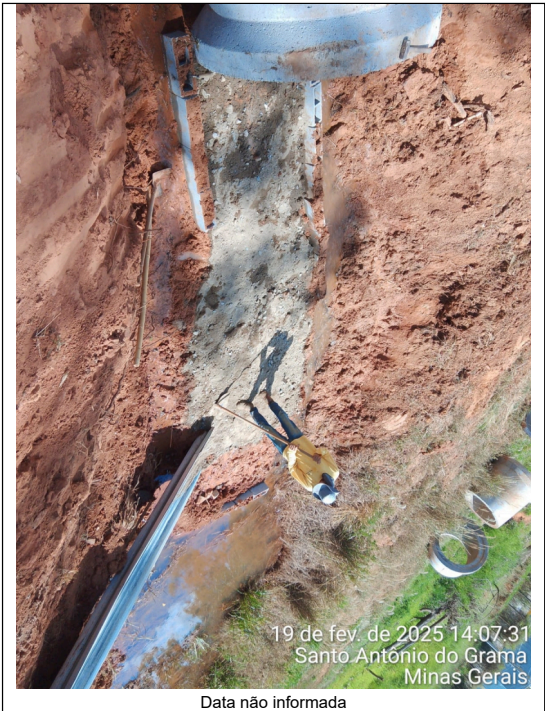


OCORRÊNCIAS		
NÚMERO DE OC	TIPO DE OCORRÊNCIA	DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA
CONFERÊNCIA		
MUNICÍPIO	CONSÓRCIO (Aprovado em 21/02/2025 - 08:33)	
Obs.:	Obs.:	
ASSINATURAS		
YURI ANDRADE COSTA LINS Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 233590/D PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA CREA 137.103/D ANTÔNIO CARLOS MARTINS BRANDÃO RT de Execução - PONTAL ENGENHARIA LTDA CREA 45.957/D		




 CIMVALPI CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO			
Nº 0148		OBRA: CTP 0191/2024 - SANTO ANTONIO DO GRAMA - IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE ACESSIBILIDADE	CONTRATO:	RESP. TÉCNICO: ANTONIO CARLOS MARTINS BRANDÃO	
ENDEREÇO: TRECHO DA RODOVIA DE ACESSO A SANTO ANTONIO DO GRAMA, BAIRRO NOVO HORIZONTE.		INÍCIO: 01/07/2024		Nº CREA-MG: 45957/D	
CIDDE:		PRAZO: 31/12/2024		Nº DA ART:	
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA		UF:		COORDENADAS:	
DATA: 18/02/2025	SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA ☔	IMPRATICÁVEL ☔	
MANHÃ	✓				
TARDE	✓				
QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO		QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	
1	ENCARREGADO DE OBRAS		1	OPERADOR DE ESCAVADEIRA	
3	PEDREIRO		3	AJUDANTE	
QTDE	EQUIPAMENTO				
2	CAVADEIRA RETA				
1	ESCAVADEIRA				
2	PÁ				
3	ENXADA				
TAREFAS REALIZADAS					
NÚMERO DE T.R.	DESCRICAÇÃO			OBSERVAÇÕES	
1	ESCAVAÇÃO DE VALA PARA INSTALAÇÃO DE MANILHAS				
2	INSTALAÇÃO DE MANILHAS PARA CANALIZAÇÃO DE CORREGO				
3	RECEBIMENTO E DESCARGA DE MANILHAS				
REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)					
 18 de fev. de 2025 16:42:51 Santo Antônio do Grama Minas Gerais Data não informada			 Data não informada		



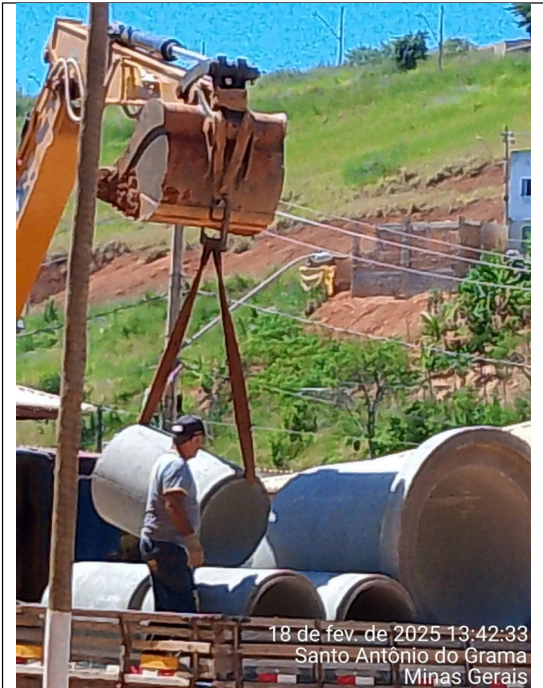

18 de fev. de 2025 13:42:33
Santo Antônio do Grama
Minas Gerais

Data não informada

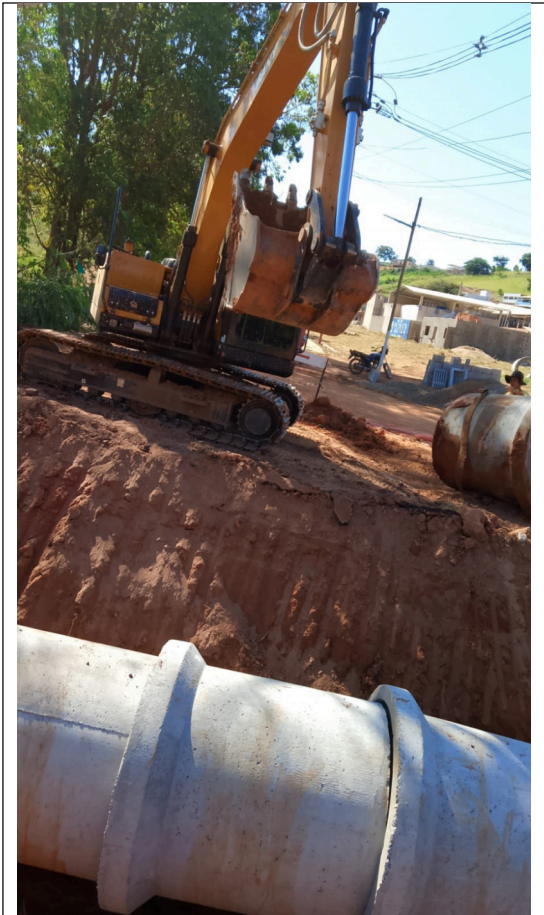

Data não informada



18 de fev. de 2025 13:42:24
Santo Antônio do Grama
Minas Gerais

Data não informada



18 de fev. de 2025 16:42:30
Santo Antônio do Grama
Minas Gerais

Data não informada

OCORRÊNCIAS		
NÚMERO DE OC	TIPO DE OCORRÊNCIA	DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA
CONFERÊNCIA		
MUNICÍPIO	CONSÓRCIO (Aprovado em 19/02/2025 - 09:34)	
Obs.:	Obs.:	
ASSINATURAS		

YURI ANDRADE COSTA LINS

PEDRO MARTINO ZEFERINO

ANTÔNIO CARLOS MARTINS BRANDÃO



Fiscal de Obras - CIMVALPI
CREA 233590/D

Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA
CREA 137.103/D

RT de Execução - PONTAL ENGENHARIA LTDA
CREA 45.957/D




RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº 0147	OBRA: CTP 0191/2024 - SANTO ANTONIO DO GRAMA - IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE ACESSIBILIDADE	CONTRATO:	RESP. TÉCNICO: ANTONIO CARLOS MARTINS BRANDÃO
ENDEREÇO: TRECHO DA RODOVIA DE ACESSO A SANTO ANTONIO DO GRAMA, BAIRRO NOVO HORIZONTE.	INÍCIO: 01/07/2024	Nº CREA-MG: 45957/D	
CIDDE:	PRAZO: 31/12/2024	Nº DA ART:	
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA	UF:	COORDENADAS:	
DATA: 17/02/2025	SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA ☔
MANHÃ	✓		IMPRATICÁVEL ☔
TARDE	✓		
QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
1	ENCARREGADO DE OBRAS	1	OPERADOR DE ESCAVADEIRA
3	PEDREIRO	3	AJUDANTE
QTDE	EQUIPAMENTO		
1	ESCAVADEIRA		
3	PÁ		
1	CAMINHÃO CARROCERIA		
3	ENXADA		
4	CARRINHO DE MÃO		
TAREFAS REALIZADAS			
NÚMERO DE T.R.	DESCRICAÇÃO	OBSERVAÇÕES	
1	CONCRETAGEM DE SARJETA		
2	TRANSPORTE DE PEYVER PARA PROXIMO DO CANTEIRO		
3	CONSTRUÇÃO DE DESVIO NA RODOVIA		
4	COMPACTAÇÃO DE PISTA COM ROLO		
5	REJUNTAMENTO DE MEIO FIO PREMOLDADO		

REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)



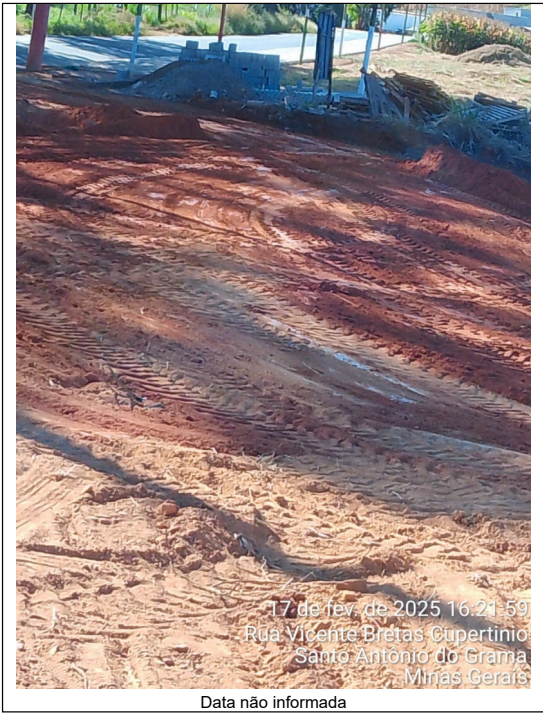

OCORRÊNCIAS		
NÚMERO DE OC	TIPO DE OCORRÊNCIA	DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA
CONFERÊNCIA		
MUNICÍPIO	CONSÓRCIO (Aprovado em 18/02/2025 - 08:38)	
Obs.:	Obs.:	
ASSINATURAS		
YURI ANDRADE COSTA LINS Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 233590/D	PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA CREA 137.103/D	ANTÔNIO CARLOS MARTINS BRANDÃO RT de Execução - PONTAL ENGENHARIA LTDA CREA 45.957/D



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº 0146	OBRA: CTP 0191/2024 - SANTO ANTONIO DO GRAMA - IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE ACESSIBILIDADE	CONTRATO:	RESP. TÉCNICO: ANTONIO CARLOS MARTINS BRANDÃO
ENDEREÇO: TRECHO DA RODOVIA DE ACESSO A SANTO ANTONIO DO GRAMA, BAIRRO NOVO HORIZONTE.		INÍCIO: 01/07/2024	Nº CREA-MG: 45957/D
CIDDE:		PRAZO: 31/12/2024	Nº DA ART:
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA		UF:	COORDENADAS:
DATA: 14/02/2025	SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA ☔
MANHÃ	✓		IMPRATICÁVEL ☔
TARDE	✓		
QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
1	ENCARREGADO DE OBRAS	3	PEDREIRO
3	AJUDANTE		
QTDE	EQUIPAMENTO		
3	PÁ		
1	CAMINHÃO CARROCERIA		
3	ENXADA		
4	CARRINHO DE MÃO		
1	SERRA DE BANCADA		
TAREFAS REALIZADAS			
NÚMERO DE T.R.	DESCRIÇÃO	OBSERVAÇÕES	
1	TRANSPORTE DE PEYVER PARA PROXIMO DO CANTEIRO		
2	ESPALHAMENTO DE AREIA PARA BERÇO NA PISTA		
3	PAVIMENTAÇÃO EM PEYVER DE CONCRETO		

REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATORIOS)



Data não informada



Data não informada

OCORRÊNCIAS		
NÚMERO DE OC	TIPO DE OCORRÊNCIA	DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA
CONFERÊNCIA		
MUNICÍPIO	CONSÓRCIO (Aprovado em 17/02/2025 - 09:14)	
Obs.:	Obs.:	
ASSINATURAS		
YURI ANDRADE COSTA LINS Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 233590/D	PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA CREA 137.103/D	ANTÔNIO CARLOS MARTINS BRANDÃO RT de Execução - PONTAL ENGENHARIA LTDA CREA 45.957/D

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº 0145	OBRA: CTP 0191/2024 - SANTO ANTONIO DO GRAMA - IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE ACESSIBILIDADE	CONTRATO:	RESP. TÉCNICO: ANTONIO CARLOS MARTINS BRANDÃO
ENDEREÇO: TRECHO DA RODOVIA DE ACESSO A SANTO ANTONIO DO GRAMA, BAIRRO NOVO HORIZONTE.		INÍCIO: 01/07/2024	Nº CREA-MG: 45957/D
CIDDE:		PRAZO: 31/12/2024	Nº DA ART:
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA		UF:	COORDENADAS:
DATA: 13/02/2025	SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA ☔
MANHÃ	✓		IMPRATICÁVEL ☔
TARDE	✓		
QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
1	ENCARREGADO DE OBRAS	3	PEDREIRO
3	AJUDANTE		
QTDE	EQUIPAMENTO		
3	PÁ		
1	ROLO COMPACTADOR		
2	CHIBANCA		
3	ENXADA		
4	CARRINHO DE MÃO		
1	BETONEIRA		
TAREFAS REALIZADAS			
NÚMERO DE T.R.	DESCRICAO	OBSERVAÇÕES	
1	COMPACTAÇÃO DE PISTA COM ROLO		
2	ACERTO E NIVELAMENTO DE PISTA MANUAL		
3	CONCRETAGEM LATERAL DE MANILHA		
4	DESMANCHE DE CERCA		
5	EXECUÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM		
6	EXECUÇÃO DE BOCA DE LOBO		
REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)			





Data não informada



Data não informada



Data não informada




Data não informada

OCORRÊNCIAS		
NÚMERO DE OC	TIPO DE OCORRÊNCIA	DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA
CONFERÊNCIA		
MUNICÍPIO	CONSÓRCIO (Aprovado em 14/02/2025 - 08:26)	
Obs.:	Obs.:	
ASSINATURAS		
YURI ANDRADE COSTA LINS Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 233590/D PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA CREA 137.103/D ANTÔNIO CARLOS MARTINS BRANDÃO RT de Execução - PONTAL ENGENHARIA LTDA CREA 45.957/D		



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº 0144	OBRA: CTP 0191/2024 - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE ACESSIBILIDADE	CONTRATO:		RESP. TÉCNICO: ANTONIO CARLOS MARTINS BRANDÃO
ENDEREÇO: TRECHO DA RODOVIA DE ACESSO A SANTO ANTONIO DO GRAMA, BAIRRO NOVO HORIZONTE.		INÍCIO: 01/07/2024		Nº CREA-MG: 45957/D
CIDDE:		PRAZO: 31/12/2024		Nº DA ART:
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA		UF:		COORDENADAS:
DATA: 12/02/2025	SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA ☔	IMPRATICÁVEL ☔
MANHÃ	✓			
TARDE	✓			
QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO		QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
1	ENCARREGADO DE OBRAS		1	OPERADOR DE ESCAVADEIRA
3	PEDREIRO		3	AJUDANTE
QTDE	EQUIPAMENTO			
3	CAVADEIRA RETA			
1	ESCAVADEIRA			
3	ENXADA			
2	CARRINHO DE MÃO			
TAREFAS REALIZADAS				
NÚMERO DE T.R.	DESCRIÇÃO		OBSERVAÇÕES	
1	REJUNTAMENTO DE MANILHAS			
2	INSTALAÇÃO DE MANILHAS PARA CANALIZAÇÃO DE CORREGO			
3	LIMPEZA DE CORREGO			
REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)				

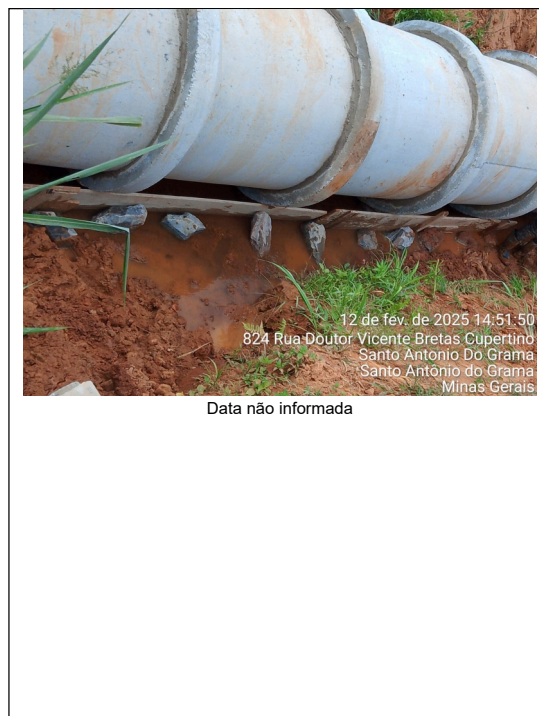



Data não informada



Data não informada

OCORRÊNCIAS		
NÚMERO DE OC	TIPO DE OCORRÊNCIA	DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA
CONFERÊNCIA		
MUNICÍPIO	CONSÓRCIO (Aprovado em 14/02/2025 - 08:26)	
Obs.:	Obs.:	
ASSINATURAS		
YURI ANDRADE COSTA LINS Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 233590/D	PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA CREA 137.103/D	ANTÔNIO CARLOS MARTINS BRANDÃO RT de Execução - PONTAL ENGENHARIA LTDA CREA 45.957/D



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº 0143	OBRA: CTP 0191/2024 - SANTO ANTONIO DO GRAMA - IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE ACESSIBILIDADE	CONTRATO:	RESP. TÉCNICO: ANTONIO CARLOS MARTINS BRANDÃO
ENDEREÇO: TRECHO DA RODOVIA DE ACESSO A SANTO ANTONIO DO GRAMA, BAIRRO NOVO HORIZONTE.	INÍCIO: 01/07/2024	Nº CREA-MG: 45957/D	
CIDDE:	PRAZO: 31/12/2024	Nº DA ART:	
DISTRITO: SANTO ANTONIO DO GRAMA	UF:	COORDENADAS:	
DATA: 11/02/2025	SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA ☔
MANHÃ	✓		IMPRATICÁVEL ☔
TARDE	✓		
QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
1	ENCARREGADO DE OBRAS	3	PEDREIRO
1	MOTORISTA CAMINHÃO MUNCK	3	AJUDANTE
QTDE	EQUIPAMENTO		
3	PÁ		
3	ENXADA		
4	CARRINHO DE MÃO		
1	CAMINHÃO MUNCK		
TAREFAS REALIZADAS			
NÚMERO DE T.R.	DESCRIÇÃO	OBSERVAÇÕES	
1	EXECUÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM		
2	CONFEÇÃO DE TAMPA PARA CAIXA DE PASSAGEM E BOCA D		
3	RECEBIMENTO DE ESCAVADEIRA		
4	TRANSPORTE DE MANILHA PARA PROXIMO DO CANTEIRO		
5	INSTALAÇÃO DE CONJUNTO QUADRO, GRELHA E CANTONEIRA		
6	EXECUÇÃO DE BOCA DE LOBO		

REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATORIOS)





Data não informada



Data não informada



Data não informada

OCORRÊNCIAS		
NÚMERO DE OC	TIPO DE OCORRÊNCIA	DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA
CONFERÊNCIA		
MUNICÍPIO	CONSÓRCIO (Aprovado em 12/02/2025 - 09:18)	
Obs.:	Obs.:	
ASSINATURAS		
YURI ANDRADE COSTA LINS Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 233590/D	PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA CREA 137.103/D	ANTÔNIO CARLOS MARTINS BRANDÃO RT de Execução - PONTAL ENGENHARIA LTDA CREA 45.957/D



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº 0142	OBRA: CTP 0191/2024 - SANTO ANTONIO DO GRAMA - IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE ACESSIBILIDADE	CONTRATO:	RESP. TÉCNICO: ANTONIO CARLOS MARTINS BRANDÃO
ENDEREÇO: TRECHO DA RODOVIA DE ACESSO A SANTO ANTONIO DO GRAMA, BAIRRO NOVO HORIZONTE.		INÍCIO: 01/07/2024	Nº CREA-MG: 45957/D
CIDDE:		PRAZO: 31/12/2024	Nº DA ART:
DISTRITO: SANTO ANTONIO DO GRAMA		UF:	COORDENADAS:
DATA: 11/02/2025	SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA ☔
QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	IMPRATICÁVEL ☔
QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO		
EQUIPAMENTO			
TAREFAS REALIZADAS			
NÚMERO DE T.R.	DESCRICAO	OBSERVAÇÕES	
REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)			
OCORRÊNCIAS			
NÚMERO DE OC	TIPO DE OCORRÊNCIA	DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA	
OBSERVAÇÕES			
RDO REFERENTE AO DIA 10/02/2025			
CONFERÊNCIA			
MUNICÍPIO	CONSÓRCIO (Reprovado)		
Obs.:	Obs.: Não foi evidenciado os serviços realizados com fotos.		
ASSINATURAS			
YURI ANDRADE COSTA LINS Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 233590/D		PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTONIO DO GRAMA CREA 137.103/D	
		ANTÔNIO CARLOS MARTINS BRANDÃO RT de Execução - PONTAL ENGENHARIA LTDA CREA 45.957/D	




RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO


Nº 0141	OBRA: CTP 0191/2024 - SANTO ANTONIO DO GRAMA - IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE ACESSIBILIDADE	CONTRATO:	RESP. TÉCNICO: ANTONIO CARLOS MARTINS BRANDÃO
ENDEREÇO: TRECHO DA RODOVIA DE ACESSO A SANTO ANTONIO DO GRAMA, BAIRRO NOVO HORIZONTE.		INÍCIO: 01/07/2024	Nº CREA-MG: 45957/D
CIDDE:		PRAZO: 31/12/2024	Nº DA ART:
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA		UF:	COORDENADAS:
DATA: 07/02/2025	SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA ☔
MANHÃ	✓		IMPRATICÁVEL ☔
TARDE	✓		
QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
1	ENCARREGADO DE OBRAS	3	PEDREIRO
3	AJUDANTE		
QTDE	EQUIPAMENTO		
1	DAMPER		
2	PÁ		
2	ENXADA		
4	CARRINHO DE MÃO		
TAREFAS REALIZADAS			
NÚMERO DE T.R.	DESCRICAÇÃO	OBSERVAÇÕES	
1	INSTALAÇÃO DE MEIO FIO PREMOLDADO		
2	CONCRETAGEM DE SARGETA		
3	EXECUÇÃO DE BOCA DE LOBO		
4	EXECUÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM		
REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATORIOS)			



Data não informada

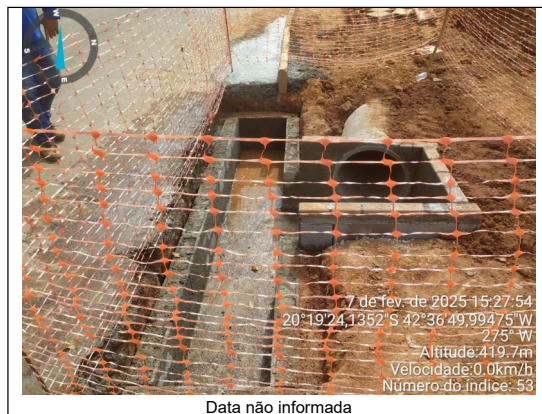

Data não informada

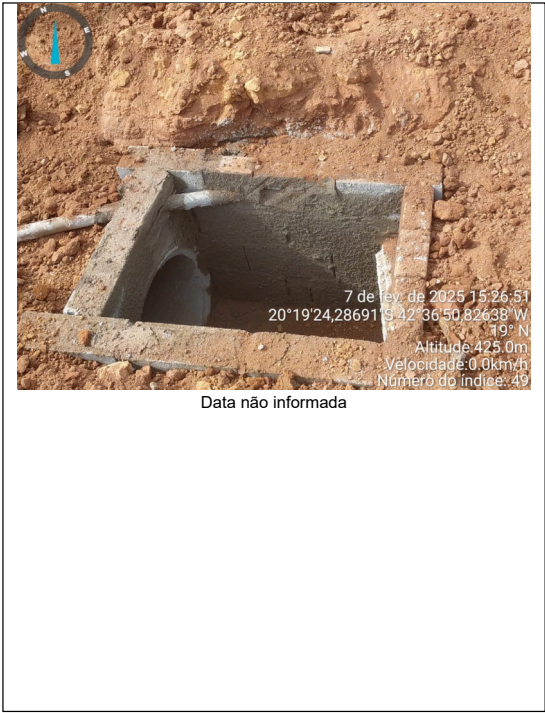

OCORRÊNCIAS		
NÚMERO DE OC	TIPO DE OCORRÊNCIA	DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA
CONFERÊNCIA		
MUNICÍPIO	CONSÓRCIO (Aprovado em 10/02/2025 - 08:32)	
Obs.:	Obs.:	
ASSINATURAS		
YURI ANDRADE COSTA LINS Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 233590/D PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA CREA 137.103/D ANTÔNIO CARLOS MARTINS BRANDÃO RT de Execução - PONTAL ENGENHARIA LTDA CREA 45.957/D		





CIMVALPI
CONSORCIO INTERMUNICIPAL
MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº 0140	OBRA: CTP 0191/2024 - SANTO ANTONIO DO GRAMA - IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE ACESSIBILIDADE	CONTRATO:	RESP. TÉCNICO: ANTONIO CARLOS MARTINS BRANDÃO
ENDEREÇO: TRECHO DA RODOVIA DE ACESSO A SANTO ANTONIO DO GRAMA, BAIRRO NOVO HORIZONTE.		INÍCIO: 01/07/2024	Nº CREA-MG: 45957/D
CIDDE:		PRAZO: 31/12/2024	Nº DA ART:
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA		UF:	COORDENADAS:
DATA: 06/02/2025	SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA ☔
MANHÃ	✓		IMPRATICÁVEL ☂
TARDE	✓		
QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
1	ENCARREGADO DE OBRAS	3	PEDREIRO
3	AJUDANTE		
QTDE	EQUIPAMENTO		
3	CAVADEIRA RETA		
2	PÁ		
3	ENXADA		
4	CARRINHO DE MÃO		
1	RETROESCAVADEIRA		
TAREFAS REALIZADAS			
NÚMERO DE T.R.	DESCRICAÇÃO	OBSERVAÇÕES	
1	ATERRAMENTO DE MANILHAS		
2	INSTALAÇÃO DE MANILHAS PARA DRENAGEM PLUVIAL		
3	EXECUÇÃO DE ALVENARIA PARA BOCA DE LOBO		
REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATORIOS)			
 6 de fev. de 2025 12:33:50 20°29'24.10075"S 42°36'51.36476"W 115° SE Altitude: 418.0m Velocidade: 0.0km/h Número do índice: 42 Data não informada  6 de fev. de 2025 14:11:02 20°19'23.48864"S 42°36'52.04513"W 127° SE Altitude: 442.2m Velocidade: 0.0km/h Número do índice: 44 Data não informada			





OCORRÊNCIAS		
NÚMERO DE OC	TIPO DE OCORRÊNCIA	DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA
CONFERÊNCIA		
MUNICÍPIO	CONSÓRCIO (Aprovado em 07/02/2025 - 08:06)	
Obs.:	Obs.:	
ASSINATURAS		
YURI ANDRADE COSTA LINS Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 233590/D	PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA CREA 137.103/D	ANTÔNIO CARLOS MARTINS BRANDÃO RT de Execução - PONTAL ENGENHARIA LTDA CREA 45.957/D



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº 0139		OBRA: CTP 0191/2024 - SANTO ANTONIO DO GRAMA - IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE ACESSIBILIDADE		CONTRATO:		RESP. TÉCNICO: ANTONIO CARLOS MARTINS BRANDÃO		
ENDEREÇO: TRECHO DA RODOVIA DE ACESSO A SANTO ANTONIO DO GRAMA, BAIRRO NOVO HORIZONTE.				INÍCIO: 01/07/2024		Nº CREA-MG: 45957/D		
CIDDE:				PRAZO: 31/12/2024		Nº DA ART:		
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA				UF:		COORDENADAS:		
DATA: 05/02/2025		SOL ☀		NUBLADO ☁		CHUVA ☔		
MANHÃ		✓				IMPRATICÁVEL ☁		
TARDE		✓						
QTDE		MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO			QTDE		MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	
1		ENCARREGADO DE OBRAS			3		PEDREIRO	
3		AJUDANTE						
QTDE		EQUIPAMENTO						
2		CAVADEIRA RETA						
1		DAMPER						
3		PÁ						
1		CAVADEIRA DE BOCA						
2		CHIBANCA						
3		ENXADA						
4		CARRINHO DE MÃO						
TAREFAS REALIZADAS								
NÚMERO DE T.R.		DESCRIÇÃO			OBSERVAÇÕES			
1		CONCRETAGEM DE BOCA DE LOBO DE REDE PLUVIAL						
2		INSTALAÇÃO DE MANILHAS PARA REDE PLUVIAL						
3		ATERRAMENTO DE MANILHAS						
REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)								

REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)



Data não informada



Data não informada




OCORRÊNCIAS		
NÚMERO DE OC	TIPO DE OCORRÊNCIA	DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA
CONFERÊNCIA		
MUNICÍPIO	CONSÓRCIO (Aprovado em 06/02/2025 - 09:02)	
Obs.:	Obs.: Solicitação da Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Grama executar a rede de drenagem pluvial embaixo da pista de caminhada para não invadir os lotes confrontantes com a mesma.	
ASSINATURAS		
YURI ANDRADE COSTA LINS Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 233590/D	PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA CREA 137.103/D	ANTÔNIO CARLOS MARTINS BRANDÃO RT de Execução - PONTAL ENGENHARIA LTDA CREA 45.957/D



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº 0138	OBRA: CTP 0191/2024 - SANTO ANTONIO DO GRAMA - IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE ACESSIBILIDADE	CONTRATO:	RESP. TÉCNICO: ANTONIO CARLOS MARTINS BRANDÃO
ENDEREÇO: TRECHO DA RODOVIA DE ACESSO A SANTO ANTONIO DO GRAMA, BAIRRO NOVO HORIZONTE.	INÍCIO: 01/07/2024	Nº CREA-MG: 45957/D	
CIDDE:	PRAZO: 31/12/2024	Nº DA ART:	
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA	UF:	COORDENADAS:	
DATA: 04/02/2025	SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA ☔
MANHÃ	✓		IMPRATICÁVEL ☔
TARDE	✓		
QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
1	ENCARREGADO DE OBRAS	3	PEDREIRO
3	AJUDANTE		
QTDE	EQUIPAMENTO		
3	PÁ		
2	CHIBANCA		
3	ENXADA		
4	CARRINHO DE MÃO		
TAREFAS REALIZADAS			
NÚMERO DE T.R.	DESCRICAÇÃO	OBSERVAÇÕES	
1	RECEBIMENTO DE BICA CORRICA		
2	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA INSTALAÇÃO DE BOCA DE LOBO		
3	ESPALHAMENTO DE BICA CORRIDA EM FUNDO DE VALA		
4	RECEBIMENTO E DESCARGA DE MANILHA		

REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)

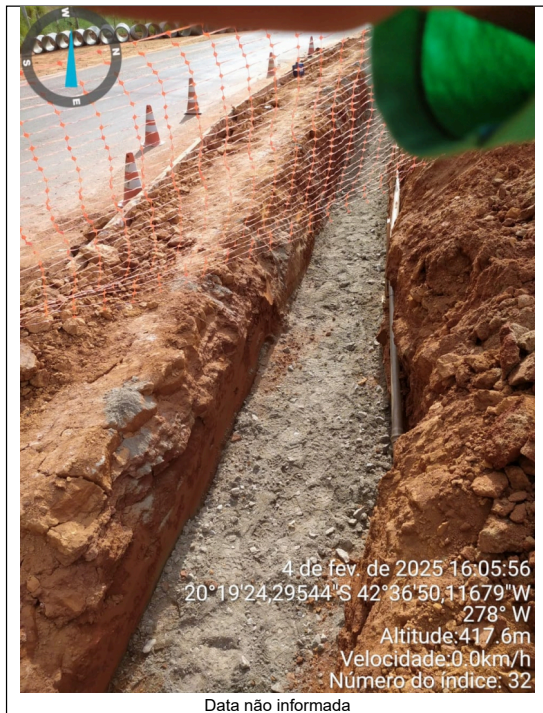



Data não informada



Data não informada



Data não informada

OCORRÊNCIAS		
NÚMERO DE OC	TIPO DE OCORRÊNCIA	DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA
CONFERÊNCIA		
MUNICÍPIO	CONSÓRCIO (Aprovado em 05/02/2025 - 08:58)	
Obs.:	Obs.:	
ASSINATURAS		
YURI ANDRADE COSTA LINS Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 233590/D	PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA CREA 137.103/D	ANTÔNIO CARLOS MARTINS BRANDÃO RT de Execução - PONTAL ENGENHARIA LTDA CREA 45.957/D



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº 0137	OBRA: CTP 0191/2024 - SANTO ANTONIO DO GRAMA - IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE ACESSIBILIDADE	CONTRATO:	RESP. TÉCNICO: ANTONIO CARLOS MARTINS BRANDÃO
ENDEREÇO: TRECHO DA RODOVIA DE ACESSO A SANTO ANTONIO DO GRAMA, BAIRRO NOVO HORIZONTE.	INÍCIO: 01/07/2024	Nº CREA-MG: 45957/D	
CIDDE:	PRAZO: 31/12/2024	Nº DA ART:	
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA	UF:	COORDENADAS:	
DATA: 03/02/2025	SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA ☔
MANHÃ		✓	
TARDE		✓	
QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
1	ENCARREGADO DE OBRAS	1	OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA
3	PEDREIRO	3	AJUDANTE
QTDE		EQUIPAMENTO	
3	PÁ		
2	ENXADA		
2	CARRINHO DE MÃO		
1	RETROESCAVADEIRA		
TAREFAS REALIZADAS			
NÚMERO DE T.R.	DESCRICAÇÃO	OBSERVAÇÕES	
1	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA	PARA IMPLANTAÇÃO DE REDE PLUVIAL EM TUBOS DE CONCRETO 600 MM	
2	ENRONCAMENTO DE FUNDO DE VALA		

REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)





OCORRÊNCIAS		
NÚMERO DE OC	TIPO DE OCORRÊNCIA	DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA
CONFERÊNCIA		
MUNICÍPIO	CONSÓRCIO (Aprovado em 05/02/2025 - 08:58)	
Obs.:	Obs.:	
ASSINATURAS		
YURI ANDRADE COSTA LINS Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 233590/D	PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA CREA 137.103/D	ANTÔNIO CARLOS MARTINS BRANDÃO RT de Execução - PONTAL ENGENHARIA LTDA CREA 45.957/D



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº 0136		OBRA: CTP 0191/2024 - SANTO ANTONIO DO GRAMA - IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE ACESSIBILIDADE		CONTRATO:		RESP. TÉCNICO: ANTONIO CARLOS MARTINS BRANDÃO	
ENDEREÇO: TRECHO DA RODOVIA DE ACESSO A SANTO ANTONIO DO GRAMA, BAIRRO NOVO HORIZONTE.				INÍCIO: 01/07/2024		Nº CREA-MG: 45957/D	
CIDDE:				PRAZO: 31/12/2024		Nº DA ART:	
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA				UF:		COORDENADAS:	
DATA: 31/01/2025		SOL ☀		NUBLADO ☁		CHUVA ☔	
MANHÃ		✓				IMPRATICÁVEL ☔	
TARDE		✓					
QTDE		MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO				QTDE	
1		ENCARREGADO DE OBRAS				3	
3		AJUDANTE					
QTDE		EQUIPAMENTO					
2		CAVADEIRA RETA					
3		PÁ					
1		CAVADEIRA DE BOCA					
2		CHIBANCA					
3		ENXADA					
4		CARRINHO DE MÃO					
TAREFAS REALIZADAS							
NÚMERO DE T.R.		DESCRICAO				OBSERVAÇÕES	
1		LIMPEZA E CAPINA					
2		LIMPEZA DE SARGETA					
3		ESCAVAÇÃO PARA INSTALAÇÃO MANILHAS					
4		RECEBIMENTO E DESCARGA DE MANILHA					

REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)



Data não informada



Data não informada



OCORRÊNCIAS		
NÚMERO DE OC	TIPO DE OCORRÊNCIA	DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA
CONFERÊNCIA		
MUNICÍPIO	CONSÓRCIO (Aprovado em 03/02/2025 - 08:58)	
Obs.:	Obs.:	
ASSINATURAS		
YURI ANDRADE COSTA LINS Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 233590/D	PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA CREA 137.103/D	ANTÔNIO CARLOS MARTINS BRANDÃO RT de Execução - PONTAL ENGENHARIA LTDA CREA 45.957/D



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº 0135	OBRA: CTP 0191/2024 - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE ACESSIBILIDADE	CONTRATO:		RESP. TÉCNICO: ANTONIO CARLOS MARTINS BRANDÃO
ENDEREÇO: TRECHO DA RODOVIA DE ACESSO A SANTO ANTONIO DO GRAMA, BAIRRO NOVO HORIZONTE.		INÍCIO: 01/07/2024		Nº CREA-MG: 45957/D
CIDDE:		PRAZO: 31/12/2024		Nº DA ART:
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA		UF:		COORDENADAS:
DATA: 30/01/2025	SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA ☔	IMPRATICÁVEL ☔
MANHÃ		✓		
TARDE		✓		
QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO		QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
1	ENCARREGADO DE OBRAS		3	PEDREIRO
3	AJUDANTE			
QTDE	EQUIPAMENTO			
3	PÁ			
3	ENXADA			
4	CARRINHO DE MÃO			
TAREFAS REALIZADAS				
NÚMERO DE T.R.	DESCRICAO		OBSERVAÇÕES	
1	REJUNTAMENTO DE MEIO FIO PREMOLDADO			
2	LIMPEZA DE SARGETA			
REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)				



Data não informada



Data não informada



Data não informada

OCORRÊNCIAS	
NÚMERO DE OC	TIPO DE OCORRÊNCIA
DESCRÇÃO DA OCORRÊNCIA	
OBSERVAÇÕES	
RDO REFERENTE AO DIA 29-01-2025, ENVIADO EM ATRASO POR FALHA DE ENVIO	
CONFERÊNCIA	
MUNICÍPIO	CONSÓRCIO (Aprovado em 31/01/2025 - 14:58)
Obs.:	Obs.:
ASSINATURAS	
YURI ANDRADE COSTA LINS Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 233590/D	PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA CREA 137.103/D
ANTÔNIO CARLOS MARTINS BRANDÃO RT de Execução - PONTAL ENGENHARIA LTDA CREA 45.957/D	



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº 0134	OBRA: CTP 0191/2024 - SANTO ANTONIO DO GRAMA - IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE ACESSIBILIDADE	CONTRATO:	RESP. TÉCNICO: ANTONIO CARLOS MARTINS BRANDÃO
ENDEREÇO: TRECHO DA RODOVIA DE ACESSO A SANTO ANTONIO DO GRAMA, BAIRRO NOVO HORIZONTE.		INÍCIO: 01/07/2024	Nº CREA-MG: 45957/D
CIDDE:		PRAZO: 31/12/2024	Nº DA ART:
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA		UF:	COORDENADAS:
DATA: 30/01/2025	SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA ☔
MANHÃ		✓	IMPRATICÁVEL ☔
TARDE		✓	
QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
1	ENCARREGADO DE OBRAS	3	PEDREIRO
3	AJUDANTE		
QTDE	EQUIPAMENTO		
3	PÁ		
2	CHIBANCA		
3	ENXADA		
4	CARRINHO DE MÃO		
TAREFAS REALIZADAS			
NÚMERO DE T.R.	DESCRICAÇÃO	OBSERVAÇÕES	
1	REJUNTAMENTO DE MEIO FIO PREMOLDADO		
2	ACERTO E NIVELAMENTO MANUAL DE PISTA		
REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)			



Data não informada



Data não informada



Data não informada



Data não informada

Ocorrências		
NÚMERO DE OC	TIPO DE OCORRÊNCIA	DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA
CONFERÊNCIA		
MUNICÍPIO	CONSÓRCIO (Aprovado em 31/01/2025 - 14:58)	
Obs.:	Obs.:	
ASSINATURAS		
YURI ANDRADE COSTA LINS Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 233590/D	PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA CREA 137.103/D	ANTÔNIO CARLOS MARTINS BRANDÃO RT de Execução - PONTAL ENGENHARIA LTDA CREA 45.957/D



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº 0133	OBRA: CTP 0191/2024 - SANTO ANTONIO DO GRAMA - IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE ACESSIBILIDADE	CONTRATO:	RESP. TÉCNICO: ANTONIO CARLOS MARTINS BRANDÃO
ENDEREÇO: TRECHO DA RODOVIA DE ACESSO A SANTO ANTONIO DO GRAMA, BAIRRO NOVO HORIZONTE.		INÍCIO: 01/07/2024	Nº CREA-MG: 45957/D
CIDDE:		PRAZO: 31/12/2024	Nº DA ART:
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA		UF:	COORDENADAS:
DATA: 28/01/2025	SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA ☔
MANHÃ	✓		
TARDE		✓	
QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
1	ENCARREGADO DE OBRAS	3	PEDREIRO
3	AJUDANTE		
QTDE	EQUIPAMENTO		
3	PÁ		
1	ROLO COMPACTADOR		
3	ENXADA		
4	CARRINHO DE MÃO		
1	SERRA DE BANCADA		
TAREFAS REALIZADAS			
NÚMERO DE T.R.	DESCRICAÇÃO	OBSERVAÇÕES	
1	PAVIMENTAÇÃO EM PEYVER DE CONCRETO		
2	ESPALHAMENTO DE AREIA PARA BERÇO NA PISTA		
3	COMPACTAÇÃO DE CALCAMENTO EM PEYVER		
REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATORIOS)			



Data não informada



Data não informada



Data não informada

OCORRÊNCIAS		
NÚMERO DE OC	TIPO DE OCORRÊNCIA	DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA
CONFERÊNCIA		
MUNICÍPIO	CONSÓRCIO (Aprovado em 29/01/2025 - 14:25)	
Obs.:	Obs.:	
ASSINATURAS		
YURI ANDRADE COSTA LINS Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 233590/D	PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA CREA 137.103/D	ANTÔNIO CARLOS MARTINS BRANDÃO RT de Execução - PONTAL ENGENHARIA LTDA CREA 45.957/D



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº 0132	OBRA: CTP 0191/2024 - SANTO ANTONIO DO GRAMA - IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE ACESSIBILIDADE	CONTRATO:	RESP. TÉCNICO: ANTONIO CARLOS MARTINS BRANDÃO
ENDEREÇO: TRECHO DA RODOVIA DE ACESSO A SANTO ANTONIO DO GRAMA, BAIRRO NOVO HORIZONTE.		INÍCIO: 01/07/2024	Nº CREA-MG: 45957/D
CIDDE:		PRAZO: 31/12/2024	Nº DA ART:
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA		UF:	COORDENADAS:
DATA: 27/01/2025	SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA ☔
MANHÃ	✓		IMPRATICÁVEL ☁
TARDE	✓		
QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
1	ENCARREGADO DE OBRAS	3	PEDREIRO
3	AJUDANTE		
QTDE	EQUIPAMENTO		
3	PÁ		
1	ROLO COMPACTADOR		
3	ENXADA		
4	CARRINHO DE MÃO		
1	SERRA DE BANCADA		
TAREFAS REALIZADAS			
NÚMERO DE T.R.	DESCRICAÇÃO	OBSERVAÇÕES	
1	COMPACTAÇÃO DE CALÇAMENTO EM PEYVER		
2	PAVIMENTAÇÃO EM PEYVER DE CONCRETO		
3	REJUNTAMENTO DE MEIO FIO PREMOLDADO		
4	ESPALHAMENTO DE AREIA PARA BERÇO NA PISTA		
REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)			
			
Data não informada			
			
Data não informada			
			
Data não informada			
			
Data não informada			
			
Data não informada			
Ocorrências			
NÚMERO DE OC	TIPO DE OCORRÊNCIA	DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA	
CONFERÊNCIA			
MUNICÍPIO	CONSÓRCIO (Aprovado em 28/01/2025 - 08:06)		
Obs.:	Obs.:		
ASSINATURAS			

YURI ANDRADE COSTA LINS
Fiscal de Obras - CIMVALPI
CREA 233590/D

PEDRO MARTINO ZEFERINO
Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA
CREA 137.103/D

ANTÔNIO CARLOS MARTINS BRANDÃO
RT de Execução - PONTAL ENGENHARIA LTDA
CREA 45.957/D



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO


Nº 0131	OBRA: CTP 0191/2024 - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE ACESSIBILIDADE	CONTRATO:		RESP. TÉCNICO: ANTONIO CARLOS MARTINS BRANDÃO
ENDEREÇO: TRECHO DA RODOVIA DE ACESSO A SANTO ANTONIO DO GRAMA, BAIRRO NOVO HORIZONTE.		INÍCIO: 01/07/2024		Nº CREA-MG: 45957/D
CIDDE:		PRAZO: 31/12/2024		Nº DA ART:
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA		UF:		COORDENADAS:
DATA: 24/01/2025	SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA ☔	IMPRATICÁVEL ☔
MANHÃ	✓			
TARDE	✓			
QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO		QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
1	ENCARREGADO DE OBRAS		3	PEDREIRO
3	AJUDANTE			
QTDE	EQUIPAMENTO			
2	PÁ			
2	ENXADA			
2	CARRINHO DE MÃO			
TAREFAS REALIZADAS				
NÚMERO DE T.R.	DESCRICAÇÃO		OBSERVAÇÕES	
1	PAVIMENTAÇÃO EM PAVER DE CONCRETO			
2	ESPALHAMENTO E NIVELAMENTO DE AREIA PARA BERÇO			
REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)				



Data não informada



Data não informada

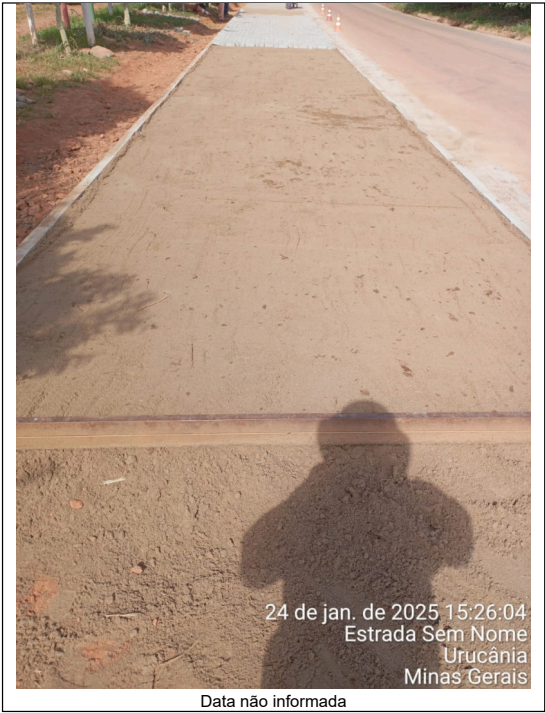

OCORRÊNCIAS	
NÚMERO DE OC	TIPO DE OCORRÊNCIA
CONFERÊNCIA	
MUNICÍPIO	CONSÓRCIO (Aprovado em 27/01/2025 - 08:16)
Obs.:	Obs.:
ASSINATURAS	
YURI ANDRADE COSTA LINS Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 233590/D	PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA CREA 137.103/D
ANTÔNIO CARLOS MARTINS BRANDÃO RT de Execução - PONTAL ENGENHARIA LTDA CREA 45.957/D	



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº 0130	OBRA: CTP 0191/2024 - SANTO ANTONIO DO GRAMA - IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE ACESSIBILIDADE	CONTRATO:	RESP. TÉCNICO: ANTONIO CARLOS MARTINS BRANDÃO
ENDEREÇO: TRECHO DA RODOVIA DE ACESSO A SANTO ANTONIO DO GRAMA, BAIRRO NOVO HORIZONTE.		INÍCIO: 01/07/2024	Nº CREA-MG: 45957/D
CIDDE:	PRAZO: 31/12/2024	Nº DA ART:	
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA	UF:	COORDENADAS:	
DATA: 23/01/2025	SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA ☔
MANHÃ	✓		IMPRATICÁVEL ☁
TARDE	✓		
QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
1	ENCARREGADO DE OBRAS	3	PEDREIRO
3	AJUDANTE		
QTDE	EQUIPAMENTO		
3	PÁ		
1	ROLO COMPACTADOR		
3	ENXADA		
4	CARRINHO DE MÃO		
1	SERRA DE BANCADA		
TAREFAS REALIZADAS			
NÚMERO DE T.R.	DESCRICAÇÃO	OBSERVAÇÕES	
1	PAVIMENTAÇÃO EM PEYVER DE CONCRETO		
2	ESPALHAMENTO DE AREIA PARA BERÇO NA PISTA		
3	COMPACTAÇÃO DE CALCAMENTO EM PEYVER		
REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATORIOS)			



OCORRÊNCIAS		
NÚMERO DE OC	TIPO DE OCORRÊNCIA	DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA
CONFERÊNCIA		
MUNICÍPIO	CONSÓRCIO (Aprovado em 24/01/2025 - 08:36)	
Obs.:	Obs.:	
ASSINATURAS		
YURI ANDRADE COSTA LINS Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 233590/D PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA CREA 137.103/D ANTÔNIO CARLOS MARTINS BRANDÃO RT de Execução - PONTAL ENGENHARIA LTDA CREA 45.957/D		


RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº 0129	OBRA: CTP 0191/2024 - SANTO ANTONIO DO GRAMA - IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE ACESSIBILIDADE	CONTRATO:		RESP. TÉCNICO: ANTONIO CARLOS MARTINS BRANDÃO
ENDEREÇO: TRECHO DA RODOVIA DE ACESSO A SANTO ANTONIO DO GRAMA, BAIRRO NOVO HORIZONTE.		INÍCIO: 01/07/2024		Nº CREA-MG: 45957/D
CIDDE:		PRAZO: 31/12/2024		Nº DA ART:
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA		UF:		COORDENADAS:
DATA: 22/01/2025	SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA ☔	IMPRATICÁVEL ☁
MANHÃ	✓			
TARDE	✓			
QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO		QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
1	ENCARREGADO DE OBRAS		3	PEDREIRO
5	AJUDANTE			
QTDE	EQUIPAMENTO			
2	CAVADEIRA RETA			
1	DAMPER			
3	PÁ			
1	ROLO COMPACTADOR			
2	CHIBANCA			
3	ENXADA			
4	CARRINHO DE MÃO			
TAREFAS REALIZADAS				
NÚMERO DE T.R.	DESCRIÇÃO		OBSERVAÇÕES	
1	RECEBIMENTO E DESCARGA DE MEIO FIO PREMOLDADO			
2	ACERTO E NIVELAMENTO DE PISTA MANUAL			
3	COMPACTAÇÃO DE SOLO COM ROLO			
4	CONCRETAGEM DE SARJETA			
5	REJUNTAMENTO DE MEIO FIO PREMOLDADO			
REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)				





Data não informada

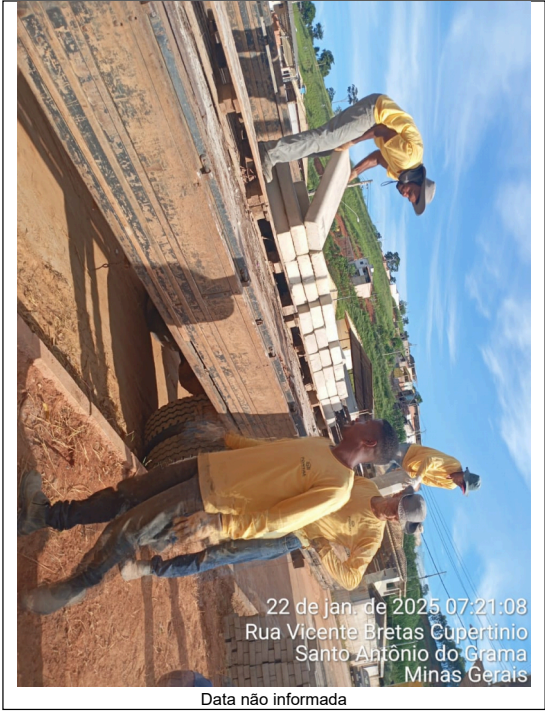

Data não informada



Data não informada

OCORRÊNCIAS		
NÚMERO DE OC	TIPO DE OCORRÊNCIA	DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA
CONFERÊNCIA		
MUNICÍPIO	CONSÓRCIO (Aprovado em 24/01/2025 - 08:36)	
Obs.:	Obs.:	
ASSINATURAS		
YURI ANDRADE COSTA LINS Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 233590/D	PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA CREA 137.103/D	ANTÔNIO CARLOS MARTINS BRANDÃO RT de Execução - PONTAL ENGENHARIA LTDA CREA 45.957/D



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº 0128	OBRA: CTP 0191/2024 - SANTO ANTONIO DO GRAMA - IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE ACESSIBILIDADE	CONTRATO:	RESP. TÉCNICO: ANTONIO CARLOS MARTINS BRANDÃO
ENDEREÇO: TRECHO DA RODOVIA DE ACESSO A SANTO ANTONIO DO GRAMA, BAIRRO NOVO HORIZONTE.		INÍCIO: 01/07/2024	Nº CREA-MG: 45957/D
CIDDE:		PRAZO: 31/12/2024	Nº DA ART:
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA		UF:	COORDENADAS:
DATA: 21/01/2025	SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA ☔
MANHÃ	✓		IMPRATICÁVEL ☁
TARDE	✓		
QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
1	ENCARREGADO DE OBRAS	3	PEDREIRO
5	AJUDANTE		
QTDE	EQUIPAMENTO		
2	CAVADEIRA RETA		
1	DAMPER		
3	PÁ		
2	CHIBANCA		
3	ENXADA		
4	CARRINHO DE MÃO		
TAREFAS REALIZADAS			
NÚMERO DE T.R.	DESCRICAÇÃO	OBSERVAÇÕES	
1	INSTALAÇÃO DE MEIO FIO PREMOLDADO		
2	ESCAVAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DE MEIO FIO E SARGETA		
3	CONCRETAGEM DE SARGETA		
4	ACERTO E NIVELAMENTO DE PISTA MANUAL		

REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)





OCORRÊNCIAS		
NÚMERO DE OC	TIPO DE OCORRÊNCIA	DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA
CONFERÊNCIA		
MUNICÍPIO	CONSÓRCIO (Aprovado em 22/01/2025 - 09:06)	
Obs.:	Obs.:	
ASSINATURAS		
YURI ANDRADE COSTA LINS Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 233590/D PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA CREA 137.103/D ANTÔNIO CARLOS MARTINS BRANDÃO RT de Execução - PONTAL ENGENHARIA LTDA CREA 45.957/D		



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº 0127	OBRA: CTP 0191/2024 - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE ACESSIBILIDADE	CONTRATO:	RESP. TÉCNICO: ANTONIO CARLOS MARTINS BRANDÃO
ENDEREÇO: TRECHO DA RODOVIA DE ACESSO A SANTO ANTONIO DO GRAMA, BAIRRO NOVO HORIZONTE.		INÍCIO: 01/07/2024	Nº CREA-MG: 45957/D
CIDDE:		PRAZO: 31/12/2024	Nº DA ART:
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA		UF:	COORDENADAS:
DATA: 21/01/2025	SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA ☔
MANHÃ	✓		IMPRATICÁVEL ☔
TARDE	✓		
QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
1	ENCARREGADO DE OBRAS	3	PEDREIRO
5	AJUDANTE		
QTDE	EQUIPAMENTO		
2	CAVADEIRA RETA		
1	DAMPER		
3	PÁ		
1	CAMINHÃO CARROCERIA		
2	CHIBANCA		
3	ENXADA		
4	CARRINHO DE MÃO		
TAREFAS REALIZADAS			
NÚMERO DE T.R.	DESCRICAÇÃO	OBSERVAÇÕES	
1	TRANSPORTE DE MEIO FIO PARA PROXIMO DO CANTEIRO		
2	INSTALAÇÃO DE MEIO FIO PREMOLDADO		
3	RECEBIMENTO E DESCARGA DE CIMENTO		
4	ESCAVAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE MEIO FIO E SARJETA		
5	CONCRETAGEM DE SARJETA		
REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)			



Data não informada



Data não informada





OCORRÊNCIAS	
NÚMERO DE OC	TIPO DE OCORRÊNCIA
DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA	
OBSERVAÇÕES	
RDO REFERENTE AO DIA 20/01/2025, FEITO EM ATRASO POIS NAO HOUVE EXPEDIENTE NO ESCRITORIO	
CONFERÊNCIA	
MUNICÍPIO	CONSÓRCIO (Aprovado em 21/01/2025 - 11:30)
Obs.:	Obs.:
ASSINATURAS	
YURI ANDRADE COSTA LINS Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 233590/D	PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA CREA 137.103/D
ANTÔNIO CARLOS MARTINS BRANDÃO RT de Execução - PONTAL ENGENHARIA LTDA CREA 45.957/D	





CIMVALPI

CONSORCIO INTERMUNICIPAL
MULTISETORIAL DO VALE DO PIRANGA

Assinaturas do Documento



Documento Assinado Eletronicamente por **YURI ANDRADE COSTA LINS - ENGENHEIRO CIVIL JÚNIOR**, CPF: 084.94*. **6- *2 em **24/02/2025 15:04:22**, Cód. Autenticidade da Assinatura: 15K0.1Z04.5226.A159.2416, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Documento Assinado Eletronicamente por **ANTONIO CARLOS MARTINS BRANDÃO**, CPF: 385.06*. **6- *4 em **24/02/2025 14:49:40**, Cód. Autenticidade da Assinatura: 1495.5U49.3404.E034.8442, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Informações do Documento

ID do Documento: **E05.EF5** - Tipo de Documento: **FORMULÁRIO DE MEDIÇÕES**.

Elaborado por **GILBERTO ARAUJO GOMIDES**, CPF: 069.58*. **6- *7 , em **24/02/2025 - 14:38:05**

Código de Autenticidade deste Documento: 14X3.6R38.0058.9827.8827

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
<https://zeropapel.cimvalpi.mg.gov.br/verdocumento>

