

FORMULÁRIO DE MEDIÇÕES

RELATÓRIO PARCIAL (SITUAÇÃO: APROVADA PELO CONSÓRCIO)

Enviado por ANTONIO CARLOS MARTINS BRANDAO em 20/03/2025 - 17:16

Registro: 20/03/2025							8ª MEDIÇÃO						
Obra: 635.1 - CTP 0191/2024 - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE ACESSIBILIDADE							Período de 21/02/2025 a 20/03/2025						
Ordens de Serviço: 482/2024							Local: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA						
OBSERVAÇÕES													
Enviada por ANTONIO CARLOS MARTINS BRANDAO (FORNECEDOR) em 20/03/2025 às 17:16													
ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	QUANTIDADE MEDIDA		VALOR MEDIDO				
							NESTA MEDIÇÃO	ACUMULADA	VALOR PREVISTO (BDI)	NESTA MEDIÇÃO (BDI)	ACUMULADA (BDI)	SALDO (BDI)	
01	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO												
01.01	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA - para obras que exigem a utilização de grande quantidade de equipamentos e são executadas em centros urbanos ou próximos de centros urbanos. Obs.: Não se aplica aos serviços de Tapa Buracos.												
01.01.01	OBRAS ATÉ O VALOR DE R\$ 1.000.000,00 - MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA PAVIMENTAÇÃO, EXCLUSIVE PARA TAPA-BURACOS	%	1	R\$ 25,00	R\$ 31,62	R\$ 31,62	0.5	4	R\$ 31,62	R\$ 77,10	R\$ 3.108,51	R\$ -3.076,89	
04	TRABALHOS EM TERRA												
04.08	ESCAVAÇÃO MECANICA DE VALAS COM DESCARGA LATERAL												
04.08.02	1.5 M < H <= 3.0 M	m³	263.4	R\$ 5,29	R\$ 6,73	R\$ 1.772,68	0.979	131.699	R\$ 1.772,68	R\$ 6,59	R\$ 886,34	R\$ 886,34	
05	DRENAGEM URBANA												
05.08	BUEIRO TUBULAR												
05.08.20*	TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA1, DIÂMETRO 600MM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO	M	180	R\$ 232,29	R\$ 294,90	R\$ 53.082,00	28	90	R\$ 53.082,00	R\$ 8.257,20	R\$ 26.541,00	R\$ 26.541,00	
05.10	CAIXA DE CAPTAÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL												



05.10.01	CAIXA DE CAPTAÇÃO E DRENAGEM TIPO A (100 X 100 X 120 CM), D = 500 MM A 1500MM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA FORA	un	12	R\$ 2.582,14	R\$ 3.278,04	R\$ 39.336,48	2	6	R\$ 39.336,48	R\$ 3.278,04	R\$ 9.834,12	R\$ 29.502,36
06	PAVIMENTAÇÃO											
06.19	PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO DE CONCRETO											
06.19.01	PISO INTERTRAVADO 10X20CM E= 6,0CM 35MPA C/ COLCHAO AREIA	m²	2918.34	R\$ 85,13	R\$ 108,08	R\$ 315.414,19	35.88	2918.34	R\$ 315.414,19	R\$ 3.877,91	R\$ 315.414,18	R\$ 0,01
15	ADMINISTRAÇÃO LOCAL											
15.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - % BASEADA ACÓRDÃO 2.622/2013 DO TCU SOBRE SOMA DOS ITENS 1 A 14	%	15.1	R\$ 329,17	R\$ 416,25	R\$ 6.285,38	6.55	52.4	R\$ 6.285,38	R\$ 1.015,04	R\$ 40.556,78	R\$ -34.271,41
									TOTAL:	R\$ 16.511,88	R\$ 665.366,69	

YURI ANDRADE COSTA LINS
Fiscal de Obras - CIMVALPI
CREA 233590/D
Aprovação: 25/03/2025


PEDRO MARTINO ZEFERINO
Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA
CREA 137.103/D


ANTÔNIO CARLOS MARTINS BRANDÃO
RT de Execução - PONTAL ENGENHARIA LTDA
CREA 45.957/D



Nº 0166	OBRA: CTP 0191/2024 - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE ACESSIBILIDADE	CONTRATO:	RESP. TÉCNICO: ANTONIO CARLOS MARTINS BRANDÃO
ENDEREÇO: TRECHO DA RODOVIA DE ACESSO A SANTO ANTONIO DO GRAMA, BAIRRO NOVO HORIZONTE.		INÍCIO: 01/07/2024	Nº CREA-MG: 45957/D
CIDDE:		PRAZO: 31/12/2024	Nº DA ART:
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA		UF:	COORDENADAS:
DATA: 18/03/2025	SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA ☔
MANHÃ	✓		IMPRATICÁVEL ☁
TARDE	✓		
QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
1	ENCARREGADO DE OBRAS	3	PEDREIRO
3	AJUDANTE		
QTDE	EQUIPAMENTO		
1	COMPACTADOR DE SOLO		
3	PÁ		
3	ENXADA		
2	CARRINHO DE MÃO		
TAREFAS REALIZADAS			
NÚMERO DE T.R.	DESCRICAÇÃO	OBSERVAÇÕES	
1	COMPACTAÇÃO DE VALA		
2	REJUNTAMENTO DE MANILHAS		
3	ATERRAMENTO DE MANILHAS		
4	INSTALAÇÃO DE MANILHAS DE 600MM		

REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)

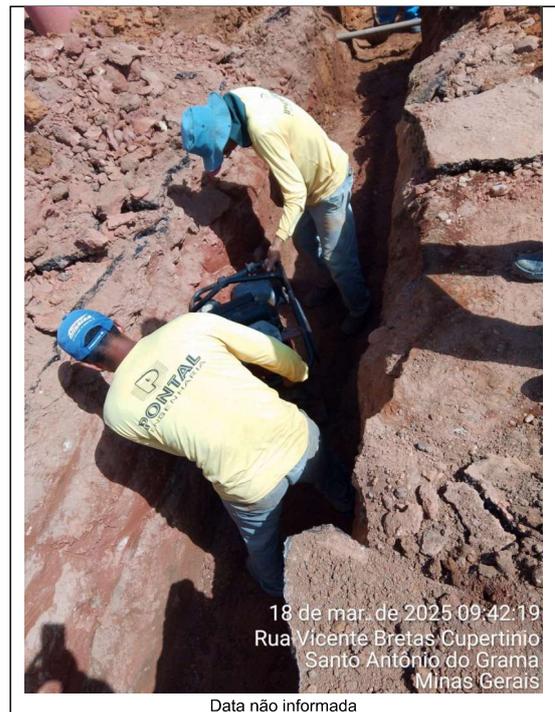

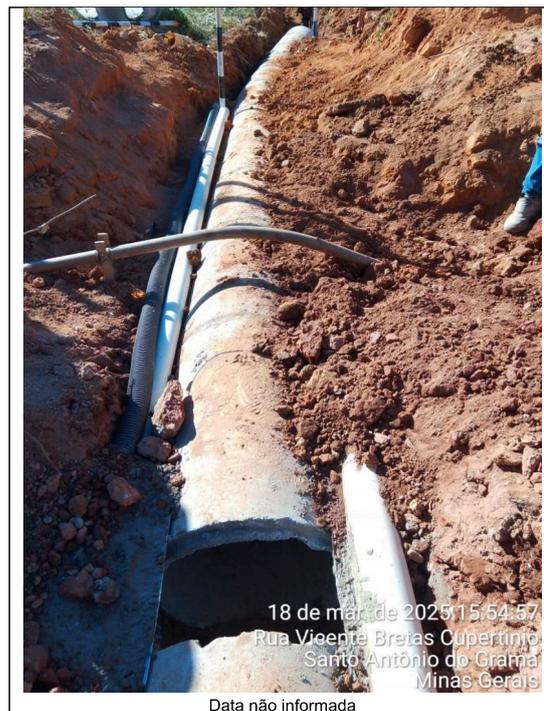



OCORRÊNCIAS		
NÚMERO DE OC	TIPO DE OCORRÊNCIA	DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA
CONFERÊNCIA		
MUNICÍPIO		
CONSÓRCIO (Aprovado em 19/03/2025 - 14:45)		
Obs.:	Obs.:	
ASSINATURAS		
_____ YURI ANDRADE COSTA LINS Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 233590/D	_____ PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA CREA 137.103/D	_____ ANTÔNIO CARLOS MARTINS BRANDÃO RT de Execução - PONTAL ENGENHARIA LTDA CREA 45.957/D



Nº 0165	OBRA: CTP 0191/2024 - SANTO ANTONIO DO GRAMA - IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE ACESSIBILIDADE	CONTRATO:	RESP. TÉCNICO: ANTONIO CARLOS MARTINS BRANDÃO
ENDEREÇO: TRECHO DA RODOVIA DE ACESSO A SANTO ANTONIO DO GRAMA, BAIRRO NOVO HORIZONTE.		INÍCIO: 01/07/2024	Nº CREA-MG: 45957/D
CIDDE:		PRAZO: 31/12/2024	Nº DA ART:
DISTRITO: SANTO ANTONIO DO GRAMA		UF:	COORDENADAS:
DATA: 17/03/2025	SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA ☔
MANHÃ	✓		IMPRATICÁVEL ☔
TARDE		✓	
QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
1	ENCARREGADO DE OBRAS	1	OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA
3	PEDREIRO	3	AJUDANTE
QTDE	EQUIPAMENTO		
2	CAVADEIRA RETA		
3	PÁ		
1	ROLO COMPACTADOR		
3	CHIBANCA		
3	ENXADA		
2	CARRINHO DE MÃO		
1	RETROESCAVADEIRA		
TAREFAS REALIZADAS			
NÚMERO DE T.R.	DESCRICAÇÃO	OBSERVAÇÕES	
1	ESCAVAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE MANILHA DE 600MM		
2	REJUNTAMENTO DE MEIO FIO PREMOLDADO		
3	ESPALHAMENTO DE AREIA PARA BERÇO NA PISTA		
4	PAVIMENTAÇÃO EM PEYVER DE CONCRETO		
5	COMPACTAÇÃO DE PISTA COM ROLO		

REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)



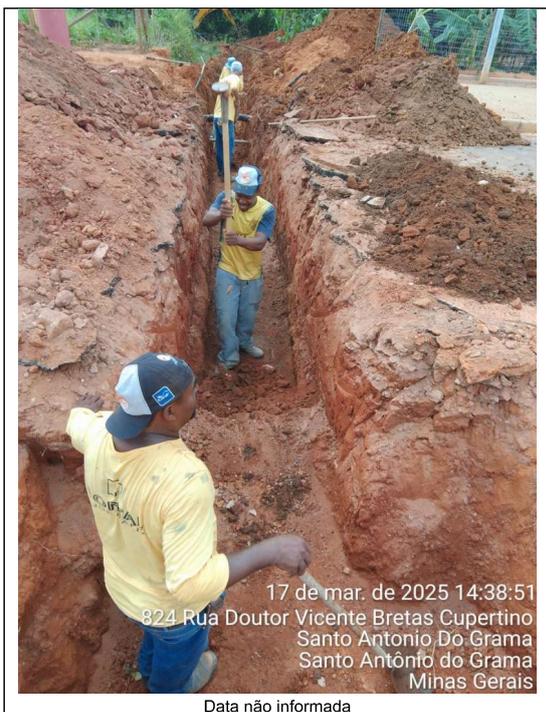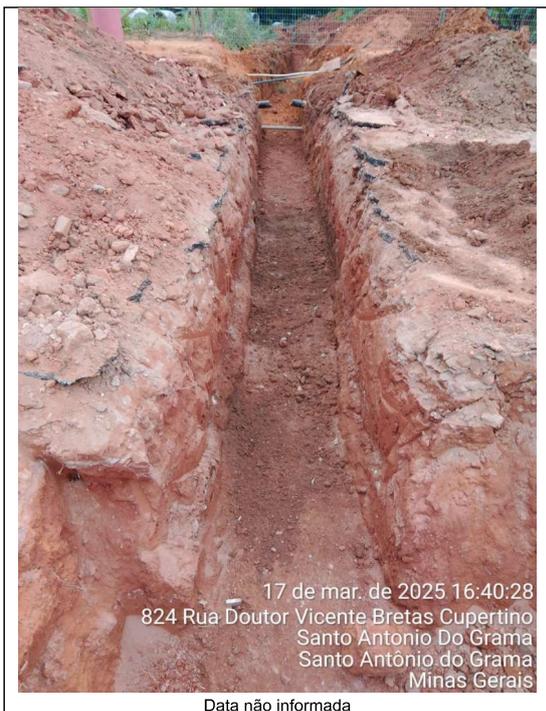

OCORRÊNCIAS		
NÚMERO DE OC	TIPO DE OCORRÊNCIA	DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA
CONFERÊNCIA		
MUNICÍPIO		CONSÓRCIO (Aprovado em 19/03/2025 - 14:45)
Obs.:		Obs.:
ASSINATURAS		
<p>YURI ANDRADE COSTA LINS Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 233590/D</p>	<p>PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA CREA 137.103/D</p>	<p>ANTÔNIO CARLOS MARTINS BRANDÃO RT de Execução - PONTAL ENGENHARIA LTDA CREA 45.957/D</p>



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº 0164	OBRA: CTP 0191/2024 - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE ACESSIBILIDADE	CONTRATO:	RESP. TÉCNICO: ANTONIO CARLOS MARTINS BRANDÃO
ENDEREÇO: TRECHO DA RODOVIA DE ACESSO A SANTO ANTONIO DO GRAMA, BAIRRO NOVO HORIZONTE.		INÍCIO: 01/07/2024	Nº CREA-MG: 45957/D
CIDDE:		PRAZO: 31/12/2024	Nº DA ART:
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA		UF:	COORDENADAS:
DATA: 14/03/2025	SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA ☔
MANHÃ	✓		IMPRATICÁVEL ☔
TARDE	✓		
QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
1	ENCARREGADO DE OBRAS	3	PEDREIRO
3	AJUDANTE		
QTDE	EQUIPAMENTO		
1	MARTELETE		
3	PÁ		
1	ROLO COMPACTADOR		
3	ENXADA		
4	CARRINHO DE MÃO		
1	RETROESCAVADEIRA		
TAREFAS REALIZADAS			
NÚMERO DE T.R.	DESCRICAÇÃO	OBSERVAÇÕES	
1	CONCRETAGEM DE MEIO FIO		
2	ACERTO E NIVELAMENTO DE PISTA COM RETROESCAVADEIRA		
3	DESMONTE DE FORMA		
4	CONCRETAGEM DE SARJETA		
5	COMPACTAÇÃO DE PISTA COM ROLO		

REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)






OCORRÊNCIAS		
NÚMERO DE OC	TIPO DE OCORRÊNCIA	DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA
	CONFERÊNCIA	
MUNICÍPIO	CONSÓRCIO (Aprovado em 17/03/2025 - 16:19)	
Obs.:	Obs.:	
ASSINATURAS		
_____ YURI ANDRADE COSTA LINS Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 233590/D	_____ PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA CREA 137.103/D	_____ ANTÔNIO CARLOS MARTINS BRANDÃO RT de Execução - PONTAL ENGENHARIA LTDA CREA 45.957/D



Nº 0163	OBRA: CTP 0191/2024 - SANTO ANTONIO DO GRAMA - IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE ACESSIBILIDADE	CONTRATO:	RESP. TÉCNICO: ANTONIO CARLOS MARTINS BRANDÃO
ENDEREÇO: TRECHO DA RODOVIA DE ACESSO A SANTO ANTONIO DO GRAMA, BAIRRO NOVO HORIZONTE.		INÍCIO: 01/07/2024	Nº CREA-MG: 45957/D
CIDDE:		PRAZO: 31/12/2024	Nº DA ART:
DISTRITO: SANTO ANTONIO DO GRAMA		UF:	COORDENADAS:
DATA: 13/03/2025	SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA ☔
MANHÃ	✓		IMPRATICÁVEL ☔
TARDE	✓		
QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
1	ENCARREGADO DE OBRAS	3	PEDREIRO
3	AJUDANTE		
QTDE	EQUIPAMENTO		
2	CAVADEIRA RETA		
1	DAMPER		
3	PÁ		
2	CHIBANCA		
3	ENXADA		
4	CARRINHO DE MÃO		
1	BETONEIRA		
TAREFAS REALIZADAS			
NÚMERO DE T.R.	DESCRICOAO	OBSERVAÇÕES	
1	PAVIMENTAÇÃO EM PEYVER DE CONCRETO		
2	INSTALAÇÃO DE MEIO FIO PREMOLDADO		
3	ESPALHAMENTO DE AREIA PARA BERÇO NA PISTA		
4	EXECUÇÃO DE FORMA PARA CONCRETAGEM DE ALA	ALA DE CONCRETO ARMADO	
5	ESCAVAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE MEIO FIO E SARGETA		
6	ARMAÇÃO DE FERRAGEM DE ALA	ALA DE CONCRETO ARMADO	
7	CONCRETAGEM DE SARGETA		
8	CONCRETAGEM DE ALA	ALA DE CONCRETO ARMADO	

REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATORIOS)

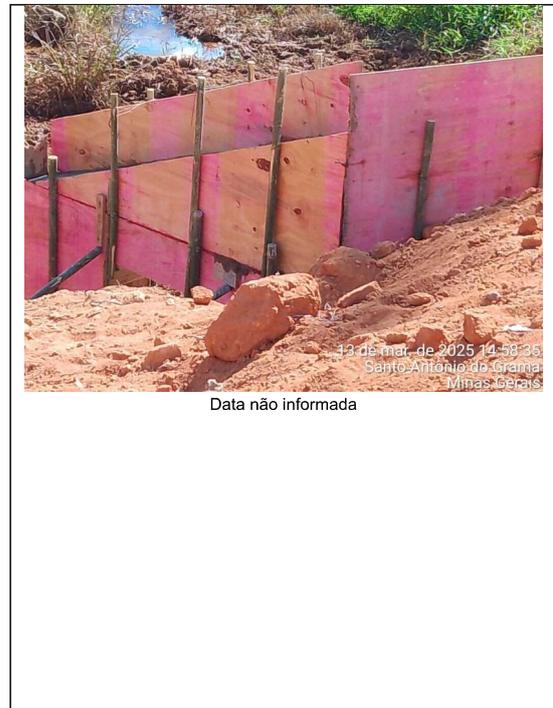



Data não informada



Data não informada



Data não informada




Data não informada



OCORRÊNCIAS		
NÚMERO DE OC	TIPO DE OCORRÊNCIA	DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA
	CONFERÊNCIA	
MUNICÍPIO	CONSÓRCIO (Aprovado em 17/03/2025 - 16:18)	
Obs.:	Obs.:	
ASSINATURAS		
_____ YURI ANDRADE COSTA LINS Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 233590/D	_____ PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA CREA 137.103/D	_____ ANTÔNIO CARLOS MARTINS BRANDÃO RT de Execução - PONTAL ENGENHARIA LTDA CREA 45.957/D



Nº 0162	OBRA: CTP 0191/2024 - SANTO ANTONIO DO GRAMA - IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE ACESSIBILIDADE	CONTRATO:	RESP. TÉCNICO: ANTONIO CARLOS MARTINS BRANDÃO
ENDEREÇO: TRECHO DA RODOVIA DE ACESSO A SANTO ANTONIO DO GRAMA, BAIRRO NOVO HORIZONTE.		INÍCIO: 01/07/2024	Nº CREA-MG: 45957/D
CIDDE:		PRAZO: 31/12/2024	Nº DA ART:
DISTRITO: SANTO ANTONIO DO GRAMA		UF:	COORDENADAS:
DATA: 12/03/2025	SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA ☔
MANHÃ	✓		IMPRATICÁVEL ☔
TARDE	✓		
QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
1	ENCARREGADO DE OBRAS	3	PEDREIRO
3	AJUDANTE		
QTDE	EQUIPAMENTO		
1	DAMPER		
3	PÁ		
3	ENXADA		
4	CARRINHO DE MÃO		
1	BETONEIRA		
TAREFAS REALIZADAS			
NÚMERO DE T.R.	DESCRICAÇÃO	OBSERVAÇÕES	
1	EXECUÇÃO DE FORMA PARA CONCRETAGEM DE ALA	ALA DE CONCRETO ARMADO	
2	CONCRETAGEM DE ALA	ALA DE CONCRETO ARMADO	
3	ARMAÇÃO DE FERRAGEM DE ALA	ALA DE CONCRETO ARMADO	

REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)

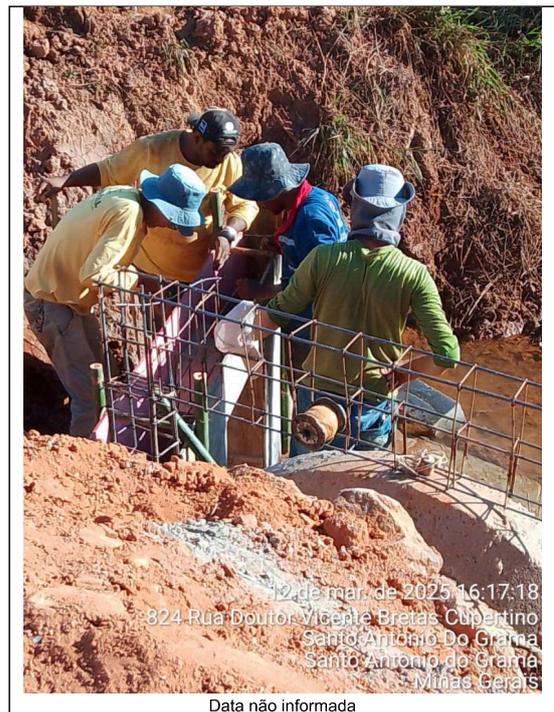

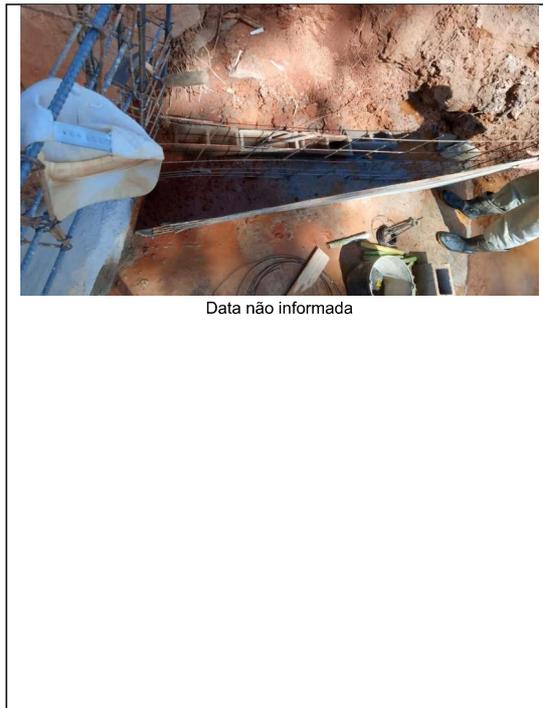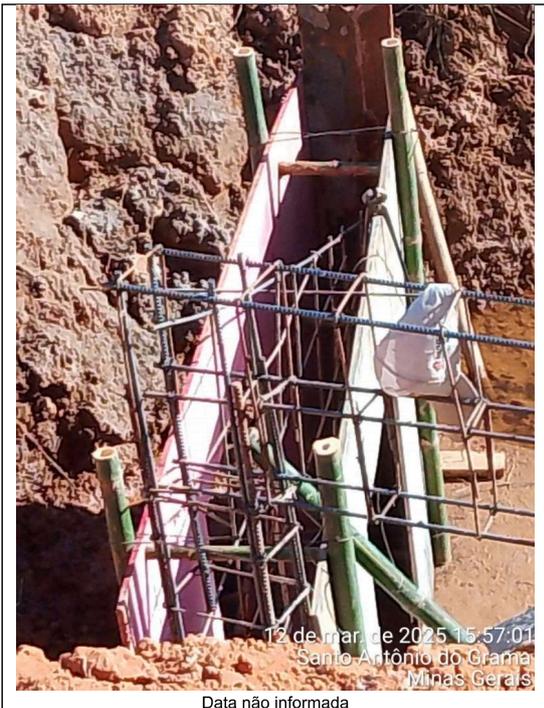


OCORRÊNCIAS		
NÚMERO DE OC	TIPO DE OCORRÊNCIA	DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA
CONFERÊNCIA		
MUNICÍPIO	CONSÓRCIO (Aprovado em 13/03/2025 - 08:47)	
Obs.:	Obs.:	
ASSINATURAS		
_____ YURI ANDRADE COSTA LINS Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 233590/D	_____ PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA CREA 137.103/D	_____ ANTÔNIO CARLOS MARTINS BRANDÃO RT de Execução - PONTAL ENGENHARIA LTDA CREA 45.957/D



Nº 0161	OBRA: CTP 0191/2024 - SANTO ANTONIO DO GRAMA - IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE ACESSIBILIDADE	CONTRATO:	RESP. TÉCNICO: ANTONIO CARLOS MARTINS BRANDÃO
ENDEREÇO: TRECHO DA RODOVIA DE ACESSO A SANTO ANTONIO DO GRAMA, BAIRRO NOVO HORIZONTE.		INÍCIO: 01/07/2024	Nº CREA-MG: 45957/D
CIDDE:		PRAZO: 31/12/2024	Nº DA ART:
DISTRITO: SANTO ANTONIO DO GRAMA		UF:	COORDENADAS:
DATA: 11/03/2025	SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA ☔
MANHÃ	✓		IMPRATICÁVEL ☔
TARDE	✓		
QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
1	ENCARREGADO DE OBRAS	3	PEDREIRO
3	AJUDANTE		
QTDE	EQUIPAMENTO		
1	DAMPER		
3	PÁ		
2	CHIBANCA		
3	ENXADA		
4	CARRINHO DE MÃO		
1	BETONEIRA		
TAREFAS REALIZADAS			
NÚMERO DE T.R.	DESCRICAÇÃO	OBSERVAÇÕES	
1	ESCAVAÇÃO E LIMPEZA MANUAL DE ACESSO À MANILHA 120		
2	CONCRETAGEM DE ACESSO À MANILHA 1200MM		

REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)

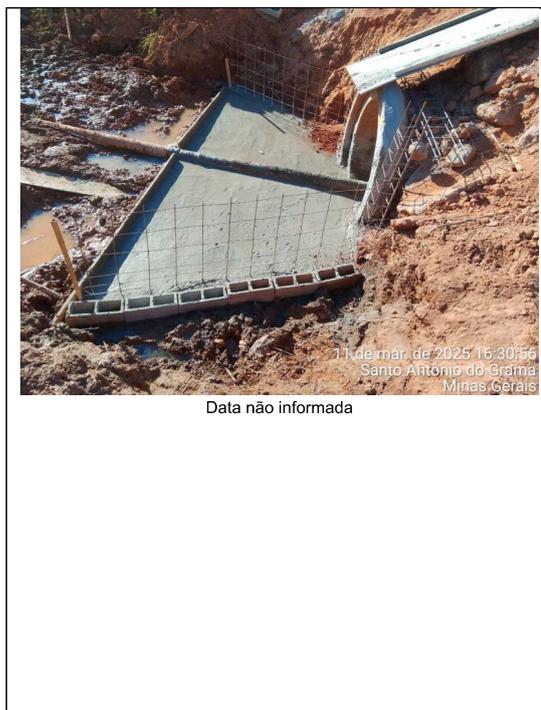




Data não informada



Data não informada

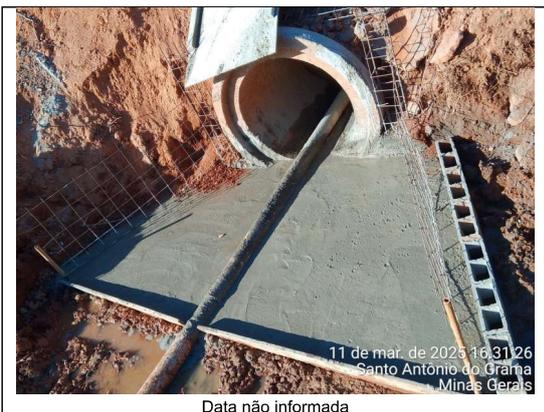

Data não informada

OCORRÊNCIAS		
NÚMERO DE OC	TIPO DE OCORRÊNCIA	DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA
	CONFERÊNCIA	
MUNICÍPIO	CONSÓRCIO (Aprovado em 13/03/2025 - 08:47)	
Obs.:	Obs.:	
ASSINATURAS		
_____ YURI ANDRADE COSTA LINS Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 233590/D	_____ PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA CREA 137.103/D	_____ ANTÔNIO CARLOS MARTINS BRANDÃO RT de Execução - PONTAL ENGENHARIA LTDA CREA 45.957/D



Nº 0160	OBRA: CTP 0191/2024 - SANTO ANTONIO DO GRAMA - IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE ACESSIBILIDADE	CONTRATO:	RESP. TÉCNICO: ANTONIO CARLOS MARTINS BRANDÃO
ENDEREÇO: TRECHO DA RODOVIA DE ACESSO A SANTO ANTONIO DO GRAMA, BAIRRO NOVO HORIZONTE.		INÍCIO: 01/07/2024	Nº CREA-MG: 45957/D
CIDDE:		PRAZO: 31/12/2024	Nº DA ART:
DISTRITO: SANTO ANTONIO DO GRAMA		UF:	COORDENADAS:
DATA: 10/03/2025	SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA ☔
MANHÃ	✓		IMPRATICÁVEL ☔
TARDE	✓		
QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
1	ENCARREGADO DE OBRAS	1	OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA
3	PEDREIRO	3	AJUDANTE
QTDE	EQUIPAMENTO		
2	CAVADEIRA RETA		
3	CAVADEIRA DE BOCA		
3	ENXADA		
3	CARRINHO DE MÃO		
1	RETROESCAVADEIRA		
TAREFAS REALIZADAS			
NÚMERO DE T.R.	DESCRICAÇÃO	OBSERVAÇÕES	
1	ESCAVAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DE MANILHAS 1200MM		
2	CONFECCAO DE CERCA DE ARAME FARPADO		

REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)




Data não informada



Data não informada



Data não informada

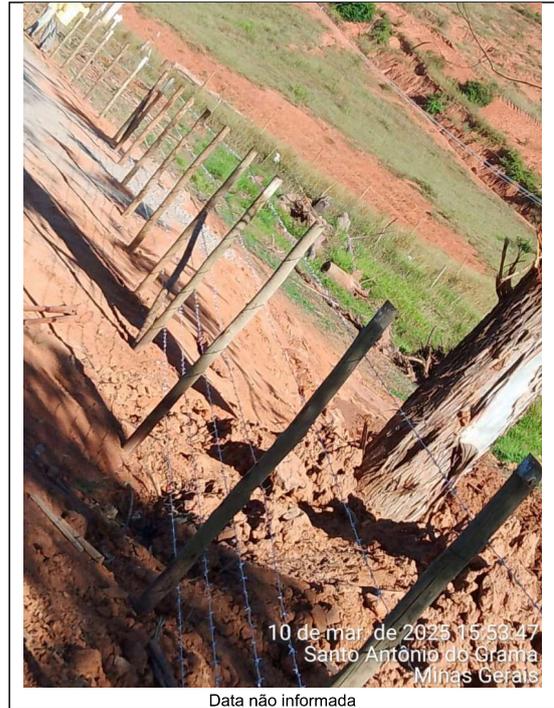

Data não informada



Data não informada

OCORRÊNCIAS		
NÚMERO DE OC	TIPO DE OCORRÊNCIA	DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA
	CONFERÊNCIA	
MUNICÍPIO	CONSÓRCIO (Aprovado em 13/03/2025 - 08:47)	
Obs.:	Obs.:	
ASSINATURAS		
<p>YURI ANDRADE COSTA LINS Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 233590/D</p>	<p>PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA CREA 137.103/D</p>	<p>ANTÔNIO CARLOS MARTINS BRANDÃO RT de Execução - PONTAL ENGENHARIA LTDA CREA 45.957/D</p>




RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº 0159	OBRA: CTP 0191/2024 - SANTO ANTONIO DO GRAMA - IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE ACESSIBILIDADE	CONTRATO:	RESP. TÉCNICO: ANTONIO CARLOS MARTINS BRANDÃO
ENDEREÇO: TRECHO DA RODOVIA DE ACESSO A SANTO ANTONIO DO GRAMA, BAIRRO NOVO HORIZONTE.		INÍCIO: 01/07/2024	Nº CREA-MG: 45957/D
CIDDE:		PRAZO: 31/12/2024	Nº DA ART:
DISTRITO: SANTO ANTONIO DO GRAMA		UF:	COORDENADAS:
DATA: 07/03/2025	SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA ☔
MANHÃ	✓		IMPRATICÁVEL ☔
TARDE	✓		
QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
1	ENCARREGADO DE OBRAS	3	PEDREIRO
3	AJUDANTE		
QTDE	EQUIPAMENTO		
3	PÁ		
3	ENXADA		
4	CARRINHO DE MÃO		
1	BETONEIRA		
1	SERRA DE BANCADA		
TAREFAS REALIZADAS			
NÚMERO DE T.R.	DESCRICAÇÃO	OBSERVAÇÕES	
1	ESPALHAMENTO DE AREIA PARA BERÇO NA PISTA		
2	PAVIMENTAÇÃO EM PEYVER DE CONCRETO		
3	REJUNTAMENTO DE MEIO FIO PREMOLDADO		
4	ARREIMATE DE PISTA		

REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)



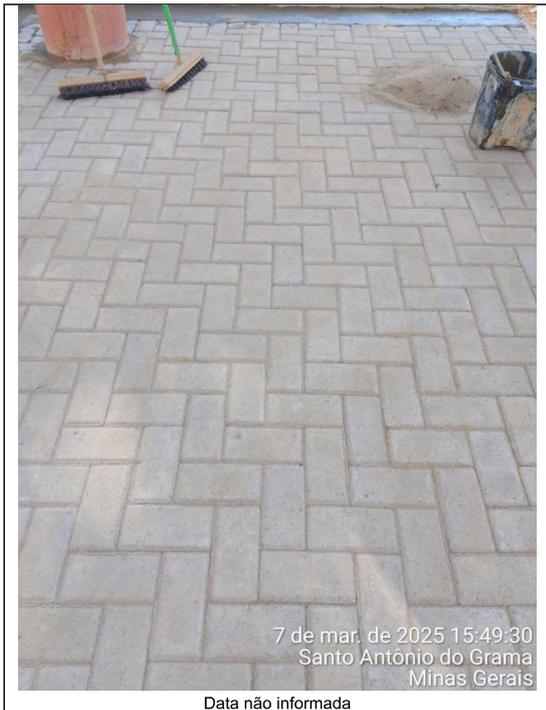

OCORRÊNCIAS		
NÚMERO DE OC	TIPO DE OCORRÊNCIA	DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA
CONFERÊNCIA		
MUNICÍPIO	CONSÓRCIO (Aprovado em 10/03/2025 - 08:50)	
Obs.:	Obs.:	
ASSINATURAS		
<p>_____ YURI ANDRADE COSTA LINS Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 233590/D</p>	<p>_____ PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA CREA 137.103/D</p>	<p>_____ ANTÔNIO CARLOS MARTINS BRANDÃO RT de Execução - PONTAL ENGENHARIA LTDA CREA 45.957/D</p>



Nº 0158	OBRA: CTP 0191/2024 - SANTO ANTONIO DO GRAMA - IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE ACESSIBILIDADE	CONTRATO:	RESP. TÉCNICO: ANTONIO CARLOS MARTINS BRANDÃO
ENDEREÇO: TRECHO DA RODOVIA DE ACESSO A SANTO ANTONIO DO GRAMA, BAIRRO NOVO HORIZONTE.		INÍCIO: 01/07/2024	Nº CREA-MG: 45957/D
CIDDE:		PRAZO: 31/12/2024	Nº DA ART:
DISTRITO: SANTO ANTONIO DO GRAMA		UF:	COORDENADAS:
DATA: 06/03/2025	SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA ☔
MANHÃ	✓		IMPRATICÁVEL ☔
TARDE	✓		
QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
1	ENCARREGADO DE OBRAS	3	PEDREIRO
3	AJUDANTE		
QTDE	EQUIPAMENTO		
1	ROLO LISO		
2	PÁ		
2	ENXADA		
2	CARRINHO DE MÃO		
TAREFAS REALIZADAS			
NÚMERO DE T.R.	DESCRICAÇÃO	OBSERVAÇÕES	
1	ESCAVAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE MEIO FIO E SARJETA		
2	PAVIMENTAÇÃO EM PAVER DE CONCRETO		
3	INSTALAÇÃO DE MEIO FIO PREMOLDADO		

REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)





OCORRÊNCIAS		
NÚMERO DE OC	TIPO DE OCORRÊNCIA	DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA
CONFERÊNCIA		
MUNICÍPIO	CONSÓRCIO (Aprovado em 07/03/2025 - 07:55)	
Obs.:	Obs.:	
ASSINATURAS		
<p>_____ YURI ANDRADE COSTA LINS Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 233590/D</p>	<p>_____ PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA CREA 137.103/D</p>	<p>_____ ANTÔNIO CARLOS MARTINS BRANDÃO RT de Execução - PONTAL ENGENHARIA LTDA CREA 45.957/D</p>




Nº 0157	OBRA: CTP 0191/2024 - SANTO ANTONIO DO GRAMA - IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE ACESSIBILIDADE	CONTRATO:	RESP. TÉCNICO: ANTONIO CARLOS MARTINS BRANDÃO
ENDEREÇO: TRECHO DA RODOVIA DE ACESSO A SANTO ANTONIO DO GRAMA, BAIRRO NOVO HORIZONTE.		INÍCIO: 01/07/2024	Nº CREA-MG: 45957/D
CIDDE:		PRAZO: 31/12/2024	Nº DA ART:
DISTRITO: SANTO ANTONIO DO GRAMA		UF:	COORDENADAS:
DATA: 05/03/2025	SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA ☔
MANHÃ	✓		IMPRATICÁVEL ☔
TARDE	✓		
QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
1	ENCARREGADO DE OBRAS	3	PEDREIRO
3	AJUDANTE		
QTDE	EQUIPAMENTO		
3	PÁ		
1	CAMINHÃO CARROCERIA		
3	ENXADA		
4	CARRINHO DE MÃO		
1	SERRA DE BANCADA		
TAREFAS REALIZADAS			
NÚMERO DE T.R.	DESCRICAÇÃO	OBSERVAÇÕES	
1	ESPALHAMENTO DE AREIA PARA BERÇO NA PISTA		
2	PAVIMENTAÇÃO EM PEYVER DE CONCRETO		
3	RECEBIMENTO DE AREIA NA OBRA		
REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)			



5 de mar. de 2025 15:22:12
Data não informada



5 de mar. de 2025 15:23:49
Santo Antônio do Grama
Minas Gerais
Data não informada

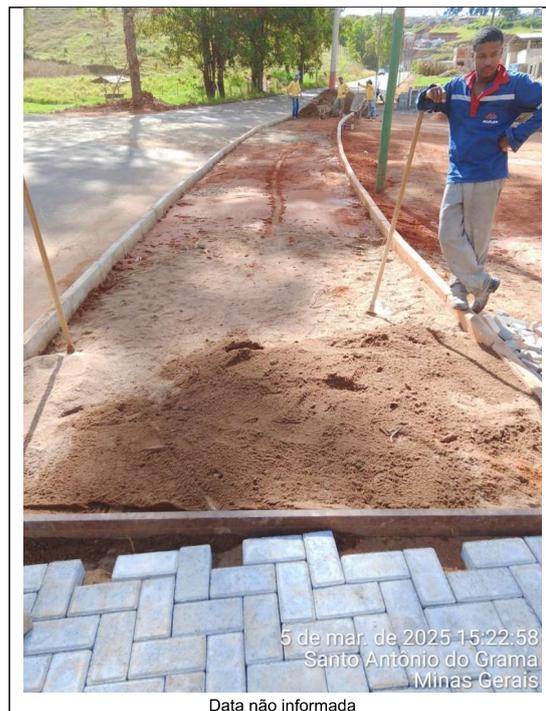

OCORRÊNCIAS		
NÚMERO DE OC	TIPO DE OCORRÊNCIA	DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA
CONFERÊNCIA		
MUNICÍPIO	CONSÓRCIO (Aprovado em 06/03/2025 - 09:35)	
Obs.:	Obs.:	
ASSINATURAS		
_____ YURI ANDRADE COSTA LINS Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 233590/D	_____ PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA CREA 137.103/D	_____ ANTÔNIO CARLOS MARTINS BRANDÃO RT de Execução - PONTAL ENGENHARIA LTDA CREA 45.957/D



Nº 0156	OBRA: CTP 0191/2024 - SANTO ANTONIO DO GRAMA - IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE ACESSIBILIDADE	CONTRATO:	RESP. TÉCNICO: ANTONIO CARLOS MARTINS BRANDÃO
ENDEREÇO: TRECHO DA RODOVIA DE ACESSO A SANTO ANTONIO DO GRAMA, BAIRRO NOVO HORIZONTE.		INÍCIO: 01/07/2024	Nº CREA-MG: 45957/D
CIDDE:		PRAZO: 31/12/2024	Nº DA ART:
DISTRITO: SANTO ANTONIO DO GRAMA		UF:	COORDENADAS:
DATA: 28/02/2025	SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA ☔
MANHÃ	✓		IMPRATICÁVEL ☁
TARDE	✓		
QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
1	ENCARREGADO DE OBRAS	3	PEDREIRO
3	AJUDANTE		
QTDE	EQUIPAMENTO		
2	CAVADEIRA RETA		
3	PÁ		
1	CAMINHÃO CARROCERIA		
1	ROLO COMPACTADOR		
2	CHIBANCA		
3	ENXADA		
4	CARRINHO DE MÃO		
TAREFAS REALIZADAS			
NÚMERO DE T.R.	DESCRICAÇÃO	OBSERVAÇÕES	
1	ESCAVAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE MEIO FIO E SARJETA		
2	TRANSPORTE DE PEYVER PARA PROXIMO DO CANTEIRO		
3	COMPACTAÇÃO DE PISTA COM ROLO		
4	INSTALAÇÃO DE MEIO FIO PREMOLDADO		
5	ACERTO E NIVELAMENTO DE PISTA MANUAL		
6	CONCRETAGEM DE SARGETA		

REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATORIOS)






OCORRÊNCIAS		
NÚMERO DE OC	TIPO DE OCORRÊNCIA	DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA
CONFERÊNCIA		
MUNICÍPIO	CONSÓRCIO (Aprovado em 06/03/2025 - 09:35)	
Obs.:	Obs.:	
ASSINATURAS		
_____ YURI ANDRADE COSTA LINS Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 233590/D	_____ PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA CREA 137.103/D	_____ ANTÔNIO CARLOS MARTINS BRANDÃO RT de Execução - PONTAL ENGENHARIA LTDA CREA 45.957/D



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº 0155	OBRA: CTP 0191/2024 - SANTO ANTONIO DO GRAMA - IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE ACESSIBILIDADE	CONTRATO:	RESP. TÉCNICO: ANTONIO CARLOS MARTINS BRANDÃO
ENDEREÇO: TRECHO DA RODOVIA DE ACESSO A SANTO ANTONIO DO GRAMA, BAIRRO NOVO HORIZONTE.		INÍCIO: 01/07/2024	Nº CREA-MG: 45957/D
CIDDE:		PRAZO: 31/12/2024	Nº DA ART:
DISTRITO: SANTO ANTONIO DO GRAMA		UF:	COORDENADAS:
DATA: 27/02/2025	SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA ☔
MANHÃ	✓		IMPRATICÁVEL ☔
TARDE	✓		
QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
1	ENCARREGADO DE OBRAS	3	PEDREIRO
3	AJUDANTE		
QTDE	EQUIPAMENTO		
2	CAVADEIRA RETA		
3	PÁ		
1	ROLO COMPACTADOR		
2	CHIBANCA		
3	ENXADA		
4	CARRINHO DE MÃO		
TAREFAS REALIZADAS			
NÚMERO DE T.R.	DESCRICAÇÃO	OBSERVAÇÕES	
1	CONCRETAGEM DE SARJETA		
2	COMPACTAÇÃO DE PISTA COM ROLO		
3	ESCAVAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE MEIO FIO E SARGETA		
4	ACERTO E NIVELAMENTO DE PISTA MANUAL		
5	INSTALAÇÃO DE MEIO FIO PREMOLDADO		

REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)

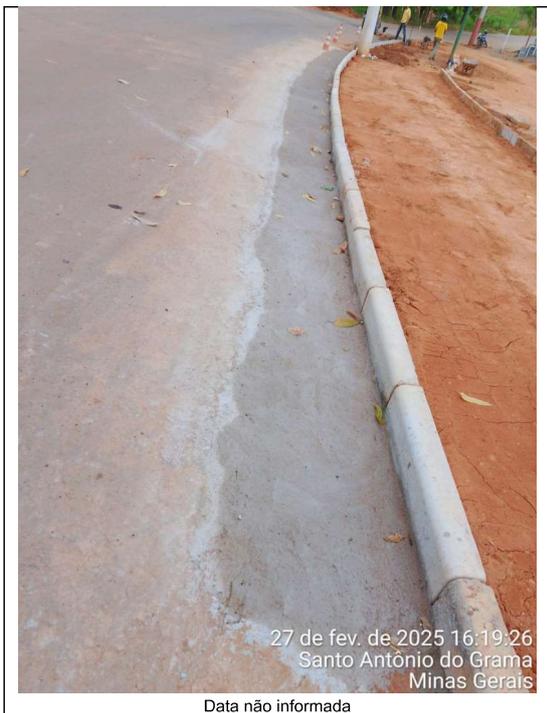



Data não informada




Data não informada

OCORRÊNCIAS		
NÚMERO DE OC	TIPO DE OCORRÊNCIA	DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA
CONFERÊNCIA		
MUNICÍPIO	CONSÓRCIO (Aprovado em 28/02/2025 - 09:58)	
Obs.:	Obs.:	
ASSINATURAS		
<p>_____ YURI ANDRADE COSTA LINS Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 233590/D</p>	<p>_____ PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA CREA 137.103/D</p>	<p>_____ ANTÔNIO CARLOS MARTINS BRANDÃO RT de Execução - PONTAL ENGENHARIA LTDA CREA 45.957/D</p>




Nº 0154	OBRA: CTP 0191/2024 - SANTO ANTONIO DO GRAMA - IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE ACESSIBILIDADE	CONTRATO:	RESP. TÉCNICO: ANTONIO CARLOS MARTINS BRANDÃO
ENDEREÇO: TRECHO DA RODOVIA DE ACESSO A SANTO ANTONIO DO GRAMA, BAIRRO NOVO HORIZONTE.		INÍCIO: 01/07/2024	Nº CREA-MG: 45957/D
CIDDE:		PRAZO: 31/12/2024	Nº DA ART:
DISTRITO: SANTO ANTONIO DO GRAMA		UF:	COORDENADAS:
DATA: 26/02/2025	SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA ☔
MANHÃ	✓		IMPRATICÁVEL ☔
TARDE	✓		
QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
1	ENCARREGADO DE OBRAS	1	MOTORISTA DE CAMINHÃO BÁSCULA
3	PEDREIRO	1	OPERADOR DE CARREGADEIRA
3	AJUDANTE		
QTDE	EQUIPAMENTO		
1	PÁ CARREGADEIRA		
1	COMPACTADOR DE SOLO		
1	ROLO COMPACTADOR		
1	CAMINHÃO BASCULANTE		
TAREFAS REALIZADAS			
NÚMERO DE T.R.	DESCRICAÇÃO	OBSERVAÇÕES	
1	ATERRO COMPACTADO DE VALA		
2	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSP. DE MATERIAL PARA ATERRO		
3	ENCASCALHAMENTO DE PISTA SOBRE ATERRO COMPACTADO		

REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)

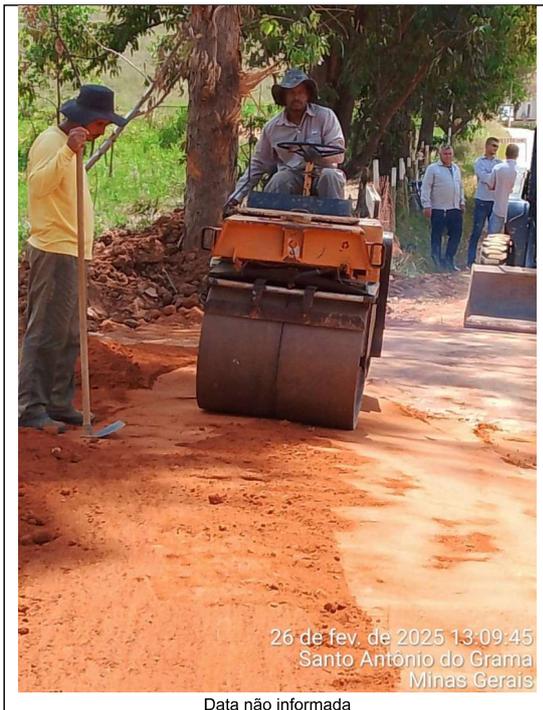



Data não informada

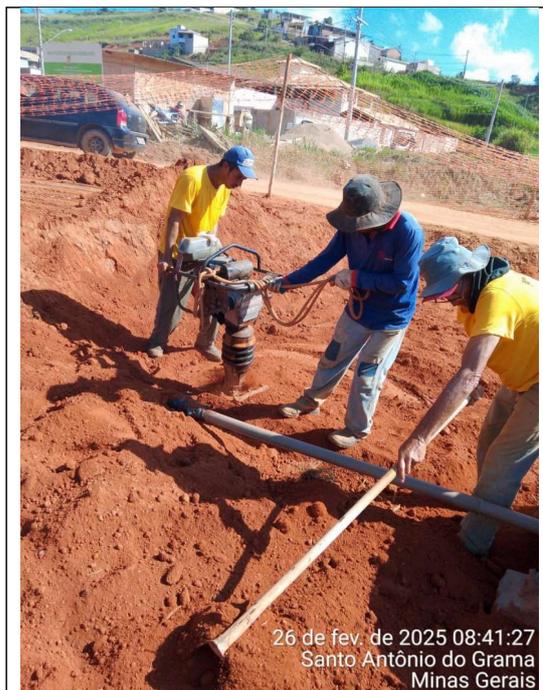

Data não informada



Data não informada



OCORRÊNCIAS		
NÚMERO DE OC	TIPO DE OCORRÊNCIA	DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA
	CONFERÊNCIA	
MUNICÍPIO	CONSÓRCIO (Aprovado em 27/02/2025 - 08:46)	
Obs.:		Obs.:
ASSINATURAS		
<p>YURI ANDRADE COSTA LINS Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 233590/D</p>	<p>PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA CREA 137.103/D</p>	<p>ANTÔNIO CARLOS MARTINS BRANDÃO RT de Execução - PONTAL ENGENHARIA LTDA CREA 45.957/D</p>



Nº 0153	OBRA: CTP 0191/2024 - SANTO ANTONIO DO GRAMA - IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE ACESSIBILIDADE	CONTRATO:	RESP. TÉCNICO: ANTONIO CARLOS MARTINS BRANDÃO
ENDEREÇO: TRECHO DA RODOVIA DE ACESSO A SANTO ANTONIO DO GRAMA, BAIRRO NOVO HORIZONTE.		INÍCIO: 01/07/2024	Nº CREA-MG: 45957/D
CIDDE:		PRAZO: 31/12/2024	Nº DA ART:
DISTRITO: SANTO ANTONIO DO GRAMA		UF:	COORDENADAS:
DATA: 25/02/2025	SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA ☔
MANHÃ	✓		IMPRATICÁVEL ☔
TARDE		✓	
QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
1	ENCARREGADO DE OBRAS	1	MOTORISTA DE CAMINHÃO CAÇAMBA
1	OPERADOR DE ESCAVADEIRA	3	PEDREIRO
3	AJUDANTE		
QTDE	EQUIPAMENTO		
1	ESCAVADEIRA		
1	COMPACTADOR DE SOLO		
3	PÁ		
1	CAMINHÃO BASCULANTE		
3	CARRINHO DE MÃO		
1	BETONEIRA		
TAREFAS REALIZADAS			
NÚMERO DE T.R.	DESCRICAO	OBSERVAÇÕES	
1	ATERRO COMPACTADO DE VALA		
2	EXECUÇÃO DE CONTRABERÇO EM REDE PLUVIAL 1200 MM		
3	CORTE, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL PARA ATERRO		

REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)



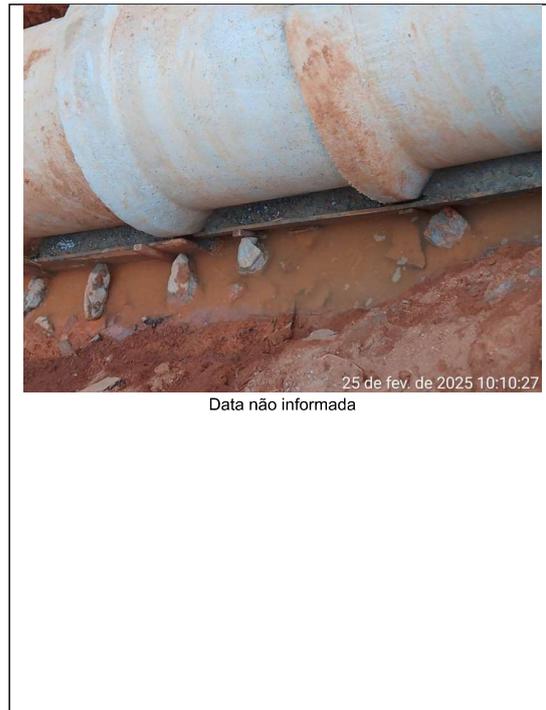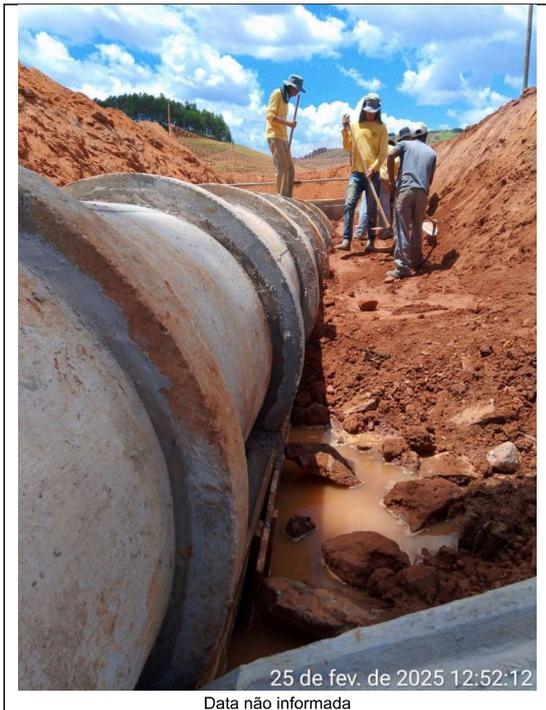


OCORRÊNCIAS	
NÚMERO DE OC	TIPO DE OCORRÊNCIA
CONFERÊNCIA	
MUNICÍPIO	CONSÓRCIO (Aprovado em 26/02/2025 - 08:19)
Obs.:	Obs.:
ASSINATURAS	
<p>_____ YURI ANDRADE COSTA LINS Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 233590/D</p>	<p>_____ PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA CREA 137.103/D</p>
	<p>_____ ANTÔNIO CARLOS MARTINS BRANDÃO RT de Execução - PONTAL ENGENHARIA LTDA CREA 45.957/D</p>



Nº 0152	OBRA: CTP 0191/2024 - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE ACESSIBILIDADE	CONTRATO:	RESP. TÉCNICO: ANTONIO CARLOS MARTINS BRANDÃO
ENDEREÇO: TRECHO DA RODOVIA DE ACESSO A SANTO ANTONIO DO GRAMA, BAIRRO NOVO HORIZONTE.		INÍCIO: 01/07/2024	Nº CREA-MG: 45957/D
CIDDE:		PRAZO: 31/12/2024	Nº DA ART:
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA		UF:	COORDENADAS:
DATA: 24/02/2025	SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA ☔
MANHÃ	✓		IMPRATICÁVEL ☔
TARDE	✓		
QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
1	ENCARREGADO DE OBRAS	3	PEDREIRO
3	AJUDANTE		
QTDE	EQUIPAMENTO		
2	PÁ		
2	ENXADA		
3	CARRINHO DE MÃO		
1	BETONEIRA		
TAREFAS REALIZADAS			
NÚMERO DE T.R.	DESCRICAÇÃO	OBSERVAÇÕES	
1	REBOCO E INSTALAÇÃO DE TAMPA DE CAIXA DE PASSAGEM		
2	REJUNTAMENTO DE REDE PLUVIAL 1200 MM		
3	EXECUÇÃO DE CONTRABERÇO EM REDE PLUVIAL 1200 MM		

REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)

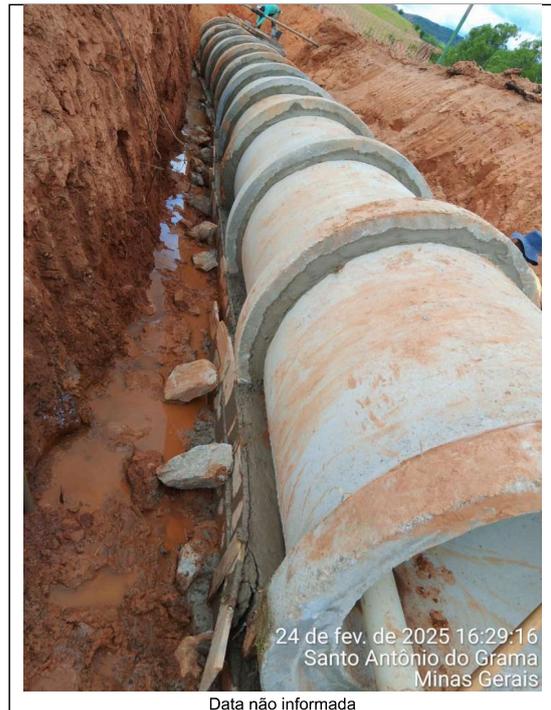



OCORRÊNCIAS		
NÚMERO DE OC	TIPO DE OCORRÊNCIA	DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA
CONFERÊNCIA		
MUNICÍPIO	CONSÓRCIO (Aprovado em 26/02/2025 - 08:19)	
Obs.:	Obs.:	
ASSINATURAS		
_____ YURI ANDRADE COSTA LINS Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 233590/D	_____ PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA CREA 137.103/D	_____ ANTÔNIO CARLOS MARTINS BRANDÃO RT de Execução - PONTAL ENGENHARIA LTDA CREA 45.957/D





Assinaturas do Documento



Documento Assinado Eletronicamente por **YURI ANDRADE COSTA LINS - ENGENHEIRO CIVIL JÚNIOR**, CPF: 084.94*. **6- *2 em **25/03/2025 16:22:45**, Cód. Autenticidade da Assinatura: 1696.2H22.245A.227K.3174, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Documento Assinado Eletronicamente por **ANTONIO CARLOS MARTINS BRANDÃO**, CPF: 385.06*. **6- *4 em **25/03/2025 15:54:32**, Cód. Autenticidade da Assinatura: 1520.0X54.832V.327X.2542, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Informações do Documento

ID do Documento: **EB9.4B2** - Tipo de Documento: **FORMULÁRIO DE MEDIÇÕES.**

Elaborado por **GILBERTO ARAUJO GOMIDES**, CPF: 069.58*. **6- *7 , em **25/03/2025 - 14:30:19**

Código de Autenticidade deste Documento: 1423.3830.5197.471K.4601

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
<https://zeropapel.cimvalpi.mg.gov.br/verdocumento>

