



FORMULÁRIO DE MEDIÇÕES

RELATÓRIO PARCIAL (SITUAÇÃO: APROVADA PELO CONSÓRCIO)

Enviado por Márcio Antônio do Carmo em 20/06/2023 - 10:38

Registro: 20/06/2023			1ª MEDIÇÃO														
Obra: CTP - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA			Período de 01/12/2022 a 14/06/2023														
Local: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA																	
OBSERVAÇÕES																	
Enviada por Márcio Antônio do Carmo (FORNECEDOR) em 12/04/2023 às 13:24																	
							QUANTIDADE MEDIDA				VALOR MEDIDO						
ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	NESTA MEDIÇÃO	ACUMULADA	VALOR PREVISTO (BDI)	VALOR PREVISTO (ADMC)	NESTA MEDIÇÃO (BDI)	NESTA MEDIÇÃO (ADMC)	ACUMULADA (BDI)	ACUMULADA (ADMC)	SALDO (BDI)	SALDO (ADMC)	
01	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO																
01.01	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA - para obras que exigem a utilização de grande quantidade de equipamentos e são executadas em centros urbanos ou próximos de centros urbanos. Obs.: Não se aplica aos serviços de Tapa Buracos.																
01.01.03	OBRAS DE VALOR ACIMA DE R\$ 3000.001,00 - MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA PAVIMENTAÇÃO, EXCLUSIVE PARA TAPA-BURACOS	%	0.2	R\$ 81.450.179,25	R\$ 166.536.094,60	R\$ 33.307.218,92	0.2	0.2	R\$ 33.307.218,92	R\$ 43.749.032,06	R\$ 1.918,20	R\$ 2.191,01	R\$ 1.918,20	R\$ 2.191,01	R\$ 33.305.300,72	R\$ 43.746.841,05	
02.06	SINALIZAÇÃO/SEGURANÇA																
02.06.01	PLACA DE OBRA EM LONA IMPRESSAO DIGITAL P. SUDECAP	m²	4.5	R\$ 230,67	R\$ 292,84	R\$ 1.317,78	0	0	R\$ 1.317,78	R\$ 1.363,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.317,78	R\$ 1.363,46	
02.06.02	PLACA 0,50 m x 0,50 m DUPLA FACE CHAPA GALVANIZADA 22 EM CAVALETE	un/mês	120	R\$ 17,95	R\$ 22,79	R\$ 2.734,80	4	4	R\$ 2.734,80	R\$ 2.829,60	R\$ 91,16	R\$ 94,32	R\$ 91,16	R\$ 94,32	R\$ 2.643,64	R\$ 2.735,28	
02.06.04	CONE MASTER 75 cm BASE DE BORRACHA CORPO POLIETILENO	un	120	R\$ 39,48	R\$ 50,12	R\$ 6.014,40	10	10	R\$ 6.014,40	R\$ 6.223,20	R\$ 501,20	R\$ 518,60	R\$ 501,20	R\$ 518,60	R\$ 5.513,20	R\$ 5.704,80	
02.06.06	SINALIZADOR ELET.MONOLIGHT LED 60 A 70 FLASHES/MIN	un	150	R\$ 90,80	R\$ 115,27	R\$ 17.290,50	0	0	R\$ 17.290,50	R\$ 17.890,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.290,50	R\$ 17.890,50	
02.07	TAPUME / ISOLAMENTOS																
02.07.03	CERCA DE 5 FIOS DE ARAME FARPA DO E MOURÕES DE EUCALIPTO	M	284	R\$ 32,13	R\$ 40,78	R\$ 11.581,52	0	0	R\$ 11.581,52	R\$ 11.984,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.581,52	R\$ 11.984,80	
04	TRABALHOS EM TERRA																
04.01	ESCAVAÇÃO MECANICA INCLUSIVE TRANSPORTE ATE 50 m																
04.01.02	DESMATAMENTO,DESTOC.E LIMPEZA,INCL.TRANSP. ATE 50M	m²	20494.02	R\$ 0,54	R\$ 0,69	R\$ 14.140,87	16396	16396	R\$ 14.140,87	R\$ 14.550,75	R\$ 11.313,24	R\$ 11.641,16	R\$ 11.313,24	R\$ 11.641,16	R\$ 2.827,63	R\$ 2.909,59	
04.01.03	CORTE DE ÁRVORE NATIVA COM MOTO-SERRA 0,15M =< Ø < 0,30M - ATÉ 1.000 UNIDADES	UN	300	R\$ 25,37	R\$ 32,21	R\$ 9.663,00	0	0	R\$ 9.663,00	R\$ 9.999,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.663,00	R\$ 9.999,00	
04.03	ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA																
04.03.01	EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	m³	27084.94	R\$ 5,86	R\$ 7,44	R\$ 201.511,95	13500	13500	R\$ 201.511,95	R\$ 208.554,04	R\$ 100.440,00	R\$ 103.950,00	R\$ 100.440,00	R\$ 103.950,00	R\$ 101.071,95	R\$ 104.604,04	
04.03.02	EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA	m³	722.79	R\$ 7,78	R\$ 9,88	R\$ 7.141,17	300	300	R\$ 7.141,17	R\$ 7.386,91	R\$ 2.964,00	R\$ 3.066,00	R\$ 2.964,00	R\$ 3.066,00	R\$ 4.177,17	R\$ 4.320,91	
04.05	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA																
04.05.01	DMT <= 1 KM	m³	26023.96	R\$ 3,08	R\$ 3,91	R\$ 101.753,68	16500	16500	R\$ 101.753,68	R\$ 105.397,04	R\$ 64.515,00	R\$ 66.825,00	R\$ 64.515,00	R\$ 66.825,00	R\$ 37.238,68	R\$ 38.572,04	
04.05.02	1 KM < DMT <= 2 KM	m³	1060.92	R\$ 5,96	R\$ 7,56	R\$ 8.020,56	850	850	R\$ 8.020,56	R\$ 8.307,00	R\$ 6.426,00	R\$ 6.655,50	R\$ 6.426,00	R\$ 6.655,50	R\$ 1.594,56	R\$ 1.651,50	
04.06	ATERRO E REATERRO COMPACTADO																
04.06.01	COM ROLO VIBRATORIO	m³	23173.07	R\$ 4,25	R\$ 5,39	R\$ 124.902,85	8500	8500	R\$ 124.902,85	R\$ 129.305,73	R\$ 45.815,00	R\$ 47.430,00	R\$ 45.815,00	R\$ 47.430,00	R\$ 79.087,85	R\$ 81.875,73	
04.06.02	COM PLACA VIBRATORIA	m³	449.63	R\$ 16,27	R\$ 20,66	R\$ 9.289,36	350	350	R\$ 9.289,36	R\$ 9.613,09	R\$ 7.231,00	R\$ 7.483,00	R\$ 7.231,00	R\$ 7.483,00	R\$ 2.058,36	R\$ 2.130,09	
04.06.06	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-	M³	2616.33	R\$ 0,23	R\$ 0,29	R\$ 758,74	2616,33	2616,33	R\$ 758,74	R\$ 784,90	R\$ 758,74	R\$ 784,90	R\$ 758,74	R\$ 784,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	

Este documento foi assinado eletronicamente por LUIZ FERNANDO DA SILVA BORGES e Luciano Xavier de Castro. Para verificar as assinaturas vá ao site https://as.inatural.com.br:443 e lixe o código A33-3-AE02-3D5A-C40F.

	FORA															
04.08	ESCAVAÇÃO MECANICA DE VALAS COM DESCARGA LATERAL															
04.08.02	1,5 M < H <= 3,0 M	m³	1629.85	R\$ 5,10	R\$ 6,48	R\$ 10.561,43	1200	1200	R\$ 10.561,43	R\$ 10.920,00	R\$ 7.776,00	R\$ 8.040,00	R\$ 7.776,00	R\$ 8.040,00	R\$ 2.785,43	R\$ 2.880,00
05	DRENAGEM URBANA															
05.07	CANALETA PADRÃO SUDECAP															
05.07.03	TIPO 2 - D= 600 MM, PREMOLDADA DE CONCRETO															
05.08	BUEIRO TUBULAR															
05.08.02	BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO, CLASSE CA-1. BSTC Ø 0,80 M - CORPO (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E BERÇO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E COMPACTAÇÃO	m	223.5	R\$ 665,20	R\$ 844,47	R\$ 188.739,05	203.5	203.5	R\$ 188.739,05	R\$ 195.280,89	R\$ 171.849,65	R\$ 177.806,09	R\$ 171.849,65	R\$ 177.806,09	R\$ 16.889,40	R\$ 17.474,80
05.08.03*	BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO, CLASSE CA-1. BSTC Ø1,00 M - CORPO (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E BERÇO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E COMPACTAÇÃO)	M	15.49	R\$ 883,24	R\$ 1.121,27	R\$ 17.368,47	15,49	15,49	R\$ 17,368,47	R\$ 17.970,41	R\$ 17,368,47	R\$ 17,970,41	R\$ 17,368,47	R\$ 17,970,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05.08.04*	BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO, CLASSE CA-1. BSTC Ø1,20 M - CORPO (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E BERÇO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E COMPACTAÇÃO)	M	85.52	R\$ 1.225,09	R\$ 1.195,06	R\$ 102.201,53	85.52	85.52	R\$ 102.201,53	R\$ 137.838,57	R\$ 102.201,53	R\$ 137.838,57	R\$ 102.201,53	R\$ 137.838,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05.08.05*	BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO, CLASSE CA-1. BSTC Ø1,50 M - CORPO (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E BERÇO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E COMPACTAÇÃO)	M	84.75	R\$ 1.796,35	R\$ 1.195,06	R\$ 101.281,34	78.75	78.75	R\$ 101.281,34	R\$ 199.967,63	R\$ 94.110,98	R\$ 185.810,63	R\$ 94.110,98	R\$ 185.810,63	R\$ 7.170,36	R\$ 14.167,00
05.08.06	BUEIRO DUPLO TUBULAR DE CONCRETO, CLASSE CA-1. BDTC Ø 1,50M - CORPO (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E BERÇO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E COMPACTAÇÃO)	M³	19.04	R\$ 3.502,64	R\$ 4.446,60	R\$ 84.663,26	19.04	19.04	R\$ 84.663,26	R\$ 87.730,99	R\$ 84.663,26	R\$ 87.730,99	R\$ 84.663,26	R\$ 87.730,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05.08.08	BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO, BSTC Ø 0,80 M - BOCA/EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E COMPACTAÇÃO)	UN	19	R\$ 1.601,88	R\$ 2.033,59	R\$ 38.638,21	0	0	R\$ 38.638,21	R\$ 39.977,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 38.638,21	R\$ 39.977,33
05.08.09	BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO, BSTC Ø 1,00 M - BOCA/EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E COMPACTAÇÃO)	UN	2	R\$ 2.489,31	R\$ 2.033,59	R\$ 4.067,18	0	0	R\$ 4.067,18	R\$ 6.539,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.067,18	R\$ 6.539,42
05.08.10	BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO, BSTC Ø 1,20 M - BOCA/EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E COMPACTAÇÃO)	UN	10	R\$ 3.649,68	R\$ 2.033,59	R\$ 20.335,90	0	0	R\$ 20.335,90	R\$ 47.938,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.335,90	R\$ 47.938,60
05.08.12	BUEIRO DUPLO TUBULAR DE CONCRETO, BDTC Ø 1,50 M - BOCA/EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E COMPACTAÇÃO)	UN	2	R\$ 9.240,22	R\$ 20.335,90	R\$ 40.671,80	2	2	R\$ 40.671,80	R\$ 24.274,06	R\$ 40.671,80	R\$ 24.274,06	R\$ 40.671,80	R\$ 24.274,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05.09	BUEIRO CELULAR DE CONCRETO (ADUELAS)															
05.09.03	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE >= 50,10 KM	t x km	23673	R\$ 0,72	R\$ 0,91	R\$ 21.542,43	20122.05	20122.05	R\$ 21.542,43	R\$ 22.489,35	R\$ 18.311,07	R\$ 19.115,95	R\$ 18.311,07	R\$ 19.115,95	R\$ 3.231,36	R\$ 3.373,40
05.10	CAIXA DE CAPTAÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL															
05.11.01	JOGADA	m³	97.29	R\$ 127,87	R\$ 162,33	R\$ 15.793,09	97.29	97.29	R\$ 15.793,09	R\$ 16.340,83	R\$ 15.793,09	R\$ 16.340,83	R\$ 15.793,09	R\$ 16.340,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09.06	SERVIÇOS COMPLEMENTARES - CERCAMENTO															
09.06.01	CERCA DE ARAME FARPA DO, TIPOOC.CA-01(COM 4 FIOS E MOURÃO DE MADEIRA COM ESPAÇAMENTO DE 2,5METROS) ((EXECUÇÃO,INCLUINDO ESCAVAÇÃO,	M	9365	R\$ 14,48	R\$ 18,39	R\$ 172.222,35	1004	1004	R\$ 172.222,35	R\$ 178.122,30	R\$ 18.463,56	R\$ 19.096,08	R\$ 18.463,56	R\$ 19.096,08	R\$ 153.758,79	R\$ 159.026,22

Este documento foi assinado eletronicamente por LUIZ ENRIQUE DA SILVA TORRES e Luciano Xavier de Castro. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certsign.com.br:443 e utilize o código A3D3-AE02-3D51-FC40F

	FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)															
09.06.02	REMOÇÃO DE CERCAS	M	7820	R\$ 7,34	R\$ 9,32	R\$ 72.882,40	141	141	R\$ 72.882,40	R\$ 75.463,00	R\$ 1.314,12	R\$ 1.360,65	R\$ 1.314,12	R\$ 1.360,65	R\$ 71.568,28	R\$ 74.102,35
14	SERVICOS TÉCNICOS															
14.01	TOPOGRAFIA															
15	ADMINISTRAÇÃO LOCAL															
15.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - % BASEADA ACÓRDÃO 2.622/2013 DO TCU SOBRE SOMA DOS ITENS 1 a 14	%	6.55	R\$ 132.737.097,60	R\$ 168.509.745,40	R\$ 1.103.738.832,37	6.55	6.55	R\$ 1.103.738.832,37	R\$ 1.141.993.663,94	R\$ 62.821,08	R\$ 71.755,72	R\$ 62.821,08	R\$ 71.755,72	R\$ 1.103.676.011,29	R\$ 1.141.921.908,22
					TOTAL:						R\$ 877.318,13	R\$ 1.017.779,46	R\$ 877.318,13	R\$ 1.017.779,46		

Luiz Henrique da Silva Borges
Fiscal de Obras - CIMVALPI
CREA 208579/D
Aprovação: 30/06/2023

APROVADO AUTOMATICAMENTE PELO SISTEMA
PEDRO MARTINO ZEFERINO
Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA
CREA 137.103/D
Aprovação: 26/06/2023

Luciano Xavier de Castro
RT de Execução - CONSÓRCIO 3T -SOLOCAP-CONEP
CREA 59784/D

Este documento foi assinado eletronicamente por LUIZ HENRIQUE DA SILVA BORGES e Luciano Xavier de Castro.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código A3D3-AE02-3D5A-C401.



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº 0007	OBRA: CTP - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	CONTRATO:	RESP. TÉCNICO: LUCIANO XAVIER
ENDEREÇO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA		INÍCIO: 01/04/2023	Nº CREA-MG: 59784/D
CIDDE:		PRAZO: 01/10/2023	Nº DA ART:
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA		UF:	COORDENADAS:
DATA: 14/06/2023	SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA ☔
MANHÃ	✓		IMPRATICÁVEL ☔
TARDE	✓		
QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
1	ENCARREGADO DE OBRAS	2	OPERADOR
4	MOTORISTA	1	PEDREIRO
1	TOPÓGRAFO	3	AJUDANTE
1	SINALEIRO		
QTDE	EQUIPAMENTO		
1	ESCAVADEIRA		
2	VEÍCULO DE APOIO		
1	CAMINHÃO PIPA		
3	CAMINHÃO BASCULANTE		
1	MOTONIVELADORA		
TAREFAS REALIZADAS			
NÚMERO DE T.R.	DESCRIÇÃO	OBSERVAÇÕES	
1	UMECTAÇÃO	ESTRADA DE ACESSO ENTRE SANTO ANTÔNIO DO GRAMA E ABRE CAMPO	
2	SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO TOPOGRÁFICO	ESTRADA DE ACESSO ENTRE SANTO ANTÔNIO DO GRAMA E ABRE CAMPO	
3	ATERRO/COMPACTAÇÃO DA TUBULAÇÃO	ESTRADA DE ACESSO ENTRE SANTO ANTÔNIO DO GRAMA E ABRE CAMPO	
4	REJUNTE DE TUBULAÇÃO	ESTRADA DE ACESSO ENTRE SANTO ANTÔNIO DO GRAMA E ABRE CAMPO	
5	SUPRESSÃO VEGETAL (MECÂNICA)	ESTRADA DE ACESSO ENTRE SANTO ANTÔNIO DO GRAMA E ABRE CAMPO	
6	EXECUÇÃO DE DRENAGEM	ESTRADA DE ACESSO ENTRE SANTO ANTÔNIO DO GRAMA E ABRE CAMPO	
7	SINALIZAÇÃO	ESTRADA DE ACESSO ENTRE SANTO ANTÔNIO DO GRAMA E ABRE CAMPO	

REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)


 Este documento foi assinado eletronicamente por LUIZ HEINRIQUE DA SILVA BORGES e Luciano Xavier de Castro. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.cerisign.com.br/443> e utilize o código A3D3-AE02-3D5A-C40F.



Data não informada




Data não informada

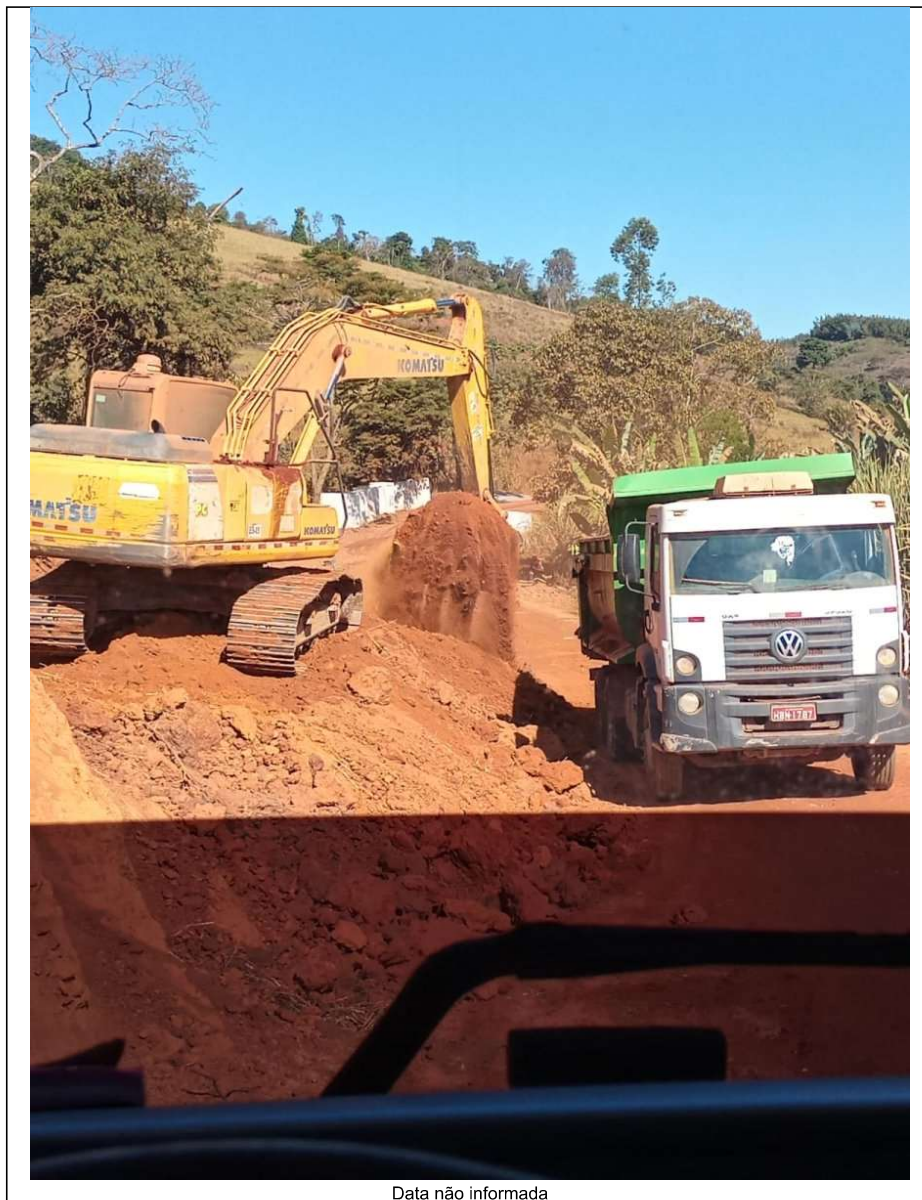

Data não informada



Data não informada

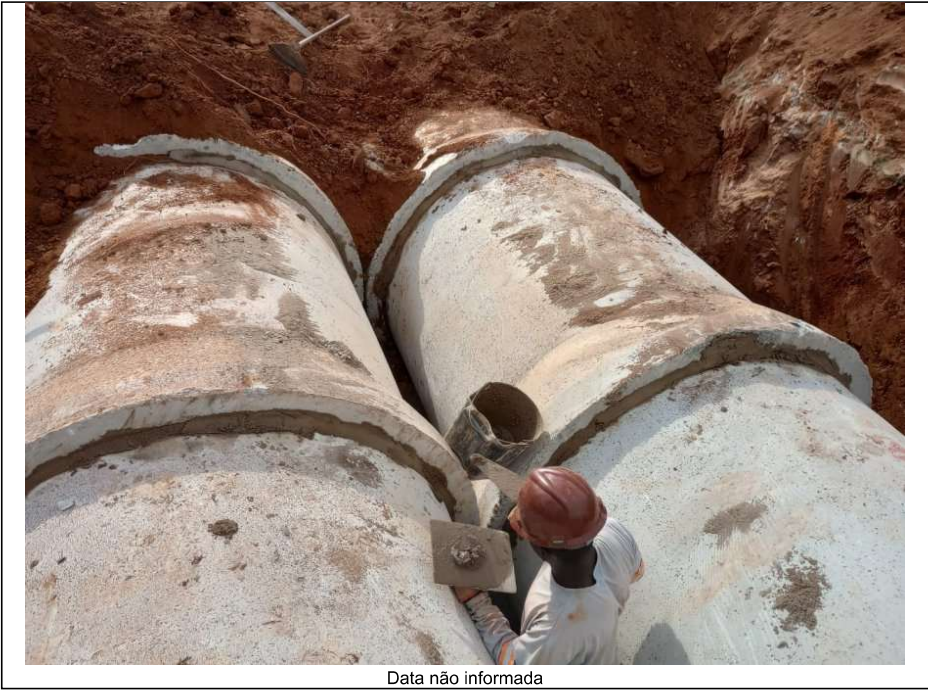

Data não informada



Data não informada

OCORRÊNCIAS		
NÚMERO DE OC	TIPO DE OCORRÊNCIA	DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA
OBSERVAÇÕES		
EQUIPE E05 13/05/2023		
CONFERÊNCIA		
MUNICÍPIO (Aprovado)	CONSÓRCIO (Aprovado em 16/06/2023 - 14:36)	
Obs.:	Obs.: *RDO COM FOTOS SEM DATA. Obs.: *Terraplenagem - Limpeza de vias e transporte. Transporte pedra para construção do bueiro EST.179. *Retirada de solo mole e transporte de pedra para construção do colchão drenante. *Topografia - Locação de Bueiro na Est. 230 , Est. 239 e Est. 257 e Locação e nivelamento nas Est. 230 a Est. 257. *Finalizando ala do bueiro 151. *Cerca - Sendo construída Est. 192 a Est. 198. *Caminhão munck com apoio no transporte das manilhas. *Obs: Deslocamento das Est. 238 ate Est. 261 do eixo para o LD. D. *FALTA SINALIZAÇÃO *FALTA BANHEIRO QUIMICO.	
ASSINATURAS		
Luiz Henrique da Silva Borges Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 208579/D APROVADO AUTOMATICAMENTE PELO SISTEMA PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA CREA 137.103/D Luciano Xavier de Castro RT de Execução - CONSÓRCIO 3T –SOLOCAP-CONEPP CREA 59784/D		

Este documento foi assinado eletronicamente por LUIZ HENRIQUE DA SILVA BORGES e LUCIANO XAVIER DE CASTRO. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://sistemas.waysistemas.com.br/verificacao> e utilize o código A3D3-AE02-3D5A-C40F.



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº 0006	OBRA: CTP - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	CONTRATO:	RESP. TÉCNICO: LUCIANO XAVIER
ENDEREÇO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA		INÍCIO: 01/04/2023	Nº CREA-MG: 59784/D
CIDDE:		PRAZO: 01/10/2023	Nº DA ART:
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA		UF:	COORDENADAS:
DATA: 13/06/2023	SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA ☔
MANHÃ	✓		
TARDE	✓		
QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
1	ENCARREGADO DE OBRAS	2	OPERADOR
4	MOTORISTA	1	PEDREIRO
1	TOPÓGRAFO	3	AJUDANTE
1	SINALEIRO		
QTDE	EQUIPAMENTO		
1	ESCAVADEIRA		
2	VEÍCULO DE APOIO		
1	CAMINHÃO PIPA		
3	CAMINHÃO BASCULANTE		
1	MOTONIVELADORA		
TAREFAS REALIZADAS			
NÚMERO DE T.R.	DESCRIÇÃO	OBSERVAÇÕES	
1	SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO TOPOGRÁFICO	ESTRADA DE ACESSO ENTRE SANTO ANTÔNIO DO GRAMA E ABRE CAMPO	
2	UMECTAÇÃO	ESTRADA DE ACESSO ENTRE SANTO ANTÔNIO DO GRAMA E ABRE CAMPO	
3	REMOÇÃO MECÂNICA DE MATERIAL	ESTRADA DE ACESSO ENTRE SANTO ANTÔNIO DO GRAMA E ABRE CAMPO	
4	APLICAÇÃO DE MATAÇOS	ESTRADA DE ACESSO ENTRE SANTO ANTÔNIO DO GRAMA E ABRE CAMPO	
5	SINALIZAÇÃO	ESTRADA DE ACESSO ENTRE SANTO ANTÔNIO DO GRAMA E ABRE CAMPO	
REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)			

Este documento foi assinado eletronicamente por LUIZ HEINRIQUE DA SILVA BORGES e Luciano Xavier de Castro. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.cerisign.com.br/443> e utilize o código A3D3-AE02-3D5A-C40F.



OCCORRÊNCIAS		
NÚMERO DE OC	TIPO DE OCORRÊNCIA	DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA
OBSERVAÇÕES		
EQUIPE E05 12/05/2023		
CONFERÊNCIA		
MUNICÍPIO (Aprovado)	CONSÓRCIO (Aprovado em 14/06/2023 - 16:51)	
Obs.:	Obs.: *Terraplenagem - Limpeza de vias e transporte. Transporte pedra para construção do bueiro EST.179. *Retirada de solo mole e transporte de pedra para construção do colchão drenante. *Topografia - Locação de Bueiro na Est. 230 , Est. 239 e Est. 257 e Locação e nivelamento nas Est. 230 a Est. 257. *Finalizando ala do bueiro 151. *Cerca - Sendo construída Est. 192 a Est. 198. *Caminhão munck com apoio no transporte das manilhas. *Obs: Deslocamento das Est. 238 até Est. 261 do eixo para o LD. D. *FALTA SINALIZAÇÃO *FALTA BANHEIRO QUIMICO.	
ASSINATURAS		
Luiz Henrique da Silva Borges Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 208579/D APROVADO AUTOMATICAMENTE PELO SISTEMA PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA CREA 137.103/D Luciano Xavier de Castro RT de Execução - CONSÓRCIO 3T –SOLOCAP-CONEPP CREA 59784/D		

Este documento foi assinado eletronicamente por LUIZ HENRIQUE DA SILVA BORGES e Luciano Xavier de Castro. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://sistemas.waysistemas.com.br/443> e utilize o código A3D3-AE02-3D5A-C40F.



CIMVALPI
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL
MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº 0005	OBRA: CTP - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	CONTRATO:	RESP. TÉCNICO: LUCIANO XAVIER
ENDEREÇO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA	INÍCIO: 01/04/2023	Nº CREA-MG: 59784/D	
CIDDE:	PRAZO: 01/10/2023	Nº DA ART:	
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA	UF:	COORDENADAS:	
DATA: 12/06/2023	SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA ☔
MANHÃ	✓		IMPRATICÁVEL ☔
TARDE	✓		
QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
1	ENCARREGADO DE OBRAS	2	OPERADOR
4	MOTORISTA	1	PEDREIRO
1	TOPÓGRAFO	3	AJUDANTE
1	SINALEIRO		
QTDE	EQUIPAMENTO		
1	ESCAVADEIRA		
2	VEÍCULO DE APOIO		
1	CAMINHÃO PIPA		
3	CAMINHÃO BASCULANTE		
1	MOTONIVELADORA		
TAREFAS REALIZADAS			
NÚMERO DE T.R.	DESCRIÇÃO	OBSERVAÇÕES	
1	EXECUÇÃO DE ATERRO	ESTRADA DE ACESSO ENTRE SANTO ANTÔNIO DO GRAMA E ABRE CAMPO	
2	SINALIZAÇÃO	ESTRADA DE ACESSO ENTRE SANTO ANTÔNIO DO GRAMA E ABRE CAMPO	
3	UMECTAÇÃO	ESTRADA DE ACESSO ENTRE SANTO ANTÔNIO DO GRAMA E ABRE CAMPO	
4	EXECUÇÃO DE CORTE	ESTRADA DE ACESSO ENTRE SANTO ANTÔNIO DO GRAMA E ABRE CAMPO	
5	SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO TOPOGRÁFICO	ESTRADA DE ACESSO ENTRE SANTO ANTÔNIO DO GRAMA E ABRE CAMPO	
REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)			

Este documento foi assinado eletronicamente por LUIZ HENRIQUE DA SILVA BORGES e Luciano Xavier de Castro. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.ceris.gn.com.br/443> e utilize o código A3D3-AE02-3D5A-C40F.





NÚMERO DE OC		TIPO DE OCORRÊNCIA	OCORRÊNCIAS	DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA
EQUIPE E05 09/05/2023			OBSERVAÇÕES	
MUNICÍPIO (Aprovado)			CONFERÊNCIA	
Obs.:			CONSÓRCIO (Aprovado)	
			Obs.: *CONFORME EXECUTADO EM CAMPO. *FALTA SINALIZAÇÃO NA OBRA. *FALTA BANHEIRO QUIMICO.	
			ASSINATURAS	
Luiz Henrique da Silva Borges Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 208579/D		APROVADO AUTOMATICAMENTE PELO SISTEMA PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA CREA 137.103/D		Luciano Xavier de Castro RT de Execução - CONSÓRCIO 3T –SOLOCAP-CONEP CREA 59784/D

Este documento foi assinado eletronicamente por LUIZ HENRIQUE DA SILVA BORGES e Luciano Xavier de Castro.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.gestis.gn.com.br:443> e utilize o código A3D3-AE02-3D5A-C40F.



CIMVALPI
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL
MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº 0004	OBRA: CTP - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	CONTRATO:	RESP. TÉCNICO: LUCIANO XAVIER
ENDEREÇO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA	INÍCIO: 01/04/2023	Nº CREA-MG: 59784/D	
CIDDE:	PRAZO: 01/10/2023	Nº DA ART:	
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA	UF:	COORDENADAS:	
DATA: 10/06/2023	SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA ☔
MANHÃ	✓		IMPRATICÁVEL ☔
TARDE	✓		
QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
2	OPERADOR	4	MOTORISTA
1	PEDREIRO	1	ENCARREGADO DE TERRAPLANAGEM
1	TOPÓGRAFO	3	AJUDANTE
1	SINALEIRO		
QTDE	EQUIPAMENTO		
1	ESCAVADEIRA		
2	VEÍCULO DE APOIO		
1	CAMINHÃO PIPA		
3	CAMINHÃO BASCULANTE		
1	MOTONIVELADORA		
TAREFAS REALIZADAS			
NÚMERO DE T.R.	DESCRIÇÃO	OBSERVAÇÕES	
1	SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO TOPOGRÁFICO	ESTRADA DE ACESSO ENTRE SANTO ANTÔNIO DO GRAMA E ABRE CAMPO	
2	EXECUÇÃO DE ATERRO	ESTRADA DE ACESSO ENTRE SANTO ANTÔNIO DO GRAMA E ABRE CAMPO	
3	APLICAÇÃO DE MATACO	ESTRADA DE ACESSO ENTRE SANTO ANTÔNIO DO GRAMA E ABRE CAMPO	
4	EXECUÇÃO DE CORTE	ESTRADA DE ACESSO ENTRE SANTO ANTÔNIO DO GRAMA E ABRE CAMPO	
5	UMECTAÇÃO	ESTRADA DE ACESSO ENTRE SANTO ANTÔNIO DO GRAMA E ABRE CAMPO	
6	SINALIZAÇÃO	ESTRADA DE ACESSO ENTRE SANTO ANTÔNIO DO GRAMA E ABRE CAMPO	
REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)			

Este documento foi assinado eletronicamente por LUIZ HENRIQUE DA SILVA BORGES e Luciano Xavier de Castro. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.ceris.gn.com.br/443 e utilize o código A3D3-AE02-3D5A-C40F.





Data não informada



Data não informada

NÚMERO DE OC		TIPO DE OCORRÊNCIA	OCORRÊNCIAS	DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA
EQUIPE E05 08/05/2023			OBSERVAÇÕES	
MUNICÍPIO (Aprovado)			CONFERÊNCIA	
Obs.:			CONSÓRCIO (Aprovado)	
			Obs.: *CONFORME EXECUTADO EM CAMPO. *FALTA SINALIZAÇÃO NA OBRA. *FALTA BANHEIRO QUIMICO.	
			ASSINATURAS	
Luiz Henrique da Silva Borges Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 208579/D		APROVADO AUTOMATICAMENTE PELO SISTEMA PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA CREA 137.103/D		Luciano Xavier de Castro RT de Execução - CONSÓRCIO 3T -SOLOCAP-CONEP CREA 59784/D

Este documento foi assinado eletronicamente por LUIZ HENRIQUE DA SILVA BORGES e Luciano Xavier de Castro. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.gestipn.com.br:443> e utilize o código A3D3-AE02-3D5A-C40F.



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº 0003	OBRA: CTP - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	CONTRATO:	RESP. TÉCNICO: LUCIANO XAVIER
ENDEREÇO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA		INÍCIO: 01/04/2023	Nº CREA-MG: 59784/D
CIDDE:		PRAZO: 01/10/2023	Nº DA ART:
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA		UF:	COORDENADAS:
DATA: 10/06/2023	SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA ☔
MANHÃ	✓		
TARDE	✓		
QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
2	OPERADOR	4	MOTORISTA
1	PEDREIRO	1	ENCARREGADO DE TERRAPLANAGEM
1	TOPÓGRAFO	3	AJUDANTE
1	SINALEIRO		
QTDE	EQUIPAMENTO		
1	ESCAVADEIRA		
2	VEÍCULO DE APOIO		
1	CAMINHÃO PIPA		
3	CAMINHÃO BASCULANTE		
1	MOTONIVELADORA		
TAREFAS REALIZADAS			
NÚMERO DE T.R.	DESCRIÇÃO	OBSERVAÇÕES	
1	SINALIZAÇÃO	ESTRADA DE ACESSO ENTRE SANTO ANTÔNIO DO GRAMA E ABRE CAMPO	
2	PREPARAÇÃO DE COLCHÃO DRENANTE	ESTRADA DE ACESSO ENTRE SANTO ANTÔNIO DO GRAMA E ABRE CAMPO	
3	APLICAÇÃO DE MATACO	ESTRADA DE ACESSO ENTRE SANTO ANTÔNIO DO GRAMA E ABRE CAMPO	
4	EXECUÇÃO DE DRENAGEM	ESTRADA DE ACESSO ENTRE SANTO ANTÔNIO DO GRAMA E ABRE CAMPO	
5	SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO TOPOGRÁFICO	ESTRADA DE ACESSO ENTRE SANTO ANTÔNIO DO GRAMA E ABRE CAMPO	
6	UMECTAÇÃO		
REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)			

Este documento foi assinado eletronicamente por LUIZ HEINRIQUE DA SILVA BORGES e Luciano Xavier de Castro. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.cerisign.com.br/443> e utilize o código A3D3-AE02-3D5A-C40F.



Data não informada



Data não informada



Data não informada

OCORRÊNCIAS		
NÚMERO DE OC	TIPO DE OCORRÊNCIA	DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA
OBSERVAÇÕES		
EQUIPE E05 07/05/2023		
CONFERÊNCIA		
MUNICÍPIO (Aprovado)	CONSÓRCIO (Aprovado)	
Obs.:	Obs.: *TOPOGRAFIA - LOCAÇÃO DE BUEIRO EST. 196 E 199+10 E LOCAÇÃO DE EIXOS EST. 216 A EST. 245. *CERCA - CONCLUÍDA CERCA NAS EST. LD 201 ATÉ EST. 209. *DRENAGEM - EXECUÇÃO DE BUEIRO NAS EST. 196 E 199+10. *EXECUÇÃO DE ALA L.EQ BUEIRO EST. 151+10. INÍCIO DE ALA L.D. BUEIRO 151+10. *TERRAPLENAGEM INÍCIO SO ATERRO NAS EST. 190 ATÉ EST. 198 (ÁREA DE ESCALONAMENTO L. ESQ.), REMOÇÃO DO SOLO MOLE E TRANSPORTE NAS EST. 268 A 275. *OBS: DMT DISTÂNCIA MATERIAL INDO PARA EST. 13 E BOTA FORA DA FAZ. *FALTA SINALIZAÇÃO NA OBRA.	
ASSINATURAS		
Luiz Henrique da Silva Borges Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 208579/D	APROVADO AUTOMATICAMENTE PELO SISTEMA PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA CREA 137.103/D	Luciano Xavier de Castro RT de Execução - CONSÓRCIO 3T -SOLOCAP-CONEP CREA 59784/D

Este documento foi assinado eletronicamente por LUIZ HENRIQUE DA SILVA BORGES e Luciano Xavier de Castro
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certsign.com.br:443> e utilize o código A3D3-AE02-3D5A-040F



CIMVALPI
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL
MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº 0002	OBRA: CTP - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	CONTRATO:	RESP. TÉCNICO: LUCIANO XAVIER
ENDEREÇO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA	INÍCIO: 01/04/2023	Nº CREA-MG: 59784/D	
CIDDE:	PRAZO: 01/10/2023	Nº DA ART:	
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA	UF:	COORDENADAS:	
DATA: 07/06/2023	SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA ☔
MANHÃ	✓		IMPRATICÁVEL ☔
TARDE	✓		
QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
1	ENCARREGADO DE OBRAS	2	OPERADOR
4	MOTORISTA	1	PEDREIRO
1	TOPÓGRAFO	3	AJUDANTE
1	SINALEIRO		
QTDE	EQUIPAMENTO		
1	ESCAVADEIRA		
1	VEÍCULO DE APOIO		
1	CAMINHÃO PIPA		
3	CAMINHÃO BASCULANTE		
1	MOTONIVELADORA		
TAREFAS REALIZADAS			
NÚMERO DE T.R.	DESCRIÇÃO	OBSERVAÇÕES	
1	EXECUÇÃO DE DRENAGEM	ESTRADA DE ACESSO ENTRE SANTO ANTÔNIO DO GRAMA E ABRE CAMPO	
2	EXECUÇÃO DE BUEIRO	ESTRADA DE ACESSO ENTRE SANTO ANTÔNIO DO GRAMA E ABRE CAMPO	
3	EXECUÇÃO DE ALA	ESTRADA DE ACESSO ENTRE SANTO ANTÔNIO DO GRAMA E ABRE CAMPO	
4	SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO TOPOGRÁFICO	ESTRADA DE ACESSO ENTRE SANTO ANTÔNIO DO GRAMA E ABRE CAMPO	
5	SINALIZAÇÃO	ESTRADA DE ACESSO ENTRE SANTO ANTÔNIO DO GRAMA E ABRE CAMPO	
6	UMECTAÇÃO	ESTRADA DE ACESSO ENTRE SANTO ANTÔNIO DO GRAMA E ABRE CAMPO	
REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)			

Este documento foi assinado eletronicamente por LUIZ HENRIQUE DA SILVA BORGES e Luciano Xavier de Castro. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.ceris.gn.com.br/443 e utilize o código A3D3-AE02-3D5A-C40F.



OCORRÊNCIAS		
NÚMERO DE OC	TIPO DE OCORRÊNCIA	DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA
OBSERVAÇÕES		
EQUIPE E05 06/05/2023		
CONFERÊNCIA		
MUNICÍPIO (Aprovado)	CONSÓRCIO (Aprovado)	
Obs.:	Obs.: *DRENAGEM - TERMINO DO BUEIRO EST. 137 E INICIO DO BUEIRO EST. 198 +14. *CERCA - EST. 202 A 209. *TOPOGRAFIA - LOCAÇÃO DE BUEIROS MARCAÇÃO DE ALA E LOCAÇÃO DE EIXO. *CONSTRUÇÃO DE ALA BUEIRO EST. 151+10. *TERRAPLENAGEM - LIMPEZA DE VIAS CORTES E ATERRO NAS EST. DE CORTE 185 A EST. 189. ATERRO NAS EST. 192 A EST. 198. *FALTA SINALIZAÇÃO NA OBRA. *FALTA BANHEIRO QUIMICO.	
ASSINATURAS		
Luiz Henrique da Silva Borges Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 208579/D	APROVADO AUTOMATICAMENTE PELO SISTEMA PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA CREA 137.103/D	Luciano Xavier de Castro RT de Execução - CONSÓRCIO 3T -SOLOCAP-CONEPP CREA 59784/D

Este documento foi assinado eletronicamente por LUIZ HENRIQUE DA SILVA BORGES e Luciano Xavier de Castro. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.cpfis.com.br:443> e utilize o código A3D3-AE02-3D5A-C40F.



CIMVALPI
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL
MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº 0001	OBRA: CTP - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	CONTRATO:	RESP. TÉCNICO: LUCIANO XAVIER
ENDEREÇO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA	INÍCIO: 01/04/2023	Nº CREA-MG: 59784/D	
CIDDE:	PRAZO: 01/10/2023	Nº DA ART:	
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA	UF:	COORDENADAS:	
DATA: 07/06/2023	SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA ☔
MANHÃ	✓		IMPRATICÁVEL ☔
TARDE	✓		
QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
1	ENCARREGADO DE OBRAS	2	OPERADOR
4	MOTORISTA	1	PEDREIRO
1	TOPÓGRAFO	3	AJUDANTE
1	SINALEIRO		
QTDE	EQUIPAMENTO		
1	ESCAVADEIRA		
2	VEÍCULO DE APOIO		
1	CAMINHÃO PIPA		
3	CAMINHÃO BASCULANTE		
1	MOTONIVELADORA		
TAREFAS REALIZADAS			
NÚMERO DE T.R.	DESCRIÇÃO	OBSERVAÇÕES	
1	EXECUÇÃO DE DRENAGEM	ESTRADA DE ACESSO ENTRE SANTO ANTÔNIO DO GRAMA E ABRE CAMPO	
2	EXECUÇÃO DE CAMADA DE REFORÇO	ESTRADA DE ACESSO ENTRE SANTO ANTÔNIO DO GRAMA E ABRE CAMPO	
3	SINALIZAÇÃO	ESTRADA DE ACESSO ENTRE SANTO ANTÔNIO DO GRAMA E ABRE CAMPO	
4	SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO TOPOGRÁFICO	ESTRADA DE ACESSO ENTRE SANTO ANTÔNIO DO GRAMA E ABRE CAMPO	
5	UMECTAÇÃO		
REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)			

Este documento foi assinado eletronicamente por LUIZ HENRIQUE DA SILVA BORGES e Luciano Xavier de Castro. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assintatras.ceris.gn.com.br/443> e utilize o código A3D3-AE02-3D5A-C40F.



OCORRÊNCIAS		
NÚMERO DE OC	TIPO DE OCORRÊNCIA	DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA
OBSERVAÇÕES		
EQUIPE E05 05/05/2023		
CONFERÊNCIA		
MUNICÍPIO (Aprovado)	CONSÓRCIO (Aprovado)	
Obs.:	Obs.: *TOPOGRAFIA - LOCAÇÃO OFFSET E NIVELAMENTO. *DRENAGEM - TERMINO BUEIRO EST. 92 E INICIO DO BUEIRO EST. 137. *TERRAPLENAGEM - LIMPEZA NAS EST. 181 A EST. 199. REBAIXO NAS EST. 189 ATE EST. 193. CORTE NAS EST. 185 ATÉ EST. 190. *CERCA - CONCLUIDA NA EST. 151 A EST. 178. *FALTA DE SINALIZAÇÃO NA OBRA. *FALTA BANHEIRO QUIMICO.	
ASSINATURAS		
Luiz Henrique da Silva Borges Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 208579/D	APROVADO AUTOMATICAMENTE PELO SISTEMA PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA CREA 137.103/D	Luciano Xavier de Castro RT de Execução - CONSÓRCIO 3T -SOLOCAP-CONEP CREA 59784/D

Este documento foi assinado eletronicamente por LUIZ HENRIQUE DA SILVA BORGES e Luciano Xavier de Castro.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certsign.com.br:443> e utilize o código A3D3-AE02-3D5A-C40F.



CIMVALPI
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL
MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO


Nº	OBRA: CTP - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	CONTRATO:	RESP. TÉCNICO: LUCIANO XAVIER
ENDEREÇO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA	INÍCIO: 01/04/2023	Nº CREA-MG: 59784/D	
CIDDE:	PRAZO: 01/10/2023	Nº DA ART:	
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA	UF:	COORDENADAS:	
DATA: 06/06/2023	SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA ☔
MANHÃ	✓		IMPRATICÁVEL ☔
TARDE	✓		
QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
1	ENCARREGADO DE OBRAS	2	OPERADOR
4	MOTORISTA	1	PEDREIRO
1	TOPÓGRAFO	3	AJUDANTE
1	SINALEIRO		
QTDE	EQUIPAMENTO		
1	ESCAVADEIRA		
2	VEÍCULO DE APOIO		
1	CAMINHÃO PIPA		
3	CAMINHÃO BASCULANTE		
1	MOTONIVELADORA		
TAREFAS REALIZADAS			
NÚMERO DE T.R.	DESCRICAO	OBSERVAÇÕES	
1	EXECUÇÃO DE ATERRO	ESTRADA DE ACESSO ENTRE SANTO ANTÔNIO DO GRAMA E ABRE CAMPO	
2	SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO TOPOGRÁFICO	ESTRADA DE ACESSO ENTRE SANTO ANTÔNIO DO GRAMA E ABRE CAMPO	
3	EXECUÇÃO DE CORTE	ESTRADA DE ACESSO ENTRE SANTO ANTÔNIO DO GRAMA E ABRE CAMPO	
4	UMECTAÇÃO	ESTRADA DE ACESSO ENTRE SANTO ANTÔNIO DO GRAMA E ABRE CAMPO	
5	SINALIZAÇÃO	ESTRADA DE ACESSO ENTRE SANTO ANTÔNIO DO GRAMA E ABRE CAMPO	
REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)			

Este documento foi assinado eletronicamente por LUIZ HENRIQUE DA SILVA BORGES e Luciano Xavier de Castro. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certisign.com.br/443> e utilize o código A3D3-AE02-3D5A-C40F.



domingo, 4 de junho de 2023 08:37:49

Data não informada

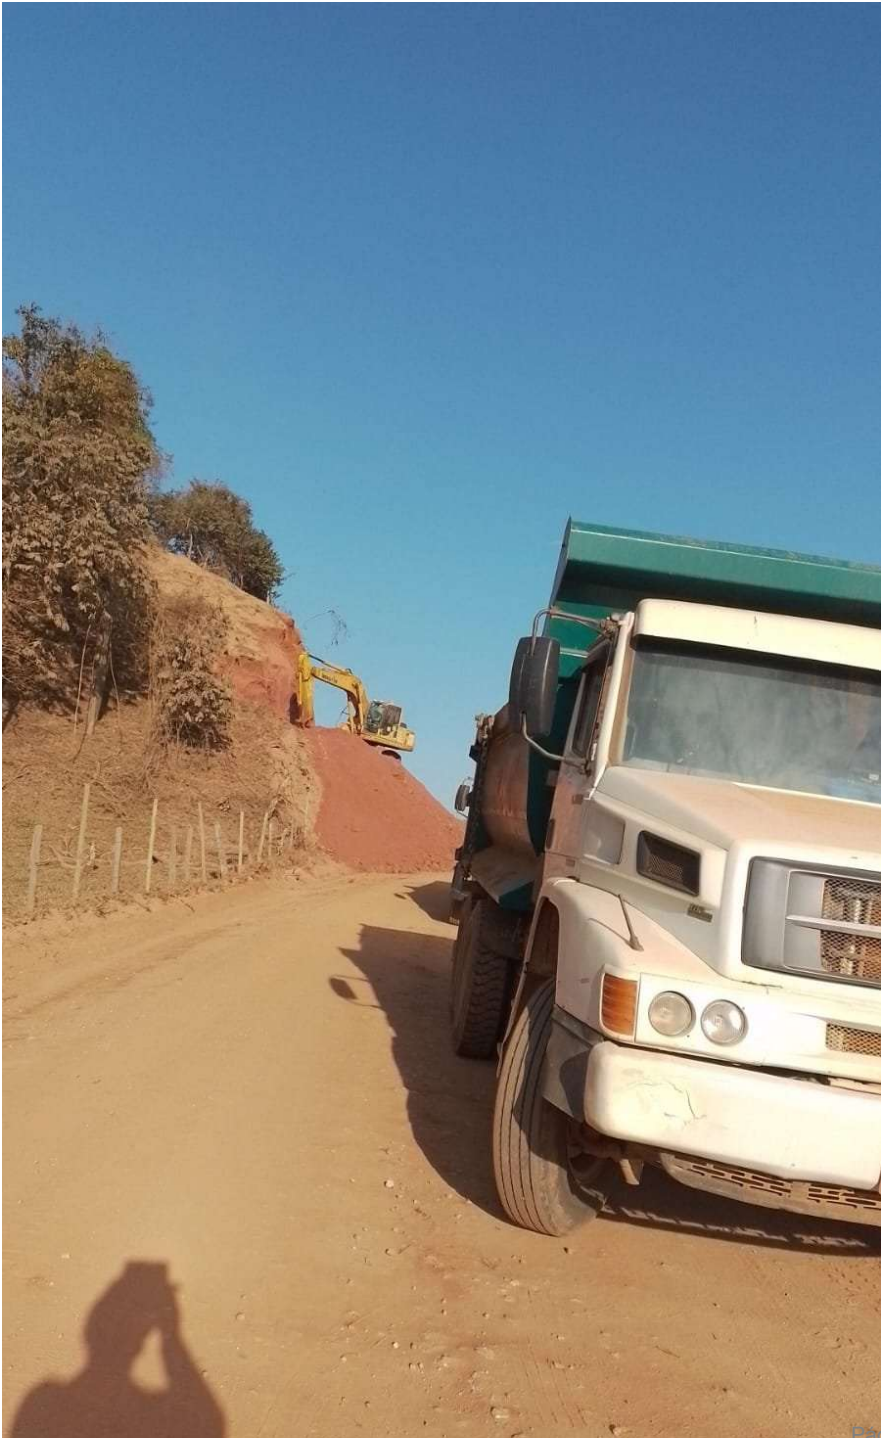

Este documento foi assinado eletronicamente por LUIZ HENRIQUE DA SILVA BORGES e Luciano Xavier de Castro.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certsign.com.br:443> e utilize o código A3D3-AE02-3D5A-C40F.

domingo, 4 de junho de 2023 07:54:43

Data não informada



domingo, 4 de junho de 2023 10:37:11

Data não informada




Este documento foi assinado eletronicamente por LUIZ HENRIQUE DA SILVA BORGES e Luciano Xavier de Castro.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certsign.com.br:443> e utilize o código A3D3-AE02-3D5A-C40F.



--

--

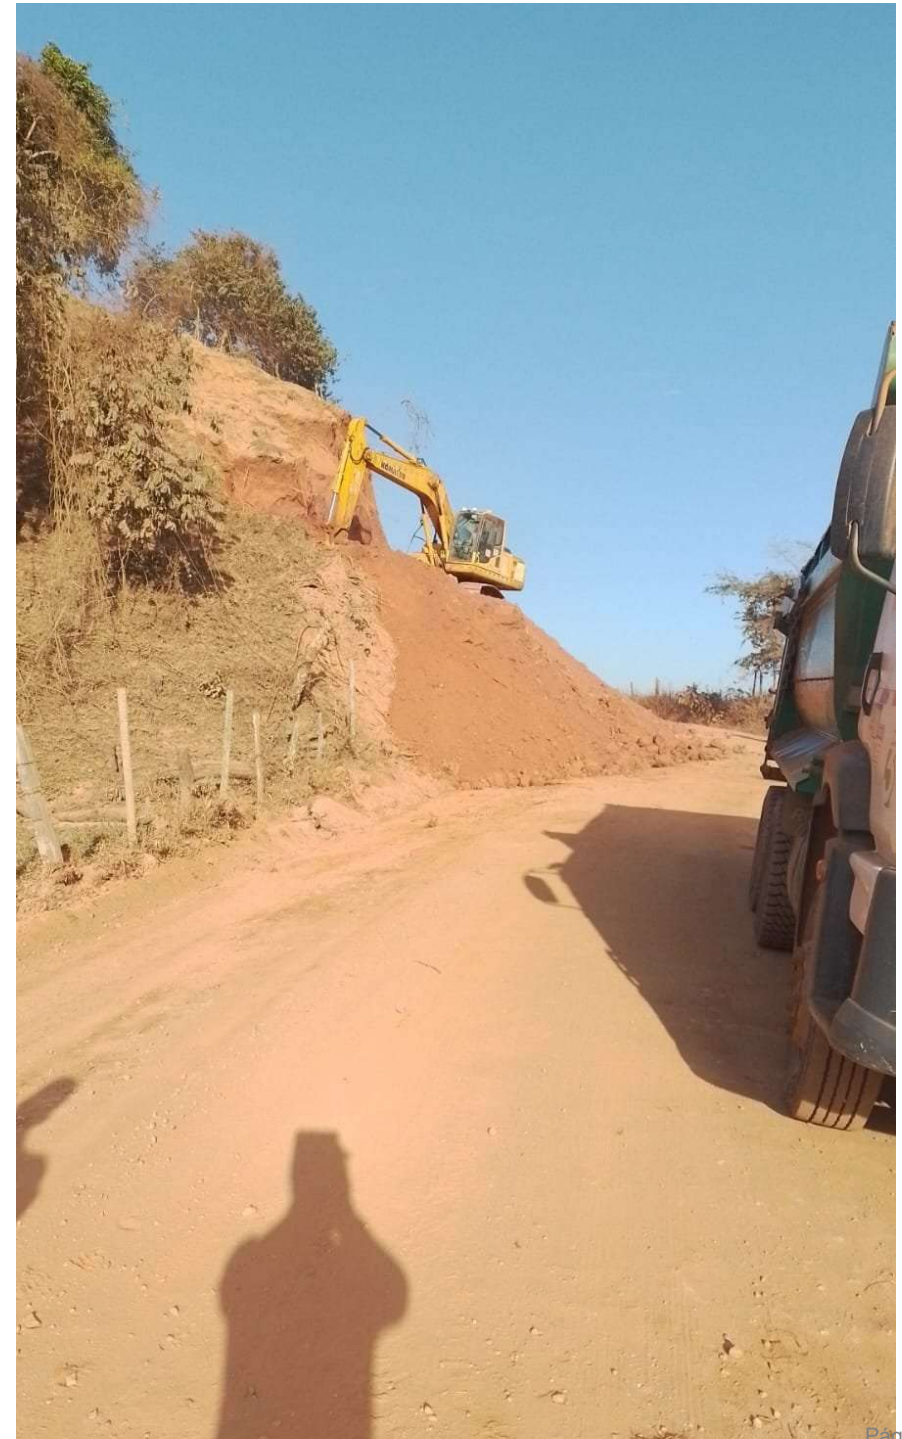

Data não informada		Data não informada	
domingo, 4 de junho de 2023 07:58:18		domingo, 4 de junho de 2023 07:54:23	
NÚMERO DE OC		OCORRÊNCIAS	
TIPO DE OCORRÊNCIA		DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA	
OBSERVAÇÕES			
EQUIPE E05 04/05/2023			
MUNICÍPIO (Aprovado)		CONFERÊNCIA	
CONSÓRCIO (Aprovado)			
Obs.:		Obs.: *CONFORME EXECUTADO EM CAMPO. *FALTA SINALIZAÇÃO NA OBRA. *FALTA DE BANHEIRO QUIMICO.	
ASSINATURAS			
Luiz Henrique da Silva Borges Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 208579/D	APROVADO AUTOMATICAMENTE PELO SISTEMA PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA CREA 137.103/D	Luciano Xavier de Castro RT de Execução - CONSÓRCIO 3T –SOLOCAP-CONEP CREA 59784/D	

Este documento foi assinado eletronicamente por LUIZ HENRIQUE DA SILVA BORGES e Luciano Xavier de Castro.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certsign.com.br:443> e utilize o código A3D3-AE02-3D5A-C40F.



CIMVALPI
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL
MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº	OBRA: CTP - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	CONTRATO:		RESP. TÉCNICO: LUCIANO XAVIER
ENDEREÇO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA		INÍCIO: 01/04/2023		Nº CREA-MG: 59784/D
CIDDE:		PRAZO: 01/10/2023		Nº DA ART:
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA		UF:		COORDENADAS:
DATA: 04/06/2023	SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA ☔	IMPRATICÁVEL ☔
MANHÃ	✓			
TARDE	✓			
QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO		QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
1	ENCARREGADO DE OBRAS		2	OPERADOR
4	MOTORISTA		1	PEDREIRO
1	TOPÓGRAFO		3	AJUDANTE
1	SINALEIRO			
QTDE	EQUIPAMENTO			
1	ESCAVADEIRA			
2	VEÍCULO DE APOIO			
1	CAMINHÃO PIPA			
3	CAMINHÃO BASCULANTE			
1	MOTONIVELADORA			
TAREFAS REALIZADAS				
NÚMERO DE T.R.	DESCRICAO	OBSERVAÇÕES		
1	SINALIZAÇÃO	ESTRADA DE ACESSO ENTRE SANTO ANTÔNIO DO GRAMA E ABRE CAMPO		
2	UMECTAÇÃO	ESTRADA DE ACESSO ENTRE SANTO ANTÔNIO DO GRAMA E ABRE CAMPO		
3	EXECUÇÃO DE GREIDE	ESTRADA DE ACESSO ENTRE SANTO ANTÔNIO DO GRAMA E ABRE CAMPO		
4	EXECUÇÃO DE ATERRO	ESTRADA DE ACESSO ENTRE SANTO ANTÔNIO DO GRAMA E ABRE CAMPO		
5	SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO TOPOGRÁFICO	ESTRADA DE ACESSO ENTRE SANTO ANTÔNIO DO GRAMA E ABRE CAMPO		
6	EXECUÇÃO DE COLCHÃO DRENANTE COM MATAÇO	ESTRADA DE ACESSO ENTRE SANTO ANTÔNIO DO GRAMA E ABRE CAMPO		
REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)				

Este documento foi assinado eletronicamente por LUIZ HENRIQUE DA SILVA BORGES e Luciano Xavier de Castro. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.ceris.gn.com.br/443> e utilize o código A3D3-AE02-3D5A-C40F.



Data não informada



Este documento foi assinado eletronicamente por LUIZ HENRIQUE DA SILVA BORGES e Luciano Xavier de Castro.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certsign.com.br:443> e utilize o código A3D3-AE02-3D5A-C40F.

sábado, 3 de junho de 2023 09:37:31
-20°16'21,587"S -42°34'35,544"W

Data não informada

Este documento foi assinado eletronicamente por LUIZ HENRIQUE DA SILVA BORGES e Luciano Xavier de Castro.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certsign.com.br:443> e utilize o código A3D3-AE02-3D5A-C40F.

--

--



sábado, 3 de junho de 2023 08:56:50
-20°16'21,587"S -42°34'35,544"W

Data não informada

sábado, 3 de junho de 2023 10:52:48

Data não informada

--

--



Data não informada		Data não informada	
sábado, 3 de junho de 2023 09:16:32		sábado, 3 de junho de 2023 09:00:29	
OCORRÊNCIAS			
NÚMERO DE OC	TIPO DE OCORRÊNCIA	DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA	
OBSERVAÇÕES			
EQUIPE E05 03/06/2023			
CONFERÊNCIA			
MUNICÍPIO (Aprovado)	CONSÓRCIO (Aprovado)		
Obs.:	Obs.: *CONFORME EXECUTADO EM CAMPO. *NECESSÁRIO BANHEIRO QUIMICO NA OBRA. *NECESSÁRIO SINALIZAÇÃO DOS BUEIROS EXECUTADOS.		
ASSINATURAS			
Luiz Henrique da Silva Borges Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 208579/D	APROVADO AUTOMATICAMENTE PELO SISTEMA PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA CREA 137.103/D		Luciano Xavier de Castro RT de Execução - CONSÓRCIO 3T -SOLOCAP-CONEP CREA 59784/D

Este documento foi assinado eletronicamente por LUIZ HENRIQUE DA SILVA BORGES e Luciano Xavier de Castro.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certsign.com.br:443> e utilize o código A3D3-AL-02-3D5A-C40F



CIMVALPI
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL
MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº	OBRA: CTP - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	CONTRATO:	RESP. TÉCNICO: LUCIANO XAVIER
ENDEREÇO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA	INÍCIO: 01/04/2023	Nº CREA-MG: 59784/D	
CIDDE:	PRAZO: 01/10/2023	Nº DA ART:	
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA	UF:	COORDENADAS:	
DATA: 04/06/2023	SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA ☔
MANHÃ	✓		
TARDE	✓		
QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
1	ENCARREGADO DE OBRAS	2	OPERADOR
4	MOTORISTA	1	PEDREIRO
1	TOPÓGRAFO	3	AJUDANTE
1	SINALEIRO		
QTDE	EQUIPAMENTO		
1	ESCAVADEIRA		
1	VEÍCULO DE APOIO		
1	CAMINHÃO PIPA		
3	CAMINHÃO BASCULANTE		
1	MOTONIVELADORA		
TAREFAS REALIZADAS			
NÚMERO DE T.R.	DESCRIÇÃO	OBSERVAÇÕES	
1	EXCUÇÃO DE COLCHÃO DRENANTE COM MATAÇO	ESTRADA DE ACESSO ENTRE SANTO ANTÔNIO DO GRAMA E ABRE CAMPO	
2	SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO TOPOGRÁFICO	ESTRADA DE ACESSO ENTRE SANTO ANTÔNIO DO GRAMA E ABRE CAMPO	
3	EXECUÇÃO DE DRENAGEM	ESTRADA DE ACESSO ENTRE SANTO ANTÔNIO DO GRAMA E ABRE CAMPO	
4	UMECTAÇÃO	ESTRADA DE ACESSO ENTRE SANTO ANTÔNIO DO GRAMA E ABRE CAMPO	
5	SINALIZAÇÃO	ESTRADA DE ACESSO ENTRE SANTO ANTÔNIO DO GRAMA E ABRE CAMPO	
6	SUPRESSÃO VEGETAL (MECÂNICA)	ESTRADA DE ACESSO ENTRE SANTO ANTÔNIO DO GRAMA E ABRE CAMPO	
REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)			

Este documento foi assinado eletronicamente por LUIZ HEINRIQUE DA SILVA BORGES e Luciano Xavier de Castro. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.cerisign.com.br/443> e utilize o código A3D3-AE02-3D5A-C40F.



OCORRÊNCIAS		
NÚMERO DE OC	TIPO DE OCORRÊNCIA	DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA
OBSERVAÇÕES		
EQUIPE E05 02/06/2023		
CONFERÊNCIA		
MUNICÍPIO (Aprovado)	CONSÓRCIO (Aprovado)	
Obs.:	Obs.: *TOPOGRAFIA - LOCAÇÃO DE BUEIRO LEVANTAMENTO PRIMITIVO DA PEDRA AS MARGENS DA PISTA NAS EST. 88,89,90,91. E MEDIÇÃO NOS TRECHOS EXECUTADOS. *DRENAGEM - CONSTRUÇÃO DO BUEIRO NA EST. 92+5. TERRAPLENAGEM - LIMPEZA DE VIAS E TRANSPORTE DE MATACO DA PEDREIRA P/ CONSTRUÇÃO DO BUEIRO NA EST. 179. *TRANSPORTE DE LIMPEZA P/ BOTA FORA (FAZ.). *TRANSPORTE DE BOTA FORA NOS BORDOS ESQ. NAS EST. 209 A EST. 213. *CERCA- SENDO FEITA NAS EST. 160 A EST. 176.	
ASSINATURAS		
Luiz Henrique da Silva Borges Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 208579/D	APROVADO AUTOMATICAMENTE PELO SISTEMA PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA CREA 137.103/D	Luciano Xavier de Castro RT de Execução - CONSÓRCIO 3T -SOLOCAP-CONEPP CREA 59784/D

Este documento foi assinado eletronicamente por LUIZ HENRIQUE DA SILVA BORGES e Luciano Xavier de Castro
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certsign.com.br:443> e utilize o código A3D3-AE02-3D5A-240F.



CIMVALPI
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL
MULTISETORIAL DO VALE DO PIRANGA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº	OBRA: CTP - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	CONTRATO:	RESP. TÉCNICO: LUCIANO XAVIER
ENDEREÇO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA	INÍCIO: 01/04/2023	Nº CREA-MG: 59784/D	
CIDDE:	PRAZO: 01/10/2023	Nº DA ART:	
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA	UF:	COORDENADAS:	
DATA: 02/06/2023	SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA ☔
MANHÃ	✓		IMPRATICÁVEL ☔
TARDE	✓		
QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
1	ENCARREGADO DE OBRAS	2	OPERADOR
4	MOTORISTA	1	PEDREIRO
1	TOPÓGRAFO	3	AJUDANTE
1	SINALEIRO		
QTDE	EQUIPAMENTO		
1	ESCAVADEIRA		
2	VEÍCULO DE APOIO		
1	CAMINHÃO PIPA		
3	CAMINHÃO BASCULANTE		
1	MOTONIVELADORA		
TAREFAS REALIZADAS			
NÚMERO DE T.R.	DESCRIÇÃO	OBSERVAÇÕES	
1	SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO TOPOGRÁFICO	ESTRADA DE ACESSO ENTRE SANTO ANTÔNIO DO GRAMA E ABRE CAMPO	
2	EXECUÇÃO DE COLCHÃO DRENANTE COM MATAÇO	ESTRADA DE ACESSO ENTRE SANTO ANTÔNIO DO GRAMA E ABRE CAMPO	
3	EXECUÇÃO DE DRENAGEM	ESTRADA DE ACESSO ENTRE SANTO ANTÔNIO DO GRAMA E ABRE CAMPO	
4	UMECTAÇÃO	ESTRADA DE ACESSO ENTRE SANTO ANTÔNIO DO GRAMA E ABRE CAMPO	
5	SUPRESSÃO VEGETAL (MECÂNICA)	ESTRADA DE ACESSO ENTRE SANTO ANTÔNIO DO GRAMA E ABRE CAMPO	
6	SINALIZAÇÃO	ESTRADA DE ACESSO ENTRE SANTO ANTÔNIO DO GRAMA E ABRE CAMPO	
REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)			

Este documento foi assinado eletronicamente por LUIZ HENRIQUE DA SILVA BORGES e Luciano Xavier de Castro. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.ceris.gn.com.br/443> e utilize o código A3D3-AE02-3D5A-C40F.



Data não informada



Data não informada





Data não informada



Data não informada

NÚMERO DE OC		TIPO DE OCORRÊNCIA		OCORRÊNCIAS	
				OBSERVAÇÕES	
EQUIPE E05 01/06/2023				CONFERÊNCIA	
MUNICÍPIO (Aprovado)				CONSÓRCIO (Aprovado)	
Obs.:				Obs.: *PREPARAÇÃO LIMPEZA BUEIRO EST. 179. *CONSTRUÇÃO DE CERCA NAS EST. 162 ATE EST.175. *CONTRUÇÃO DO BUEIRO NA EST. 75 +12. *LIMPEZA NA ÁREA DE ESCALONAMENTO DA EST. 191 A EST. 198. *TOPOGRAFIA - LOCAÇÃO DE BUEIRO NA EST. 192. *LOCAÇÃO DE BORDOS E	

Este documento foi assinado eletronicamente por LUIZ HENRIQUE DA SILVA BORGES e Luciano Xavier de Castro. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certsign.com.br:443> e utilize o código A3D3-AE02-3D5A-C40F.

NIVELAMENTO NAS EST. 98 ATÉ EST. 125. *NECESSARIO SINALIZAÇÃO DO BUEIROS QUE FORAM REALIZADOS AS TRAVESSIAS. *SEM BANHEIRO QUIMICO NA OBRA.

ASSINATURAS

Luiz Henrique da Silva Borges
Fiscal de Obras - CIMVALPI
CREA 208579/D

APROVADO AUTOMATICAMENTE PELO SISTEMA
PEDRO MARTINO ZEFERINO
Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA
CREA 137.103/D

Luciano Xavier de Castro
RT de Execução - CONSÓRCIO 3T -SOLOCAP-CONEP
CREA 59784/D

Este documento foi assinado eletronicamente por LUIZ HENRIQUE DA SILVA BORGES e Luciano Xavier de Castro.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certsign.com.br:443> e utilize o código A3D3-AE02-3D5A-C40F



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº	OBRA: CTP - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	CONTRATO:	RESP. TÉCNICO: LUCIANO XAVIER
ENDEREÇO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA	INÍCIO: 01/04/2023	Nº CREA-MG: 59784/D	
CIDDE:	PRAZO: 01/10/2023	Nº DA ART:	
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA	UF:	COORDENADAS:	
DATA: 01/06/2023	SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA ☔
MANHÃ	✓		
TARDE	✓		
QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
1	ENCARREGADO DE OBRAS	2	OPERADOR
4	MOTORISTA	1	PEDREIRO
1	TOPÓGRAFO	3	AJUDANTE
1	SINALEIRO		
QTDE	EQUIPAMENTO		
1	ESCAVADEIRA		
2	VEÍCULO DE APOIO		
1	CAMINHÃO PIPA		
3	CAMINHÃO BASCULANTE		
1	MOTONIVELADORA		
TAREFAS REALIZADAS			
NÚMERO DE T.R.	DESCRIÇÃO	OBSERVAÇÕES	
1	EXECUÇÃO DE DRENAGEM	ESTRADA DE ACESSO ENTRE SANTO ANTÔNIO DO GRAMA E ABRE CAMPO	
2	SINALIZAÇÃO	ESTRADA DE ACESSO ENTRE SANTO ANTÔNIO DO GRAMA E ABRE CAMPO	
3	SUPRESSÃO VEGETAL (MECÂNICA)	ESTRADA DE ACESSO ENTRE SANTO ANTÔNIO DO GRAMA E ABRE CAMPO	
4	SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO TOPOGRÁFICO	ESTRADA DE ACESSO ENTRE SANTO ANTÔNIO DO GRAMA E ABRE CAMPO	
5	UMECTAÇÃO	ESTRADA DE ACESSO ENTRE SANTO ANTÔNIO DO GRAMA E ABRE CAMPO	
REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)			

Este documento foi assinado eletronicamente por LUIZ HENRIQUE DA SILVA BORGES e Luciano Xavier de Castro. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.cerisign.com.br/443> e utilize o código A3D3-AE02-3D5A-C40F.



Data não informada



Data não informada



Data não informada



Data não informada



Data não informada



31 de mai de 2023 07:59:33
638 Rua Capitão Braga
Santo Antonio Do Grama
Santo Antônio do Grama
Minas Gerais

Data não informada

NÚMERO DE OC		TIPO DE OCORRÊNCIA		OCORRÊNCIAS		DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA	
EQUIPE E05 31/05/2023				OBSERVAÇÕES			
MUNICÍPIO (Aprovado)		CONSÓRCIO (Aprovado)		CONFERÊNCIA			
Obs.:		Obs.:		Obs.:		Obs.:	

MARCOS E ENG. CIVIL PEDRO DA PREFEITURA, RETIRADA DO BUEIRO DA EST. 87+15. *NECESSIDADE DE SINALIZAÇÃO DAS DRENAGENS.
*NECESSIDADE DE BANHEIRO QUIMICO NA OBRA. *CONSERTAR A PLACA DA OBRA.

ASSINATURAS

Luiz Henrique da Silva Borges
Fiscal de Obras - CIMVALPI
CREA 208579/D

APROVADO AUTOMATICAMENTE PELO SISTEMA
PEDRO MARTINO ZEFERINO
Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA
CREA 137.103/D

Luciano Xavier de Castro
RT de Execução - CONSÓRCIO 3T -SOLOCAP-CONEPP
CREA 59784/D

Este documento foi assinado eletronicamente por LUIZ HENRIQUE DA SILVA BORGES e Luciano Xavier de Castro.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certsign.com.br:443> e utilize o código A3D3-AE02-3D5A-C40F.



CIMVALPI
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL
MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº	OBRA: CTP - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	CONTRATO:	RESP. TÉCNICO: LUCIANO XAVIER
ENDEREÇO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA	INÍCIO: 01/04/2023	Nº CREA-MG: 59784/D	
CIDDE:	PRAZO: 01/10/2023	Nº DA ART:	
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA	UF:	COORDENADAS:	
DATA: 31/05/2023	SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA ☔
MANHÃ	✓		IMPRATICÁVEL ☔
TARDE	✓		
QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
1	ENCARREGADO DE OBRAS	2	OPERADOR
4	MOTORISTA	1	PEDREIRO
1	TOPÓGRAFO	3	AJUDANTE
1	SINALEIRO		
QTDE	EQUIPAMENTO		
1	ESCAVADEIRA		
2	VEÍCULO DE APOIO		
1	CAMINHÃO PIPA		
3	CAMINHÃO BASCULANTE		
1	MOTONIVELADORA		
TAREFAS REALIZADAS			
NÚMERO DE T.R.	DESCRIÇÃO	OBSERVAÇÕES	
1	SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO TOPOGRÁFICO	ESTRADA DE ACESSO ENTRE SANTO ANTÔNIO DO GRAMA E ABRE CAMPO	
2	UMECTAÇÃO	ESTRADA DE ACESSO ENTRE SANTO ANTÔNIO DO GRAMA E ABRE CAMPO	
3	SINALIZAÇÃO	ESTRADA DE ACESSO ENTRE SANTO ANTÔNIO DO GRAMA E ABRE CAMPO	
4	EXECUÇÃO DE DRENAGEM	ESTRADA DE ACESSO ENTRE SANTO ANTÔNIO DO GRAMA E ABRE CAMPO	
REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)			

Este documento foi assinado eletronicamente por LUIZ HENRIQUE DA SILVA BORGES e Luciano Xavier de Castro. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.ceris.gn.com.br/443 e utilize o código A3D3-AE02-3D5A-C40F.



NÚMERO DE OC		TIPO DE OCORRÊNCIA	OCORRÊNCIAS	DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA
EQUIPE E05 30/05/2023		OBSERVAÇÕES		
MUNICÍPIO (Aprovado)		CONFERÊNCIA		
Obs.:		CONSÓRCIO (Aprovado)		
		Obs.: *Topografia com marcação bueiro Est. 151+10. *Nivelamento das Est.208 a 218. *Drenagem - Construção do bueiro Est. 151+10. *Terraplenagem - Limpeza da estrada nos estaqueamentos 208 a 218. *Obs: Mudança deslocamento do eixo da Est. 101 ate Est. 123. *Cerca - Est.156 a Est. 174+13. *Obs: Bueiro Est. 151+10 erro de execução. Será refeito. *Sinalização dos bueiro. *Banheiro químico.		
ASSINATURAS				
Luiz Henrique da Silva Borges Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 208579/D		APROVADO AUTOMATICAMENTE PELO SISTEMA PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA CREA 137.103/D		Luciano Xavier de Castro RT de Execução - CONSÓRCIO 3T –SOLOCAP-CONEPP CREA 59784/D

Este documento foi assinado eletronicamente por LUIZ HENRIQUE DA SILVA BORGES e Luciano Xavier de Castro. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.cimvalpi.com.br:443> e utilize o código A3D3-AE02-3D5A-C40F.



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº	OBRA: CTP - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	CONTRATO:	RESP. TÉCNICO: LUCIANO XAVIER
ENDEREÇO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA	INÍCIO: 01/04/2023	Nº CREA-MG: 59784/D	
CIDDE:	PRAZO: 01/10/2023	Nº DA ART:	
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA	UF:	COORDENADAS:	
DATA: 30/05/2023	SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA ☔
MANHÃ	✓		
TARDE	✓		
QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
1	ENCARREGADO DE OBRAS	2	OPERADOR
4	MOTORISTA	1	PEDREIRO
1	TOPÓGRAFO	3	AJUDANTE
1	SINALEIRO		
QTDE	EQUIPAMENTO		
1	ESCAVADEIRA		
2	VEÍCULO DE APOIO		
1	CAMINHÃO PIPA		
3	CAMINHÃO BASCULANTE		
1	MOTONIVELADORA		
TAREFAS REALIZADAS			
NÚMERO DE T.R.	DESCRIÇÃO	OBSERVAÇÕES	
1	EXECUÇÃO DE DRENAGEM	ESTRADA DE ACESSO ENTRE SANTO ANTÔNIO DO GRAMA E ABRE CAMPO	
2	EXECUÇÃO DE ATERRO	ESTRADA DE ACESSO ENTRE SANTO ANTÔNIO DO GRAMA E ABRE CAMPO	
3	SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO TOPOGRÁFICO	ESTRADA DE ACESSO ENTRE SANTO ANTÔNIO DO GRAMA E ABRE CAMPO	
4	UMECTAÇÃO	ESTRADA DE ACESSO ENTRE SANTO ANTÔNIO DO GRAMA E ABRE CAMPO	
5	SINALIZAÇÃO	ESTRADA DE ACESSO ENTRE SANTO ANTÔNIO DO GRAMA E ABRE CAMPO	
REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)			

Este documento foi assinado eletronicamente por LUIZ HENRIQUE DA SILVA BORGES e Luciano Xavier de Castro. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.cerisign.com.br/443> e utilize o código A3D3-AE02-3D5A-C40F.



Data não informada

Este documento foi assinado eletronicamente por LUIZ HENRIQUE DA SILVA BORGES e Luciano Xavier de Castro.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certsign.com.br:443> e utilize o código A3D3-AE02-3D5A-C40F.




unda-feira, 29 de maio de 2023 14:10:21
-20°18'23,046"S -42°35'3,196"W

Data não informada




Data não informada

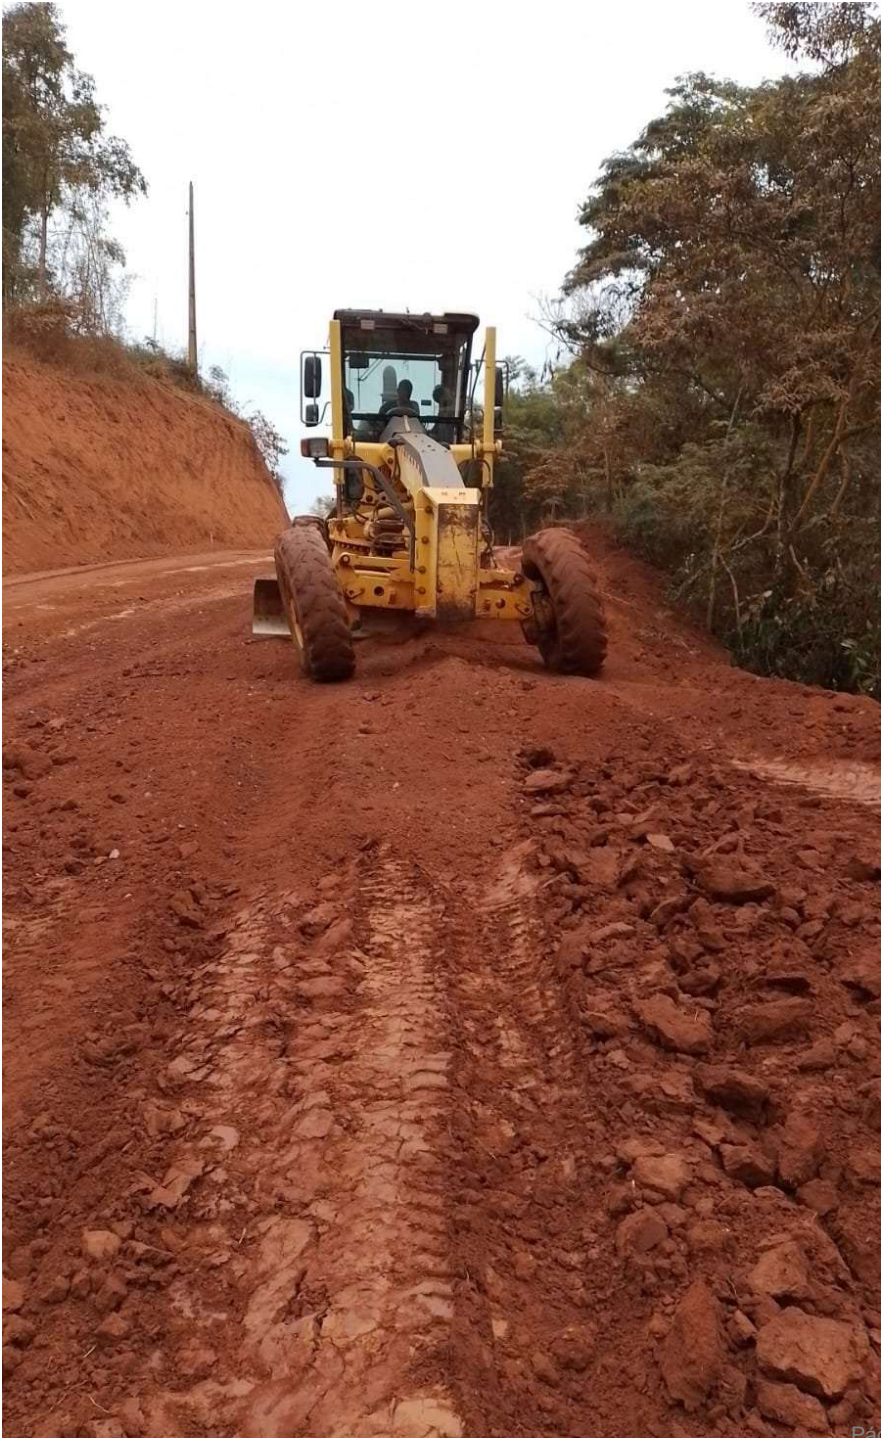

Este documento foi assinado eletronicamente por LUIZ HENRIQUE DA SILVA BORGES e Luciano Xavier de Castro.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certsign.com.br:443> e utilize o código A3D3-AE02-3D5A-C40F.

Quarta-feira, 29 de maio de 2023 14:13:37
-20°18'22,947"S -42°35'3,064"W
Data não informada

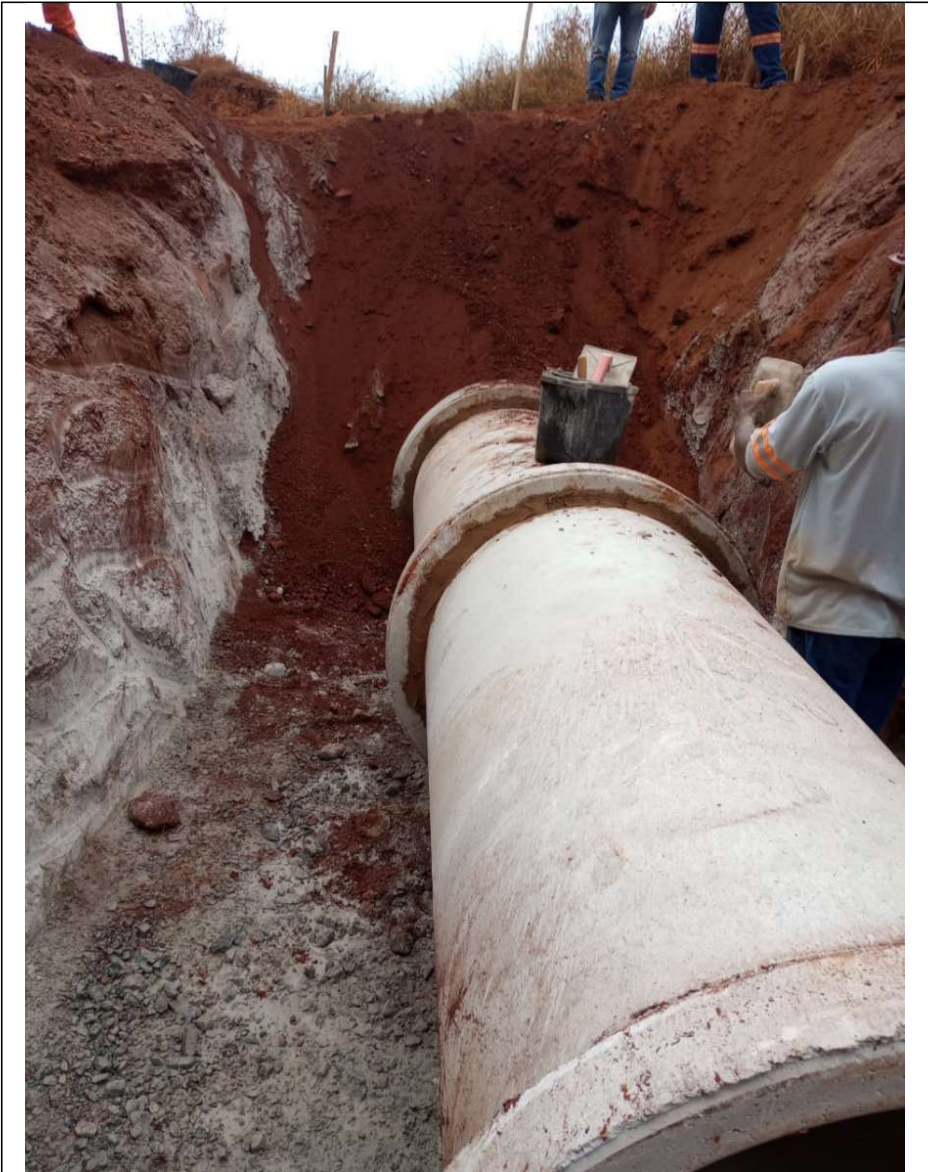

Data não informada

Este documento foi assinado eletronicamente por LUIZ HENRIQUE DA SILVA BORGES e Luciano Xavier de Castro.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certsign.com.br:443> e utilize o código A3D3-AE02-3D5A-C40F.

OCORRÊNCIAS			
NÚMERO DE OC	TIPO DE OCORRÊNCIA	DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA	

OBSERVAÇÕES	
EQUIPE E05 29/05/2023	
CONFERÊNCIA	
MUNICÍPIO (Aprovado)	CONSÓRCIO (Aprovado)
Obs.:	Obs.: *NECESSÁRIO BANHEIRO QUIMICO NA OBRA. *SINALIZAÇÃO NOS BUEIROS. *DRENAGEM - TERMINIO TRAVESSIA BUEIRO EST. 63 E INICIO DO BUEIRO EST. 110+13. *TERRAPLENAGEM - FINAL DO ATERRO DO ESCALONAMENTO NAS EST. 143,144,145 E 146. *LIMPEZA - EST. 202 A EST. 205. TOPOGRAFIA - LOCAÇÃO EIXO NAS EST. 202 A EST. 208 E LOCAÇÃO DOS BORDOS. *EQUIPAMENTOS - CHEGADA PIPA 20 MIL LITROS. *OBS: NAS EST. 208 A EST. 212 NO PROJETO INFORMA 120 DE RAIO, MAIS FOI NECESSÁRIO AJUSTAR PARA 70.
ASSINATURAS	
Luiz Henrique da Silva Borges Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 208579/D	APROVADO AUTOMATICAMENTE PELO SISTEMA PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA CREA 137.103/D Luciano Xavier de Castro RT de Execução - CONSÓRCIO 3T -SOLOCAP-CONEP CREA 59784/D

Este documento foi assinado eletronicamente por LUIZ HENRIQUE DA SILVA BORGES e Luciano Xavier de Castro.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certsign.com.br:443> e utilize o código A3D3-AE02-3D5A-C40F.



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº	OBRA: CTP - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	CONTRATO:	RESP. TÉCNICO: LUCIANO XAVIER
ENDEREÇO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA	INÍCIO: 01/04/2023	Nº CREA-MG: 59784/D	
CIDDE:	PRAZO: 01/10/2023	Nº DA ART:	
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA	UF:	COORDENADAS:	
DATA: 27/05/2023	SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA ☔
MANHÃ	✓		IMPRATICÁVEL ☔
TARDE	✓		
QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
1	ENCARREGADO DE OBRAS	2	OPERADOR
4	MOTORISTA	1	PEDREIRO
1	TOPÓGRAFO	3	AJUDANTE
1	SINALEIRO		
QTDE	EQUIPAMENTO		
1	ESCAVADEIRA		
2	VEÍCULO DE APOIO		
1	CAMINHÃO PIPA		
3	CAMINHÃO BASCULANTE		
1	MOTONIVELADORA		
TAREFAS REALIZADAS			
NÚMERO DE T.R.	DESCRIÇÃO	OBSERVAÇÕES	
1	SINALIZAÇÃO	ESTRADA DE ACESSO ENTRE SANTO ANTÔNIO DO GRAMA E ABRE CAMPO	
2	UMECTAÇÃO	ESTRADA DE ACESSO ENTRE SANTO ANTÔNIO DO GRAMA E ABRE CAMPO	
3	EXECUÇÃO DE DRENAGEM	ESTRADA DE ACESSO ENTRE SANTO ANTÔNIO DO GRAMA E ABRE CAMPO	
4	SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO TOPOGRÁFICO	ESTRADA DE ACESSO ENTRE SANTO ANTÔNIO DO GRAMA E ABRE CAMPO	
5	SUPRESSÃO VEGETAL (MECÂNICA)	ESTRADA DE ACESSO ENTRE SANTO ANTÔNIO DO GRAMA E ABRE CAMPO	
REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)			

Este documento foi assinado eletronicamente por LUIZ HENRIQUE DA SILVA BORGES e Luciano Xavier de Castro. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certisign.com.br/443> e utilize o código A3D3-AE02-3D5A-C40F.



NÚMERO DE OC		TIPO DE OCORRÊNCIA	DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA
		OBSERVAÇÕES	
EQUIPE E05 26/05/2023			
		CONFERÊNCIA	
MUNICÍPIO (Aprovado)	CONSÓRCIO (Aprovado)		
Obs.:	Obs.: *MARCAÇÃO E DESLOCAMENTO DA ESTRADA NA EST. 163 A EST. 170. *MARCAÇÃO DE BUEIRO EST. 63 E DO BUEIRO EST. 110+13. *LIMPEZA DE CORTE NAS EST. 202 A EST. 207. *TERMINO DO BUEIRO 43 E INICIO DO BUEIRO 63. *NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DE EPI'S POR TODOS FUNCIONÁRIOS PRESENTES NA OBRA.		
ASSINATURAS			
Luiz Henrique da Silva Borges Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 208579/D		APROVADO AUTOMATICAMENTE PELO SISTEMA PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA CREA 137.103/D	
		Luciano Xavier de Castro RT de Execução - CONSÓRCIO 3T - SOLOCAP-CONEPP CREA 59784/D	

Este documento foi assinado eletronicamente por LUIZ HENRIQUE DA SILVA BORGES e Luciano Xavier de Castro. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinturass.cimvalpi.com.br:443> e utilize o código A3D3-AE02-3D5A-C40F.



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº	OBRA: CTP - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	CONTRATO:	RESP. TÉCNICO: LUCIANO XAVIER
ENDEREÇO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA	INÍCIO: 01/04/2023	Nº CREA-MG: 59784/D	
CIDDE:	PRAZO: 01/10/2023	Nº DA ART:	
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA	UF:	COORDENADAS:	
DATA: 27/05/2023	SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA ☔
MANHÃ	✓		IMPRATICÁVEL ☔
TARDE	✓		
QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
1	ENCARREGADO DE OBRAS	2	OPERADOR
4	MOTORISTA	1	PEDREIRO
1	TOPÓGRAFO	3	AJUDANTE
1	SINALEIRO		
QTDE	EQUIPAMENTO		
1	ESCAVADEIRA		
2	VEÍCULO DE APOIO		
1	CAMINHÃO PIPA		
3	CAMINHÃO BASCULANTE		
1	MOTONIVELADORA		
TAREFAS REALIZADAS			
NÚMERO DE T.R.	DESCRIÇÃO	OBSERVAÇÕES	
1	SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO TOPOGRÁFICO	ESTRADA DE ACESSO ENTRE SANTO ANTÔNIO DO GRAMA E ABRE CAMPO	
2	EXECUÇÃO DE ATERRO	ESTRADA DE ACESSO ENTRE SANTO ANTÔNIO DO GRAMA E ABRE CAMPO	
3	SINALIZAÇÃO	ESTRADA DE ACESSO ENTRE SANTO ANTÔNIO DO GRAMA E ABRE CAMPO	
4	EXECUÇÃO DE DRENAGEM	ESTRADA DE ACESSO ENTRE SANTO ANTÔNIO DO GRAMA E ABRE CAMPO	
5	UMECTAÇÃO	ESTRADA DE ACESSO ENTRE SANTO ANTÔNIO DO GRAMA E ABRE CAMPO	
REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)			

Este documento foi assinado eletronicamente por LUIZ HENRIQUE DA SILVA BORGES e Luciano Xavier de Castro. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.ceris.gn.com.br/443> e utilize o código A3D3-AE02-3D5A-C40F.



OCORRÊNCIAS		
NÚMERO DE OC	TIPO DE OCORRÊNCIA	DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA
OBSERVAÇÕES		
EQUIPE E05 25/05/2023		
CONFERÊNCIA		
MUNICÍPIO (Aprovado)	CONSÓRCIO (Aprovado)	
Obs.:	Obs.: *DRENAGEM, CONSTRUÇÃO DO BUEIRO EST. 25 E INICIO DE CONSTRUÇÃO DO BUEIRO EST. 43. *CORTE EST. 165 A EST. 172. *ATERRO EST. 158 A EST. 163. TOPOGRAFIA LOCÇÃO E NIVELAMENTO NAS EST. 179 A EST.216 *CHEGADA DE UMA RETROESCAVADEIRA PARA APOIO NA OBRA. *NECESSÁRIO A UTILIZAÇÃO DE EPIS, POR TODOS FUNCIONÁRIOS.	
ASSINATURAS		
Luiz Henrique da Silva Borges Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 208579/D	APROVADO AUTOMATICAMENTE PELO SISTEMA PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA CREA 137.103/D	Luciano Xavier de Castro RT de Execução - CONSÓRCIO 3T –SOLOCAP-CONEP CREA 59784/D

Este documento foi assinado eletronicamente por LUIZ HENRIQUE DA SILVA BORGES e Luciano Xavier de Castro.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certsign.com.br:443> e utilize o código A3D3-AE02-3D5A-C40F.



CIMVALPI
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL
MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº	OBRA: CTP - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	CONTRATO:	RESP. TÉCNICO: LUCIANO XAVIER
ENDEREÇO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA	INÍCIO: 01/04/2023	Nº CREA-MG: 59784/D	
CIDDE:	PRAZO: 01/10/2023	Nº DA ART:	
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA	UF:	COORDENADAS:	
DATA: 25/05/2023	SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA ☔
MANHÃ	✓		IMPRATICÁVEL ☔
TARDE	✓		
QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
1	ENCARREGADO DE OBRAS	2	OPERADOR
4	MOTORISTA	1	PEDREIRO
1	TOPÓGRAFO	3	AJUDANTE
1	SINALEIRO		
QTDE	EQUIPAMENTO		
1	ESCAVADEIRA		
1	VEÍCULO DE APOIO		
1	CAMINHÃO PIPA		
3	CAMINHÃO BASCULANTE		
1	MOTONIVELADORA		
TAREFAS REALIZADAS			
NÚMERO DE T.R.	DESCRIÇÃO	OBSERVAÇÕES	
1	SINALIZAÇÃO	ESTRADA DE ACESSO ENTRE SANTO ANTÔNIO DO GRAMA E ABRE CAMPO	
2	UMECTAÇÃO	ESTRADA DE ACESSO ENTRE SANTO ANTÔNIO DO GRAMA E ABRE CAMPO	
3	EXECUÇÃO DE ATERRO	ESTRADA DE ACESSO ENTRE SANTO ANTÔNIO DO GRAMA E ABRE CAMPO	
4	EXECUÇÃO DE DRENAGEM	ESTRADA DE ACESSO ENTRE SANTO ANTÔNIO DO GRAMA E ABRE CAMPO	
5	SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO TOPOGRÁFICO	ESTRADA DE ACESSO ENTRE SANTO ANTÔNIO DO GRAMA E ABRE CAMPO	
REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)			

Este documento foi assinado eletronicamente por LUIZ HENRIQUE DA SILVA BORGES e Luciano Xavier de Castro. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.ceris.gn.com.br/443> e utilize o código A3D3-AE02-3D5A-C40F.



Data não informada




Data não informada



Data não informada



Data não informada

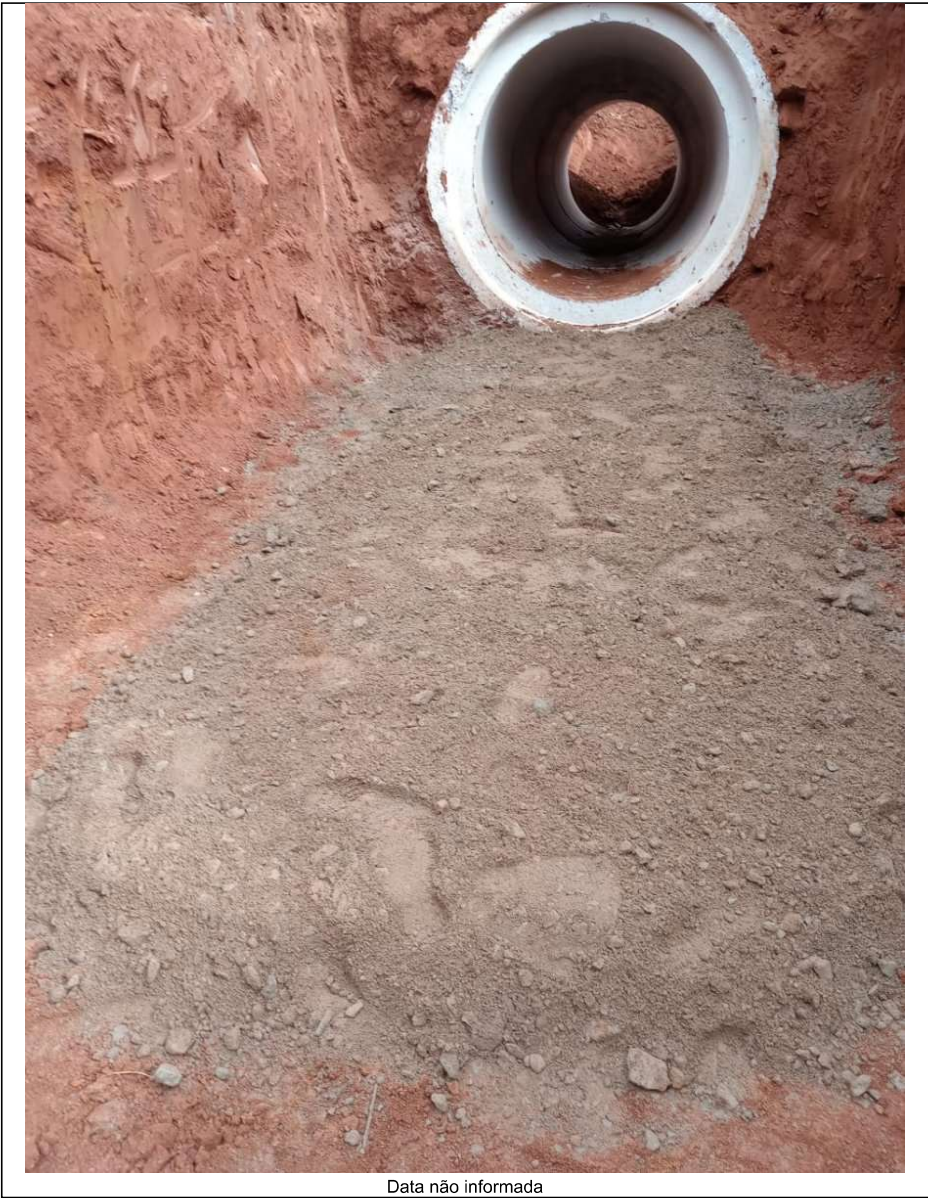

Data não informada



Data não informada

NÚMERO DE OC		TIPO DE OCORRÊNCIA	DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA
EQUIPE E05 24/05/2023		OBSERVAÇÕES	
MUNICÍPIO (Aprovado)		CONSÓRCIO (Aprovado)	
Obs.:		Obs.: *Necessário escoramento da vala. *Bueiro Est. 28+15 finalizado. *Iniciado Bueiro Est. 25. *Escalonamento Est. 140 a Est. 144, (material utilizado da Est. 156 a Est. 163. *Limpeza e abertura da Est. 141 a 170. *Est. 207 até Est. 216 ajuste de deslocamento, para não atingir poço de peixe e curral.	

Este documento foi assinado eletronicamente por LUIZ HENRIQUE DA SILVA BORGES e Luciano Xavier de Castro. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certsign.com.br:443 e utilize o código A3D3-AE02-3D5A-C40F.

ASSINATURAS		
Luiz Henrique da Silva Borges Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 208579/D	APROVADO AUTOMATICAMENTE PELO SISTEMA PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA CREA 137.103/D	Luciano Xavier de Castro RT de Execução - CONSÓRCIO 3T –SOLOCAP-CONEP CREA 59784/D

Este documento foi assinado eletronicamente por LUIZ HENRIQUE DA SILVA BORGES e Luciano Xavier de Castro.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certsign.com.br:443> e utilize o código A3D3-AE02-3D5A-C40F.



CIMVALPI
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL
MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº	OBRA: CTP - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	CONTRATO:	RESP. TÉCNICO: LUCIANO XAVIER
ENDEREÇO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA	INÍCIO: 01/04/2023	Nº CREA-MG: 59784/D	
CIDDE:	PRAZO: 01/10/2023	Nº DA ART:	
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA	UF:	COORDENADAS:	
DATA: 24/05/2023	SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA ☔
MANHÃ	✓		IMPRATICÁVEL ☔
TARDE	✓		
QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
1	ENCARREGADO DE OBRAS	2	OPERADOR
4	MOTORISTA	1	PEDREIRO
1	TOPÓGRAFO	3	AJUDANTE
1	SINALEIRO		
QTDE	EQUIPAMENTO		
1	ESCAVADEIRA		
2	VEÍCULO DE APOIO		
1	CAMINHÃO PIPA		
3	CAMINHÃO BASCULANTE		
1	MOTONIVELADORA		
TAREFAS REALIZADAS			
NÚMERO DE T.R.	DESCRIÇÃO	OBSERVAÇÕES	
1	ABERTURA DE CAIXA DE PISTA	ESTRADA DE ACESSO ENTRE SANTO ANTÔNIO DO GRAMA E ABRE CAMPO	
2	UMECTAÇÃO	ESTRADA DE ACESSO ENTRE SANTO ANTÔNIO DO GRAMA E ABRE CAMPO	
3	SINALIZAÇÃO	ESTRADA DE ACESSO ENTRE SANTO ANTÔNIO DO GRAMA E ABRE CAMPO	
4	SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO TOPOGRÁFICO	ESTRADA DE ACESSO ENTRE SANTO ANTÔNIO DO GRAMA E ABRE CAMPO	
REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)			

Este documento foi assinado eletronicamente por LUIZ HENRIQUE DA SILVA BORGES e Luciano Xavier de Castro. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.ceris.gn.com.br/443 e utilize o código A3D3-AE02-3D5A-C40F.



Data não informada



Data não informada

OCORRÊNCIAS		
NÚMERO DE OC	TIPO DE OCORRÊNCIA	DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA
OBSERVAÇÕES		
EQUIPE E05 23/05/2023		
CONFERÊNCIA		
MUNICÍPIO	CONSÓRCIO (Aprovado)	
Obs.:	Obs.: * Bueiro 28+15 diam. 1,5 (em construção). *Mudança de cerca nas est. 120a 153. *Limpeza e abertura da estrada est. 128 a est. 175. *Necessidade de substituição do pipa para um com capacidade de 20 mil litros. *Necessidade de uma retroescavadeira para apoio na drenagem. *Obrigatório o escoramento das valas para execução da drenagem.	
ASSINATURAS		
Luiz Henrique da Silva Borges Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 208579/D	APROVADO AUTOMATICAMENTE PELO SISTEMA PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA CREA 137.103/D	Luciano Xavier de Castro RT de Execução - CONSÓRCIO 3T –SOLOCAP-CONEPP CREA 59784/D

Este documento foi assinado eletronicamente por LUIZ HENRIQUE DA SILVA BORGES e LUCIANO XAVIER DE CASTRO. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.cpfisign.com.br:443> e utilize o código A3D3-AE02-3D5A-C40F.



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº	OBRA: CTP - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	CONTRATO:	RESP. TÉCNICO: LUCIANO XAVIER
ENDEREÇO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA	INÍCIO: 01/04/2023	Nº CREA-MG: 59784/D	
CIDDE:	PRAZO: 01/10/2023	Nº DA ART:	
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA	UF:	COORDENADAS:	
DATA: 22/05/2023	SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA ☔
MANHÃ	✓		IMPRATICÁVEL ☔
TARDE	✓		
QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
1	ENCARREGADO DE OBRAS	2	OPERADOR
4	MOTORISTA	1	PEDREIRO
1	TOPÓGRAFO	3	AJUDANTE
1	SINALEIRO		
QTDE	EQUIPAMENTO		
1	ESCAVADEIRA		
2	VEÍCULO DE APOIO		
1	CAMINHÃO PIPA		
3	CAMINHÃO BASCULANTE		
1	MOTONIVELADORA		
TAREFAS REALIZADAS			
NÚMERO DE T.R.	DESCRIÇÃO	OBSERVAÇÕES	
1	SINALIZAÇÃO	ESTRADA DE ACESSO ENTRE SANTO ANTÔNIO DO GRAMA E ABRE CAMPO	
2	UMECTAÇÃO	ESTRADA DE ACESSO ENTRE SANTO ANTÔNIO DO GRAMA E ABRE CAMPO	
3	SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO TOPOGRÁFICO	ESTRADA DE ACESSO ENTRE SANTO ANTÔNIO DO GRAMA E ABRE CAMPO	
4	EXECUÇÃO DE DRENAGEM	ESTRADA DE ACESSO ENTRE SANTO ANTÔNIO DO GRAMA E ABRE CAMPO	
5	ABERTURA DE CAIXA DE DRENAGEM	ESTRADA DE ACESSO ENTRE SANTO ANTÔNIO DO GRAMA E ABRE CAMPO	
REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)			

Este documento foi assinado eletronicamente por LUIZ HENRIQUE DA SILVA BORGES e Luciano Xavier de Castro. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.ceris.gn.com.br/443> e utilize o código A3D3-AE02-3D5A-C40F.



Data não informada



Data não informada



Data não informada



Data não informada

OCORRÊNCIAS		
NÚMERO DE OC	TIPO DE OCORRÊNCIA	DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA
OBSERVAÇÕES		
EQUIPE E05 22/05/2023		
CONFERÊNCIA		
MUNICÍPIO	CONSÓRCIO (Aprovado)	
Obs.:	Obs.: *ESTACA DA CERCA ESTA SENDO COLOCADA COM 3M DE EIXO A EIXO, SENDO O QUE PEDE EM PROJETO 2,5m DE EIXO A EIXO. *CERCA EST. 205 A 226 - (DESLOCAMENTO DO EIXO E BORDOS DEVIDO A PROPRIEDADE COM PORTEIRA PROXIMO). *BUEIRO EST. 12 (EM CONSTRUÇÃO). *LIMPEZA DA VIA DA ESTRADA. *TOPOGRAFIA MARCAÇÃO E DESLOCAMAMENTO DE CURVAS. *POUCA SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA.	
ASSINATURAS		
Luiz Henrique da Silva Borges Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 208579/D	APROVADO AUTOMATICAMENTE PELO SISTEMA PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA CREA 137.103/D	Luciano Xavier de Castro RT de Execução - CONSÓRCIO 3T -SOLOCAP-CONEP CREA 59784/D

Este documento foi assinado eletronicamente por LUIZ HENRIQUE DA SILVA BORGES e Luciano Xavier de Castro.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certsign.com.br:443> e utilize o código A3D3-AE02-3D5A-C40F.



CIMVALPI
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL
MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº	OBRA: CTP - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	CONTRATO:	RESP. TÉCNICO: LUCIANO XAVIER
ENDEREÇO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA	INÍCIO: 01/04/2023	Nº CREA-MG: 59784/D	
CIDDE:	PRAZO: 01/10/2023	Nº DA ART:	
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA	UF:	COORDENADAS:	
DATA: 22/05/2023	SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA ☔
MANHÃ	✓		IMPRATICÁVEL ☔
TARDE	✓		
QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
1	ENCARREGADO DE OBRAS	2	OPERADOR
4	MOTORISTA	1	PEDREIRO
1	TOPÓGRAFO	3	AJUDANTE
1	SINALEIRO		
QTDE	EQUIPAMENTO		
1	ESCAVADEIRA		
2	VEÍCULO DE APOIO		
1	CAMINHÃO PIPA		
3	CAMINHÃO BASCULANTE		
1	MOTONIVELADORA		
TAREFAS REALIZADAS			
NÚMERO DE T.R.	DESCRIÇÃO	OBSERVAÇÕES	
1	UMECTAÇÃO	ESTRADA DE ACESSO ENTRE SANTO ANTÔNIO DO GRAMA E ABRE CAMPO	
2	SINALIZAÇÃO	ESTRADA DE ACESSO ENTRE SANTO ANTÔNIO DO GRAMA E ABRE CAMPO	
3	SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO TOPOGRÁFICO	ESTRADA DE ACESSO ENTRE SANTO ANTÔNIO DO GRAMA E ABRE CAMPO	
4	EXECUÇÃO DE DRENAGEM	ESTRADA DE ACESSO ENTRE SANTO ANTÔNIO DO GRAMA E ABRE CAMPO	
5	EXCUÇÃO DE BASE	ESTRADA DE ACESSO ENTRE SANTO ANTÔNIO DO GRAMA E ABRE CAMPO	
REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)			

Este documento foi assinado eletronicamente por LUIZ HENRIQUE DA SILVA BORGES e Luciano Xavier de Castro. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.ceris.gn.com.br/443> e utilize o código A3D3-AE02-3D5A-C40F.



OCORRÊNCIAS		
NÚMERO DE OC	TIPO DE OCORRÊNCIA	
DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA		
OBSERVAÇÕES		
EQUIPE E05 20/05/2023		
CONFERÊNCIA		
MUNICÍPIO	CONSÓRCIO (Aprovado)	
Obs.:	Obs.: *Conforme executado em campo. *Melhorar a sinalização de segurança.	
ASSINATURAS		
Luiz Henrique da Silva Borges Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 208579/D	APROVADO AUTOMATICAMENTE PELO SISTEMA PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA CREA 137.103/D	Luciano Xavier de Castro RT de Execução - CONSÓRCIO 3T –SOLOCAP-CONEP CREA 59784/D

Este documento foi assinado eletronicamente por LUIZ HENRIQUE DA SILVA BORGES e Luciano Xavier de Castro.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certsign.com.br:443> e utilize o código A3D3-AE2-3D5A-C40F.



CIMVALPI
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL
MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº	OBRA: CTP - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	CONTRATO:	RESP. TÉCNICO: LUCIANO XAVIER
ENDEREÇO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA	INÍCIO: 01/04/2023	Nº CREA-MG: 59784/D	
CIDDE:	PRAZO: 01/10/2023	Nº DA ART:	
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA	UF:	COORDENADAS:	
DATA: 22/05/2023	SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA ☔
MANHÃ	✓		IMPRATICÁVEL ☔
TARDE	✓		
QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
1	ENCARREGADO DE OBRAS	2	OPERADOR
4	MOTORISTA	1	PEDREIRO
1	TOPÓGRAFO	3	AJUDANTE
1	SINALEIRO		
QTDE	EQUIPAMENTO		
1	ESCAVADEIRA		
2	VEÍCULO DE APOIO		
1	CAMINHÃO PIPA		
3	CAMINHÃO BASCULANTE		
1	MOTONIVELADORA		
TAREFAS REALIZADAS			
NÚMERO DE T.R.	DESCRIÇÃO	OBSERVAÇÕES	
1	EXECUÇÃO DE DRENAGEM	ESTRADA DE ACESSO ENTRE SANTO ANTÔNIO DO GRAMA E ABRE CAMPO	
2	UMECTAÇÃO	ESTRADA DE ACESSO ENTRE SANTO ANTÔNIO DO GRAMA E ABRE CAMPO	
3	EXCUÇÃO DE BASE	ESTRADA DE ACESSO ENTRE SANTO ANTÔNIO DO GRAMA E ABRE CAMPO	
4	SINALIZAÇÃO	ESTRADA DE ACESSO ENTRE SANTO ANTÔNIO DO GRAMA E ABRE CAMPO	
5	SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO TOPOGRÁFICO	ESTRADA DE ACESSO ENTRE SANTO ANTÔNIO DO GRAMA E ABRE CAMPO	
REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)			

Este documento foi assinado eletronicamente por LUIZ HENRIQUE DA SILVA BORGES e Luciano Xavier de Castro. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.ceris.gn.com.br/443> e utilize o código A3D3-AE02-3D5A-C40F.





OCORRÊNCIAS		
NÚMERO DE OC	TIPO DE OCORRÊNCIA	DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA
OBSERVAÇÕES		
EQUIPE E05 19/05/2023		
CONFERÊNCIA		
MUNICÍPIO	CONSÓRCIO (Aprovado)	
Obs.:	Obs.: * Topografia - Marcação Bueiro Est. 13 alocado para Est. 12. *Bueiro Est. 21 alocado pra Est. 25 *Forração cascalho - Est. 47 a 03 *Cerca concluída 579 m *Pouca sinalização de segurança na obra.	
ASSINATURAS		
_____ Luiz Henrique da Silva Borges Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 208579/D APROVADO AUTOMATICAMENTE PELO SISTEMA PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA CREA 137.103/D _____ Luciano Xavier de Castro RT de Execução - CONSÓRCIO 3T –SOLOCAP-CONEPP CREA 59784/D		

Este documento foi assinado eletronicamente por LUIZ HENRIQUE DA SILVA BORGES e Luciano Xavier de Castro. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.gestis.gm.com.br:443> e utilize o código A3D3-AE02-3D5A-C40F.



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº	OBRA: CTP - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	CONTRATO:	RESP. TÉCNICO: LUCIANO XAVIER
ENDEREÇO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA	INÍCIO: 01/04/2023	Nº CREA-MG: 59784/D	
CIDDE:	PRAZO: 01/10/2023	Nº DA ART:	
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA	UF:	COORDENADAS:	
DATA: 19/05/2023	SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA ☔
MANHÃ	✓		IMPRATICÁVEL ☁
TARDE	✓		
QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
1	ENCARREGADO DE OBRAS	2	OPERADOR
4	MOTORISTA	1	PEDREIRO
1	TOPÓGRAFO	3	AJUDANTE
1	SINALEIRO		
QTDE	EQUIPAMENTO		
1	ESCAVADEIRA		
2	VEÍCULO DE APOIO		
1	CAMINHÃO PIPA		
3	CAMINHÃO BASCULANTE		
1	MOTONIVELADORA		
TAREFAS REALIZADAS			
NÚMERO DE T.R.	DESCRIÇÃO	OBSERVAÇÕES	
1	EXECUÇÃO DE BUEIRO	ESTRADA DE ACESSO ENTRE SANTO ANTÔNIO DO GRAMA E ABRE CAMPO	
2	SINALIZAÇÃO	ESTRADA DE ACESSO ENTRE SANTO ANTÔNIO DO GRAMA E ABRE CAMPO	
3	UMECTAÇÃO	ESTRADA DE ACESSO ENTRE SANTO ANTÔNIO DO GRAMA E ABRE CAMPO	
4	EXCUÇÃO DE BASE	ESTRADA DE ACESSO ENTRE SANTO ANTÔNIO DO GRAMA E ABRE CAMPO	
5	SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO TOPOGRÁFICO	ESTRADA DE ACESSO ENTRE SANTO ANTÔNIO DO GRAMA E ABRE CAMPO	
REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)			

Este documento foi assinado eletronicamente por LUIZ HENRIQUE DA SILVA BORGES e Luciano Xavier de Castro. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.ceris.gn.com.br/443> e utilize o código A3D3-AE02-3D5A-C40F.



Data não informada



Data não informada



Data não informada



Data não informada

Este documento foi assinado eletronicamente por LUIZ HENRIQUE DA SILVA BORGES e Luciano Xavier de Castro.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certsign.com.br:443> e utilize o código A3D3-AE02-3D5A-C40F.



NÚMERO DE OC		TIPO DE OCORRÊNCIA	OCORRÊNCIAS	DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA
EQUIPE E05 18/05/2023			OBSERVAÇÕES	
MUNICÍPIO			CONFERÊNCIA	
Obs.:			CONSÓRCIO (Aprovado)	
			ASSINATURAS	
Luiz Henrique da Silva Borges Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 208579/D		APROVADO AUTOMATICAMENTE PELO SISTEMA PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA CREA 137.103/D		Luciano Xavier de Castro RT de Execução - CONSÓRCIO 3T –SOLOCAP-CONEPP CREA 59784/D

Este documento foi assinado eletronicamente por LUIZ HENRIQUE DA SILVA BORGES e Luciano Xavier de Castro.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.gestis.grt.com.br:443> e utilize o código A3D3-AE02-3D5A-C40F.



CIMVALPI
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL
MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA


RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº	OBRA: CTP - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	CONTRATO:		RESP. TÉCNICO: LUCIANO XAVIER
ENDEREÇO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA		INÍCIO: 01/04/2023		Nº CREA-MG: 59784/D
CIDDE:		PRAZO: 01/10/2023		Nº DA ART:
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA		UF:		COORDENADAS:
DATA: 17/05/2023	SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA ☔	IMPRATICÁVEL ☔
MANHÃ	✓			
TARDE	✓			
QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO		QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
1	ENCARREGADO DE OBRAS		2	OPERADOR
4	MOTORISTA		1	PEDREIRO
1	TOPÓGRAFO		3	AJUDANTE
1	SINALEIRO			
QTDE	EQUIPAMENTO			
1	ESCAVADEIRA			
2	VEÍCULO DE APOIO			
1	CAMINHÃO PIPA			
3	CAMINHÃO BASCULANTE			
1	MOTONIVELADORA			
TAREFAS REALIZADAS				
NÚMERO DE T.R.	DESCRICAÇÃO	OBSERVAÇÕES		
1	SINALIZAÇÃO	ESTRADA DE ACESSO ENTRE SANTO ANTÔNIO DO GRAMA E ABRE CAMPO		
2	RECEBIMENTO DE MATERIAL	(MANILHAS) ESTRADA DE ACESSO ENTRE SANTO ANTÔNIO DO GRAMA E ABRE CAMPO		
3	UMECTAÇÃO	ESTRADA DE ACESSO ENTRE SANTO ANTÔNIO DO GRAMA E ABRE CAMPO		
4	EXECUÇÃO DE ATERRO	ESTRADA DE ACESSO ENTRE SANTO ANTÔNIO DO GRAMA E ABRE CAMPO		
5	SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO TOPOGRÁFICO	ESTRADA DE ACESSO ENTRE SANTO ANTÔNIO DO GRAMA E ABRE CAMPO		
6	EXECUÇÃO DE GREIDE	ESTRADA DE ACESSO ENTRE SANTO ANTÔNIO DO GRAMA E ABRE CAMPO		
REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)				

Este documento foi assinado eletronicamente por LUIZ HENRIQUE DA SILVA BORGES e Luciano Xavier de Castro. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.ceris.gn.com.br/443> e utilize o código A3D3-AE02-3D5A-C40F.



Data não informada

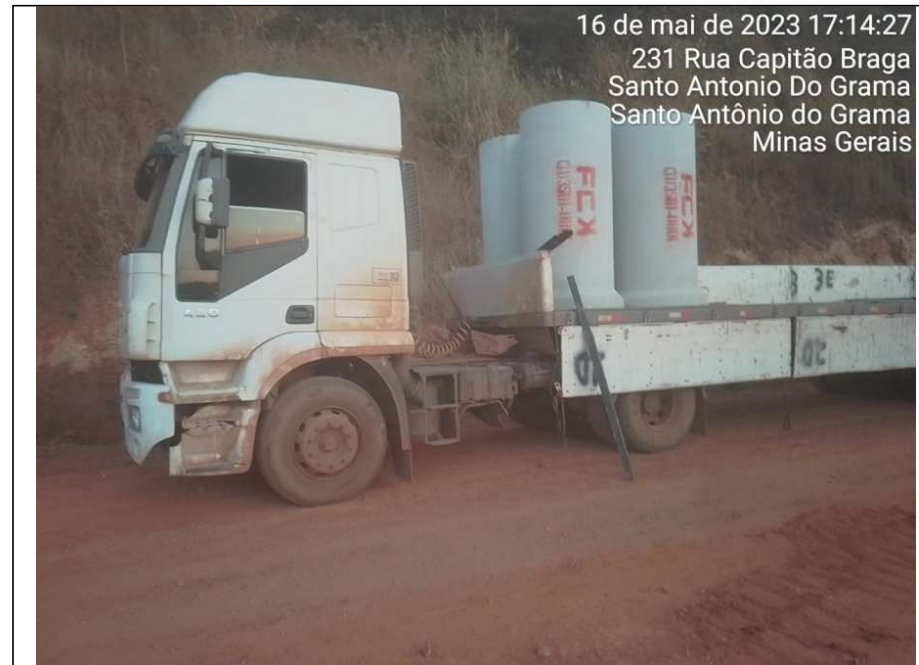

Data não informada



Data não informada



Data não informada

Este documento foi assinado eletronicamente por LUIZ HENRIQUE DA SILVA BORGES e Luciano Xavier de Castro.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certsign.com.br:443> e utilize o código A3D3-AE02-3D5A-C40F.



NÚMERO DE OC		TIPO DE OCORRÊNCIA	OCORRÊNCIAS	DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA
EQUIPE E05 16/05/2023			OBSERVAÇÕES	
MUNICÍPIO			CONFERÊNCIA	
Obs.:			CONSÓRCIO (Aprovado)	Obs.: *Equipe de topografia - Nivel. e Jcação - Est. 01 a 09 *Limpeza rampa e corte - Est. 05 a 12 *Aplicação material (Est. 02 a Est. 03), restante material aplicado na bifurcação para Rio Casca, e alocado no Bota Fora.
			ASSINATURAS	
Luiz Henrique da Silva Borges Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 208579/D		APROVADO AUTOMATICAMENTE PELO SISTEMA PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA CREA 137.103/D		Luciano Xavier de Castro RT de Execução - CONSÓRCIO 3T -SOLOCAP-CONEP CREA 59784/D


Este documento foi assinado eletronicamente por LUIZ HENRIQUE DA SILVA BORGES e Luciano Xavier de Castro.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.gestis.gm.com.br:443> e utilize o código A3D3-AE02-3D5A-C40F.



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº	OBRA: CTP - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	CONTRATO:	RESP. TÉCNICO: LUCIANO XAVIER
ENDEREÇO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA	INÍCIO: 01/04/2023	Nº CREA-MG: 59784/D	
CIDDE:	PRAZO: 01/10/2023	Nº DA ART:	
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA	UF:	COORDENADAS:	
DATA: 16/05/2023	SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA ☔
MANHÃ	✓		IMPRATICÁVEL ☔
TARDE	✓		
QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
1	ENCARREGADO DE OBRAS	2	OPERADOR
4	MOTORISTA	1	PEDREIRO
1	TOPÓGRAFO	3	AJUDANTE
1	SINALEIRO		
QTDE	EQUIPAMENTO		
1	ESCAVADEIRA		
1	VEÍCULO DE APOIO		
1	CAMINHÃO PIPA		
3	CAMINHÃO BASCULANTE		
1	MOTONIVELADORA		
TAREFAS REALIZADAS			
NÚMERO DE T.R.	DESCRIÇÃO	OBSERVAÇÕES	
1	SINALIZAÇÃO	ESTRADA DE ACESSO ENTRE SANTO ANTÔNIO DO GRAMA E ABRE CAMPO	
2	EXECUÇÃO DE CORTE	ESTRADA DE ACESSO ENTRE SANTO ANTÔNIO DO GRAMA E ABRE CAMPO	
3	SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO TOPOGRÁFICO	ESTRADA DE ACESSO ENTRE SANTO ANTÔNIO DO GRAMA E ABRE CAMPO	
4	UMECTAÇÃO	ESTRADA DE ACESSO ENTRE SANTO ANTÔNIO DO GRAMA E ABRE CAMPO	
5	EXECUÇÃO DE ATERRO	ESTRADA DE ACESSO ENTRE SANTO ANTÔNIO DO GRAMA E ABRE CAMPO	
REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)			

Este documento foi assinado eletronicamente por LUIZ HENRIQUE DA SILVA BORGES e Luciano Xavier de Castro. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.ceris.gn.com.br/443> e utilize o código A3D3-AE02-3D5A-C40F.



OCORRÊNCIAS	
NÚMERO DE OC	TIPO DE OCORRÊNCIA
DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA	
OBSERVAÇÕES	
EQUIPE E05 15/05/2023	
CONFERÊNCIA	
MUNICÍPIO	CONSÓRCIO (Aprovado)
Obs.:	Obs.: *Rampa est. 01 a 07 *Material rampa para bota fora. *Topografia nivelamento locação est. 106 a 125. *Necessário melhor a sinalização nos locais de trabalho, e os pontos que antecedem.
ASSINATURAS	
Luiz Henrique da Silva Borges Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 208579/D	APROVADO AUTOMATICAMENTE PELO SISTEMA PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA CREA 137.103/D
Luciano Xavier de Castro RT de Execução - CONSÓRCIO 3T -SOLOCAP-CONEP CREA 59784/D	

Este documento foi assinado eletronicamente por LUIZ HENRIQUE DA SILVA BORGES e Luciano Xavier de Castro.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certsign.com.br:443> e utilize o código A3D3-AE02-3D5A-C40F



CIMVALPI
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL
MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº	OBRA: CTP - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	CONTRATO:	RESP. TÉCNICO: LUCIANO XAVIER
ENDEREÇO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA	INÍCIO: 01/04/2023	Nº CREA-MG: 59784/D	
CIDDE:	PRAZO: 01/10/2023	Nº DA ART:	
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA	UF:	COORDENADAS:	
DATA: 15/05/2023	SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA ☔
MANHÃ	✓		IMPRATICÁVEL ☔
TARDE	✓		
QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
1	ENCARREGADO DE OBRAS	2	OPERADOR
3	MOTORISTA	1	TOPÓGRAFO
1	AJUDANTE	1	SINALEIRO
QTDE	EQUIPAMENTO		
2	ESCAVADEIRA		
2	VEÍCULO DE APOIO		
1	CAMINHÃO PIPA		
2	CAMINHÃO BASCULANTE		
1	MOTONIVELADORA		
TAREFAS REALIZADAS			
NÚMERO DE T.R.	DESCRIÇÃO	OBSERVAÇÕES	
1	SINALIZAÇÃO	ESTRADA DE ACESSO ENTRE SANTO ANTÔNIO DO GRAMA E ABRE CAMPO	
2	EXECUÇÃO DE RAMPA	ESTRADA DE ACESSO ENTRE SANTO ANTÔNIO DO GRAMA E ABRE CAMPO	
3	SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO TOPOGRÁFICO	ESTRADA DE ACESSO ENTRE SANTO ANTÔNIO DO GRAMA E ABRE CAMPO	
4	UMECTAÇÃO	ESTRADA DE ACESSO ENTRE SANTO ANTÔNIO DO GRAMA E ABRE CAMPO	
5	EXECUÇÃO DE ATERRO	ESTRADA DE ACESSO ENTRE SANTO ANTÔNIO DO GRAMA E ABRE CAMPO	
REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)			

Este documento foi assinado eletronicamente por LUIZ HENRIQUE DA SILVA SOARES e Luciano Xavier de Castro. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certis.org.br/443 e utilize o código A3D3-AE02-3D5A-C40F.



12 de mai de 2023 12:40:05
230 Rua Capitão Braga
Santo Antonio Do Grama
Santo Antônio do Grama
Minas Gerais

Data não informada



12 de mai de 2023 12:28:13
230 Rua Capitão Braga
Santo Antonio Do Grama
Santo Antônio do Grama
Minas Gerais

Data não informada



12 de mai de 2023 10:58:55
230 Rua Capitão Braga
Santo Antonio Do Grama
Santo Antônio do Grama
Minas Gerais

Data não informada



12 de mai de 2023 12:38:53
230 Rua Capitão Braga
Santo Antonio Do Grama
Santo Antônio do Grama
Minas Gerais

Data não informada

Este documento foi assinado eletronicamente por LUIZ HENRIQUE DA SILVA BORGES e Luciano Xavier de Castro.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certsign.com.br:443> e utilize o código A3D3-AE02-3D5A-C40F.



NÚMERO DE OC		OCORRÊNCIAS	
TIPO DE OCORRÊNCIA		DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA	
OBSERVAÇÕES			
EQUIPE E05 12/05/2023			
MUNICÍPIO		CONFERÊNCIA	
		CONSÓRCIO (Aprovado)	
Obs.:		Obs.: * Pouca sinalização nos trechos de intervenção. * Rampa est. 03 a 08. * Somente 01 escavadeira.	
ASSINATURAS			
Luiz Henrique da Silva Borges Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 208579/D		APROVADO AUTOMATICAMENTE PELO SISTEMA PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA CREA 137.103/D	
		Luciano Xavier de Castro RT de Execução - CONSÓRCIO 3T –SOLOCAP-CONEPP CREA 59784/D	

Este documento foi assinado eletronicamente por LUIZ HENRIQUE DA SILVA BORGES e Luciano Xavier de Castro.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.cerisign.com.br:443> e utilize o código A3D3-AE02-3D5A-C40F.



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº	OBRA: CTP - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	CONTRATO:	RESP. TÉCNICO: LUCIANO XAVIER
ENDEREÇO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA	INÍCIO: 01/04/2023	Nº CREA-MG: 59784/D	
CIDDE:	PRAZO: 01/10/2023	Nº DA ART:	
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA	UF:	COORDENADAS:	
DATA: 12/05/2023	SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA ☔
MANHÃ	✓		IMPRATICÁVEL ☔
TARDE	✓		
QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
1	ENCARREGADO DE OBRAS	2	OPERADOR
3	MOTORISTA	1	TOPÓGRAFO
1	AJUDANTE	1	SINALEIRO
QTDE	EQUIPAMENTO		
2	ESCAVADEIRA		
2	VEÍCULO DE APOIO		
1	CAMINHÃO PIPA		
2	CAMINHÃO BASCULANTE		
1	MOTONIVELADORA		
TAREFAS REALIZADAS			
NÚMERO DE T.R.	DESCRIÇÃO	OBSERVAÇÕES	
1	EXECUÇÃO DE SUBLEITO	ESTRADA DE ACESSO ENTRE SANTO ANTÔNIO DO GRAMA E ABRE CAMPO	
2	UMECTAÇÃO	ESTRADA DE ACESSO ENTRE SANTO ANTÔNIO DO GRAMA E ABRE CAMPO	
3	SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO TOPOGRÁFICO	ESTRADA DE ACESSO ENTRE SANTO ANTÔNIO DO GRAMA E ABRE CAMPO	
4	EXECUÇÃO DE CERCA	ESTRADA DE ACESSO ENTRE SANTO ANTÔNIO DO GRAMA E ABRE CAMPO	
5	EXECUÇÃO DE RAMPA	ESTRADA DE ACESSO ENTRE SANTO ANTÔNIO DO GRAMA E ABRE CAMPO	
6	EXECUÇÃO DE CAMADA DE REFORÇO	ESTRADA DE ACESSO ENTRE SANTO ANTÔNIO DO GRAMA E ABRE CAMPO	
7	SINALIZAÇÃO	ESTRADA DE ACESSO ENTRE SANTO ANTÔNIO DO GRAMA E ABRE CAMPO	
REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)			

Este documento foi assinado eletronicamente por LUIZ HENRIQUE DA SILVA SOARES e Luciano Xavier de Castro. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certisign.com.br/443> e utilize o código A3D3-AE02-3D5A-C40F.



Este documento foi assinado eletronicamente por LUIZ HENRIQUE DA SILVA BORGES e Luciano Xavier de Castro.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certsign.com.br:443> e utilize o código A3D3-AE02-3D5A-C40F.



NÚMERO DE OC		TIPO DE OCORRÊNCIA	OCORRÊNCIAS	DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA
			OBSERVAÇÕES	
EQUIPE E05 11/05/2023				
MUNICÍPIO (Aprovado)		CONFERÊNCIA		
		CONSÓRCIO (Aprovado)		
Obs.:		Obs.: * Pouca Sinalização nos trechos onde tem intervenção. * Somente 01 escavadeira trabalhando. * Corte na Est. 73 a 75. * Aterro Est. 27 a 38. * Material de corte que sobrou foi alocado na entrada da pedreira. * Regularização da Est. 15 a 24.		
ASSINATURAS				
_____ Luiz Henrique da Silva Borges Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 208579/D		_____ APROVADO AUTOMATICAMENTE PELO SISTEMA PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA CREA 137.103/D		_____ Luciano Xavier de Castro RT de Execução - CONSÓRCIO 3T –SOLOCAP-CONEP CREA 59784/D

Este documento foi assinado eletronicamente por LUIZ HENRIQUE DA SILVA BORGES e Luciano Xavier de Castro. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.gestis.gm.com.br:443> e utilize o código A3D3-AE02-3D5A-C40F.



CIMVALPI
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL
MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº	OBRA: CTP - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	CONTRATO:	RESP. TÉCNICO: LUCIANO XAVIER
ENDEREÇO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA	INÍCIO: 01/04/2023	Nº CREA-MG: 59784/D	
CIDDE:	PRAZO: 01/10/2023	Nº DA ART:	
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA	UF:	COORDENADAS:	
DATA: 11/05/2023	SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA ☔
MANHÃ	✓		IMPRATICÁVEL ☔
TARDE	✓		
QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
1	ENCARREGADO DE OBRAS	2	OPERADOR
3	MOTORISTA	1	TOPÓGRAFO
1	AJUDANTE	1	SINALEIRO
QTDE	EQUIPAMENTO		
1	ESCAVADEIRA		
2	VEÍCULO DE APOIO		
1	CAMINHÃO PIPA		
2	CAMINHÃO BASCULANTE		
1	MOTONIVELADORA		
TAREFAS REALIZADAS			
NÚMERO DE T.R.	DESCRIÇÃO	OBSERVAÇÕES	
1	UMECTAÇÃO	ESTRADA DE ACESSO ENTRE SANTO ANTÔNIO DO GRAMA E ABRE CAMPO	
2	SINALIZAÇÃO	ESTRADA DE ACESSO ENTRE SANTO ANTÔNIO DO GRAMA E ABRE CAMPO	
3	EXECUÇÃO DE CERCA	ESTRADA DE ACESSO ENTRE SANTO ANTÔNIO DO GRAMA E ABRE CAMPO	
4	SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO TOPOGRÁFICO	ESTRADA DE ACESSO ENTRE SANTO ANTÔNIO DO GRAMA E ABRE CAMPO	
5	EXECUÇÃO DE SUB-BASE	ESTRADA DE ACESSO ENTRE SANTO ANTÔNIO DO GRAMA E ABRE CAMPO	
6	EXECUÇÃO DE SUBLEITO	ESTRADA DE ACESSO ENTRE SANTO ANTÔNIO DO GRAMA E ABRE CAMPO	
REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)			

Este documento foi assinado eletronicamente por LUIZ HENRIQUE DA SILVA SOARES e Luciano Xavier de Castro. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certis.br/ e utilize o código A3D3-AE02-3D5A-C40F.



Data não informada



Data não informada



Data não informada



Data não informada

Este documento foi assinado eletronicamente por LUIZ HENRIQUE DA SILVA BORGES e Luciano Xavier de Castro.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certsign.com.br:443> e utilize o código A3D3-AE02-3D5A-C40F.



NÚMERO DE OC		TIPO DE Ocorrência	DESCRIÇÃO DA Ocorrência
EQUIPE E05 10/05/2023		Ocorrências	
Município		CONSORCIO (Aprovado)	
Obs.:		Obs.: * Necessita melhorar a sinalização que antecede as máquinas trabalhando, informando obra a 300m, 100m, 50m, quase houve um acidente com um motociclista próximo a um equipamento que estava trabalhando sem sinalização. * Atividades - Corte nas estacas 73 a 75 Aterro nas estacas 76 a 85, 56 a 80, 29 a 36. * Forração com cascalho estaca 76 a 84 (camada 7cm aproximado).	
Luiz Henrique da Silva Borges Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 208579/D		APROVADO AUTOMATICAMENTE PELO SISTEMA PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA CREA 137.103/D	
		Luciano Xavier de Castro RT de Execução - CONSÓRCIO 3T –SOLOCAP-CONEP CREA 59784/D	

Este documento foi assinado eletronicamente por LUIZ HENRIQUE DA SILVA BORGES e Luciano Xavier de Castro. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.ceritis.grn.com.br:443> e utilize o código A3D3-AE02-3D5A-C40F.



CIMVALPI
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL
MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº	OBRA: CTP - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	CONTRATO:	RESP. TÉCNICO: LUCIANO XAVIER
ENDEREÇO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA	INÍCIO: 01/04/2023	Nº CREA-MG: 59784/D	
CIDDE:	PRAZO: 01/10/2023	Nº DA ART:	
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA	UF:	COORDENADAS:	
DATA: 10/05/2023	SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA ☔
MANHÃ	✓		IMPRATICÁVEL ☔
TARDE	✓		
QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
1	ENCARREGADO DE OBRAS	2	MOTORISTA
1	TOPÓGRAFO	1	AJUDANTE
1	SINALEIRO		
QTDE	EQUIPAMENTO		
2	ESCAVADEIRA		
2	VEÍCULO DE APOIO		
1	CAMINHÃO PIPA		
2	CAMINHÃO BASCULANTE		
1	MOTONIVELADORA		
TAREFAS REALIZADAS			
NÚMERO DE T.R.	DESCRIÇÃO	OBSERVAÇÕES	
1	SINALIZAÇÃO	ESTRADA DE ACESSO ENTRE SANTO ANTÔNIO DO GRAMA E ABRE CAMPO	
2	LIMPEZA	ESTRADA DE ACESSO ENTRE SANTO ANTÔNIO DO GRAMA E ABRE CAMPO	
3	EXECUÇÃO DE RAMPA	ESTRADA DE ACESSO ENTRE SANTO ANTÔNIO DO GRAMA E ABRE CAMPO	
4	UMECTAÇÃO	ESTRADA DE ACESSO ENTRE SANTO ANTÔNIO DO GRAMA E ABRE CAMPO	
5	SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO TOPOGRÁFICO	ESTRADA DE ACESSO ENTRE SANTO ANTÔNIO DO GRAMA E ABRE CAMPO	
6	EXECUÇÃO DE CERCA	ESTRADA DE ACESSO ENTRE SANTO ANTÔNIO DO GRAMA E ABRE CAMPO	
7	EXECUÇÃO DE SUBLEITO	ESTRADA DE ACESSO ENTRE SANTO ANTÔNIO DO GRAMA E ABRE CAMPO	
REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)			

Este documento foi assinado eletronicamente por LUIZ HENRIQUE DA SILVA SOARES e Luciano Xavier de Castro. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certis.br/assinaturas.ceris.br/443> e utilize o código A3D3-AE02-3D5A-C40F.



Data não informada



Data não informada



Data não informada



Data não informada



NÚMERO DE OC		TIPO DE OCORRÊNCIA	OCORRÊNCIAS	DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA
EQUIPE E05 09/05/2023			OBSERVAÇÕES	
MUNICÍPIO			CONFERÊNCIA	
Obs.:			CONSÓRCIO (Aprovado)	
			Obs.: * Cerca das estacas 27 a 38 * Pouca sinalização de segurança. * Falta placa de obra. * Locação do eixo da topografia estaca 50 a 100	
ASSINATURAS				
Luiz Henrique da Silva Borges Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 208579/D		APROVADO AUTOMATICAMENTE PELO SISTEMA PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA CREA 137.103/D		Luciano Xavier de Castro RT de Execução - CONSÓRCIO 3T –SOLOCAP-CONEP CREA 59784/D

Este documento foi assinado eletronicamente por LUIZ HENRIQUE DA SILVA BORGES e LUCIANO XAVIER DE CASTRO. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinturaturas.gntis.gr.com.br:443> e utilize o código A3D3-AE02-3D5A-C40F.



CIMVALPI
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL
MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº	OBRA: CTP - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	CONTRATO:	RESP. TÉCNICO: LUCIANO XAVIER
ENDEREÇO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA	INÍCIO: 01/04/2023	Nº CREA-MG: 59784/D	
CIDDE:	PRAZO: 01/10/2023	Nº DA ART:	
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA	UF:	COORDENADAS:	
DATA: 10/05/2023	SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA ☔
MANHÃ	✓		IMPRATICÁVEL ☔
TARDE	✓		
QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
1	ENCARREGADO DE OBRAS	2	OPERADOR
3	MOTORISTA	1	TOPÓGRAFO
3	AJUDANTE	2	SINALEIRO
QTDE	EQUIPAMENTO		
2	ESCAVADEIRA		
1	VEÍCULO DE APOIO		
1	CAMINHÃO PIPA		
2	CAMINHÃO BASCULANTE		
1	MOTONIVELADORA		
TAREFAS REALIZADAS			
NÚMERO DE T.R.	DESCRIÇÃO	OBSERVAÇÕES	
1	SUPRESSÃO VEGETAL	ESTRADA DE ACESSO ENTRE SANTO ANTÔNIO DO GRAMA E ABRE CAMPO	
2	SINALIZAÇÃO	ESTRADA DE ACESSO ENTRE SANTO ANTÔNIO DO GRAMA E ABRE CAMPO	
3	SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO TOPOGRÁFICO	ESTRADA DE ACESSO ENTRE SANTO ANTÔNIO DO GRAMA E ABRE CAMPO	
4	ABERTURA DE PISTA	ESTRADA DE ACESSO ENTRE SANTO ANTÔNIO DO GRAMA E ABRE CAMPO	
5	UMECTAÇÃO	ESTRADA DE ACESSO ENTRE SANTO ANTÔNIO DO GRAMA E ABRE CAMPO	
REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)			

Este documento foi assinado eletronicamente por LUIZ HENRIQUE DA SILVA SOARES e Luciano Xavier de Castro. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assnaturas.ceris.br/ e utilize o código A3D3-AE02-3D5A-C40F.



5 de mai de 2023 09:22:57
230 Rua Capitão Braga
Santo Antonio Do Grama
Santo Antônio do Grama
Minas Gerais

Data não informada



5 de mai de 2023 09:20:58
Estrada sem nome
Santo Antônio do Grama
Minas Gerais

Data não informada



5 de mai de 2023 09:22:57
230 Rua Capitão Braga
Santo Antonio Do Grama
Santo Antônio do Grama
Minas Gerais

Data não informada



5 de mai de 2023 14:18:47
230 Rua Capitão Braga
Santo Antonio Do Grama
Santo Antônio do Grama
Minas Gerais

Data não informada

OCORRÊNCIAS		
NÚMERO DE OC	TIPO DE OCORRÊNCIA	DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA
OBSERVAÇÕES		
EQUIPE E05 05/05/2023		
CONFERÊNCIA		
MUNICÍPIO	CONSÓRCIO (Aprovado)	
Obs.:	Obs.: * Somente 01 Escavadeira na obra, que parou as 15:30, problema mecânico. * Patrol começou a trabalhar apartir das 15:30 hrs * Equipe de topografia locação do eixo 78 a 100 * Limpeza na via Estaca 050 a 073 * Mudança cerca estaca 36 a 42 total (120mts) * Pouca sinalização na obra. * Falta da placa de obra.	
ASSINATURAS		
Luiz Henrique da Silva Borges Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 208579/D	APROVADO AUTOMATICAMENTE PELO SISTEMA PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA CREA 137.103/D	Luciano Xavier de Castro RT de Execução - CONSÓRCIO 3T -SOLOCAP-CONEP CREA 59784/D

Este documento foi assinado eletronicamente por LUIZ HENRIQUE DA SILVA BORGES e Luciano Xavier de Castro.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certsign.com.br:443> e utilize o código A3D3-AE02-3D5A-C40F.



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL
MULTISSECTORIAL DO VALE DO PIRANGA

Este documento foi assinado eletronicamente por LUIZ HENRIQUE DA SILVA SOARES e Luciano Xavier de Castro. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certicon.com.br/443> e utilize o código A3D3-AE02-3D5A-C40F.

Este documento foi assinado eletronicamente por LUIZ HENRIQUE DA SILVA SOARES e Luciano Xavier de Castro. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certicon.com.br/443> e utilize o código A3D3-AE02-3D5A-C40F.



Data não informada



Data não informada



Data não informada

OCORRÊNCIAS		
NÚMERO DE OC	TIPO DE OCORRÊNCIA	DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA
OBSERVAÇÕES		
EQUIPE E05 06/05/2023		
CONFERÊNCIA		
MUNICÍPIO	CONSÓRCIO (Aprovado)	
Obs.:	Obs.: *Falta da Placa de obra. *Pouca sinalização de segurança.	
ASSINATURAS		
Luiz Henrique da Silva Borges Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 208579/D	APROVADO AUTOMATICAMENTE PELO SISTEMA PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA CREA 137.103/D	Luciano Xavier de Castro RT de Execução - CONSÓRCIO 3T –SOLOCAP-CONEP CREA 59784/D

Este documento foi assinado eletronicamente por LUIZ HENRIQUE DA SILVA BORGES e Luciano Xavier de Castro.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certsign.com.br:443> e utilize o código A3D3-AE2-3D5A-C40F.




CIMVALPI
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL
MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº	OBRA: CTP - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	CONTRATO:	RESP. TÉCNICO: LUCIANO XAVIER
ENDEREÇO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA	INÍCIO: 01/04/2023	Nº CREA-MG: 59784/D	
CIDDE:	PRAZO: 01/10/2023	Nº DA ART:	
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA	UF:	COORDENADAS:	
DATA: 09/05/2023	SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA ☔
MANHÃ	✓		IMPRATICÁVEL ☔
TARDE	✓		
QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
1	ENCARREGADO DE OBRAS	2	OPERADOR
3	MOTORISTA	1	TOPÓGRAFO
3	AJUDANTE	2	SINALEIRO
QTDE	EQUIPAMENTO		
2	ESCAVADEIRA		
1	VEÍCULO DE APOIO		
1	CAMINHÃO PIPA		
2	CAMINHÃO BASCULANTE		
1	MOTONIVELADORA		
TAREFAS REALIZADAS			
NÚMERO DE T.R.	DESCRIÇÃO	OBSERVAÇÕES	
1	UMECTAÇÃO	ESTRADA DE ACESSO ENTRE SANTO ANTÔNIO DO GRAMA E ABRE CAMPO	
2	SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO TOPOGRÁFICO	ESTRADA DE ACESSO ENTRE SANTO ANTÔNIO DO GRAMA E ABRE CAMPO	
3	LIMPEZA	ESTRADA DE ACESSO ENTRE SANTO ANTÔNIO DO GRAMA E ABRE CAMPO	
4	EXECUÇÃO DE GREIDE	ESTRADA DE ACESSO ENTRE SANTO ANTÔNIO DO GRAMA E ABRE CAMPO	
5	SINALIZAÇÃO	ESTRADA DE ACESSO ENTRE SANTO ANTÔNIO DO GRAMA E ABRE CAMPO	
6	ABERTURA DE PISTA	ESTRADA DE ACESSO ENTRE SANTO ANTÔNIO DO GRAMA E ABRE CAMPO	
REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)			

Este documento foi assinado eletronicamente por LUIZ HENRIQUE DA SILVA SOARES e Luciano Xavier de Castro. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certis.br/assinaturas> ou utilize o código A3D3-AE02-3D5A-C40F.



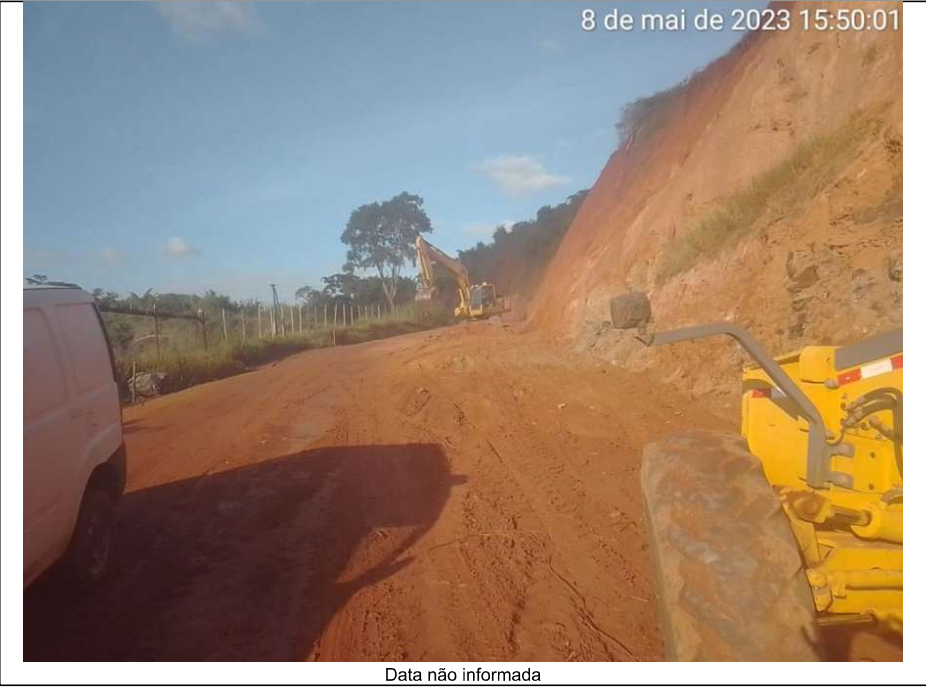

NÚMERO DE OC		TIPO DE OCORRÊNCIA	OCORRÊNCIAS	DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA
EQUIPE E05 08/05/2023			OBSERVAÇÕES	
MUNICÍPIO			CONFERÊNCIA	
Obs.:			CONSÓRCIO (Aprovado)	
				Obs.: * Somente 01 escavadeira trabalhando * Limpeza da estaca 58 a 81. * Regularização Estaca 43 a 52. * Topografia locação da estaca 100 a 123. * Falta placa de obra * Pouca sinalização de segurança.
ASSINATURAS				
Luiz Henrique da Silva Borges Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 208579/D		APROVADO AUTOMATICAMENTE PELO SISTEMA PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA CREA 137.103/D		Luciano Xavier de Castro RT de Execução - CONSÓRCIO 3T –SOLOCAP-CONEP CREA 59784/D

Este documento foi assinado eletronicamente por LUIZ HENRIQUE DA SILVA BORGES e LUCIANO XAVIER DE CASTRO. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.gestis.grp.com.br:443> e utilize o código A3D3-AE02-3D5A-C40F.



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº	OBRA: CTP - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	CONTRATO:	RESP. TÉCNICO: LUCIANO XAVIER
ENDEREÇO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA	INÍCIO: 01/04/2023	Nº CREA-MG: 59784/D	
CIDDE:	PRAZO: 01/10/2023	Nº DA ART:	
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA	UF:	COORDENADAS:	
DATA: 05/05/2023	SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA ☔
MANHÃ	✓		IMPRATICÁVEL ☔
TARDE	✓		
QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
1	ENCARREGADO DE OBRAS	2	OPERADOR
3	MOTORISTA	1	TOPÓGRAFO
3	AJUDANTE	2	SINALEIRO
QTDE	EQUIPAMENTO		
2	ESCAVADEIRA		
1	VEÍCULO DE APOIO		
1	CAMINHÃO PIPA		
2	CAMINHÃO BASCULANTE		
1	MOTONIVELADORA		
TAREFAS REALIZADAS			
NÚMERO DE T.R.	DESCRIÇÃO	OBSERVAÇÕES	
1	EXECUÇÃO DE ATERRO	ESTRADA DE ACESSO ENTRE SANTO ANTÔNIO DO GRAMA E ABRE CAMPO	
2	TRANSPORTE DE MATERIAL	ESTRADA DE ACESSO ENTRE SANTO ANTÔNIO DO GRAMA E ABRE CAMPO	
3	UMECTAÇÃO	ESTRADA DE ACESSO ENTRE SANTO ANTÔNIO DO GRAMA E ABRE CAMPO	
4	LIMPEZA MECÂNICA	ESTRADA DE ACESSO ENTRE SANTO ANTÔNIO DO GRAMA E ABRE CAMPO	
5	SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO TOPOGRÁFICO	ESTRADA DE ACESSO ENTRE SANTO ANTÔNIO DO GRAMA E ABRE CAMPO	
6	SINALIZAÇÃO	ESTRADA DE ACESSO ENTRE SANTO ANTÔNIO DO GRAMA E ABRE CAMPO	
7	TRATAMENTO DE SUBLEITO	ESTRADA DE ACESSO ENTRE SANTO ANTÔNIO DO GRAMA E ABRE CAMPO	
REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)			

Este documento foi assinado eletronicamente por LUIZ HENRIQUE DA SILVA SOARES e Luciano Xavier de Castro. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certisign.com.br/443> e utilize o código A3D3-AE02-3D5A-C40F.



Data não informada



Data não informada



Data não informada



Data não informada



NÚMERO DE OC		TIPO DE OCORRÊNCIA		OCORRÊNCIAS		DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA	
EQUIPE E05 04/05/2023				OBSERVAÇÕES			
MUNICÍPIO				CONFERÊNCIA			
CONSÓRCIO (Aprovado)				Obs.: * Equipe de topografia ausente. * 1 Escavadeira parada em manutenção. * Placa de obra ate o presente momento não esta no local. * Podem ser solicitados materiais, certificar.			
Obs.:				Assinaturas			
Luiz Henrique da Silva Borges Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 208579/D		APROVADO AUTOMATICAMENTE PELO SISTEMA PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA CREA 137.103/D		Luciano Xavier de Castro RT de Execução - CONSÓRCIO 3T –SOLOCAP-CONEPP CREA 59784/D			



CIMVALPI
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL
MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº	OBRA: CTP - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	CONTRATO:	RESP. TÉCNICO: LUCIANO XAVIER
ENDEREÇO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA	INÍCIO: 01/04/2023	Nº CREA-MG: 59784/D	
CIDDE:	PRAZO: 01/10/2023	Nº DA ART:	
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA	UF:	COORDENADAS:	
DATA: 04/05/2023	SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA ☔
MANHÃ	✓		IMPRATICÁVEL ☁
TARDE	✓		
QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
1	ENCARREGADO DE OBRAS	2	OPERADOR
3	MOTORISTA	1	TOPÓGRAFO
3	AJUDANTE	2	SINALEIRO
QTDE	EQUIPAMENTO		
2	ESCAVADEIRA		
1	VEÍCULO DE APOIO		
1	CAMINHÃO PIPA		
2	CAMINHÃO BASCULANTE		
1	MOTONIVELADORA		
TAREFAS REALIZADAS			
NÚMERO DE T.R.	DESCRIÇÃO	OBSERVAÇÕES	
1	TRANSPORTE DE MATERIAL	ESTRADA DE ACESSO ENTRE SANTO ANTÔNIO DO GRAMA E ABRE CAMPO	
2	SINALIZAÇÃO	ESTRADA DE ACESSO ENTRE SANTO ANTÔNIO DO GRAMA E ABRE CAMPO	
3	SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO TOPOGRÁFICO	ESTRADA DE ACESSO ENTRE SANTO ANTÔNIO DO GRAMA E ABRE CAMPO	
4	UMECTAÇÃO	ESTRADA DE ACESSO ENTRE SANTO ANTÔNIO DO GRAMA E ABRE CAMPO	
5	EXECUÇÃO DE ATERRO	ESTRADA DE ACESSO ENTRE SANTO ANTÔNIO DO GRAMA E ABRE CAMPO	
6	TRATAMENTO DE SUBLEITO	ESTRADA DE ACESSO ENTRE SANTO ANTÔNIO DO GRAMA E ABRE CAMPO	
REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)			

Este documento foi assinado eletronicamente por LUIZ HENRIQUE DA SILVA SOARES e Luciano Xavier de Castro. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinturp.ceris.org.br/assinturp> e utilize o código A3D3-AE02-3D5A-C40F.



Data não informada



Data não informada



Data não informada



Data não informada

Este documento foi assinado eletronicamente por LUIZ HENRIQUE DA SILVA BORGES e Luciano Xavier de Castro.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certsig.com.br:443> e utilize o código A3D3-AE02-3D5A-C40F.



NÚMERO DE OC		OCORRÊNCIAS	
TIPO DE OCORRÊNCIA		DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA	
OBSERVAÇÕES			
EQUIPE E05 03/05/2023			
CONFERÊNCIA			
MUNICÍPIO		CONSÓRCIO (Aprovado)	
Obs.:		Obs.: Conforme realizado em campo.	
ASSINATURAS			
Luiz Henrique da Silva Borges Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 208579/D		APROVADO AUTOMATICAMENTE PELO SISTEMA PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA CREA 137.103/D	
		Luciano Xavier de Castro RT de Execução - CONSÓRCIO 3T –SOLOCAP-CONEPP CREA 59784/D	

Este documento foi assinado eletronicamente por LUIZ HENRIQUE DA SILVA BORGES e Luciano Xavier de Castro.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.gestis.org.com.br:443> e utilize o código A3D3-AE02-3D5A-C40F.



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº	OBRA: CTP - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	CONTRATO:	RESP. TÉCNICO: LUCIANO XAVIER
ENDEREÇO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA	INÍCIO: 01/04/2023	Nº CREA-MG: 59784/D	
CIDDE:	PRAZO: 01/10/2023	Nº DA ART:	
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA	UF:	COORDENADAS:	
DATA: 03/05/2023	SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA ☔
MANHÃ	✓		IMPRATICÁVEL ☁
TARDE		✓	
QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
1	ENCARREGADO DE OBRAS	2	OPERADOR
1	TOPÓGRAFO		
QTDE	EQUIPAMENTO		
2	ESCAVADEIRA		
1	VEÍCULO DE APOIO		
1	CAMINHÃO PIPA		
2	CAMINHÃO BASCULANTE		
1	MOTONIVELADORA		
TAREFAS REALIZADAS			
NÚMERO DE T.R.	DESCRICAO	OBSERVAÇÕES	
1	TRANSPORTE DE MATERIAL PARA BOTA FORA	ESTRADA DE ACESSO ENTRE SANTO ANTÔNIO DO GRAMA E ABRE CAMPO	
2	EXECUÇÃO DE RAMPA	ESTRADA DE ACESSO ENTRE SANTO ANTÔNIO DO GRAMA E ABRE CAMPO	
3	SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO TOPOGRÁFICO	ESTRADA DE ACESSO ENTRE SANTO ANTÔNIO DO GRAMA E ABRE CAMPO	
4	SINALIZAÇÃO	ESTRADA DE ACESSO ENTRE SANTO ANTÔNIO DO GRAMA E ABRE CAMPO	
5	TRATAMENTO DE SUBLEITO	ESTRADA DE ACESSO ENTRE SANTO ANTÔNIO DO GRAMA E ABRE CAMPO	
6	EXECUÇÃO DE ATERRO	ESTRADA DE ACESSO ENTRE SANTO ANTÔNIO DO GRAMA E ABRE CAMPO	
REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)			

Este documento foi assinado eletronicamente por LUIZ HENRIQUE DA SILVA BORGES e Luciano Xavier de Castro. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assnaturas.design.com.br/443 e utilize o código A3D3-AE02-3D5A-C40F.





NÚMERO DE OC		TIPO DE OCORRÊNCIA		OCORRÊNCIAS		DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA	
EQUIPE E05 02/05/2023				OBSERVAÇÕES			
				CONFERÊNCIA			
MUNICÍPIO				CONSÓRCIO (Aprovado)			
Obs.:				Obs.: Conforme realizado em campo			
ASSINATURAS							
Luiz Henrique da Silva Borges Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 208579/D		APROVADO AUTOMATICAMENTE PELO SISTEMA PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA CREA 137.103/D		Luciano Xavier de Castro RT de Execução - CONSÓRCIO 3T –SOLOCAP-CONEPP CREA 59784/D			

Este documento foi assinado eletronicamente por LUIZ HENRIQUE DA SILVA BORGES e Luciano Xavier de Castro.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.gestis.org.com.br:443> e utilize o código A3D3-AE02-3D5A-C40F.



CIMVALPI
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL
MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº	OBRA: CTP - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	CONTRATO:	RESP. TÉCNICO: LUCIANO XAVIER
ENDEREÇO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA	INÍCIO: 01/04/2023	Nº CREA-MG: 59784/D	
CIDDE:	PRAZO: 01/10/2023	Nº DA ART:	
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA	UF:	COORDENADAS:	
DATA: 03/05/2023	SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA ☔
MANHÃ	✓		IMPRATICÁVEL ☁
TARDE	✓		
QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
1	ENCARREGADO DE OBRAS	2	OPERADOR
1	TOPÓGRAFO		
QTDE	EQUIPAMENTO		
2	ESCAVADEIRA		
1	VEÍCULO DE APOIO		
1	CAMINHÃO PIPA		
2	CAMINHÃO BASCULANTE		
1	MOTONIVELADORA		
TAREFAS REALIZADAS			
NÚMERO DE T.R.	DESCRICAO	OBSERVAÇÕES	
1	EXECUÇÃO DE ATERRO	ESTRADA DE ACESSO ENTRE SANTO ANTÔNIO DO GRAMA E ABRE CAMPO	
2	SINALIZAÇÃO	ESTRADA DE ACESSO ENTRE SANTO ANTÔNIO DO GRAMA E ABRE CAMPO	
3	SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO TOPOGRÁFICO	ESTRADA DE ACESSO ENTRE SANTO ANTÔNIO DO GRAMA E ABRE CAMPO	
4	TRANSPORTE DE MATERIAL	ESTRADA DE ACESSO ENTRE SANTO ANTÔNIO DO GRAMA E ABRE CAMPO	
5	EXECUÇÃO DE RAMPA	ESTRADA DE ACESSO ENTRE SANTO ANTÔNIO DO GRAMA E ABRE CAMPO	
6	TRATAMENTO DE SUBLEITO	ESTRADA DE ACESSO ENTRE SANTO ANTÔNIO DO GRAMA E ABRE CAMPO	
REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)			

Este documento foi assinado eletronicamente por LUIZ HENRIQUE DA SILVA BORGES e Luciano Xavier de Castro. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.design.com.br/443 e utilize o código A3D3-AE02-3D5A-C40F.



Data não informada



Data não informada



Data não informada



Data não informada



NÚMERO DE OC		TIPO DE OCORRÊNCIA	OCORRÊNCIAS	DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA
EQUIPE E05 01/05/2023			OBSERVAÇÕES	
MUNICÍPIO			CONFERÊNCIA	
Obs.:			CONSÓRCIO (Aprovado)	Obs.: Conforme realizado em campo.
ASSINATURAS				
Luiz Henrique da Silva Borges Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 208579/D		APROVADO AUTOMATICAMENTE PELO SISTEMA PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA CREA 137.103/D		Luciano Xavier de Castro RT de Execução - CONSÓRCIO 3T –SOLOCAP-CONEP CREA 59784/D

Este documento foi assinado eletronicamente por LUIZ HENRIQUE DA SILVA BORGES e Luciano Xavier de Castro.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.gestis.org.com.br:443> e utilize o código A3D3-AE02-3D5A-C40F.



CIMVALPI
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL
MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº	OBRA: CTP - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	CONTRATO:	RESP. TÉCNICO: LUCIANO XAVIER
ENDEREÇO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA	INÍCIO: 01/04/2023	Nº CREA-MG: 59784/D	
CIDDE:	PRAZO: 01/10/2023	Nº DA ART:	
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA	UF:	COORDENADAS:	
DATA: 28/04/2023	SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA ☔
MANHÃ	✓		IMPRATICÁVEL ☁
TARDE			✓
QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
1	ENCARREGADO DE OBRAS	2	OPERADOR
1	TOPÓGRAFO		
QTDE	EQUIPAMENTO		
2	ESCAVADEIRA		
1	VEÍCULO DE APOIO		
1	CAMINHÃO PIPA		
2	CAMINHÃO BASCULANTE		
1	MOTONIVELADORA		
TAREFAS REALIZADAS			
NÚMERO DE T.R.	DESCRICAO	OBSERVAÇÕES	
1	EXECUÇÃO DE RAMPA	ESTRADA DE ACESSO ENTRE SANTO ANTÔNIO DO GRAMA E ABRE CAMPO	
2	MELHORIA DE ACESSOS (DANOS DE CHUVA)	ESTRADA DE ACESSO ENTRE SANTO ANTÔNIO DO GRAMA E ABRE CAMPO	
3	SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO TOPOGRÁFICO	ESTRADA DE ACESSO ENTRE SANTO ANTÔNIO DO GRAMA E ABRE CAMPO	
4	SINALIZAÇÃO	ESTRADA DE ACESSO ENTRE SANTO ANTÔNIO DO GRAMA E ABRE CAMPO	
5	TRANSPORTE DE MATERIAL	ESTRADA DE ACESSO ENTRE SANTO ANTÔNIO DO GRAMA E ABRE CAMPO	
REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)			

Este documento foi assinado eletronicamente por LUIZ HENRIQUE DA SILVA BORGES e Luciano Xavier de Castro. Para verificar as assinaturas vá ao site https://as-sinaturas.design.com.br/443 e utilize o código A3D3-AE02-3D5A-C40F.



Data não informada



Data não informada



Data não informada



Data não informada

Este documento foi assinado eletronicamente por LUIZ HENRIQUE DA SILVA BORGES e Luciano Xavier de Castro.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certsig.com.br:443> e utilize o código A3D3-AE02-3D5A-C40F.

OCORRÊNCIAS		
NÚMERO DE OC	TIPO DE OCORRÊNCIA	DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA
OBSERVAÇÕES		
EQUIPE E05 28/04/2023		
CONFERÊNCIA		
MUNICÍPIO	CONSÓRCIO (Aprovado)	
Obs.:	Obs.: Conforme realizado em campo.	
ASSINATURAS		
Luiz Henrique da Silva Borges Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 208579/D	APROVADO AUTOMATICAMENTE PELO SISTEMA PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA CREA 137.103/D	Luciano Xavier de Castro RT de Execução - CONSÓRCIO 3T -SOLOCAP-CONEP CREA 59784/D

Este documento foi assinado eletronicamente por LUIZ HENRIQUE DA SILVA BORGES e Luciano Xavier de Castro.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certsign.com.br:443> e utilize o código A3D3-AE02-3D5A-C40F.



CIMVALPI
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL
MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº	OBRA: CTP - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	CONTRATO:	RESP. TÉCNICO: LUCIANO XAVIER
ENDEREÇO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA	INÍCIO: 01/04/2023	Nº CREA-MG: 59784/D	
CIDDE:	PRAZO: 01/10/2023	Nº DA ART:	
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA	UF:	COORDENADAS:	
DATA: 28/04/2023	SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA ☔
MANHÃ	✓		IMPRATICÁVEL ☔
TARDE	✓		
QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
1	ENCARREGADO DE OBRAS	2	OPERADOR
1	TOPÓGRAFO		
QTDE	EQUIPAMENTO		
2	ESCAVADEIRA		
1	VEÍCULO DE APOIO		
1	CAMINHÃO PIPA		
2	CAMINHÃO BASCULANTE		
1	MOTONIVELADORA		
TAREFAS REALIZADAS			
NÚMERO DE T.R.	DESCRIÇÃO	OBSERVAÇÕES	
1	TRATAMENTO DE SUBLEITO	ESTRADA DE ACESSO ENTRE SANTO ANTÔNIO DO GRAMA E ABRE CAMPO	
2	COLETA DE SOLO PARA ANÁLISES LABORATORIAIS	ESTRADA DE ACESSO ENTRE SANTO ANTÔNIO DO GRAMA E ABRE CAMPO	
3	UMECTAÇÃO	ESTRADA DE ACESSO ENTRE SANTO ANTÔNIO DO GRAMA E ABRE CAMPO	
4	SINALIZAÇÃO	ESTRADA DE ACESSO ENTRE SANTO ANTÔNIO DO GRAMA E ABRE CAMPO	
5	TRANSPORTE DE MATERIAL	ESTRADA DE ACESSO ENTRE SANTO ANTÔNIO DO GRAMA E ABRE CAMPO	
6	SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO TOPOGRÁFICO	ESTRADA DE ACESSO ENTRE SANTO ANTÔNIO DO GRAMA E ABRE CAMPO	
7	EXECUÇÃO DE GREIDE	ESTRADA DE ACESSO ENTRE SANTO ANTÔNIO DO GRAMA E ABRE CAMPO	
8	EXECUÇÃO DE RAMPA	ESTRADA DE ACESSO ENTRE SANTO ANTÔNIO DO GRAMA E ABRE CAMPO	
9	EXECUÇÃO DE ATERRO	ESTRADA DE ACESSO ENTRE SANTO ANTÔNIO DO GRAMA E ABRE CAMPO	
REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)			

Este documento foi assinado eletronicamente por LUIZ HENRIQUE DA SILVA BORGES e Luciano Xavier de Castro. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.design.com.br/443 e utilize o código A3D3-AE02-3D5A-C40F.



Data não informada



Data não informada



Data não informada



Data não informada



NÚMERO DE OC		TIPO DE OCORRÊNCIA		OCORRÊNCIAS		DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA	
EQUIPE E05 27/04/2023				OBSERVAÇÕES			
				CONFERÊNCIA			
MUNICÍPIO				CONSÓRCIO (Aprovado)			
Obs.:				Obs.: Conforme realizado em campo.			
ASSINATURAS							
Luiz Henrique da Silva Borges Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 208579/D		APROVADO AUTOMATICAMENTE PELO SISTEMA PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA CREA 137.103/D		Luciano Xavier de Castro RT de Execução - CONSÓRCIO 3T –SOLOCAP-CONEPP CREA 59784/D			

Este documento foi assinado eletronicamente por LUIZ HENRIQUE DA SILVA BORGES e Luciano Xavier de Castro.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.ceris.gru.com.br:443> e utilize o código A3D3-AE02-3D5A-C40F.



CIMVALPI
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL
MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº	OBRA: CTP - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	CONTRATO:	RESP. TÉCNICO: LUCIANO XAVIER
ENDEREÇO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA	INÍCIO: 01/04/2023	Nº CREA-MG: 59784/D	
CIDDE:	PRAZO: 01/10/2023	Nº DA ART:	
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA	UF:	COORDENADAS:	
DATA: 28/04/2023	SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA ☔
MANHÃ	✓		IMPRATICÁVEL ☁
TARDE	✓		
QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
1	ENCARREGADO DE OBRAS	2	OPERADOR
1	TOPÓGRAFO		
QTDE	EQUIPAMENTO		
2	ESCAVADEIRA		
1	VEÍCULO DE APOIO		
1	CAMINHÃO PIPA		
2	CAMINHÃO BASCULANTE		
1	MOTONIVELADORA		
TAREFAS REALIZADAS			
NÚMERO DE T.R.	DESCRIÇÃO	OBSERVAÇÕES	
1	EXECUÇÃO DE ATERRO	ESTRADA DE ACESSO ENTRE SANTO ANTÔNIO DO GRAMA E ABRE CAMPO	
2	EXECUÇÃO DE RAMPA		
3	SINALIZAÇÃO	ESTRADA DE ACESSO ENTRE SANTO ANTÔNIO DO GRAMA E ABRE CAMPO	
4	TRATAMENTO DE SUBLEITO	ESTRADA DE ACESSO ENTRE SANTO ANTÔNIO DO GRAMA E ABRE CAMPO	
5	SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO TOPOGRÁFICO	ESTRADA DE ACESSO ENTRE SANTO ANTÔNIO DO GRAMA E ABRE CAMPO	
6	UMECTAÇÃO	ESTRADA DE ACESSO ENTRE SANTO ANTÔNIO DO GRAMA E ABRE CAMPO	
7	EXECUÇÃO DE GREIDE	ESTRADA DE ACESSO ENTRE SANTO ANTÔNIO DO GRAMA E ABRE CAMPO	
8	TRANSPORTE DE MATERIAL	ESTRADA DE ACESSO ENTRE SANTO ANTÔNIO DO GRAMA E ABRE CAMPO	
REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)			

Este documento foi assinado eletronicamente por LUIZ HENRIQUE DA SILVA BORGES e Luciano Xavier de Castro. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.design.com.br/443> e utilize o código A3D3-AE02-3D5A-C40F.



Data não informada



Data não informada



Data não informada



Data não informada



NÚMERO DE OC		TIPO DE OCORRÊNCIA	OCORRÊNCIAS	DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA
EQUIPE E05 26/04/2023			OBSERVAÇÕES	
MUNICÍPIO			CONFERÊNCIA	
Obs.:			CONSÓRCIO (Aprovado)	Obs.: Conforme realizado em campo.
ASSINATURAS				
Luiz Henrique da Silva Borges Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 208579/D		APROVADO AUTOMATICAMENTE PELO SISTEMA PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA CREA 137.103/D		Luciano Xavier de Castro RT de Execução - CONSÓRCIO 3T –SOLOCAP-CONEPP CREA 59784/D

Este documento foi assinado eletronicamente por LUIZ HENRIQUE DA SILVA BORGES e Luciano Xavier de Castro.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.gestis.gn.com.br:443> e utilize o código A3D3-AE02-3D5A-C40F.



CIMVALPI
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL
MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº	OBRA: CTP - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	CONTRATO:	RESP. TÉCNICO: LUCIANO XAVIER
ENDEREÇO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA	INÍCIO: 01/04/2023	Nº CREA-MG: 59784/D	
CIDDE:	PRAZO: 01/10/2023	Nº DA ART:	
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA	UF:	COORDENADAS:	
DATA: 26/04/2023	SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA ☔
MANHÃ	✓		IMPRATICÁVEL ☔
TARDE	✓		
QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
1	ENCARREGADO DE OBRAS	2	OPERADOR
1	TOPÓGRAFO		
QTDE	EQUIPAMENTO		
1	ESCAVADEIRA		
1	VEÍCULO DE APOIO		
1	CAMINHÃO PIPA		
2	CAMINHÃO BASCULANTE		
1	MOTONIVELADORA		
TAREFAS REALIZADAS			
NÚMERO DE T.R.	DESCRIÇÃO	OBSERVAÇÕES	
1	SINALIZAÇÃO	ESTRADA DE ACESSO ENTRE SANTO ANTÔNIO DO GRAMA E ABRE CAMPO	
2	TRATAMENTO DE SUBLEITO	ESTRADA DE ACESSO ENTRE SANTO ANTÔNIO DO GRAMA E ABRE CAMPO	
3	EXECUÇÃO DE ATERRO	ESTRADA DE ACESSO ENTRE SANTO ANTÔNIO DO GRAMA E ABRE CAMPO	
4	UMECTAÇÃO	ESTRADA DE ACESSO ENTRE SANTO ANTÔNIO DO GRAMA E ABRE CAMPO	
5	SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO TOPOGRÁFICO	ESTRADA DE ACESSO ENTRE SANTO ANTÔNIO DO GRAMA E ABRE CAMPO	
6	TRANSPORTE DE MATERIAL	ESTRADA DE ACESSO ENTRE SANTO ANTÔNIO DO GRAMA E ABRE CAMPO	
7	EXECUÇÃO DE GREIDE	ESTRADA DE ACESSO ENTRE SANTO ANTÔNIO DO GRAMA E ABRE CAMPO	
8	CONFORMAÇÃO DE TALUDE DE RAMPA	ESTRADA DE ACESSO ENTRE SANTO ANTÔNIO DO GRAMA E ABRE CAMPO	
REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)			

Este documento foi assinado eletronicamente por LUIZ HENRIQUE DA SILVA BORGES e Luciano Xavier de Castro. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.design.com.br/443> e utilize o código A3D3-AE02-3D5A-C40F.



25 de abr de 2023 11:31:09
230 Rua Capitão Braga
Santo Antonio Do Grama
Santo Antônio do Grama
Minas Gerais

Data não informada



25 de abr de 2023 16:16:30
230 Rua Capitão Braga
Santo Antonio Do Grama
Santo Antônio do Grama
Minas Gerais

Data não informada



25 de abr de 2023 07:39:38
290 Rua Santa Efigênia
Santo Antonio Do Grama
Santo Antônio do Grama
Minas Gerais

Data não informada

OCORRÊNCIAS	
NÚMERO DE OC	TIPO DE OCORRÊNCIA
DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA	
OBSERVAÇÕES	
EQUIPE E05 25/04/2023	
CONFERÊNCIA	
MUNICÍPIO (Aprovado)	CONSÓRCIO (Aprovado)
Obs.:	Obs.: Sinalização ineficiente, precisa ser melhor sinalizado, todo o trecho onde as maquinas estão trabalhando.
ASSINATURAS	
Luiz Henrique da Silva Borges Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 208579/D	APROVADO AUTOMATICAMENTE PELO SISTEMA PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA CREA 137.103/D
	Luciano Xavier de Castro RT de Execução - CONSÓRCIO 3T –SOLOCAP-CONEP CREA 59784/D

Este documento foi assinado eletronicamente por LUIZ HENRIQUE DA SILVA BORGES e Luciano Xavier de Castro.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certsign.com.br:443> e utilize o código A3D3-AE02-3D5A-C40F.



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº	OBRA: CTP - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	CONTRATO:	RESP. TÉCNICO: LUCIANO XAVIER
ENDEREÇO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA	INÍCIO: 01/04/2023	Nº CREA-MG: 59784/D	
CIDDE:	PRAZO: 01/10/2023	Nº DA ART:	
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA	UF:	COORDENADAS:	
DATA: 25/04/2023	SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA ☔
MANHÃ	✓		IMPRATICÁVEL ☔
TARDE	✓		
QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
1	ENCARREGADO DE OBRAS	2	OPERADOR
1	TOPÓGRAFO		
QTDE	EQUIPAMENTO		
2	ESCAVADEIRA		
1	VEÍCULO DE APOIO		
1	CAMINHÃO PIPA		
2	CAMINHÃO BASCULANTE		
1	MOTONIVELADORA		
TAREFAS REALIZADAS			
NÚMERO DE T.R.	DESCRIÇÃO	OBSERVAÇÕES	
1	EXECUÇÃO DE ATERRO	ESTRADA DE ACESSO ENTRE SANTO ANTÔNIO DO GRAMA E ABRE CAMPO	
2	UMECTAÇÃO	ESTRADA DE ACESSO ENTRE SANTO ANTÔNIO DO GRAMA E ABRE CAMPO	
3	TRATAMENTO DE SUBLEITO	ESTRADA DE ACESSO ENTRE SANTO ANTÔNIO DO GRAMA E ABRE CAMPO	
4	SUPRESSÃO VEGETAL	ESTRADA DE ACESSO ENTRE SANTO ANTÔNIO DO GRAMA E ABRE CAMPO	
5	TRANSPORTE DE MATERIAL	ESTRADA DE ACESSO ENTRE SANTO ANTÔNIO DO GRAMA E ABRE CAMPO	
6	SINALIZAÇÃO	ESTRADA DE ACESSO ENTRE SANTO ANTÔNIO DO GRAMA E ABRE CAMPO	
7	SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO TOPOGRÁFICO	ESTRADA DE ACESSO ENTRE SANTO ANTÔNIO DO GRAMA E ABRE CAMPO	
8	CONFORMAÇÃO DE TALUDE DE RAMPA	ESTRADA DE ACESSO ENTRE SANTO ANTÔNIO DO GRAMA E ABRE CAMPO	
REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)			

Este documento foi assinado eletronicamente por LUIZ HENRIQUE DA SILVA BORGES e Luciano Xavier de Castro. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.design.com.br/443> e utilize o código A3D3-AE02-3D5A-C40F.



Data não informada



Data não informada



Data não informada



Data não informada



NÚMERO DE OC		TIPO DE OCORRÊNCIA	OCORRÊNCIAS	DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA
EQUIPE E05 24/04/2023			OBSERVAÇÕES	
MUNICÍPIO			CONFERÊNCIA	
Obs.:			CONSÓRCIO (Aprovado)	Obs.: Conforme apresentado o diário.
ASSINATURAS				
Luiz Henrique da Silva Borges Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 208579/D		APROVADO AUTOMATICAMENTE PELO SISTEMA PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA CREA 137.103/D		Luciano Xavier de Castro RT de Execução - CONSÓRCIO 3T –SOLOCAP-CONEP CREA 59784/D

Este documento foi assinado eletronicamente por LUIZ HENRIQUE DA SILVA BORGES e Luciano Xavier de Castro.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.gestis.org.com.br:443> e utilize o código A3D3-AE02-3D5A-C40F.



CIMVALPI
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL
MULTISETTORIAL DO VALE DO PIRANGA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº	OBRA: CTP - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	CONTRATO:	RESP. TÉCNICO: LUCIANO XAVIER
ENDEREÇO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA	INÍCIO: 01/04/2023	Nº CREA-MG: 59784/D	
CIDDE:	PRAZO: 01/10/2023	Nº DA ART:	
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA	UF:	COORDENADAS:	
DATA: 24/04/2023	SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA ☔
MANHÃ	✓		IMPRATICÁVEL ☔
TARDE	✓		
QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
1	ENCARREGADO DE OBRAS	2	OPERADOR
1	TOPÓGRAFO		
QTDE	EQUIPAMENTO		
	TAREFAS REALIZADAS		
NÚMERO DE T.R.	DESCRIÇÃO	OBSERVAÇÕES	
1	TRATAMENTO DE SUBLEITO		
2	UMECTAÇÃO		
3	TRANSPORTE DE MATERIAL		
4	EXECUÇÃO DE ATERRO		
5	SINALIZAÇÃO		
	REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)		
	OCORRÊNCIAS		
NÚMERO DE OC	TIPO DE OCORRÊNCIA	DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA	
	OBSERVAÇÕES		
EQUIPE E05 23/04/2023			
	ASSINATURAS		
Luiz Henrique da Silva Borges Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 208579/D	APROVADO AUTOMATICAMENTE PELO SISTEMA PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA CREA 137.103/D	Luciano Xavier de Castro RT de Execução - CONSÓRCIO 3T -SOLOCAP-CONEP CREA 59784/D	

Este documento foi assinado eletronicamente por LUIZ HENRIQUE DA SILVA BORGES e LUCIANO XAVIER DE CASTRO.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.perisign.com.br/443> e utilize o código A3D3-AE02-3D5A-C40F.



CIMVALPI
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL
MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº	OBRA: CTP - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	CONTRATO:	RESP. TÉCNICO: LUCIANO XAVIER
ENDEREÇO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA	INÍCIO: 01/04/2023	Nº CREA-MG: 59784/D	
CIDDE:	PRAZO: 01/10/2023	Nº DA ART:	
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA	UF:	COORDENADAS:	
DATA: 24/04/2023	SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA ☔
MANHÃ	✓		IMPRATICÁVEL ☔
TARDE	✓		
QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
1	ENCARREGADO DE OBRAS	2	OPERADOR
1	TOPÓGRAFO		
QTDE	EQUIPAMENTO		
2	ESCAVADEIRA		
1	VEÍCULO DE APOIO		
1	CAMINHÃO PIPA		
2	CAMINHÃO BASCULANTE		
1	MOTONIVELADORA		
TAREFAS REALIZADAS			
NÚMERO DE T.R.	DESCRICAO	OBSERVAÇÕES	
1	TRANSPORTE DE MATERIAL		
2	TRATAMENTO DE SUBLEITO		
3	UMECTAÇÃO		
4	EXECUÇÃO DE ATERRO		
REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)			

Este documento foi assinado eletronicamente por LUIZ HENRIQUE DA SILVA BORGES e Luciano Xavier de Castro. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.defisign.com.br/443 e utilize o código A3D3-AE02-3D5A-C40F.



22 de abr de 2023 09:14:05
230 Rua Capitão Braga
Santo Antonio Do Grama
Santo Antônio do Grama
Minas Gerais

Data não informada



21 de abr de 2023 15:25:43

Data não informada



22 de abr de 2023 09:19:20
230 Rua Capitão Braga
Santo Antonio Do Grama
Santo Antônio do Grama
Minas Gerais

Data não informada



22 de abr de 2023 15:40:47
230 Rua Capitão Braga
Santo Antonio Do Grama
Santo Antônio do Grama
Minas Gerais

Data não informada

Este documento foi assinado eletronicamente por LUIZ HENRIQUE DA SILVA BORGES e Luciano Xavier de Castro.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certsign.com.br:443> e utilize o código A3D3-AE02-3D5A-C40F.



NÚMERO DE OC		TIPO DE OCORRÊNCIA		OCORRÊNCIAS		DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA	
				OBSERVAÇÕES			
EQUIPE E05 22/04/2023				ASSINATURAS			
Luiz Henrique da Silva Borges Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 208579/D		APROVADO AUTOMATICAMENTE PELO SISTEMA PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA CREA 137.103/D		Luciano Xavier de Castro RT de Execução - CONSÓRCIO 3T –SOLOCAP-CONEP CREA 59784/D			

Este documento foi assinado eletronicamente por LUIZ HENRIQUE DA SILVA BORGES e Luciano Xavier de Castro.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.gestis.org.com.br:443> e utilize o código A3D3-AE02-3D5A-C40F.



CIMVALPI
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL
MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº	OBRA: CTP - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	CONTRATO:	RESP. TÉCNICO: LUCIANO XAVIER
ENDEREÇO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA	INÍCIO: 01/04/2023	Nº CREA-MG: 59784/D	
CIDDE:	PRAZO: 01/10/2023	Nº DA ART:	
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA	UF:	COORDENADAS:	
DATA: 24/04/2023	SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA ☔
MANHÃ	✓		IMPRATICÁVEL ☔
TARDE	✓		
QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
1	ENCARREGADO DE OBRAS	2	OPERADOR
1	TOPÓGRAFO		
QTDE	EQUIPAMENTO		
2	ESCAVADEIRA		
1	VEÍCULO DE APOIO		
1	CAMINHÃO PIPA		
2	CAMINHÃO BASCULANTE		
1	MOTONIVELADORA		
TAREFAS REALIZADAS			
NÚMERO DE T.R.	DESCRICAO	OBSERVAÇÕES	
1	UMECTAÇÃO		
2	EXECUÇÃO DE ATERRO		
3	TRANSPORTE DE MATERIAL		
REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)			

Este documento foi assinado eletronicamente por LUIZ HENRIQUE DA SILVA BORGES e Luciano Xavier de Castro. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.defisign.com.br/443 e utilize o código A3D3-AE02-3D5A-C40F.



21 de abr de 2023 09:24:19
155 Rua A
Santo Antonio Do Grama
Santo Antônio do Grama
Minas Gerais

Data não informada



21 de abr de 2023 09:32:48
155 Rua A
Santo Antonio Do Grama
Santo Antônio do Grama
Minas Gerais

Data não informada



21 de abr de 2023 08:31:29

Data não informada



21 de abr de 2023 08:06:55
155 Rua A
Santo Antonio Do Grama
Santo Antônio do Grama
Minas Gerais

Data não informada

Este documento foi assinado eletronicamente por LUIZ HENRIQUE DA SILVA BORGES e Luciano Xavier de Castro.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certsign.com.br:443> e utilize o código A3D3-AE02-3D5A-C40F.



NÚMERO DE OC		TIPO DE OCORRÊNCIA		OCORRÊNCIAS	
				DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA	
				OBSERVAÇÕES	
EQUIPE E05 21/04/2023				ASSINATURAS	
Luiz Henrique da Silva Borges Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 208579/D		APROVADO AUTOMATICAMENTE PELO SISTEMA PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA CREA 137.103/D		Luciano Xavier de Castro RT de Execução - CONSÓRCIO 3T –SOLOCAP-CONEP CREA 59784/D	

Este documento foi assinado eletronicamente por LUIZ HENRIQUE DA SILVA BORGES e Luciano Xavier de Castro.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.gestis.org.com.br:443> e utilize o código A3D3-AE02-3D5A-C40F.



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº	OBRA: CTP - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	CONTRATO:	RESP. TÉCNICO: LUCIANO XAVIER
ENDEREÇO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA	INÍCIO: 01/04/2023	Nº CREA-MG: 59784/D	
CIDDE:	PRAZO: 01/10/2023	Nº DA ART:	
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA	UF:	COORDENADAS:	
DATA: 24/04/2023	SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA ☔
MANHÃ	✓		IMPRATICÁVEL ☔
TARDE	✓		
QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
1	ENCARREGADO DE OBRAS	2	OPERADOR
1	TOPÓGRAFO		
QTDE	EQUIPAMENTO		
2	ESCAVADEIRA		
1	VEÍCULO DE APOIO		
1	CAMINHÃO PIPA		
2	CAMINHÃO BASCULANTE		
1	MOTONIVELADORA		
TAREFAS REALIZADAS			
NÚMERO DE T.R.	DESCRICAO	OBSERVAÇÕES	
1	EXECUÇÃO DE ESCALONAMENTO		
2	EXECUÇÃO DE ABERTURA DE ATERRO		
3	REGULARIZAÇÃO DO GREIDE		
REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)			

Este documento foi assinado eletronicamente por LUIZ HENRIQUE DA SILVA BORGES e Luciano Xavier de Castro. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.defisign.com.br/443 e utilize o código A3D3-AE02-3D5A-C40F.



20 de abr de 2023 10:44:17

Data não informada



20 de abr de 2023 08:07:20

Data não informada



20 de abr de 2023 10:45:01

Data não informada



20 de abr de 2023 15:13:58

155 Rua A
Santo Antonio Do Grama
Santo Antônio do Grama
Minas Gerais

Data não informada



OCORRÊNCIAS		
NÚMERO DE OC	TIPO DE OCORRÊNCIA	DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA
OBSERVAÇÕES		
EQUIPE E05 20/04/2023 O CAMINHÃO PIPA ESTÁ FAZENDO A UMECTAÇÃO DIÁRIAMENTE. GENTILEZA CONSIDERAR ESSA ATIVIDADE NOS DIÁRIOS ANTERIORES (A PARTIR DO DIA 11/04/2023) EM QUE A MESMA NÃO FOI DESCRITA.		
ASSINATURAS		
Luiz Henrique da Silva Borges Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 208579/D	APROVADO AUTOMATICAMENTE PELO SISTEMA PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA CREA 137.103/D	Luciano Xavier de Castro RT de Execução - CONSÓRCIO 3T –SOLOCAP-CONEP CREA 59784/D

Este documento foi assinado eletronicamente por LUIZ HENRIQUE DA SILVA BORGES e Luciano Xavier de Castro.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certsign.com.br:443> e utilize o código A3D3-AE02-3D5A-C40F.



CIMVALPI
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL
MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº	OBRA: CTP - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	CONTRATO:	RESP. TÉCNICO: LUCIANO XAVIER
ENDEREÇO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA	INÍCIO: 01/04/2023	Nº CREA-MG: 59784/D	
CIDDE:	PRAZO: 01/10/2023	Nº DA ART:	
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA	UF:	COORDENADAS:	
DATA: 24/04/2023	SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA ☔
MANHÃ	✓		IMPRATICÁVEL ☔
TARDE	✓		
QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
1	ENCARREGADO DE OBRAS	2	OPERADOR
1	TOPÓGRAFO		
QTDE	EQUIPAMENTO		
2	ESCAVADEIRA		
1	VEÍCULO DE APOIO		
1	CAMINHÃO PIPA		
2	CAMINHÃO BASCULANTE		
1	MOTONIVELADORA		
TAREFAS REALIZADAS			
NÚMERO DE T.R.	DESCRICAO	OBSERVAÇÕES	
1	REGULARIZAÇÃO DE ACESSOS		
2	LIMPEZA MANUAL E MECÂNICA		
REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)			

Este documento foi assinado eletronicamente por LUIZ HENRIQUE DA SILVA BORGES e Luciano Xavier de Castro. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.design.com.br/443 e utilize o código A3D3-AE02-3D5A-C40F.





NÚMERO DE OC		TIPO DE OCORRÊNCIA	OCORRÊNCIAS	DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA
EQUIPE E05 18/04/2023			OBSERVAÇÕES	
			ASSINATURAS	
Luiz Henrique da Silva Borges Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 208579/D		APROVADO AUTOMATICAMENTE PELO SISTEMA PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA CREA 137.103/D		Luciano Xavier de Castro RT de Execução - CONSÓRCIO 3T –SOLOCAP-CONEP CREA 59784/D

Este documento foi assinado eletronicamente por LUIZ HENRIQUE DA SILVA BORGES e Luciano Xavier de Castro.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.ceris.org.br> e utilize o código A3D3-AE02-3D5A-C40F.

Atenção

Undefined offset: 0



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº	OBRA: CTP - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	CONTRATO:	RESP. TÉCNICO: LUCIANO XAVIER
ENDEREÇO:	SANTO ANTÔNIO DO GRAMA	INÍCIO: 01/04/2023	Nº CREA-MG: 59784/D
CIDDE:		PRAZO: 01/10/2023	Nº DA ART:
DISTRITO:	SANTO ANTÔNIO DO GRAMA	UF:	COORDENADAS:
DATA:	SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA ☔
IMPRATICÁVEL ☔			
QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
1	ENCARREGADO DE OBRAS	2	OPERADOR
1	TOPÓGRAFO		
QTDE	EQUIPAMENTO		
2	ESCAVADEIRA		
1	VEÍCULO DE APOIO		
1	CAMINHÃO PIPA		
2	CAMINHÃO BASCULANTE		
TAREFAS REALIZADAS			
NÚMERO DE T.R.	DESCRICAÇÃO	OBSERVAÇÕES	
REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)			
OCORRÊNCIAS			
NÚMERO DE OC	TIPO DE OCORRÊNCIA	DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA	
OBSERVAÇÕES			
EQUIPE E05 17/04/2023 NÃO HOUVE ATIVIDADE POR MOTIVO DE LUTO			
ASSINATURAS			
Luiz Henrique da Silva Borges Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 208579/D		APROVADO AUTOMATICAMENTE PELO SISTEMA PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA CREA 137.103/D	
		Luciano Xavier de Castro RT de Execução - CONSÓRCIO 3T -SOLOCAP-CONEP CREA 59784/D	

Este documento foi assinado eletronicamente por LUIZ HENRIQUE DA SILVA BORGES e LUCIANO XAVIER DE CASTRO. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certificad.com.br/43> e utilize o código 3D5A-ED2-3D5A-040F.



CIMVALPI
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL
MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº	OBRA: CTP - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	CONTRATO:	RESP. TÉCNICO: LUCIANO XAVIER
ENDEREÇO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA	INÍCIO: 01/04/2023	Nº CREA-MG: 59784/D	
CIDDE:	PRAZO: 01/10/2023	Nº DA ART:	
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA	UF:	COORDENADAS:	
DATA: 24/04/2023	SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA ☔
MANHÃ	✓		IMPRATICÁVEL ☔
TARDE	✓		
QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
1	ENCARREGADO DE OBRAS	2	OPERADOR
1	TOPÓGRAFO		
QTDE	EQUIPAMENTO		
2	ESCAVADEIRA		
1	VEÍCULO DE APOIO		
1	CAMINHÃO PIPA		
2	CAMINHÃO BASCULANTE		
TAREFAS REALIZADAS			
NÚMERO DE T.R.	DESCRICAO	OBSERVAÇÕES	
1	UMECTAÇÃO DE PISTA		
2	SUPRESSÃO VEGETAL		
REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)			

Este documento foi assinado eletronicamente por LUIZ HENRIQUE DA SILVA BORGES e Luciano Xavier de Castro.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.cerfisign.com.br/443> e utilize o código A3D3-AE02-3D5A-C40F.



Data não informada

NÚMERO DE OC		TIPO DE OCORRÊNCIA	DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA
EQUIPE E05 14/04/2023		APROVADO AUTOMATICAMENTE PELO SISTEMA	
Luiz Henrique da Silva Borges Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 208579/D		PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA CREA 137.103/D	Luciano Xavier de Castro RT de Execução - CONSÓRCIO 3T –SOLOCAP-CONEPP CREA 59784/D

Este documento foi assinado eletronicamente por LUIZ HENRIQUE DA SILVA BORGES e Luciano Xavier de Castro. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certsign.com.br:443> e utilize o código A3D3-AE02-3D5A-C40F.



CIMVALPI
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL
MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº	OBRA: CTP - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	CONTRATO:	RESP. TÉCNICO: LUCIANO XAVIER
ENDEREÇO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA	INÍCIO: 01/04/2023	Nº CREA-MG: 59784/D	
CIDDE:	PRAZO: 01/10/2023	Nº DA ART:	
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA	UF:	COORDENADAS:	
DATA: 24/04/2023	SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA ☔
MANHÃ	✓		IMPRATICÁVEL ☔
TARDE	✓		
QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
1	ENCARREGADO DE OBRAS	2	OPERADOR
1	TOPÓGRAFO		
QTDE	EQUIPAMENTO		
2	ESCAVADEIRA		
1	VEÍCULO DE APOIO		
1	CAMINHÃO PIPA		
2	CAMINHÃO BASCULANTE		
TAREFAS REALIZADAS			
NÚMERO DE T.R.	DESCRICAÇÃO	OBSERVAÇÕES	
1	UMECTAÇÃO DE PISTA		
2	SUPRESSÃO VEGETAL		
REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)			

Este documento foi assinado eletronicamente por LUIZ HENRIQUE DA SILVA BORGES e Luciano Xavier de Castro. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.cerfisign.com.br/443 e utilize o código A3D3-AE02-3D5A-C40F.





NÚMERO DE OC		TIPO DE OCORRÊNCIA	OCORRÊNCIAS	DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA
EQUIPE E05 13/04/2023			OBSERVAÇÕES	
			ASSINATURAS	
Luiz Henrique da Silva Borges Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 208579/D		APROVADO AUTOMATICAMENTE PELO SISTEMA PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA CREA 137.103/D		Luciano Xavier de Castro RT de Execução - CONSÓRCIO 3T –SOLOCAP-CONEP CREA 59784/D

Este documento foi assinado eletronicamente por LUIZ HENRIQUE DA SILVA BORGES e Luciano Xavier de Castro.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.waysistemas.com.br:443> e utilize o código A3D3-AE02-3D5A-C40F.



CIMVALPI

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL
MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº	OBRA: CTP - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	CONTRATO:	RESP. TÉCNICO: LUCIANO XAVIER
ENDEREÇO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA	INÍCIO: 01/04/2023	Nº CREA-MG: 59784/D	
CIDDE:	PRAZO: 01/10/2023	Nº DA ART:	
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA	UF:	COORDENADAS:	
DATA: 24/04/2023	SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA ☔
MANHÃ	✓		IMPRATICÁVEL ☔
TARDE	✓		
QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
1	ENCARREGADO DE OBRAS	2	OPERADOR
1	TOPÓGRAFO		
QTDE	EQUIPAMENTO		
2	ESCAVADEIRA		
1	VEÍCULO DE APOIO		
1	CAMINHÃO PIPA		
2	CAMINHÃO BASCULANTE		
TAREFAS REALIZADAS			
NÚMERO DE T.R.	DESCRICAÇÃO	OBSERVAÇÕES	
1	SUPRESSÃO VEGETAL		
REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)			
OCORRÊNCIAS			
NÚMERO DE OC	TIPO DE OCORRÊNCIA	DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA	
OBSERVAÇÕES			
EQUIPE E05 12/04/2023			
ASSINATURAS			
Luiz Henrique da Silva Borges Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 208579/D		APROVADO AUTOMATICAMENTE PELO SISTEMA PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA CREA 137.103/D	
		Luciano Xavier de Castro RT de Execução - CONSÓRCIO 3T -SOLOCAP-CONEP CREA 59784/D	

Este documento foi assinado eletronicamente por LUIZ HENRIQUE DA SILVA BORGES e LUCIANO XAVIER DE CASTRO.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.perisign.com.br/443> e utilize o código A3D3-AE02-3D5A-C40F.



CIMVALPI

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL
MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº	OBRA: CTP - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	CONTRATO:	RESP. TÉCNICO: LUCIANO XAVIER
ENDEREÇO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA	INÍCIO: 01/04/2023	Nº CREA-MG: 59784/D	
CIDDE:	PRAZO: 01/10/2023	Nº DA ART:	
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA	UF:	COORDENADAS:	
DATA: 24/04/2023	SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA ☔
MANHÃ	✓		IMPRATICÁVEL ☔
TARDE	✓		
QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
1	ENCARREGADO DE OBRAS	2	OPERADOR
1	TOPÓGRAFO		
QTDE	EQUIPAMENTO		
2	ESCAVADEIRA		
1	VEÍCULO DE APOIO		
0	CAMINHÃO PIPA		
2	CAMINHÃO BASCULANTE		
TAREFAS REALIZADAS			
NÚMERO DE T.R.	DESCRICAO	OBSERVAÇÕES	
1	SUPRESSÃO VEGETAL		
REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)			



Data não informada



Data não informada



Data não informada



Data não informada



NÚMERO DE OC		TIPO DE OCORRÊNCIA		OCORRÊNCIAS		DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA	
EQUIPE E05 11/04/2023				OBSERVAÇÕES			
				ASSINATURAS			
Luiz Henrique da Silva Borges Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 208579/D		APROVADO AUTOMATICAMENTE PELO SISTEMA PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA CREA 137.103/D		Luciano Xavier de Castro RT de Execução - CONSÓRCIO 3T –SOLOCAP-CONEP		Luciano Xavier de Castro RT de Execução - CONSÓRCIO 3T –SOLOCAP-CONEP CREA 59784/D	

Este documento foi assinado eletronicamente por LUIZ HENRIQUE DA SILVA BORGES e Luciano Xavier de Castro.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.gestis.gn.com.br:443> e utilize o código A3D3-AE02-3D5A-C40F.



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº	OBRA: CTP - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	CONTRATO:	RESP. TÉCNICO: LUCIANO XAVIER
ENDEREÇO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA	INÍCIO: 01/04/2023	Nº CREA-MG: 59784/D	
CIDDE:	PRAZO: 01/10/2023	Nº DA ART:	
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA	UF:	COORDENADAS:	
DATA: 24/04/2023	SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA ☔
MANHÃ	✓		IMPRATICÁVEL ☔
TARDE	✓		
QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
1	ENCARREGADO DE OBRAS	3	OPERADOR
1	TOPÓGRAFO		
QTDE	EQUIPAMENTO		
2	ESCAVADEIRA		
1	VEÍCULO DE APOIO		
1	CAMINHÃO PIPA		
2	CAMINHÃO BASCULANTE		
TAREFAS REALIZADAS			
NÚMERO DE T.R.	DESCRICAO	OBSERVAÇÕES	
1	ESTUDO DA TOPOGRAFIA PARA INÍCIO DAS ATIVIDADES		
REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)			

Este documento foi assinado eletronicamente por LUIZ HEINRIQUE DA SILVA BORGES e Luciano Xavier de Castro. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.waysistemas.com.br/443> e utilize o código A3D3-AE02-3D5A-C40F.



NÚMERO DE OC		TIPO DE OCORRÊNCIA	OCORRÊNCIAS	DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA
EQUIPE E05 05/04/2023			OBSERVAÇÕES	
Luiz Henrique da Silva Borges Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 208579/D		APROVADO AUTOMATICAMENTE PELO SISTEMA PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA CREA 137.103/D		Luciano Xavier de Castro RT de Execução - CONSÓRCIO 3T –SOLOCAP-CONEP CREA 59784/D

Este documento foi assinado eletronicamente por LUIZ HENRIQUE DA SILVA BORGES e Luciano Xavier de Castro.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.cpfisign.com.br:443> e utilize o código A3D3-AE02-3D5A-C40F.



CIMVALPI
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL
MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº	OBRA: CTP - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	CONTRATO:	RESP. TÉCNICO: LUCIANO XAVIER
ENDEREÇO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA	INÍCIO: 01/04/2023	Nº CREA-MG: 59784/D	
CIDDE:	PRAZO: 01/10/2023	Nº DA ART:	
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA	UF:	COORDENADAS:	
DATA: 24/04/2023	SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA ☔
MANHÃ	✓		IMPRATICÁVEL ☔
TARDE	✓		
QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
1	ENCARREGADO DE OBRAS	2	OPERADOR
1	TOPÓGRAFO		
QTDE	EQUIPAMENTO		
2	ESCAVADEIRA		
1	VEÍCULO DE APOIO		
1	CAMINHÃO PIPA		
2	CAMINHÃO BASCULANTE		
TAREFAS REALIZADAS			
NÚMERO DE T.R.	DESCRICAÇÃO	OBSERVAÇÕES	
1	LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO		
REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)			
OCORRÊNCIAS			
NÚMERO DE OC	TIPO DE OCORRÊNCIA	DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA	
OBSERVAÇÕES			
EQUIPE E05 04/04/2023			
ASSINATURAS			
Luiz Henrique da Silva Borges Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 208579/D		APROVADO AUTOMATICAMENTE PELO SISTEMA PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA CREA 137.103/D	
		Luciano Xavier de Castro RT de Execução - CONSÓRCIO 3T -SOLOCAP-CONEP CREA 59784/D	

Este documento foi assinado eletronicamente por LUIZ HENRIQUE DA SILVA BORGES e LUCIANO XAVIER DE CASTRO. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.perisign.com.br/443 e utilize o código A3D3-AE02-3D5A-C40F.



CIMVALPI
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL
MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº	OBRA: CTP - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	CONTRATO:	RESP. TÉCNICO: LUCIANO XAVIER
ENDEREÇO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA	INÍCIO: 01/04/2023	Nº CREA-MG: 59784/D	
CIDDE:	PRAZO: 01/10/2023	Nº DA ART:	
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA	UF:	COORDENADAS:	
DATA: 24/04/2023	SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA ☔
MANHÃ	✓		IMPRATICÁVEL ☔
TARDE	✓		
QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
1	ENCARREGADO DE OBRAS	2	OPERADOR
1	TOPÓGRAFO		
QTDE	EQUIPAMENTO		
2	ESCAVADEIRA		
1	VEÍCULO DE APOIO		
1	CAMINHÃO PIPA		
2	CAMINHÃO BASCULANTE		
TAREFAS REALIZADAS			
NÚMERO DE T.R.	DESCRICAÇÃO	OBSERVAÇÕES	
1	LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO		
REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)			
OCORRÊNCIAS			
NÚMERO DE OC	TIPO DE OCORRÊNCIA	DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA	
OBSERVAÇÕES			
EQUIPE E05 03/04/2023			
ASSINATURAS			
Luiz Henrique da Silva Borges Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 208579/D		APROVADO AUTOMATICAMENTE PELO SISTEMA PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA CREA 137.103/D	
		Luciano Xavier de Castro RT de Execução - CONSÓRCIO 3T -SOLOCAP-CONEP CREA 59784/D	

Este documento foi assinado eletronicamente por LUIZ HENRIQUE DA SILVA BORGES e LUCIANO XAVIER DE CASTRO. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.perisign.com.br/443 e utilize o código A3D3-AE02-3D5A-C40F.



CIMVALPI
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL
MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº	OBRA: CTP - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	CONTRATO:	RESP. TÉCNICO: LUCIANO XAVIER
ENDEREÇO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA	INÍCIO: 01/04/2023	Nº CREA-MG: 59784/D	
CIDDE:	PRAZO: 01/10/2023	Nº DA ART:	
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA	UF:	COORDENADAS:	
DATA: 24/04/2023	SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA ☔
MANHÃ	✓		IMPRATICÁVEL ☔
TARDE	✓		
QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
1	ENCARREGADO DE OBRAS	2	OPERADOR
1	TOPÓGRAFO		
QTDE	EQUIPAMENTO		
2	ESCAVADEIRA		
1	VEÍCULO DE APOIO		
1	CAMINHÃO PIPA		
2	CAMINHÃO BASCULANTE		
TAREFAS REALIZADAS			
NÚMERO DE T.R.	DESCRICAÇÃO	OBSERVAÇÕES	
1	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E EQUIPE		
REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)			
OCORRÊNCIAS			
NÚMERO DE OC	TIPO DE OCORRÊNCIA	DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA	
OBSERVAÇÕES			
EQUIPE E05 01/04/2023			
ASSINATURAS			
Luiz Henrique da Silva Borges Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 208579/D		APROVADO AUTOMATICAMENTE PELO SISTEMA PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA CREA 137.103/D	
Luciano Xavier de Castro RT de Execução - CONSÓRCIO 3T -SOLOCAP-CONEP CREA 59784/D			



Este documento foi assinado eletronicamente por LUIZ HENRIQUE DA SILVA BORGES e Luciano Xavier de Castro.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código
A3D3-AE02-3D5A-C40F.

Este documento foi assinado eletronicamente por LUIZ HENRIQUE DA SILVA BORGES e Luciano Xavier de Castro.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código A3D3-AE02-3D5A-C40F.
