



FORMULÁRIO DE MEDIÇÕES

RELATÓRIO PARCIAL (SITUAÇÃO: APROVADA PELO CONSÓRCIO)

Enviado por Márcio Antônio do Carmo em 19/08/2023 - 10:31

Registro: 19/08/2023			4ª MEDIÇÃO														
Obra: CTP 229/2023 - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA			Período de 21/07/2023 a 19/08/2023														
Local: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA																	
OBSERVAÇÕES																	
Enviada por Márcio Antônio do Carmo (FORNECEDOR) em 19/08/2023 às 10:31																	
							QUANTIDADE MEDIDA				VALOR MEDIDO						
ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	NESTA MEDIÇÃO	ACUMULADA	VALOR PREVISTO (BDI)	VALOR PREVISTO (ADMC)	NESTA MEDIÇÃO (BDI)	NESTA MEDIÇÃO (ADMC)	ACUMULADA (BDI)	ACUMULADA (ADMC)	SALDO (BDI)	SALDO (ADMC)	
01	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO																
01.01	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA - para obras que exigem a utilização de grande quantidade de equipamentos e são executadas em centros urbanos ou próximos de centros urbanos, Obs.: Não se aplica aos serviços deTapa Buracos.																
01.01.03	OBRAS DE VALOR ACIMA DE R\$ 3000,001,00 - MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA PAVIMENTAÇÃO, EXCLUSIVE PARA TAPA-BURACOS	%	0.2	R\$ 81.450,179,25	R\$ 166.536,094,60	R\$ 33.307,218,92	0.2	0.40003931964	R\$ 33.307,218,92	R\$ 43.749,032,06	R\$ 8.988,16	R\$ 9.299,68	R\$ 17.454,50	R\$ 20.091,67	R\$ 33.289,764,42	R\$ 43.728,940,39	
02.04	CONTAINER 6,00 m x 2,30 m x 2,82 m COM ISOLAMENTO TÉRMICO																
02.04.01	MOBILIZAÇÃO DE CONTAINER	un	25	R\$ 400,36	R\$ 508,26	R\$ 12.706,50	5	25	R\$ 12.706,50	R\$ 13.147,00	R\$ 2.541,30	R\$ 2.629,40	R\$ 12.706,50	R\$ 13.147,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
02.04.02	ESCRITORIO COM AR CONDICIONADO E SANITARIO	mês	72	R\$ 676,17	R\$ 858,40	R\$ 61.804,80	28	56	R\$ 61.804,80	R\$ 63.946,80	R\$ 24.035,20	R\$ 24.868,20	R\$ 48.070,40	R\$ 49.736,40	R\$ 13.734,40	R\$ 14.210,40	
02.04.03	VESTIÁRIO	mês	64	R\$ 471,54	R\$ 598,62	R\$ 38.311,68	24	48	R\$ 38.311,68	R\$ 39.639,68	R\$ 14.366,88	R\$ 14.864,88	R\$ 28.733,76	R\$ 29.729,76	R\$ 9.577,92	R\$ 9.909,92	
02.04.04	REFEITÓRIO	mês	48	R\$ 471,54	R\$ 598,62	R\$ 28.733,76	20	40	R\$ 28.733,76	R\$ 29.729,76	R\$ 11.972,40	R\$ 12.387,40	R\$ 23.944,80	R\$ 24.774,80	R\$ 4.788,96	R\$ 4.954,96	
02.04.05	DEPOSITO E FERRAMENTARIA COM LAVATORIO	mês	16	R\$ 516,02	R\$ 655,09	R\$ 10.481,44	8	16	R\$ 10.481,44	R\$ 10.844,64	R\$ 5.240,72	R\$ 5.422,32	R\$ 10.481,44	R\$ 10.844,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
02.05	BANHEIRO QUIMICO																
02.05.01	BANHEIRO QUIMICO 110 cm x 120 cm x 230 cm COM MANUTENÇÃO	mês	32	R\$ 604,99	R\$ 768,03	R\$ 24.576,96	16	32	R\$ 24.576,96	R\$ 25.428,80	R\$ 12.288,48	R\$ 12.714,40	R\$ 24.576,96	R\$ 25.428,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
02.06	SINALIZAÇÃO/SEGURANÇA																
02.06.02	PLACA 0,50 m x 0,50 m DUPLA FACE CHAPA GALVANIZADA 22 EM CAVALETE	un/mês	120	R\$ 17,95	R\$ 22,79	R\$ 2.734,80	40	84	R\$ 2.734,80	R\$ 2.829,60	R\$ 911,60	R\$ 943,20	R\$ 1.914,36	R\$ 1.980,72	R\$ 820,44	R\$ 848,88	
02.06.06	SINALIZADOR ELET,MONOLIGHT LED 60 A 70 FLASHES/MIN	un	150	R\$ 90,80	R\$ 115,27	R\$ 17.290,50	50	100	R\$ 17.290,50	R\$ 17.890,50	R\$ 5.763,50	R\$ 5.963,50	R\$ 11.527,00	R\$ 11.927,00	R\$ 5.763,50	R\$ 5.963,50	
04	TRABALHOS EM TERRA																
04.03	ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA																
04.03.01	EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	m³	27084,94	R\$ 5,86	R\$ 7,44	R\$ 201.511,95	2708,49	24376,41	R\$ 201.511,95	R\$ 208.554,04	R\$ 20.151,17	R\$ 20.855,37	R\$ 181.360,49	R\$ 187.698,36	R\$ 20.151,46	R\$ 20.855,68	
04.05	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA																
04.05.01	DMT <= 1 KM	m³	26023,96	R\$ 3,08	R\$ 3,91	R\$ 101.753,68	2602,4	23421,57	R\$ 101.753,68	R\$ 105.397,04	R\$ 10.175,38	R\$ 10.539,72	R\$ 91.578,34	R\$ 94.857,36	R\$ 10.175,34	R\$ 10.539,68	
05	DRENAGEM URBANA																
05.08	BUEIRO TUBULAR																
05.08.11*	BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO, BSTC Ø 1,50 M - BOCA(EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E COMPACTAÇÃO)	UN	10	R\$ 6.731,24	R\$ 8.545,31	R\$ 85.453,10	2	8	R\$ 85.453,10	R\$ 88.414,80	R\$ 17.090,62	R\$ 17.682,96	R\$ 68.362,48	R\$ 70.731,84	R\$ 17.090,62	R\$ 17.682,96	
05.16	DRENAGEM COMPLEMENTAR																
05.16.01	CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 02 - COM GRELHA DE CONCRETO - TCC 01 -	UN	21	R\$ 3.012,81	R\$ 3.824,76	R\$ 80.319,96	4	14	R\$ 80.319,96	R\$ 83.103,72	R\$ 15.299,04	R\$ 15.829,28	R\$ 53.546,64	R\$ 55.402,48	R\$ 26.773,32	R\$ 27.701,24	



29/08/2023, 10:43

sistemas.waysistemas.com/cimvalpi/Blk_Medicao_Relatorio_Parcial/#

	AREIA E BRITA COMERCIAIS															
05.16.17	DRENO LONGITUDINAL PROFUNDO PARA CORTE EM SOLO - DPS 07 - TUBO PEAD E BRITA COMERCIAL	M	3255	R\$ 146,72	R\$ 186,27	R\$ 606.308,85	440	3255	R\$ 606.308,85	R\$ 627.303,60	R\$ 81.958,80	R\$ 84.796,80	R\$ 606.308,85	R\$ 627.303,60	R\$ -0,00	R\$ -0,00
05.16.18	BOCA DE SAÍDA PARA DRENO LONGITUDINAL PROFUNDO - BSD 02 - TUBO DE CONCRETO PERFURADO - AREIA E BRITA COMERCIAIS	UN	23	R\$ 207,02	R\$ 262,82	R\$ 6.044,86	3	23	R\$ 6.044,86	R\$ 6.251,86	R\$ 788,46	R\$ 815,46	R\$ 6.044,86	R\$ 6.251,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06	PAVIMENTAÇÃO															
06.01	REGULARIZAÇÃO															
06.01.01	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO	m²	61472,27	R\$ 2,21	R\$ 2,81	R\$ 172.737,08	12294,45	61472,27	R\$ 172.737,08	R\$ 178.269,58	R\$ 34.547,40	R\$ 35.653,91	R\$ 172.737,08	R\$ 178.269,58	R\$ -0,00	R\$ 0,00
06.04	BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE															
06.04.01	BASE DE SOLO SEM MISTURA, COMPACTADA NA ENERGIA DO PROCTOR INTERMODIFICADO (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO, UMIDECIMENTO E COMPACTAÇÃO DO MATERIAL - EXCLUI AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL)	m³	8451,67	R\$ 19,31	R\$ 24,51	R\$ 207.150,43	4225,83	8451,67	R\$ 207.150,43	R\$ 214.334,35	R\$ 103.575,09	R\$ 107.167,05	R\$ 207.150,43	R\$ 214.334,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06.04.02	COM BRITA BICA CORRIDA (AGREGADO DE PEDREIRA)	m³	10696,63	R\$ 183,12	R\$ 232,47	R\$ 2.486.645,58	5348,32	5348,32	R\$ 2.486.645,58	R\$ 2.572.860,41	R\$ 1.243.323,95	R\$ 1.286.431,41	R\$ 1.243.323,95	R\$ 1.286.431,41	R\$ 1.243.321,63	R\$ 1.286.429,00
06.08.02	DMT > 10 km	t x km	496213,03	R\$ 0,83	R\$ 1,05	R\$ 521.023,68	67019,05	96599,9	R\$ 521.023,68	R\$ 540.872,20	R\$ 70.370,00	R\$ 73.050,76	R\$ 101.429,90	R\$ 105.293,89	R\$ 419.593,79	R\$ 435.578,31
09.06	SERVIÇOS COMPLEMENTARES - CERCAMENTO															
09.06.01	CERCA DE ARAME FARPADO, TIPO OC.CA-01 (COM 4 FIOS E MOURÃO DE MADEIRA COM ESPAÇAMENTO DE 2,5 METROS) ((EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)	M	9365	R\$ 14,48	R\$ 18,39	R\$ 172.222,35	2000	4460	R\$ 172.222,35	R\$ 178.122,30	R\$ 36.780,00	R\$ 38.040,00	R\$ 82.019,40	R\$ 84.829,20	R\$ 90.202,95	R\$ 93.293,10
09.06.02	REMOÇÃO DE CERCAS	M	7820	R\$ 7,34	R\$ 9,32	R\$ 72.882,40	2000	4141	R\$ 72.882,40	R\$ 75.463,00	R\$ 18.640,00	R\$ 19.300,00	R\$ 38.594,12	R\$ 39.960,65	R\$ 34.288,28	R\$ 35.502,35
14	SERVIÇOS TÉCNICOS															
14.01	TOPOGRAFIA															
15	ADMINISTRAÇÃO LOCAL															
15.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - % BASEADA ACORDÃO 2.622/2013 DO TCU SOBRE SOMA DOS ITENS 1 a 14	%	6,55	R\$ 132.737.097,60	R\$ 168.509.745,40	R\$ 1.103.738.832,37	6,55	13.100509054	R\$ 1.103.738.832,37	R\$ 1.141.993.663,94	R\$ 117.744,23	R\$ 121.825,16	R\$ 266.345,87	R\$ 282.334,54	R\$ 1.103.472.486,50	R\$ 1.141.711.329,40
										TOTAL:	R\$ 1.856.552,39	R\$ 1.921.080,86	R\$ 4.124.913,60	R\$ 4.401.124,16		

Luiz Henrique da Silva Borges
Fiscal de Obras - CIMVALPI
CREA 208579/D
Aprovação: 28/08/2023

PEDRO MARTINO ZEFERINO
Fiscal de Obras - SANTO ANTONIO DO GRAMA
CREA 137.103/D

Luciano Xavier de Castro
RT de Execução - CONSÓRCIO 3T - SOLOCAP-CONEP
CREA 59784/D



29/08/2023, 10:44

sistemas.waysistemas.com/cimvalpi/Blk_Medicao_Relatorio_Parcial/#



CIMVALPI
CONSORCIO INTERMUNICIPAL
MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

OBR: CTP 229/2023 - SANTO ANTONIO DO GRAMA - PAVIMENTACAO ASFALTICA		CONTRATO:		RESP. TÉCNICO: LUCIANO XAVIER	
ENDERECO: SANTO ANTONIO DO GRAMA		INICIO: 01/04/2023		Nº CREA-MG: 59784/D	
CIDDE: SANTO ANTONIO DO GRAMA		PRAZO: 01/10/2023		Nº DA ART:	
DISTRITO: SANTO ANTONIO DO GRAMA		UF:		COORDENADAS:	
DATA: 18/08/2023		SOL ☼		CHUVA ☁	
MANHA		NUBLADO ☁		IMPRATICAVEL 🚫	
TARDE		✓			
QTDE		MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO		QTDE	
1		AUXILIAR DE ENGENHARIA		1	
5		OPERADOR		5	
2		PEDREIRO		1	
6		AJUDANTE			
QTDE		EQUIPAMENTO			
2		ESCAVADEIRA			
3		VEICULO DE APOIO			
1		CAMINHÃO PIPA			
4		CAMINHÃO BASCULANTE			
1		CARRETA BASCULANTE			
1		MINI CARREGADEIRA			
1		RETROESCAVADEIRA			
1		MOTONIVELADORA			
1		TRATOR COM IMPLEMENTO GRADE			
NUMERO DE T.R.		DESCRICAO		OBSERVAÇÕES	
1		SERVICO DE ACOMPANHAMENTO TOPOGRAFICO			
2		LIMPEZA DE MATERIAL DETONADO		B92	
3		EXECUCAO DE ACABAMENTO DE BUEIRO		B257	
4		EXECUCAO DE ALONGAMENTO DE BUEIRO		B328	
5		EXECUCAO DE ALA E CAIXA DE BUEIRO		B313	
6		APLICACAO DE MATACO			
7		SINALIZACAO			
8		EXECUCAO DE COLCHAO DRENANTE			
REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATORIOS)					



29/08/2023, 10:44

sistemas.waysistemas.com/cimvalpi/Blk_Medicao_Relatorio_Parcial/#



sistemas.waysistemas.com/cimvalpi/Blk_Medicao_Relatorio_Parcial/#

3/67

29/08/2023, 10:44

sistemas.waysistemas.com/cimvalpi/Blk_Medicao_Relatorio_Parcial/#



OCORRÊNCIAS		DESCRICÃO DA OCORRÊNCIA
NÚMERO DE OC	TIPO DE OCORRÊNCIA	OBSERVAÇÕES
EQUIPE E05 17/08/2023		
MUNICÍPIO		
CONSORCIO (Aprovado em 22/08/2023 - 09:21)		
Obs.: "Topografia: Levantamento de fogo deonado. Locação de nivelamento para colcação de BGS. "Drenagem: Construção buero na Est. 313 e acabamento de buero na Est. 300 e Est. 287 "Terraplenagem: Limpeza de material deonado. Transporte de matacos para área de solo mole. Inico Transição nas Est. 279 a Est 280.		
ASSINATURAS		
Luiz Henrique da Silva Borges Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 208579/D	PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - CIMVALPI DO GRAMA CREA 131.103/D	Luciano Xavier de Castro RT de Execução - CONSORCIO 313-SOLOCAP-CONEPP CREA 39784/D



29/08/2023, 10:44

sistemas.waysistemas.com/cimvalpi/Blk_Medicao_Relatorio_Parcial/#



CIMVALPI
CONSORCIO INTERMUNICIPAL
MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

OBR: CTP 229/2023 - SANTO ANTONIO DO GRAMA - PAVIMENTACAO ASFALTICA		CONTRATO:		RESR. TÉCNICO: LUCIANO XAVIER	
ENDEREÇO: SANTO ANTONIO DO GRAMA		INÍCIO: 01/04/2023		Nº CREA-MG: 59784ID	
CIDDE: SANTO ANTONIO DO GRAMA		PRAZO: 01/10/2023		Nº DA ART:	
DISTRITO: SANTO ANTONIO DO GRAMA		UF:		COORDENADAS:	
DATA: 17/08/2023	SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA ☔	IMPRATICÁVEL 🚫	
MANHÃ	✓				
TARDE		✓			
QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO		QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	
1	AUXILIAR DE ENGENHARIA		1	ENCARREGADO DE OBRAS	
6	OPERADOR		7	MOTORISTA	
2	PEDREIRO		1	TOPOGRAFO	
6	AJUDANTE				
QTDE	EQUIPAMENTO				
2	ESCAVADEIRA				
1	PA CARREGADEIRA				
1	COMPACTADOR DE SOLO				
3	VEICULO DE APOIO				
1	CAMINHÃO PIPA				
5	CAMINHÃO BASCULANTE				
1	MINI ESCAVADEIRA				
1	CARRETA BASCULANTE				
1	RETROESCAVADEIRA				
1	MOTONIVELADORA				
1	TRATOR COM IMPLMENTO GRADE				
NÚMERO DE T.A.C.	DESCRIÇÃO	TAREFAS REALIZADAS		OBSERVAÇÕES	
1	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BUEIRO				
2	EXECUÇÃO DE COLCHAO DRENANTE				
3	SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO TOPOGRÁFICO				
4	SINALIZAÇÃO				
5	REMOÇÃO DE SOLO MOLE				
6	EXECUÇÃO DE ALA DE BUEIRO	B277 LE			
7	EXECUÇÃO DE CAIXA DE BUEIRO	B300 LD			
8	DETONAÇÃO DE ROCHA	E135 E E92			
9	TRANSPORTE/ARMAZENAMENTO DE MATERIAL - BGS				
REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATORIOS)					



Data não informada



Data não informada



29/08/2023, 10:44

sistemas.waysistemas.com/cimvalpi/Blk_Medicao_Relatorio_Parcial/#



Data não informada

Data não informada



Data não informada



OCORRÊNCIAS		DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA
NUMERO DE OC	TIPO DE OCORRÊNCIA	OBSERVAÇÕES
EQUIPE E05 16/08/2023		
MUNICIPIO		
CONSORCIO (Aprovado em 17/08/2023 - 14:33)		
Obs.: Drenagem : Acabamento dos bueiros Est. 277 e Est. 285. *Topografia: Marcação de bueiros e nivelamento. Locação da Est para colocação de BCS. Terraplenagem: Cobertura de bueiro na Est. 25. Transporte material para abalar o logo. Delimitação Est. 38 e nas Est. 89, Est. 90 na Est. 91. Remoção de solo mole e transporte de pedras.		
ASSINATURAS		
Luiz Henrique da Silva Borges Fiscal de Obras CREA 2088579/D PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras CREA 137.103/D Luciano Xavier de Castro RT de Execução - CONSORCIO CREA 59784/D		

29/08/2023, 10:44

sistemas.waysistemas.com/cimvalpi/Blk_Medicao_Relatorio_Parcial/#



CIMVALPI
CONSORCIO INTERMUNICIPAL
MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº 0060		OBR: CTP 229/2023 - SANTO ANTONIO DO GRAMA - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA		CONTRATO:		RESP. TÉCNICO: LUCIANO XAVIER	
ENDEREÇO: SANTO ANTONIO DO GRAMA		INÍCIO: 01/04/2023		Nº CREA-MG: 59784/D			
CIDDE: SANTO ANTONIO DO GRAMA		PRAZO: 01/10/2023		Nº DA ART:			
DISTRITO: SANTO ANTONIO DO GRAMA		UF:		COORDENADAS:		IMPRATICÁVEL	
DATA: 15/08/2023		SOL ☼		CHUVA ☁			
MANHÃ		✓					
TARDE		✓					
QTDE		MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO		QTDE		MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	
1	AUXILIAR DE ENGENHARIA			1	ENCARREGADO DE OBRAS		
5	OPERADOR			7	MOTORISTA		
2	PEDREIRO			1	TOPOGRAFO		
6	AJUDANTE						
QTDE		EQUIPAMENTO					
2	ESCAVADEIRA						
1	PA CARREGADEIRA						
1	COMPACTADOR DE SOLO						
3	VEICULO DE APOIO						
1	CAMINHÃO PIPA						
5	CAMINHÃO BASCULANTE						
1	MINI ESCAVADEIRA						
1	CARRETA BASCULANTE						
1	RETROESCAVADEIRA						
1	MOTONIVELADORA						
1	TRATOR COM IMPL.EMENTO GRADE						
TAREFAS REALIZADAS							
OBSERVAÇÕES							
NÚMERO DE		DESCRICO					
1	EXECUÇÃO DE COLCHÃO DRENANTE						
2	SINALIZAÇÃO						
3	EXECUÇÃO DE SUB-BASE						
4	EXECUÇÃO DE CAIXA DE BUEIRO						
5	SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO TOPOGRAFICO						
6	EXECUÇÃO DE ALA DE BUEIRO						
7	REMOÇÃO DE SOLO MOLE						
8	TRANSPORTE/ARMAZENAMENTO DE MATERIAL						
9	EXECUÇÃO DE COMPACTAÇÃO DE BUEIRO						
REGISTROS FOTOGRAFICOS - (OBRIGATORIOS)							



15 de ago. de 2023 16:24:00
Data não Informada



15 de ago. de 2023 13:52:45
Data não Informada



29/08/2023, 10:44

sistemas.waysistemas.com/cimvalpi/Blk_Medicao_Relatorio_Parcial/#



sistemas.waysistemas.com/cimvalpi/Blk_Medicao_Relatorio_Parcial/#

29/08/2023, 10:44

sistemas.waysistemas.com/cimvalpi/Blk_Medicao_Relatorio_Parcial/#



OCORRÊNCIAS		DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA	
NUMERO DE OC	TIPO DE OCORRÊNCIA		
EQUIPE E05 15/08/2023			
MUNICÍPIO	CONFERÊNCIA		
Obs.:	CONSORCIO (Aprovado em 16/08/2023 - 14:49)		
	Obs.: "Drenagem - Construção de caixa e ala do bueiro Est. 295 e ala Est. 277." "Topografia - Nivelamento nas Est. 286 até Est. 270." "Alinhamento e locação de estaca na área do solo mole. "Alterno nas Calças e alas com compactação. " Cerca - Execução nas Est. 39 a Est. 48 e realizando medição. " Terraplenagem - Remoção de solo mole e colocação de matacos cedidos pela pedreira."		
	ASSINATURAS		
LUIZ Henrique da Silva Borges Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 208579/D		PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTONIO DO GRAMA CREA 137.103/D	Luciano Xavier de Castro RT de Execução - CONSORCIO 3T - SOLOCAP-CONEPP CREA 59784/D

29/08/2023, 10:44

sistemas.waysistemas.com/cimvalpi/Blk_Medicao_Relatorio_Parcial/#




RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

OBR: CTP 229/2023 - SANTO ANTONIO DO GRAMA - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA		CONTRATO:		RESP. TÉCNICO: LUCIANO XAVIER	
ENDEREÇO: SANTO ANTONIO DO GRAMA		INÍCIO: 01/04/2023		Nº CREA-MG: 59784/D	
CIDDE: SANTO ANTONIO DO GRAMA		PRAZO: 01/10/2023		Nº DA ART:	
DISTRITO: SANTO ANTONIO DO GRAMA		UF:		COORDENADAS:	
DATA: 14/08/2023		SOL ☼		CHUVA ☁	
MANHÃ				IMPRATICÁVEL 🚫	
TARDE					
QTDE		MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO		QTDE	
1		AUXILIAR DE ENGENHARIA		1	
5		OPERADOR		7	
2		PEDREIRO		1	
5		AJUDANTE			
QTDE		EQUIPAMENTO			
2		ESCAVADEIRA			
1		PA CARREGADEIRA			
3		VEICULO DE APOIO			
1		CAMINHÃO PIPA			
5		CAMINHÃO BASCULANTE			
1		MINI ESCAVADEIRA			
1		CARRETA BASCULANTE			
1		RETROESCAVADEIRA			
1		MOTONIVELADORA			
1		TRATOR COM IMPLMENTO GRADE			
NÚMERO DE T.R.		TAREFAS REALIZADAS			
DESCRICAO		OBSERVAÇÕES			
1		EXECUÇÃO DE PULMÃO DE BGS			
2		EXECUÇÃO DE COMPLEMENTO DE BUEIRO		B295 LD	
3		SINALIZAÇÃO			
4		EXECUÇÃO DE SUB-BASE		E200 ATÉ E209	
5		SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO TOPOGRÁFICO			
6		EXECUÇÃO DE ALA DE BUEIRO		B277 LD B295 LE	
		REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATORIOS)			



29/08/2023, 10:44

sistemas.waysistemas.com/cimvalpi/Blk_Medicao_Relatorio_Parcial/#

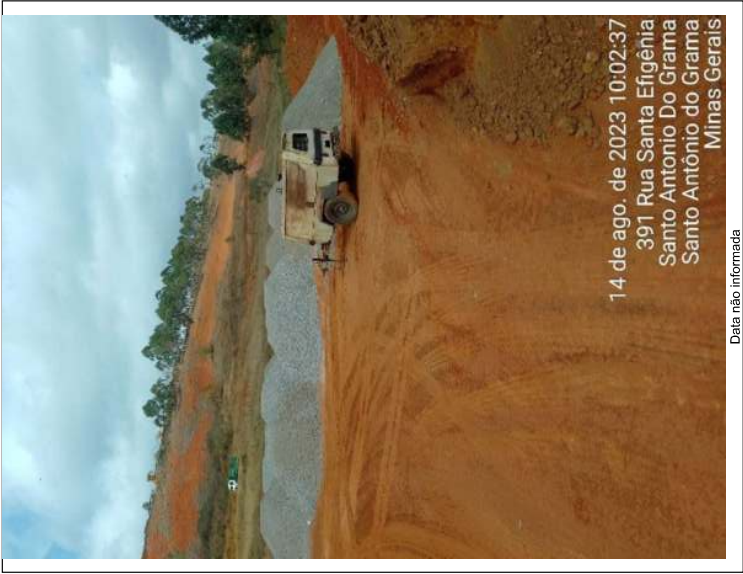

sistemas.waysistemas.com/cimvalpi/Blk_Medicao_Relatorio_Parcial/#

11/67

29/08/2023, 10:44

sistemas.waysistemas.com/cimvalpi/Blk_Medicao_Relatorio_Parcial/#



14 de ago. de 2023 10:13:20
Estrada sem nome
Santo Antônio do Grama
Minas Gerais

Data não informada



14 de ago. de 2023 10:34:20

Data não informada



14 de ago. de 2023 16:33:47

Data não informada

NÚMERO DE OC		OCORRÊNCIAS	
EQUIPE E05 - 14/08/2023		OBSERVAÇÕES	
MUNICÍPIO (Aprovado)		CONFÉRENCIA	
Obs.:		CONSORCIO (Aprovado em 15/08/2023 - 11:23) Obs.: *Drenagem - Construção bueiro nas Est. 295 e Est. 277. *Cerca - Sendo executada lado esquerdo nas Est. 25 a Est. 42. *Topografia - Nivelamento nas Est. 66 a Est. 68 e Est. 216 a Est. 220. *Terraplenagem - Cascalho nas Est. 200 a Est. 209. Início retirada solo mole nas Est. 279 a Est. 290. Obs - Est. 197 o bueiro foi alongado com 5 manilhas.	
ASSINATURAS		APROVADO AUTOMATICAMENTE PELO SISTEMA	
Luiz Henrique da Silva Borges Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 208579/D		PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA CREA 137.103/D	
		Luciano Xavier de Castro RT de Execução - CONSORCIO 3T - SOLOCAP-CONEPP CREA 59784/D	



29/08/2023, 10:44

sistemas.waysistemas.com/cimvalpi/Blk_Medicao_Relatorio_Parcial/#



CIMVALPI
CONSORCIO INTERMUNICIPAL
MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA


RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

OBR: CTP 229/2023 - SANTO ANTONIO DO GRAMA - PAVIMENTACAO ASFALTICA		CONTRATO:		RESP. TÉCNICO: LUCIANO XAVIER	
ENDEREÇO: SANTO ANTONIO DO GRAMA		INÍCIO: 01/04/2023		Nº CREAI-MG: 59784/D	
CIDDE: SANTO ANTONIO DO GRAMA		PRAZO: 01/10/2023		Nº DA ART:	
DISTRITO: SANTO ANTONIO DO GRAMA		UF:		COORDENADAS:	
DATA: 14/08/2023		SOL ☼		CHUVA ☁	
MANHÃ		NUBLADO ☁		IMPRATICÁVEL 🚫	
TARDE		✓			
QTDE		MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO		QTDE	
1		AUXILIAR DE ENGENHARIA		1	
7		OPERADOR		7	
1		PEDREIRO		1	
6		AJUDANTE		1	
QTDE		EQUIPAMENTO			
2		ESCAVADEIRA			
1		PA CARREGADEIRA			
3		VEICULO DE APOIO			
1		CAMINHÃO PIPA			
5		CAMINHÃO BASCULANTE			
1		MINI ESCAVADEIRA			
1		CARRETA BASCULANTE			
1		RETROESCAVADEIRA			
1		MOTONIVELADORA			
1		TRATOR COM IMPLMENTO GRADE			
NÚMERO DE T.R.		TAREFAS REALIZADAS			
DESCRICAO		OBSERVAÇÕES			
1		SERVICO DE ACOMPANHAMENTO TOPOGRAFICO			
2		SINALIZACAO			
3		EXECUCAO DE SUB-BASE		E262 ATÉ E265	
4		EXECUCAO DE ALA DE BUERO		B75	
REGISTROS FOTOGRÁFICOS • (OBRIGATÓRIOS)					



29/08/2023, 10:44

sistemas.waysistemas.com/cimvalpi/Blk_Medicao_Relatorio_Parcial/#

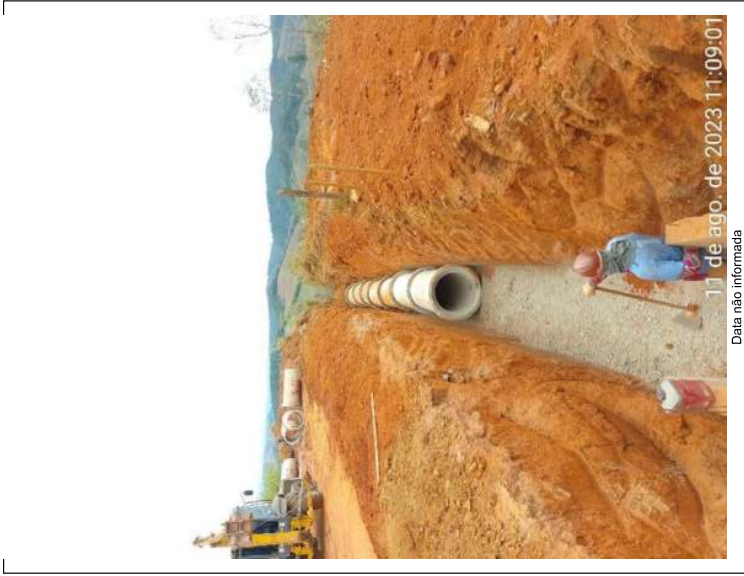

sistemas.waysistemas.com/cimvalpi/Blk_Medicao_Relatorio_Parcial/#

14/67

29/08/2023, 10:44

sistemas.waysistemas.com/cimvalpi/Blk_Medicao_Relatorio_Parcial/#



OCORRÊNCIAS		DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA
NÚMERO DE OC	TIPO DE OCORRÊNCIA	OBSERVAÇÕES
EQUIPE E05 11/08/2023		
MUNICÍPIO (Aprovado)		
Obs.: CONSORCIO (Aprovado em 15/08/2023 - 11:19) Obs.: "Dreno - Abrangimento bueiro na Est. 75. Construção de caixa e ala bueiro na Est. 230, "Cerca - Sendo construída nas Est. 0 até Est. 12 (lado esquerdo)", "Topografia - Levantamento de furos para delimitação e locação de alças e caixa nos bueiros Est. 75, Est. 230, Est. 239, Est. 277", "Terraplenagem - Limpeza nas Vias nas Est. 235 a Est. 306, Cascalho nas Est. 237 a Est. 204.		
ASSINATURAS		
Luiz Henrique da Silva Borges Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 208579/D	APROVADO AUTOMATICAMENTE PELO SISTEMA PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTONIO DO GRAMA CREA 137.103/D	Luciano Xavier de Castro RT de Execução - CONSORCIO STI-SOLOCAP-CONEPP CREA 59784/D



29/08/2023, 10:44

sistemas.waysistemas.com/cimvalpi/Blk_Medicao_Relatorio_Parcial/#



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO


OBRAS: CTP 229/2023 - SANTO ANTONIO DO GRAMA - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA		CONTRATO:		RESP. TÉCNICO: LUCIANO XAVIER	
ENDEREÇO: SANTO ANTONIO DO GRAMA		INÍCIO: 01/04/2023		Nº CREA-MG: 59784/D	
CIDDE:		PRAZO: 01/10/2023		Nº DA ART:	
DISTRITO: SANTO ANTONIO DO GRAMA		UF:		COORDENADAS:	
DATA: 11/08/2023		SOL ☼		IMPRATICÁVEL 📍	
MANHÃ		NUBLADO ☁		CHUVA 🌧	
TARDE		✓			
QTDE		MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO		QTDE	
1	AUXILIAR DE ENGENHARIA			1	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
7	OPERADOR			7	ENCARREGADO DE OBRAS
2	PEDREIRO			1	MOTORISTA
6	AJUDANTE			1	TOPOGRAFO
QTDE		EQUIPAMENTO			
1	COMPACTADOR PLACA VIBRATÓRIA				
2	ESCAVADEIRA				
1	PA CARREGADEIRA				
3	VEICULO DE APOIO				
1	CAMINHÃO TIPA				
5	CAMINHÃO BASCULANTE				
1	MINI ESCAVADEIRA				
1	CARRETA BASCULANTE				
1	RETROESCAVADEIRA				
1	MOTONIVELADORA				
1	TRATOR COM IMPLEMENTO GRADE				
NÚMERO DE T.R.		TAREFAS REALIZADAS			
DESCRICAO		OBSERVAÇÕES			
1	EXECUÇÃO DE SUB-BASE	E228 ATÉ E255			
2	EXECUÇÃO DE ALA DE BUEIRO	BUEIRO 2203 LD			
3	EXECUÇÃO DE COMPLEMENTO DE BUEIRO	BUEIRO 75			
4	SINALIZAÇÃO				
5	SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO TOPOGRÁFICO				

REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATORIOS)



29/08/2023, 10:44

sistemas.waysistemas.com/cimvalpi/Blk_Medicao_Relatorio_Parcial/#

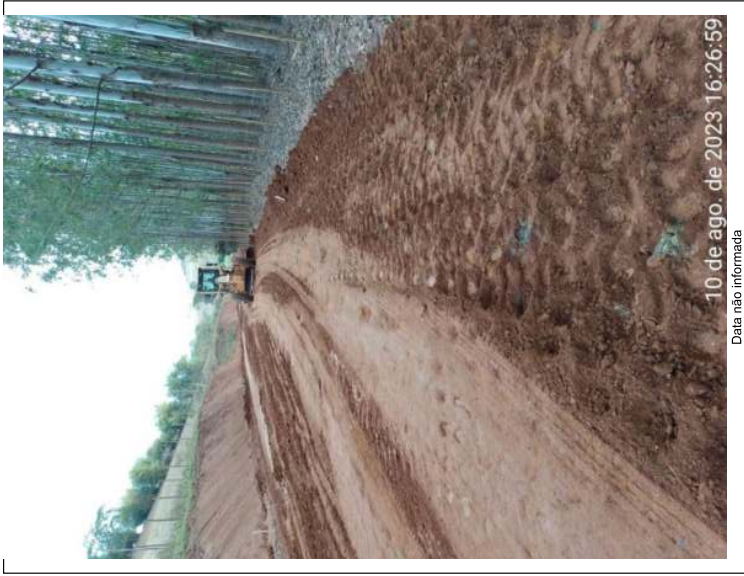

sistemas.waysistemas.com/cimvalpi/Blk_Medicao_Relatorio_Parcial/#

17/67

29/08/2023, 10:44

sistemas.waysistemas.com/cimvalpi/Blk_Medicao_Relatorio_Parcial/#



Data não informada



Data não informada



Data não informada



Data não informada



OCORRÊNCIAS	
NUMERO DE OC	TIPO DE OCORRÊNCIA
1	A PEDIDO DA PREFEREIRA, REPRESENTADA PELO FICAL JOSÉ MAURICIO, FOI EXECUTADO O COMPLEMENTO DO BUEIRO 75 LE. A FIM DE NÃO DEIXAR VALA ABERTA, PRÓXIMO À ESTRADA.
OBSERVAÇÕES	
EQUIPE E05 10/08/2023	
MUNICÍPIO (Aprovado)	
CONSORCIO (Aprovado em 15/08/2023 - 10-01)	
Obs.: "Drenagem"- Construção alongamento de bueiro na Est. 75. "Topografia"- Nivelamento para cascalho na Est. 237 até Est. 240. "Cascalho"- Cascalho nas Est. 01 até Est. 237 e Est. 237 até Est. 240. "Observação"- Bueiro com alças e calças finalizadas, porém sem acabamento -Est 230, Est 239, Est. 257.	
ASSINATURAS	
Luiz Henrique da Silva Borges Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 208679/D	APROVADO AUTOMATICAMENTE PELO SISTEMA PEDRO MANTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTONIO DO GRAMA CREA 137.103/D
	Luciano Xavier de Castro RT de Execução - CONSORCIO 3T - SOLOCAP-CONEPP CREA 69784/D

29/08/2023, 10:44

sistemas.waysistemas.com/cimvalpi/Blk_Medicao_Relatorio_Parcial/#



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

OBR: CTP 229/2023 - SANTO ANTONIO DO GRAMA - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA		CONTRATO:		RESP. TÉCNICO: LUCIANO XAVIER	
ENDERECO: SANTO ANTONIO DO GRAMA		INICIO: 01/04/2023		Nº CREIA-MG: 59784/D	
CIDDE: SANTO ANTONIO DO GRAMA		PRAZO: 01/10/2023		Nº DA ART:	
DISTRITO: SANTO ANTONIO DO GRAMA		UF:		COORDENADAS:	
DATA: 10/08/2023		SOL ☼		CHUVA ☁	
MANHÃ		NUBLADO ☁		IMPRATICÁVEL 🚫	
TARDE		✓			
QTDE		MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO		QTDE	
1		AUXILIAR DE ENGENHARIA		1	
7		OPERADOR		6	
2		PEDREIRO		1	
6		AJUDANTE			
QTDE		EQUIPAMENTO			
2		ESCAVADEIRA			
1		PA CARREGADEIRA			
2		VEICULO DE APOIO			
1		CAMINHÃO PIPA			
4		CAMINHÃO BASCULANTE			
1		MINI ESCAVADEIRA			
1		CARRETA BASCULANTE			
1		RETROSCAVADEIRA			
1		MOTONIVELADORA			
NUMERO DE T.R.		TAREFAS REALIZADAS			
DESCRICAO		OBSERVAÇÕES			
1. EXECUÇÃO DE CAMADA DE REFORÇO		E203 A E211 E214 A E219			
2. SINALIZAÇÃO					
3. TRANSPORTE DE MATERIAL: BGS					
4. EXECUÇÃO DE ALA DE BUEIRO		BUEIRO 0			
5. SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO TOPOGRÁFICO					
6. EXECUÇÃO DE CAIXA DE BUEIRO		BUEIRO 230			
		REGISTROS FOTOGRÁFICOS • (OBRIGATORIOS)			



29/08/2023, 10:44

sistemas.waysistemas.com/cimvalpi/Blk_Medicao_Relatorio_Parcial/#



sistemas.waysistemas.com/cimvalpi/Blk_Medicao_Relatorio_Parcial/#

20/67

29/08/2023, 10:44

sistemas.waysistemas.com/cimvalpi/Blk_Medicao_Relatorio_Parcial/#



OCORRÊNCIAS	
NÚMERO DE OC	DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA
OBSERVAÇÕES	
EQUIPE E05 09/08/2023	
MUNICÍPIO (Aprovado)	
CONFIRMAÇÃO	
CONSORCIO (Aprovado em 11/08/2023 - 10:12)	
Obs.: "Cerca" Sendo construída lado esquerdo Est. 26 até Est. 38. "Drenagem: Acabamento Est. 0 e construção no bueiro na Est. 230. "Topografia: Nivamento para receber cascalho Est. 205 a Est.209 e Est. 213 a Est. 230. "Terraplenagem: Camada reforço	
Obs.:	

sistemas.waysistemas.com/cimvalpi/Blk_Medicao_Relatorio_Parcial/#

21/67

29/08/2023, 10:44

sistemas.waysistemas.com/cimvalpi/Blk_Medicao_Relatorio_Parcial/#

Inas Est. 204 a Est. 207 e da Est. 213 a Est. 219, Cascalhamento da Est. 213 a Est. 230, Limpeza na área de empréstimo

ASSINATURAS

Luiz Henrique da Silva Borges
Fiscal de Obras - CIMVALPI
CREA 208579/D

APROVADO AUTOMATICAMENTE PELO SISTEMA
PEDRO MARTINO ZEFERINO
Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA
CREA 137.103/D

Luciano Xavier de Castro
RT de Execução - CONSORCIO 3T - SOLOCAP-CONEPP
CREA 59784/D



29/08/2023, 10:44

sistemas.waysistemas.com/cimvalpi/Blk_Medicao_Relatorio_Parcial/#



CIMVALPI
CONSORCIO INTERMUNICIPAL
MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

OBR: CTP 229/2023 - SANTO ANTONIO DO GRAMA - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA		CONTRATO:		RESP. TÉCNICO: LUCIANO XAVIER	
ENDEREÇO: SANTO ANTONIO DO GRAMA		INÍCIO: 01/04/2023		Nº CREA-MG: 59784/D	
CIDDE: SANTO ANTONIO DO GRAMA		PRAZO: 01/10/2023		Nº DA ART:	
DISTRITO: SANTO ANTONIO DO GRAMA		UF:		COORDENADAS:	
DATA: 09/08/2023	SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA ☔	IMPRATICÁVEL 🚫	
MANHÃ	✓				
TARDE	✓				
QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO		QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	
1	AUXILIAR DE ENGENHARIA		1	ENCARREGADO DE OBRAS	
7	OPERADOR		9	MOTORISTA	
2	PEDREIRO		1	TOPOGRAFO	
6	AJUDANTE				
QTDE	EQUIPAMENTO				
2	ESCAVADEIRA				
1	PA CARREGADEIRA				
2	VEICULO DE APOIO				
1	CAMINHÃO PIPA				
6	CAMINHÃO BASCULANTE				
1	MINI ESCAVADEIRA				
1	CARRETA BASCULANTE				
1	RETROESCAVADEIRA				
1	MOTONIVELADORA				
1	TRATOR COM IMPLMENTO GRADE				
TAREFAS REALIZADAS					
NÚMERO DE T.R.	DESCRIÇÃO		OBSERVAÇÕES		
1	EXECUÇÃO E ALTERAÇÃO DE DIMENSÕES DE BUEIRO		BUEIRO 239 LE (ACRÉSCIMO DE 2 MANILHAS)		
2	EXECUÇÃO DE BUEIRO		BUEIRO 0		
3	EXECUÇÃO DE BASE				
4	EXECUÇÃO DE CAIXA DE BUEIRO		BUEIRO 0		
5	EXECUÇÃO DE ALA DE BUEIRO		BUEIRO 0 BUEIRO 239 LD		
6	SINALIZAÇÃO				
7	SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO TOPOGRÁFICO				
REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATORIOS)					



8 de ago. de 2023 17:02:31
Estrada sem nome
Santo Antônio do Gramma
Minas Gerais

Data não informada



8 de ago. de 2023 17:01:35
231 Rua Capitão Braga
Santo Antônio Do Gramma
Santo Antônio do Gramma
Minas Gerais

Data não informada



29/08/2023, 10:44

sistemas.waysistemas.com/cimvalpi/Blk_Medicao_Relatorio_Parcial/#



sistemas.waysistemas.com/cimvalpi/Blk_Medicao_Relatorio_Parcial/#

24/67

29/08/2023, 10:44

sistemas.waysistemas.com/cimvalpi/Blk_Medicao_Relatorio_Parcial/#



OCORRÊNCIAS	
NÚMERO DE OC	TIPO DE OCORRÊNCIA
1	POSTE (ENTRE ESTACAS: 208 209) INVABILIZANDO A EXECUÇÃO DE ATERRRO EM SUA REGIÃO, AGUARDANDO POSICIONAMENTO DA PREFEITURA E CEMIG
2	POSTE (ENTRE ESTACAS: 279 283) INVABILIZANDO A REMOÇÃO DE SOLO MOLE EM SUA REGIÃO, AGUARDANDO POSICIONAMENTO DA PREFEITURA E CEMIG
OBSERVAÇÕES	
EQUIPE E05 08/08/2023	
MUNICÍPIO (Aprovado)	
Obs.: "Topografia nivelamento para catcacho. "Drenagem: Acabamento da caixa bueiro Est. 28, Construção de caixa bueiro Est. 27/4 Est. 27/5, Escavação apoiando a poda de arvore na Est. 288, Regularização com material argiloso Est. 213 até Est. 242, Bueiro Est. 0 - Total de 6 manilhas.	
ASSINATURAS	
CONFERÊNCIA	
CONSORCIO (Aprovado em 11/08/2023 - 10:02)	
Obs.: "Topografia nivelamento para catcacho. "Drenagem: Acabamento da caixa bueiro Est. 28, Construção de caixa bueiro Est. 27/4 Est. 27/5, Escavação apoiando a poda de arvore na Est. 288, Regularização com material argiloso Est. 213 até Est. 242, Bueiro Est. 0 - Total de 6 manilhas.	
APROVADO AUTOMATICAMENTE PELO SISTEMA	
Luiz Henrique da Silva Borges Fiscal de Obras - SANTO ANTONIO DO GRAMA CREA 208579/D	PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTONIO DO GRAMA CREA 137.103/D
RT de Execução - CONCORRÊNCIA - SOLOCAP-CONEPP CREA 59784/D	
Luciano Xavier de Castro RT de Execução - CONCORRÊNCIA - SOLOCAP-CONEPP CREA 59784/D	


29/08/2023, 10:44

sistemas.waysistemas.com/cimvalpi/Blk_Medicao_Relatorio_Parcial/#



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº 0054		OBRAS: CTP 229/2023 - SANTO ANTONIO DO GRAMA - PAVIMENTACAO ASFALTICA		CONTRATO:		RESP. TÉCNICO: LUCIANO XAVIER	
ENDEREÇO: SANTO ANTONIO DO GRAMA		CDDDE: SANTO ANTONIO DO GRAMA		INÍCIO: 01/04/2023		Nº CREAS-MG: 59784/D	
DISTRITO: SANTO ANTONIO DO GRAMA		SOL ☼		PRAZO: 01/10/2023		Nº DA ART:	
DATA: 08/08/2023		CHUVA ☁		COORDENADAS:		IMPRATICÁVEL 📶	
MANHÃ		Nublado ☁					
TARDE		Chuva ☁					
QTDE		MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO		QTDE		MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	
1	AUXILIAR DE ENGENHARIA	1		1	ENCARREGADO DE OBRAS		
6	OPERADOR	5		5	MOTORISTA		
1	PEDREIRO	1		1	TOPOGRAFO		
5	AJUDANTE	1		1	SINALEIRO		
QTDE		EQUIPAMENTO					
2	ESCOVADEIRA						
1	PA CARREGADEIRA						
2	VEICULO DE APOIO						
1	CAMINHÃO PIPA						
3	CAMINHÃO BASCULANTE						
1	MINI ESCOAVADEIRA						
1	RETROESCOVADEIRA						
1	MOTONIVELADORA						
1	TRATOR COM IMPLEMENTO GRADE						
TAREFAS REALIZADAS							
OBSERVAÇÕES							
NÚMERO DE T.R.		DESCRICO					
1	SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO TOPOGRÁFICO						
2	EXECUÇÃO DE ALA DE BUEIRO			230			
3	SINALIZAÇÃO						
4	PERFURAÇÃO DE ROCHA: APLICAÇÃO DE EXPLOSIVO			E92			
5	EXECUÇÃO DE CAMADA DE REFORÇO						
6	EXECUÇÃO DE BUEIRO			E0			
REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATORIOS)							

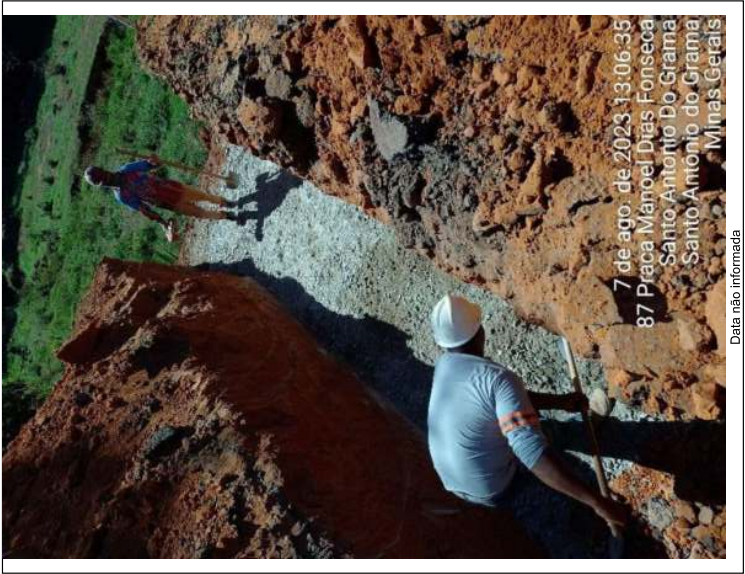

29/08/2023, 10:44

sistemas.waysistemas.com/cimvalpi/Blk_Medicao_Relatorio_Parcial/#



sistemas.waysistemas.com/cimvalpi/Blk_Medicao_Relatorio_Parcial/#

27/67

29/08/2023, 10:44

sistemas.waysistemas.com/cimvalpi/Blk_Medicao_Relatorio_Parcial/#



NUMERO DE OC	TIPO DE OCORRÊNCIA	OCORRÊNCIAS	DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA
EQUIPE E05 07/08/2023		OBSERVAÇÕES	
MUNICÍPIO (Aprovado)		CONFERÊNCIA	CONSORCIO Aprovado em 10/08/2023 - 16:53
Obs.:			Obs.: Topografia: Nivelamento da Est. 213 a Est. 230 e nivelamento da Est. 263 até Est. 276 para cascalho. "Drenagem: Cavatamento caixa de puerro Est. 28. Início construção de bueiro na Est. 0 e início construção de caixa e ala de bueiro na Est. 202. Delineação: Realizando furos nas Est. 89 e Est. 90.
		ASSINATURAS	
Luiz Henrique da Silva Borges Fiscal de Obras CIM VALPI CREA 208579/D		APROVADO AUTOMATICAMENTE PELO SISTEMA PEDRO MARTINO ZETTERNO Fiscal de Obras CREA 137.103/D	Luciano Xavier de Castro RT de Execução - CONSORCIO 97-SOLOCAP-CONEPP CREA 59784/D

29/08/2023, 10:44


sistemas.waysistemas.com/cimvalpi/Blk_Medicao_Relatorio_Parcial/#



CIMVALPI
CONSORCIO INTERMUNICIPAL
MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº 0053		OBRAS: CTP 229/2023 - SANTO ANTONIO DO GRAMA - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA		CONTRATO:		RESP. TÉCNICO: LUCIANO XAVIER	
ENDEREÇO: SANTO ANTONIO DO GRAMA		CIDDE: SANTO ANTONIO DO GRAMA		INÍCIO: 01/04/2023		Nº CREA-MG: 59784/D	
DISTRITO: SANTO ANTONIO DO GRAMA		UF:		PRAZO: 01/10/2023		Nº DA ART:	
DATA: 07/08/2023		SOL: ☼		NUBLADO: ☁		COORDENADAS: IMPRATICÁVEL 📍	
MANHÃ		✓					
TARDE		✓					
QTDE		MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO		QTDE		MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	
1		AUXILIAR DE ENGENHARIA		1		ENCARREGADO DE OBRAS	
3		OPERADOR		5		MOTORISTA	
1		AJUDANTE		1		SINALEIRO	
QTDE		EQUIPAMENTO					
1		ESCAVADEIRA					
1		VEICULO DE APOIO					
1		CAMINHÃO PIPA					
3		CAMINHÃO BASCULANTE					
1		MOTONIVELADORA					
1		TRATOR COM IMPLEMENTO GRADE					
TAREFAS REALIZADAS				OBSERVAÇÕES			
NÚMERO DE T.R.		DESCRIÇÃO					
1		SINALIZAÇÃO					
2		PERFURAÇÃO DE ROCHA: APLICAÇÃO DE EXPLOSIVO				E92	
3		EXCUÇÃO DE ATERRO					
		REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATORIOS)					

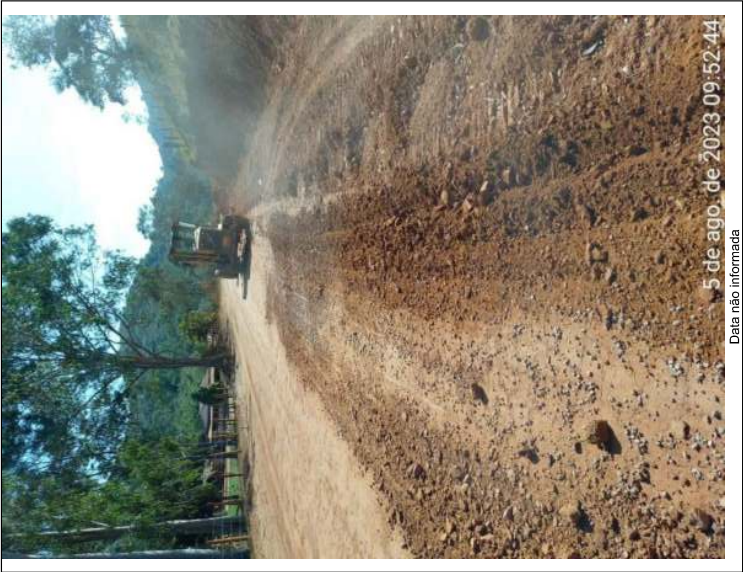

29/08/2023, 10:44

sistemas.waysistemas.com/cimvalpi/Blk_Medicao_Relatorio_Parcial/#



Data não informada



Data não informada



Data não informada



Data não informada



29/08/2023, 10:44

sistemas.waysistemas.com/cimvalpi/Blk_Medicao_Relatorio_Parcial/#



5 de ago. de 2023 12:17:29

Data não informada



5 de ago. de 2023 11:37:49
Estrada sem nome
Santo Antônio do Grama
Minas Gerais

Data não informada

NÚMERO DE OC		OCORRÊNCIAS	
	TIPO DE OCORRÊNCIA	DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA	
EQUIPE 05/08/2023			
MUNICÍPIO (Aprovado)			
Obs.:		CONSORCIO Aprovado em 08/08/2023 - 15:25	
		Obs.: Conforme executado em campo.	
ASSINATURAS			
Luiz Henrique da Silva Borges Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 208579/D		APROVADO AUTOMATICAMENTE PELO SISTEMA PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA CREA 137.703/D	
		RT de Execução - CONSORCIO 31 - SOLOCAP-CONEPP Luciano Xavier de Castro CREA 9784/D	



29/08/2023, 10:44

sistemas.waysistemas.com/cimvalpi/Blk_Medicao_Relatorio_Parcial/#




RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

OBR.: CTP 229/2023 - SANTO ANTONIO DO GRAMA - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA		CONTRATO:		RESP. TÉCNICO: LUCIANO XAVIER	
ENDEREÇO: SANTO ANTONIO DO GRAMA		INÍCIO: 01/04/2023		Nº CREA-MG: 59784/D	
CIDDE: SANTO ANTONIO DO GRAMA		PRAZO: 01/10/2023		Nº DA ART:	
DISTRITO: SANTO ANTONIO DO GRAMA		UF:		COORDENADAS:	
DATA: 07/08/2023		SOL ☼		CHUVA ☁	
MANHÃ				IMPRATICÁVEL 🚧	
TARDE					
QTDE		MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO		QTDE	
1		AUXILIAR DE ENGENHARIA		1	
7		OPERADOR		6	
5		AJUDANTE ESPECIALIZADO		2	
1		TOPOGRAFO		1	
QTDE		EQUIPAMENTO			
2		ESCAVADEIRA			
1		PA CARREGADEIRA			
2		VEICULO DE APOIO			
1		CAMINHÃO PIPA			
4		CAMINHÃO BASCULANTE			
1		MINI CARREGADEIRA			
1		RETROESCAVADEIRA			
1		MOTONIVELADORA			
1		TRATOR COM IMPLEMENTO GRADE			
NUMERO DE T.R.		TAREFAS REALIZADAS			
DESCRICAO		OBSERVAÇÕES			
1		EXECUÇÃO DE CAIXA DE BUEIRO		28 E 197	
2		PERFURAÇÃO DE ROCHA: APLICAÇÃO DE EXPLOSIVOS		E 135, E92	
3		SINALIZAÇÃO			
4		EXECUÇÃO DE SUB-BASE			
5		SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO TOPOGRÁFICO			
REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)					



29/08/2023, 10:44

sistemas.waysistemas.com/cimvalpi/Blk_Medicao_Relatorio_Parcial/#

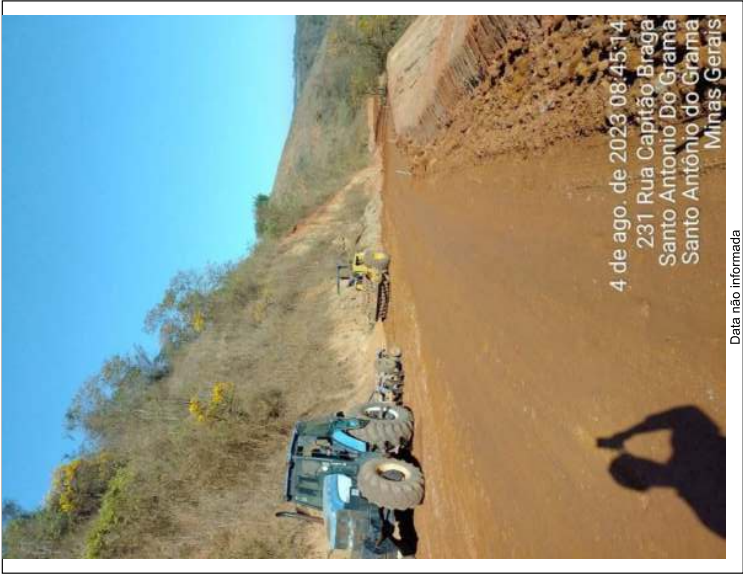

sistemas.waysistemas.com/cimvalpi/Blk_Medicao_Relatorio_Parcial/#

33/67

29/08/2023, 10:44

sistemas.waysistemas.com/cimvalpi/Blk_Medicao_Relatorio_Parcial/#



OCORRÊNCIAS		DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA	
NÚMERO DE OC	TIPO DE OCORRÊNCIA	OBSERVAÇÕES	
EQUIPE E05 04/08/2023			
MUNICÍPIO (Aprovado)		CONFÉRENCIA	
		CONSORCIO (Aprovado em 08/08/2023 - 15:18)	
Obs.:		Obs.: "Drenagem: Acabamento buelro Est. 58. Construção do buelro Est. 28. "Topografia: Levantamento e marcação nas Est. 69, Est. 70, Est. 71, Est. 72, para furos de delonapão. " Cerca: Sendo executada lado esquerdo - Est. 171 a Est. 177. " Terraplenagem: Remoção de pedras e limpeza nas Est. 71 a Est.73. Cascalhamento Est. 0 a Est.31. " Detonação:Furos nas Est. 89 a Est. 90.	
ASSINATURAS			
LUIZ HENRIQUE DA SILVA BORGES Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 208579/D		APROVADO AUTOMATICAMENTE PELO SISTEMA PEDRO MARTINO ZERENO Fiscal de Obras - SANTO ANTONIO DO GRAMA CREA 137.103/D	
		Luciano Xavier de Castro RT de Execução - CONSORCIO 3T - SOLOCAP-CONEPP CREA 59784/D	



29/08/2023, 10:44

sistemas.waysistemas.com/cimvalpi/Blk_Medicao_Relatorio_Parcial/#




RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

OBR.: CTP 229/2023 - SANTO ANTONIO DO GRAMA - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA		CONTRATO:		RESP. TÉCNICO: LUCIANO XAVIER	
ENDEREÇO: SANTO ANTONIO DO GRAMA		INÍCIO: 01/04/2023		Nº CREA-MG: 59784/D	
CIDDE: SANTO ANTONIO DO GRAMA		PRAZO: 01/10/2023		Nº DA ART:	
DISTRITO: SANTO ANTONIO DO GRAMA		UF:		COORDENADAS:	
DATA: 04/08/2023		SOL ☼		CHUVA ☁	
MANHÃ				IMPRATICÁVEL 🚫	
TARDE					
QTDE		MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO		QTDE	
1	AUXILIAR DE ENGENHARIA	1		ENCARREGADO DE OBRAS	
7	MOTORISTA	2		PEDREIRO	
1	TOPOGRAFO	5		AJUDANTE	
1	SINALEIRO				
QTDE		EQUIPAMENTO			
2	ESCAVADEIRA				
1	PA CARREGADEIRA				
2	VEICULO DE APOIO				
1	CAMINHÃO PIPA				
5	CAMINHÃO BASCULANTE				
1	MINI ESCAVADEIRA				
1	RETROESCAVADEIRA				
1	MOTONIVELADORA				
1	TRATOR COM IMPLEMENTO GRADE				
NUMERO DE T.R.		TAREFAS REALIZADAS			
DESCRICAO		OBSERVAÇÕES			
1	EXECUÇÃO DE CAIXADE BUEIRO	28			
2	SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO TOPOGRÁFICO				
3	PERFURAÇÃO DE ROCHA (INSTALAÇÃO DE EXPLOSIVO)	EI135			
4	REMOÇÃO DE ROCHA E LIMPEZA DO LOCAL	E69 A E71			
5	EXECUÇÃO DE SUB-BASE	E43 A E 68			
6	SINALIZAÇÃO				
7	EXECUÇÃO DE ALA DE BUEIRO	197 E 263			
		REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATORIOS)			



Data não informada

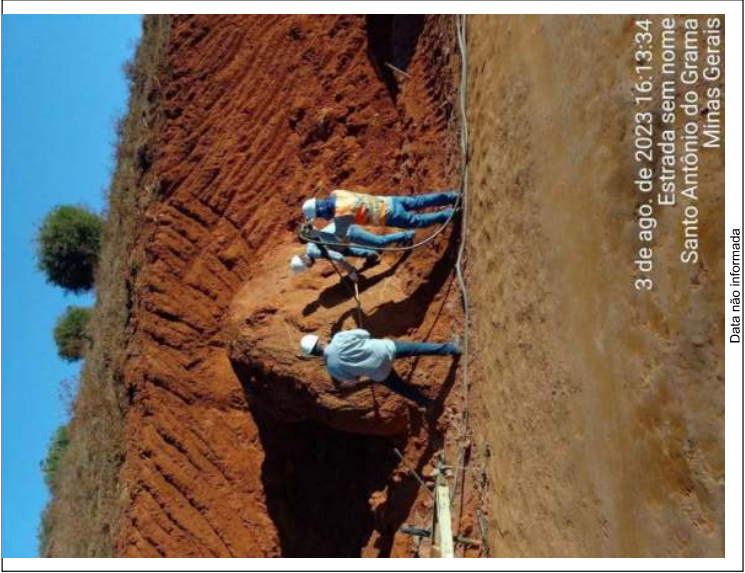


Data não informada




29/08/2023, 10:44

sistemas.waysistemas.com/cimvalpi/Blk_Medicao_Relatorio_Parcial/#

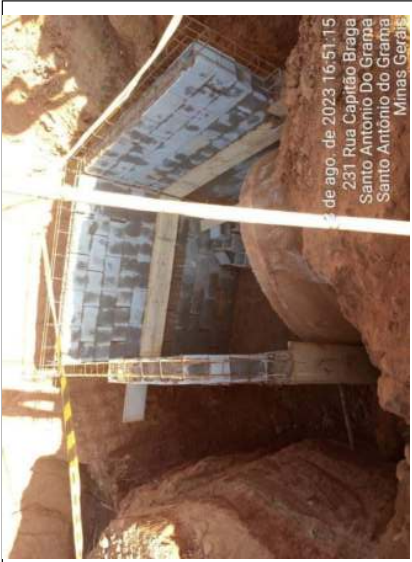

3 de ago. de 2023 16:51:15
231 Rua Capitão Braga
Santo Antônio do Gramma
Minas Gerais

Data não informada

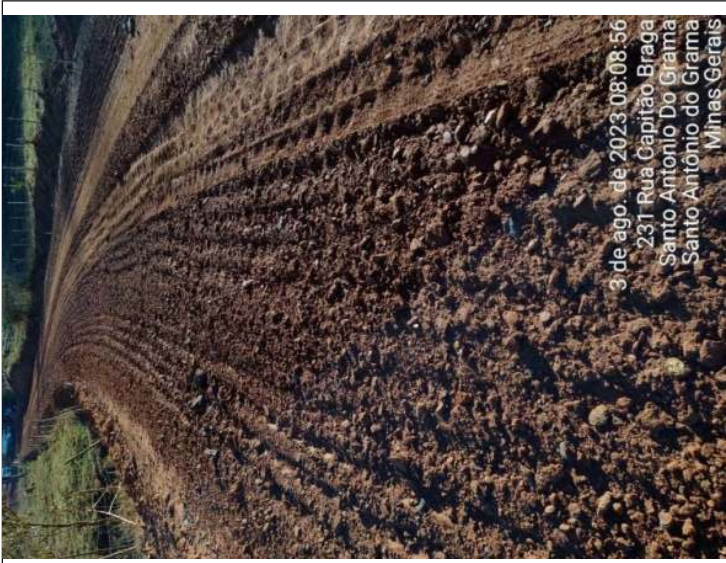

3 de ago. de 2023 08:08:56
231 Rua Capitão Braga
Santo Antônio do Gramma
Minas Gerais

Data não informada



3 de ago. de 2023 14:26:43
Estrada sem nome
Santo Antônio do Gramma
Minas Gerais

Data não informada



3 de ago. de 2023 14:27:56
Estrada sem nome
Santo Antônio do Gramma
Minas Gerais

Data não informada



sistemas.waysistemas.com/cimvalpi/Blk_Medicao_Relatorio_Parcial/#

36/67

29/08/2023, 10:44

sistemas.waysistemas.com/cimvalpi/Blk_Medicao_Relatorio_Parcial/#



3 de ago. de 2023 14:51:56
Estrada sem nome
Santo Antônio do Gramma
Minas Gerais

Data não informada



3 de ago. de 2023 14:22:55
231 Rua Capitão Braga
Santo Antônio do Gramma
Minas Gerais

Data não informada



3 de ago. de 2023 10:35:59
Estrada sem nome
Santo Antônio do Gramma
Minas Gerais

Data não informada



Data não informada



OCORRÊNCIAS	
NUMERO DE OC	DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA
OBSERVAÇÕES	
EQUIPE E05 03/08/2023	
MUNICÍPIO (Aprovado)	CONFIRMAÇÃO
CONSORCIO (Aprovado em 04/08/2023 - 16:47)	
Obs.: "Drenagem: Construção caixa bueiro Est. 28 e acabamento bueiro Est. 262. "Topografia: Marcação bueiro Est. " Nivelamento Est. 240 a Est. 260. " Cerca: Sendo construída Est. 173 a Est. 177. "Terraplenagem: Limpeza na via, nas Est. 85 a	
Obs.:	

sistemas.waysistemas.com/cimvalpi/Blk_Medicao_Relatorio_Parcial/#

37/67

29/08/2023, 10:44

sistemas.waysistemas.com/cimvalpi/Blk_Medicao_Relatorio_Parcial/#

Est. 93, Cascalho da Est. 21 até Est. 43, Limpeza, remoção de pedras e bambu Est. 94, *Início dos furos para detonação nas Est.135, Est.189, Est. 190, Est. 191, Est. 72 e Est. 73

ASSINATURAS

Luiz Henrique da Silva Borges
Fiscal de Obras - CIMVALPI
CREA 208579/D

APROVADO AUTOMATICAMENTE PELO SISTEMA
PEDRO MARTINO ZEFERINO
Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA
CREA 137.103/D

Ludiano Xavier de Castro
RT de Execução - CONSORCIO 3T –SOLOCAP-CONEPP
CREA 59784/D





RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº 0050	OBRA: CTP-228/2023 - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA • PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA		CONTRATO:		RESP. TÉCNICO: LUCIANO XAVIER	
ENDERECO: SANTO ANTONIO DO GRAMA CIDDE:			INICIO: 01/04/2023 PRAZO: 01/10/2023		Nº CREAMG: 59784JD	
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA			UF:		COORDENADAS:	
DATA: 03/08/2023	SOL ☀		NUBLADO ☁	CHUVA 🌧	IMPRATICÁVEL ⚡	
MANHÃ	✓					
TARDE	✓					
QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO		QTDE		MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	
1	AUXILIAR DE ENGENHARIA		1		ENCARREGADO DE OBRAS	
7	OPERADOR		7		MOTORISTA	
2	PEDREIRO		1		TOPOGRAFO	
5	AJUDANTE		1		SINALEIRO	
QTDE	EQUIPAMENTO					
3	ESCAVADEIRA					
1	PA CARREGADEIRA					
2	VEICULO DE APOIO					
1	CAMINHÃO PIÇA					
5	CAMINHÃO BASCULANTE					
1	MINI ESCAVADEIRA					
1	RETROESCAVADEIRA					
1	MOTONIVELADORA					
1	TRATOR COM IMPLMENTO GRADE					
NÚMERO DE T.R.	DESCRICAO		TAREFAS REALIZADAS			
1	EXECUÇÃO DE SUB-BASE E50 À E81		OBSERVAÇÕES			
2	SINALIZAÇÃO		E50 À E81			
3	EXECUÇÃO DE ALA DE BUEIRO		263			
4	EXECUÇÃO DE CAIXA D'AGUA		28			
5	REMOÇÃO DE PEDRA		E69 À E72			
6	EXECUÇÃO DE GREIDE		E15 À E16			
7	SERVICO DE ACOMPANHAMENTO TOPOGRAFICO					
REGISTROS FOTOGRAFICOS • (OBRIGATORIOS)						



2 de ago. de 2023 08:16:56
Estrada sem nome
Santo Antônio do Gramma
Minas Gerais

Data não informada

29/08/2023, 10:44

sistemas.waysistemas.com/cimvalpi/Blk_Medicao_Relatorio_Parcial/#




sistemas.waysistemas.com/cimvalpi/Blk_Medicao_Relatorio_Parcial/#

40/67

29/08/2023, 10:44

sistemas.waysistemas.com/cimvalpi/Blk_Medicao_Relatorio_Parcial/#

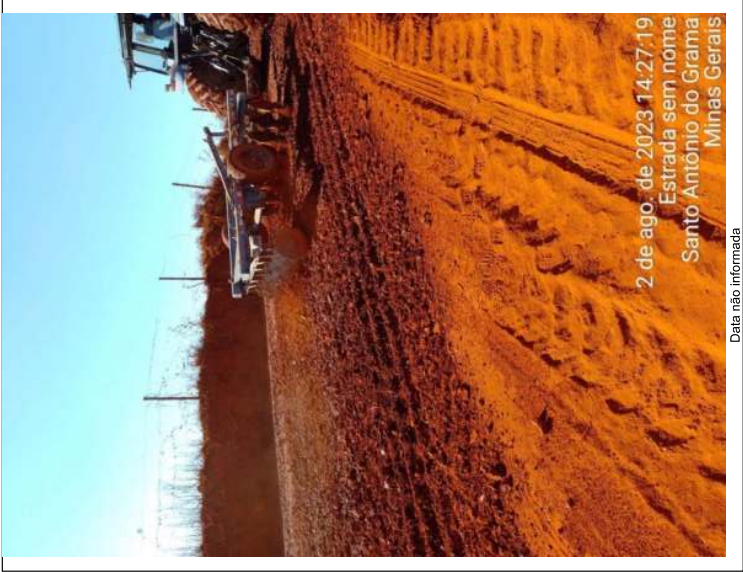

Data não informada



Data não informada

OCORRÊNCIAS		DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA
NÚMERO DE OC	TIPO DE OCORRÊNCIA	OBSERVAÇÕES
EQUIPE E05 02/08/2023		
MUNICÍPIO (Aprovado)		CONFÉRENCIA
Obs.:		CONSORCIO (Aprovado em 04/08/2023 - 16:42)
		Obs.: "Drenagem: Construção de alça e caixa do bueiro Est. 263, Est. 197 e Est. 28." "Topografia: Nivelamento nas Est. 242 a Est. 263." "Cerca: Serão construída nas Est. 263 até 277." "Ferraplenagem: Remoção pedras nas Est. 69, Est. 78, Est. 71." "Ferraplenagem: Remoção pedras nas Est. 69, Est. 78, Est. 71, Limpeza de vias com proteção. Cascalho da Est. 43 até Est. 68.
ASSINATURAS		
Luiz Henrique da Silva Borges Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 208579/D	APROVADO AUTOMATICAMENTE PELO SISTEMA PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTONIO DO GRAMA CREA 137.103/D	Luciano Xavier de Castro RT de Execução - CONSORCIO ST- SOLOCAP- CONEPP CREA 99784/D



29/08/2023, 10:44

sistemas.waysistemas.com/cimvalpi/Blk_Medicao_Relatorio_Parcial/#



CIMVALPI

CONSORCIO INTERMUNICIPAL
MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº 0049

OBRÁ: CTP 229/2023 - SANTO ANTONIO DO GRAMA - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA

ENDERECO: SANTO ANTONIO DO GRAMA

CIDDE: SANTO ANTONIO DO GRAMA

DISTRITO: SANTO ANTONIO DO GRAMA

DATA: 02/08/2023

SOL

MANHÃ

TARDE

QTDE

MAO DE OBRA INDIRETA
FUNÇÃO / CARGO

1

AUXILIAR DE ENGENHARIA

7

OPERADOR

2

PEDREIRO

5

AJUDANTE

QTDE

EQUIPAMENTO

3

ESCAVADEIRA

1

PA CARREGADEIRA

1

COMPACTADOR DE SOLO

2

VEICULO DE APOIO

1

CAMINHÃO PIPA

6

CAMINHÃO BASCULANTE

1

MINI ESCAVADEIRA

1

RETROESCAVADEIRA

1

MOTONIVELADORA

NUMERO DE T.R.

DESCRICAO

1

EXECUÇÃO DE SUB-BASE

2

SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO TOPOGRÁFICO

3

EXECUÇÃO DE ALA DE BUEIRO

4

SINALIZAÇÃO

5

EXECUÇÃO DE DRENO PROFUNDO

TAREFAS REALIZADAS

OBSERVAÇÕES

BUEIROS 197, 263

REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)

1 de ago. de 2023 10:46:50



Data não informada

1 de ago. de 2023 15:31:41



Data não informada

sistemas.waysistemas.com/cimvalpi/Blk_Medicao_Relatorio_Parcial/#

42/67

Pag.: 43 / 69 ID. do Doc.: 15.C61 - 29/08/2023 - 10:53:10 - ASSINADO POR(3): CPF:760.22*.**6.*5 CPF:015.49*.**6.*9 CPF:016.28*.**6.*7

29/08/2023, 10:44

sistemas.waysistemas.com/cimvalpi/Blk_Medicao_Relatorio_Parcial/#



sistemas.waysistemas.com/cimvalpi/Blk_Medicao_Relatorio_Parcial/#

43/67

29/08/2023, 10:44

sistemas.waysistemas.com/cimvalpi/Blk_Medicao_Relatorio_Parcial/#



sistemas.waysistemas.com/cimvalpi/Blk_Medicao_Relatorio_Parcial/#

44/67

29/08/2023, 10:44

sistemas.waysistemas.com/cimvalpi/Blk_Medicao_Relatorio_Parcial/#



OCORRÊNCIAS		DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA
NÚMERO DE OC	TIPO DE OCORRÊNCIA	OBSERVAÇÕES
EQUIPE E05 01/08/2023		
MUNICÍPIO (Aprovado)		CONFÉRENCIA
Obs.:		CONSORCIO (Aprovado em 07/08/2023 - 13.34) Obs.: "Drenagem: Construção das alas do bueiro na Est. 263. Construção de caixa e ala do bueiro Est. 197. "Dreno profundo: Est. 202 a Est. 207. "Topografia: Estaqueamento para cascalho e alinhamento para caixa de bueiros. "Terraplenagem, Limpeza e proteção cascalhamento nas Est. 111 até Est. 65.
ASSINATURAS		
APROVADO AUTOMATICAMENTE PELO SISTEMA		
LUIZ HENRIQUE DA SILVA BORGES Fiscal de Obras - CIM VALPI CREA 2085730/D		PEDRO MARTINO ZEPHERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTONIO DO GRAMA CREA 137.103/D
		LUCIANO XAVIER DE CASTRO RT de Execução - CONSORCIO ST-SOLOCAP-CONEPP CREA 59784/D

29/08/2023, 10:44

sistemas.waysistemas.com/cimvalpi/Blk_Medicao_Relatorio_Parcial/#



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

OBRAS: CTP 229/2023 - SANTO ANTONIO DO GRAMA - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA		CONTRATO:		RESR. TÉCNICO: LUCIANO XAVIER	
ENDEREÇO: SANTO ANTONIO DO GRAMA		INÍCIO: 01/04/2023		Nº CREA-MG: 59784/D	
CIDDE: SANTO ANTONIO DO GRAMA		PRAZO: 01/10/2023		Nº DA ART:	
UF:		COORDENADAS:			
DATA: 01/08/2023	SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA ☔	IMPRATICÁVEL ☹	
MANHÃ		✓			
TARDE					
QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO		
1	AUXILIAR DE ENGENHARIA	6	OPERADOR		
7	MOTORISTA	1	ELETRICISTA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA		
2	PEDREIRO	1	TOPOGRAFO		
5	AJUDANTE	1	SINALEIRO		
QTDE	EQUIPAMENTO				
2	ESCAVADEIRA				
1	PA CARREGADEIRA				
1	COMPACTADOR DE SOLO				
2	VEICULO DE APOIO				
1	CAMINHÃO PIPA				
6	CAMINHÃO BASCULANTE				
1	MINI ESCAVADEIRA				
1	RETROESCAVADEIRA				
1	MOTONIVELADORA				
NUMERO DE T.R.	DESCRIÇÃO	TAREFAS REALIZADAS			
	OBSERVAÇÕES				
1	SINALIZAÇÃO				
2	EXECUÇÃO DE COMPACTAÇÃO DE BUEIRO				
3	SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO TOPOGRÁFICO				
4	EXECUÇÃO DE ALA DE BUEIRO				
5	EXECUÇÃO DE LERA DE PROTEÇÃO				
6	EXECUÇÃO DE SUB-BASE				
7	EXECUÇÃO DE CAMADE BUEIRO				

REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATORIOS)



Data não informada



Data não informada

31 de jul. de 2023 14:25:10
Estrada sem nome
Santo Antônio do Grama
Minas Gerais



29/08/2023, 10:44

sistemas.waysistemas.com/cimvalpi/Blk_Medicao_Relatorio_Parcial/#



31 de jul. de 2023 16:29:44
Data não informada



31 de jul. de 2023 16:18:12
Estrada sem nome
Santo Antônio do Gramma
Minas Gerais

Data não informada



31 de jul. de 2023 09:18:11
Data não informada



31 de jul. de 2023 08:51:40

Data não informada




sistemas.waysistemas.com/cimvalpi/Blk_Medicao_Relatorio_Parcial/#

47/67

29/08/2023, 10:44

sistemas.waysistemas.com/cimvalpi/Blk_Medicao_Relatorio_Parcial/#

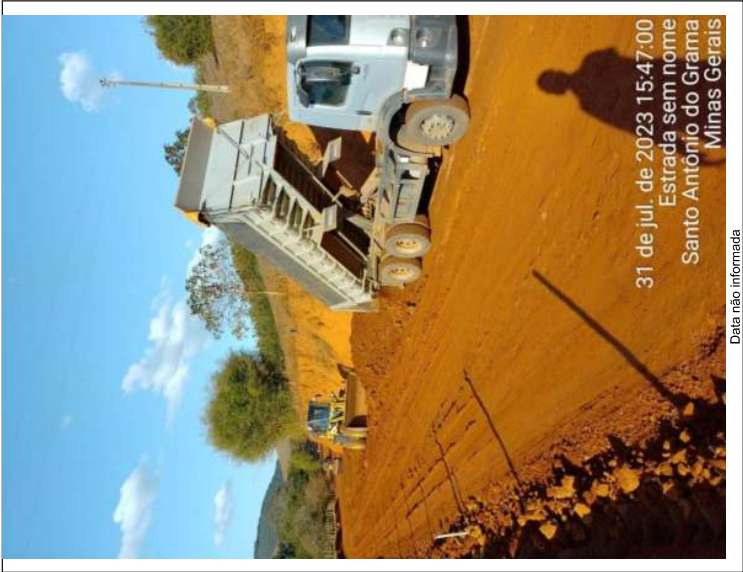

OCORRÊNCIAS		DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA
NUMERO DE OC	TIPO DE OCORRÊNCIA	OBSERVAÇÕES
EQUIPE E05 31/07/2023		
MUNICÍPIO (Aprovado)		
Obs.: CONSORCIO (Aprovado em 02/08/2023 - 15:50) Obs.: "Drenagem - Construção de caixa da bueiro Est. 197, Construção de alas do bueiro Est. 263, "Topografia - Levantamento local para detonação e marcação das Est. para cascalho, "Cerca - Sendo executada da Est. 263 até Est. 276, "Terraplenagem - Cascalho Est. 197 até Est. 199, "Ponte Est. 03 até Est. 23 (lado esquerdo), "Póua sinalização de segurança na obra, principalmente nos pontos de intervenções.		
ASSINATURAS		
APROVADO AUTOMATICAMENTE PELO SISTEMA		RT de Execução - CONSORCIO 31 - SOLOCAP-CONEPP
LUIZ HENRIQUE DA SILVA BORGES Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 208679/D		LUCIANO XAVIER DA COSTA CREA 89784/D

29/08/2023, 10:44

sistemas.waysistemas.com/cimvalpi/Blk_Medicao_Relatorio_Parcial/#

Atenção

Undefined offset: 0



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº 0047

OBRA: CTP 229/2023 - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA

ENDERECO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA

CIDDE:

DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA

DATA:

QTDE

QTDE

SOL ☀

MAO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO

CONTRATO:

INÍCIO: 01/04/2023

PRAZO: 01/10/2023

UF:

NUBLADO ☁

CHUVA ☔

QTDE

EQUIPAMENTO

TAREFAS REALIZADAS

OBSERVAÇÕES

REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATORIOS)

RESP. TÉCNICO: LUCIANO XAVIER

Nº CREA-MG: 59784/D

Nº DA ART:

COORDENADAS:

IMPRATICÁVEL 🚧

MAO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO

NÚMERO DE T.R.

DESCRIÇÃO

NÚMERO DE OC

TIPO DE OCORRÊNCIA

OCORRÊNCIAS

OBSERVAÇÕES

EQUIPE E05 31/07/2023

DESCRÇÃO DA OCORRÊNCIA

MUNICÍPIO (Aprovado)

CONFÉRENCIA

CONSORCIO (Reprovado)

Obs.: * REPROVADO RDO SEM FOTOS.

ASSINATURAS

Luiz Henrique da Silva Borges

Fiscal de Obras - CIMVALPI

CREA 208579/D

APROVADO AUTOMATICAMENTE PELO SISTEMA

PEDRO MARTINO ZEFERINO

Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA

CREA 137.103/D

Ludiano Xavier de Castro

RT de Execução - CONSORCIO 3T -SOLOCAP-CONEPP

CREA 59784/D

sistemas.waysistemas.com/cimvalpi/Blk_Medicao_Relatorio_Parcial/#

49/67

Pag.: 50 / 69 ID. do Doc.: 15.C61 - 29/08/2023 - 10:53:10 - ASSINADO POR(3): CPF:760.22*.**6.*5 CPF:015.49*.**6.*9 CPF:016.28*.**6.*7

29/08/2023, 10:44

sistemas.waysistemas.com/cimvalpi/Blk_Medicao_Relatorio_Parcial/#



CIMVALPI
CONSORCIO INTERMUNICIPAL
MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

OBR: CTP 229/2023 - SANTO ANTONIO DO GRAMA - PAVIMENTACAO ASFALTICA		CONTRATO:		RESR. TÉCNICO: LUCIANO XAVIER	
ENDERECO: SANTO ANTONIO DO GRAMA		INICIO: 01/04/2023		Nº CREA-MG: 59784/D	
CIDDE: SANTO ANTONIO DO GRAMA		PRAZO: 01/10/2023		Nº DA ART:	
DISTRITO: SANTO ANTONIO DO GRAMA		UF:		COORDENADAS:	
DATA: 31/07/2023	SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA ☔	IMPRATICÁVEL ☹	
MANHÃ		✓			
TARDE		✓			
QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO		
1	AUXILIAR DE ENGENHARIA	1	ENCARREGADO DE OBRAS		
6	OPERADOR	7	MOTORISTA		
6	PEDREIRO	1	TOPOGRAFO		
5	AJUDANTE	1	SINALEIRO		
QTDE	EQUIPAMENTO				
3	ESCAVADEIRA				
1	COMPACTADOR DE SOLO				
2	VEICULO DE APOIO				
1	CAMINHÃO PIPA				
5	CAMINHÃO BASCULANTE				
1	MINI ESCAVADEIRA				
1	RETROESCAVADEIRA				
1	MOTONIVELADORA				
TAREFAS REALIZADAS					
NÚMERO DE T.R.	DESCRIÇÃO	OBSERVAÇÕES			
1	EXECUÇÃO DE CAIXA DE BUEIRO				
2	SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO TOPOGRÁFICO				
3	EXECUÇÃO DE CAIXA DE BUEIRO				
4	EXECUÇÃO DE SUB BASE				
5	SINALIZAÇÃO				
REGISTROS FOTOGRÁFICOS • OBRIGATÓRIOS					



29/08/2023, 10:44

sistemas.waysistemas.com/cimvalpi/Blk_Medicao_Relatorio_Parcial/#



Data não informada



Data não informada



Data não informada



Data não informada



sistemas.waysistemas.com/cimvalpi/Blk_Medicao_Relatorio_Parcial/#

51/67



NÚMERO DE OC	TIPO DE OCORRÊNCIA	OCORRÊNCIAS	DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA
EQUIPE E03 28/07/2023		OBSERVAÇÕES	
		CONFERÊNCIA	
MUNICÍPIO (Aprovado)		CONSORCIO (Aprovado em 01/08/2023 - 10:00)	
Obs.:		Obs.: "Topografia - Marcação das estações para cascalho, "Cerca - Executadas mais 795 metros, "Drenagem - Acabamento buero Est. 135, Construção de ala e caixa buero Est. 197, Reforma ala buero Est. 03, Compactação das caixas e alas dos bueros, "terraplenagem - ABERTURA DE VALAS DO BUERO Est. 75, Cascalho da Est. 140 a Est. 197, Limpeza e rampa Est. 84 a Est. 173, "Falta sinalização no trechos de intervenções.	
		ASSINATURAS	
		APROVADO AUTOMATICAMENTE PELO SISTEMA	
Luiz Henrique da Silva Borges Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 208579/D	PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTONIO DO GRAMA CREA 137.103/D		Luciano Xavier de Castro RT de Execução - CONSORCIO 31 - SOLOCAP-CONEPP CREA 59784/D

29/08/2023, 10:44

sistemas.waysistemas.com/cimvalpi/Blk_Medicao_Relatorio_Parcial/#



CIMVALPI
CONSORCIO INTERMUNICIPAL
MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº 0045		OBRÁ: CTP 229/2023 - SANTO ANTONIO DO GRAMA - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA		CONTRATO:		RESR. TÉCNICO: LUCIANO XAVIER	
ENDEREÇO: SANTO ANTONIO DO GRAMA		INÍCIO: 01/04/2023		Nº CREA-MG: 59784ID			
CIDDE: SANTO ANTONIO DO GRAMA		PRAZO: 01/10/2023		Nº DA ART:			
DISTRITO: SANTO ANTONIO DO GRAMA		UF:		COORDENADAS:			
DATA: 31/07/2023		SOL ☀		CHUVA ☁		IMPRATICÁVEL 🚫	
MANHÃ		✓					
TARDE		✓					
QTDE		MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO		QTDE		MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	
1	AUXILIAR DE ENGENHARIA			1	ENCARREGADO DE OBRAS		
6	OPERADOR			6	MOTORISTA		
2	PEDREIRO			5	AJUDANTE		
1	SINALEIRO						
QTDE		EQUIPAMENTO					
3	ESCAVADEIRA						
1	COMPACTADOR DE SOLO						
2	VEICULO DE APOIO						
5	CAMINHÃO BASCULANTE						
1	MINI ESCAVADEIRA						
1	RETROESCAVADEIRA						
1	MOTONIVELADORA						
TAREFAS REALIZADAS							
NUMERO DE T.R.	DESCRIÇÃO			OBSERVAÇÕES			
1	SINALIZAÇÃO						
2	EXECUÇÃO DE CAIXA DE BUEIRO						
3	EXECUÇÃO DE ABERTURA DE CAIXA						
4	EXECUÇÃO DE SUB BASE						
REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATORIOS)							



29/08/2023, 10:44

Parcial/#	Relatorio Medico	Blk	cimvalpi.com/sistemas.waysistemas.com
1	Relatorio Medico	Blk	cimvalpi.com/sistemas.waysistemas.com



NÚMERO DE OC	TIPO DE OCORRÊNCIA	OCORRÊNCIAS OBSERVAÇÕES	DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA
EQUIPE E05 27/07/2023			
MUNICÍPIO (Aprovado)	CONSORCIO (Aprovado em 01/08/2023 - 10:09)	CONFERENCIA	
Obs.:	Obs.: - Falta de sinalização nos trechos de intervenção. - Topografia - Marcação e nivelamento para cascalho. - Cerca - Sendo construída Est. 65 até Est. 177 L.D. - Drenagem - Construção de caixa buleiro Est. 25 e construção caixa buleiro Est. 135. Acabamento com dissipador na ala do buleiro Est. 135. Compactação nas calhas dos buleiros Est. 64 e Est. 75. - Terraplenagem - Regularização da Est. 118 a Est. 121. Rebano na Est. 123 até Est. 128. Limpeza - Est. 106 a Est. 118. Limpeza as margens da estrada.		
ASSINATURAS			
APROVADO AUTOMATICAMENTE PELO SISTEMA		Luciano Xavier de Castro	
PEDRO MARTINO ZEFERINO		RT de Execução - CONSORCIO 31 - SOLOCAP-CONEPP	
Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA		CREA 59784/D	
CREA 137.103/D			
Luiz Henrique da Silva Borges			
Fiscal de Obras - CIMVALPI			
CREA 208579/D			

29/08/2023, 10:44

sistemas.waysistemas.com/cimvalpi/Blk_Medicao_Relatorio_Parcial/#



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

OBRAS: CTP 229/2023 - SANTO ANTONIO DO GRAMA - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA		CONTRATO:		RESP. TÉCNICO: LUCIANO XAVIER	
ENDEREÇO: SANTO ANTONIO DO GRAMA		INÍCIO: 01/04/2023		Nº CREA-MG: 59784/D	
CIDDE: SANTO ANTONIO DO GRAMA		PRAZO: 01/10/2023		Nº DA ART:	
DISTRITO: SANTO ANTONIO DO GRAMA		UF:		COORDENADAS:	
DATA: 27/07/2023		SOL ☼		CHUVA ☁	
MANHÃ				IMPRATICÁVEL ☹	
TARDE		✓		✓	
QTDE		MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO		QTDE	
1		AUXILIAR DE ENGENHARIA		1	
6		OPERADOR		6	
2		PEDREIRO		4	
1		SINALEIRO			
QTDE		EQUIPAMENTO			
2		ESCAVADEIRA			
2		VEICULO DE APOIO			
5		CAMINHÃO BASCULANTE			
1		MINI ESCAVADEIRA			
1		RETROESCAVADEIRA			
1		MOTONIVELADORA			
MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO		ENCARREGADO DE OBRAS			
		MOTORISTA			
		AJUDANTE			
TAREFAS REALIZADAS		OBSERVAÇÕES			
NUMERO DE T.R.		DESCRICAO			
1		SINALIZAÇÃO			
2		EXECUÇÃO DE SUB BASE			

REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATORIOS)



Data não informada



Data não informada




29/08/2023, 10:44

sistemas.waysistemas.com/cimvalpi/Blk_Medicao_Relatorio_Parcial/#




26 de jul. de 2023 15:11:54
Estrada sem nome
Santo Antônio do Grama
Minas Gerais

Data não informada

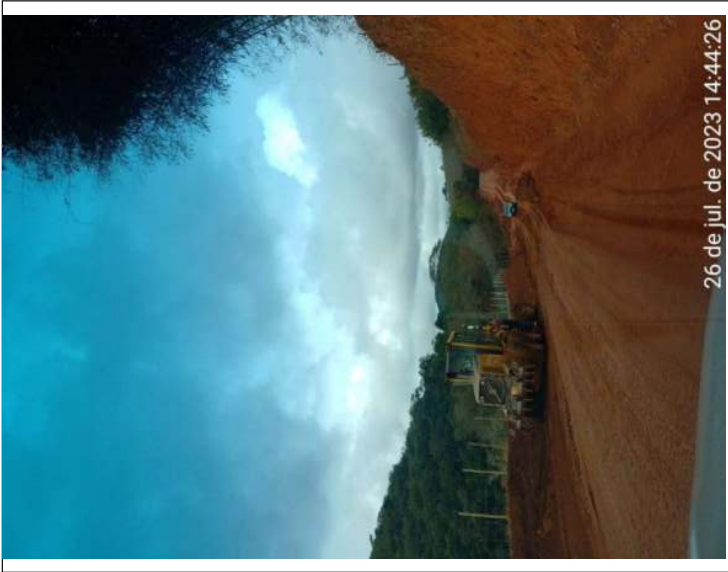

26 de jul. de 2023 14:44:26

Data não informada

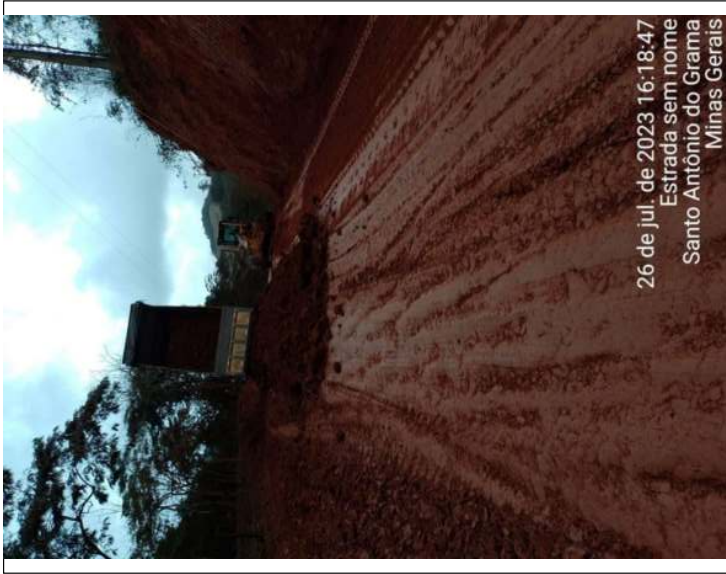

26 de jul. de 2023 16:18:47
Estrada sem nome
Santo Antônio do Grama
Minas Gerais

Data não informada



26 de jul. de 2023 15:10:56

Data não informada



OCORRÊNCIAS	
NUMERO DE OC	TIPO DE OCORRÊNCIA
OBSERVAÇÕES	
EQUIPE E05 26/07/2023	
MUNICÍPIO (Aprovado)	
Obs.: CONSORCIO (Aprovado em 28/07/2023 - 09:10) Ors.: - Drenagem - Inicio construção bueiro Est. 25 - Terraplenagem - Quebra de montes na Est. 274 e Est. 279. - Forro de cascalho Est. 136 até Est. 141.	
ASSINATURAS	
APROVADO AUTOMATICAMENTE PELO SISTEMA PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 208578/D	
LUIZ HENRIQUE DA SILVA BORGES Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 208578/D	
RT de Execução - CONSORCIO 31 - SOLOCAP-CONEPP Luciano Xavier de Castro CREA 95764/D	

29/08/2023, 10:44


sistemas.waysistemas.com/cimvalpi/Blk_Medicao_Relatorio_Parcial/#



CIMVALPI
CONSORCIO INTERMUNICIPAL
MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº 0043		OBRA: CTP 229/2023 - SANTO ANTONIO DO GRAMA - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA		CONTRATO:		RESR. TÉCNICO: LUCIANO XAVIER	
ENDEREÇO: SANTO ANTONIO DO GRAMA		INÍCIO: 01/04/2023		Nº CREA-MG: 59784ID			
CIDDE:		PRAZO: 01/10/2023		Nº DA ART:			
DISTRITO: SANTO ANTONIO DO GRAMA		UF:		COORDENADAS:			
DATA: 27/07/2023	SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA ☔	IMPRATICÁVEL ☹			
MANHÃ	✓						
TARDE	✓						
QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO		QTDE		MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO		
1	ENCARREGADO DE OBRAS		6	OPERADOR			
6	MOTORISTA		2	PEDREIRO			
1	TOPOGRAFO		5	AJUDANTE			
1	SINALEIRO						
QTDE	EQUIPAMENTO						
2	ESCAVADEIRA						
2	VEICULO DE APOIO						
1	CAMINHÃO PIPA						
5	CAMINHÃO BASCULANTE						
1	MINI ESCAVADEIRA						
1	RETROESCAVADEIRA						
1	MOTONIVELADORA						
NUMERO DE T.R.	DESCRIÇÃO		OBSERVAÇÕES		TAREFAS REALIZADAS		
1	SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO TOPOGRÁFICO						
2	EXECUÇÃO DE CAIXA DE BUEIRO						
3	SINALIZAÇÃO						
4	EXECUÇÃO DE SUB BASE						
5	EXECUÇÃO DE ABERTURA DE CAIXA						
6	EXECUÇÃO DE COMPACTAÇÃO				CAIXA DE BUEIRO 03		
REGISTROS FOTOGRÁFICOS • OBRIGATÓRIOS							

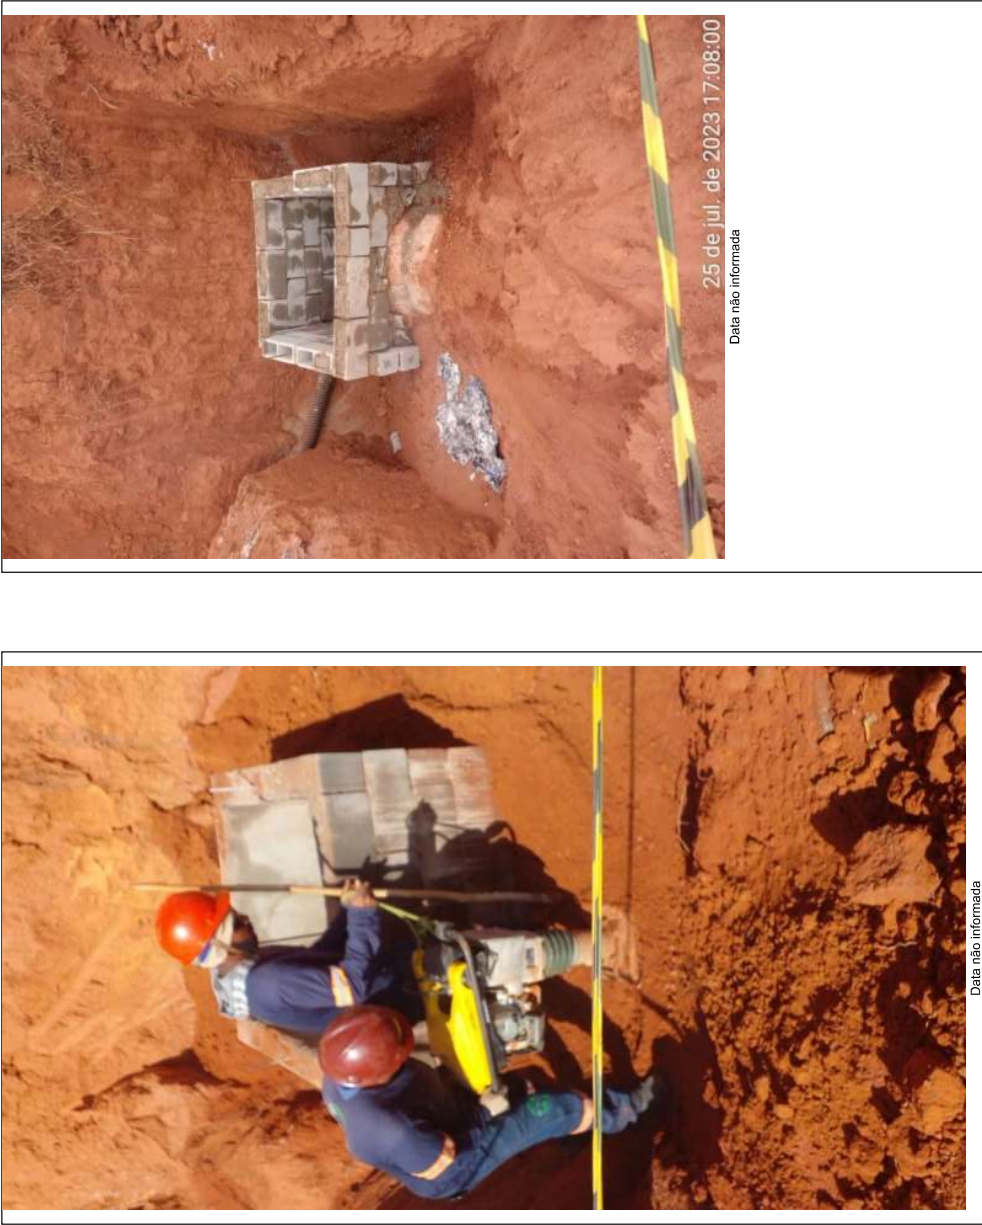

29/08/2023, 10:44

sistemas.waysistemas.com/cimvalpi/Blk_Medicao_Relatorio_Parcial/#



Data não informada



25 de jul. de 2023 17:08:00

Data não informada



Data não informada



25 de jul. de 2023 17:06:55
Estrada sem nome
Santo Antônio do Gramma
Minas Gerais

Data não informada



sistemas.waysistemas.com/cimvalpi/Blk_Medicao_Relatorio_Parcial/#

58/67

29/08/2023, 10:44

sistemas.waysistemas.com/cimvalpi/Blk_Medicao_Relatorio_Parcial/#



Data não informada



Data não informada



Data não informada



Data não informada



OCORRÊNCIAS		DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA
NÚMERO DE OC	TIPO DE OCORRÊNCIA	OBSERVAÇÕES
EQUIPE E05 25/07/2023		
MUNICÍPIO (Aprovado)		CONFÉRENCIA
CONSORCIO (Aprovado em 28/07/2023 - 09:09)		
Obs.: "Drenagem - Construção da caixa bueiro Est. 135 e compactação ao redor da caixa do bueiro Est. 03. "Cerca - Construção da cerca nas Est. 190 a Est. 207. "Topografia - Locação de bordas na Est. 215 a Est. 225 e da Est. 73 a Est. 91. "Terraplenagem - Compactação das Est. 190 a Est. 207. "Acasalhamento nas Est. 177 a Est. 190 e da Est. 170 a Est. 176. "Obs. Poste na Est. 206 e na Est. 279 e Est. 280, necessita remoção.		
ASSINATURAS		
APROVADO AUTOMATICAMENTE PELO SISTEMA		
Luiz Henrique da Silva Borges Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 208579/D	PEDRO ANTONIO DO GRAMA Fiscal de Obras - SANTO ANTONIO DO GRAMA CREA 137.103/D	Luciano Xavier da Cunha RT de Execução - CONSORCIO 31 - SOLOCAP-CONEP CREA 89784/D

29/08/2023, 10:44

sistemas.waysistemas.com/cimvalpi/Blk_Medicao_Relatorio_Parcial/#



CIMVALPI
CONSORCIO INTERMUNICIPAL
MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

OBR: CTP 229/2023 - SANTO ANTONIO DO GRAMA - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA		CONTRATO:		RESR. TÉCNICO: LUCIANO XAVIER	
ENDERECO: SANTO ANTONIO DO GRAMA		INICIO: 01/04/2023		Nº CREA-MG: 59784/D	
CIDDE: SANTO ANTONIO DO GRAMA		PRAZO: 01/10/2023		Nº DA ART:	
DISTRITO: SANTO ANTONIO DO GRAMA		UF:		COORDENADAS:	
DATA: 27/07/2023	SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA ☔	IMPRATICÁVEL 🚫	
MANHÃ	✓				
TARDE	✓				
QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO		
1	ENCARREGADO DE OBRAS	6	OPERADOR		
6	MOTORISTA	1	PEDREIRO		
1	TOPOGRAFO	5	AJUDANTE		
1	SINALEIRO				
QTDE	EQUIPAMENTO				
2	ESCAVADEIRA				
2	VEICULO DE APOIO				
1	CAMINHÃO PIPA				
5	CAMINHÃO BASCULANTE				
1	MINI ESCAVADEIRA				
1	RETROESCAVADEIRA				
1	MOTONIVELADORA				
NUMERO DE T.R.	DESCRICAO	OBSERVAÇÕES			
1	EXECUÇÃO DE CERCA				
2	EXECUÇÃO DE CAMADA DE REFORÇO				
3	SINALIZAÇÃO				
4	EXECUÇÃO DE SUB BASE				
5	SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO TOPOGRAFICO				
6	EXECUÇÃO DE DESCIDA D'AGUA	BUEIRO 12			
7	EXECUÇÃO DE CAIXA DE BUEIRO				
REGISTROS FOTOGRÁFICOS • OBRIGATORIOS					



Data não informada




Data não informada



29/08/2023, 10:44

sistemas.waysistemas.com/cimvalpi/Blk_Medicao_Relatorio_Parcial/#

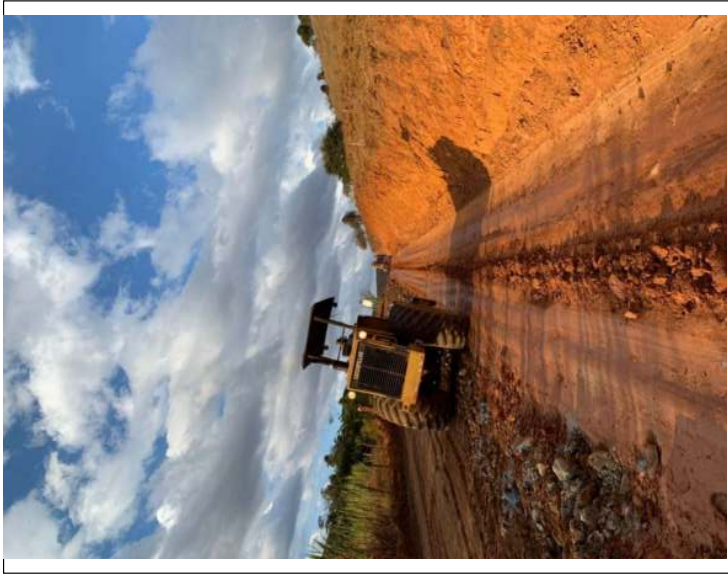

sistemas.waysistemas.com/cimvalpi/Blk_Medicao_Relatorio_Parcial/#

61/67

29/08/2023, 10:44

sistemas.waysistemas.com/cimvalpi/Blk_Medicao_Relatorio_Parcial/#



Data não informada



Data não informada



Data não informada



OCORRÊNCIAS		DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA
NUMERO DE OC	TIPO DE OCORRÊNCIA	OBSERVAÇÕES
EQUIPE E05 24/07/2023		
MUNICÍPIO (Aprovado)		CONFERÊNCIA
CONSORCIO (Aprovado em 28/07/2023 - 08:54)		
Obs.: - Drenagem - Caixa do bueiro Est. 64 e acabamento bueiro Est. 92. Decida da agua no bueiro Est. 12. -Topografia - Medição de primário da área de solo mole. - Locação para cascalheamento. - Cerra - Sertão construída nas Est. 299 a Est. 273, Est. 273 a Est. 266, Est. 266 a Est. 203, Est. 203 a Est. 206, Est. 206 a Est. 177 a Est. 190. Limpeza na Est. 330 a Est. 313. - Alisar as fotos com data e localizações.		
ASSINATURAS		
APROVADO AUTOMATICAMENTE PELO SISTEMA		
Luiz Henrique da Silva Borges Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 208679/D	PEDRO ANTONIO Fiscal de Obras - SANTO ANTONIO DO GRAMA CREA 137.103/D	Luciano Xavier da Costa RT de Execução - CONSORCIO 31 - SOLOCAP-CONEPP CREA 89784/D

29/08/2023, 10:44

sistemas.waysistemas.com/cimvalpi/Blk_Medicao_Relatorio_Parcial/#




CIMVALPI
CONSORCIO INTERMUNICIPAL
MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

OBR: CTP 229/2023 - SANTO ANTONIO DO GRAMA - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA		CONTRATO:		RESP. TÉCNICO: LUCIANO XAVIER	
ENDERECO: SANTO ANTONIO DO GRAMA		INICIO: 01/04/2023		Nº CREA-MG: 59784/D	
CIDDE: SANTO ANTONIO DO GRAMA		PRAZO: 01/10/2023		Nº DA ART:	
DISTRITO: SANTO ANTONIO DO GRAMA		UF:		COORDENADAS:	
DATA: 21/07/2023	SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA 🌧	IMPRATICÁVEL 🚫	
MANHÃ	✓				
TARDE		✓			
QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO		QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	
1	ENCARREGADO DE OBRAS		6	OPERADOR	
6	MOTORISTA		2	PEDREIRO	
1	TOPOGRAFO		5	AJUDANTE	
1	SINALEIRO				
2	ESCAVADEIRA		EQUIPAMENTO		
1	VEICULO DE APOIO				
1	CAMINHÃO PIPA				
4	CAMINHÃO BASCULANTE				
1	MINI ESCAVADEIRA				
1	RETROESCAVADEIRA				
1	MOTONIVELADORA				
TAREFAS REALIZADAS					
NÚMERO DE T.R.	DESCRIÇÃO	OBSERVAÇÕES			
1	EXECUÇÃO E REBAIXAMENTO DE CORTE				
2	SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO TOPOGRÁFICO				
3	EXECUÇÃO DE CAIXA DE BUEIRO				
4	SINALIZAÇÃO				
5	EXECUÇÃO DE ATERRO				
6	EXECUÇÃO DE ALA DE BUEIRO				
REGISTROS FOTOGRÁFICOS • (OBRIGATORIOS)					



Data não informada

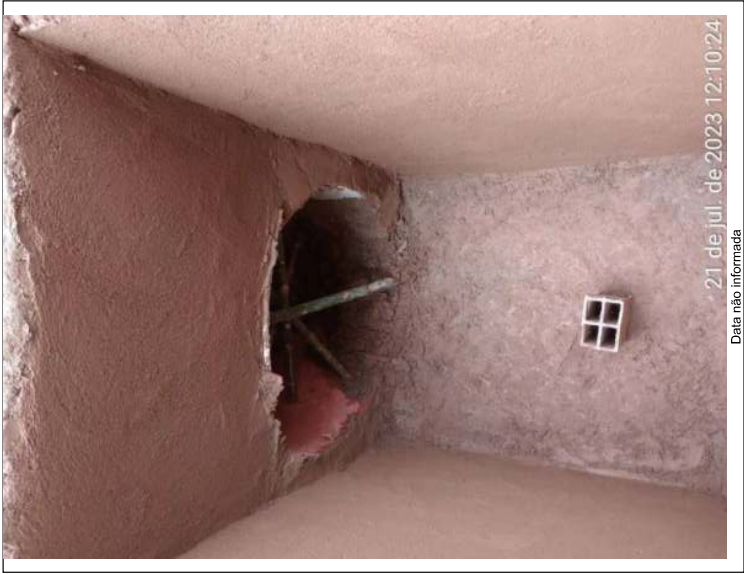

21 de jul. de 2023 12:10:24

Data não informada




29/08/2023, 10:44

sistemas.waysistemas.com/cimvalpi/Blk_Medicao_Relatorio_Parcial/#



Data não informada



Data não informada



Data não informada



Data não informada



OCORRÊNCIAS	
NÚMERO DE OC	TIPO DE OCORRÊNCIA
OBSERVAÇÕES	
EQUIPE E05 21/07/2023 HOIUE UM IMPREVISTO COM O APARELHO QUE REGISTA AS FOTOS DAS ATIVIDADES E FOI POSSIVEL REGISTRAR APENAS UMA FOTO COM DESCRIÇÃO (NESSE APARELHO), A FIM DE EVIDENCIAR AS OUTRAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESSE DIA, FOI UTILIZADO OUTRO APARELHO. ENTRETANTO SEM A DESCIOÇÃO NAS FOTOS.	
CONFERÊNCIA	
CONSORCIO (Reprovado)	
Obs.: *Reprovado, fotos sem data, hora e localização. E uma unica foto com data do dia 06/07/2023.	
ASSINATURAS	
Luiz Henrique da Silva Borges Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 208579/D	PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTONIO DO GRAMA CREA 137.703/D
Luciano Xavier de Castro RT de Execução - CONSORCIO 31 - SOLOCAP-CONEPP CREA 98784/D	

29/08/2023, 10:44

sistemas.waysistemas.com/cimvalpi/Blk_Medicao_Relatorio_Parcial/#



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO


OBRAS: CTP 229/2023 - SANTO ANTONIO DO GRAMA - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA		CONTRATO:		RESP. TÉCNICO: LUCIANO XAVIER	
ENDEREÇO: SANTO ANTONIO DO GRAMA		INÍCIO: 01/04/2023		Nº CREA-MG: 59784/D	
CIDDE: SANTO ANTONIO DO GRAMA		PRAZO: 01/10/2023		Nº DA ART:	
DISTRITO: SANTO ANTONIO DO GRAMA		UF:		COORDENADAS:	
DATA: 21/07/2023	SOL ☼	NUBLADO ☁	CHUVA ☔	IMPRATICÁVEL 🚫	
MANHÃ	✓				
TARDE	✓				
QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO		QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	
1	AUXILIAR DE ENGENHARIA		1	ENCARREGADO DE OBRAS	
6	OPERADOR		7	MOTORISTA	
2	PEDREIRO		1	TOPOGRAFO	
5	AJUDANTE		1	SINALEIRO	
QTDE	EQUIPAMENTO				
2	ESCAVADEIRA				
2	VEICULO DE APOIO				
1	CAMINHÃO PIPA				
5	CAMINHÃO BASCULANTE				
1	MINI ESCAVADEIRA				
1	RETROESCAVADEIRA				
1	MOTONIVELADORA				
NÚMERO DE T.R.		TAREFAS REALIZADAS		OBSERVAÇÕES	
1	SINALIZAÇÃO				
2	EXECUÇÃO DE DRENO PROFUNDO				
3	EXECUÇÃO DE ESCARIAMENTO				
4	EXECUÇÃO DE ALA DE BUEIRO				
5	SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO TOPOGRÁFICO				
6	EXECUÇÃO E REBAIXAMENTO DE CORTE				
7	EXECUÇÃO DE CAIXA DE BUEIRO				

REGISTROS FOTOGRÁFICOS • (OBRIGATORIOS)



29/08/2023, 10:44

sistemas.waysistemas.com/cimvalpi/Blk_Medicao_Relatorio_Parcial/#




sistemas.waysistemas.com/cimvalpi/Blk_Medicao_Relatorio_Parcial/#

66/67

29/08/2023, 10:44

sistemas.waysistemas.com/cimvalpi/Blk_Medicao_Relatorio_Parcial/#

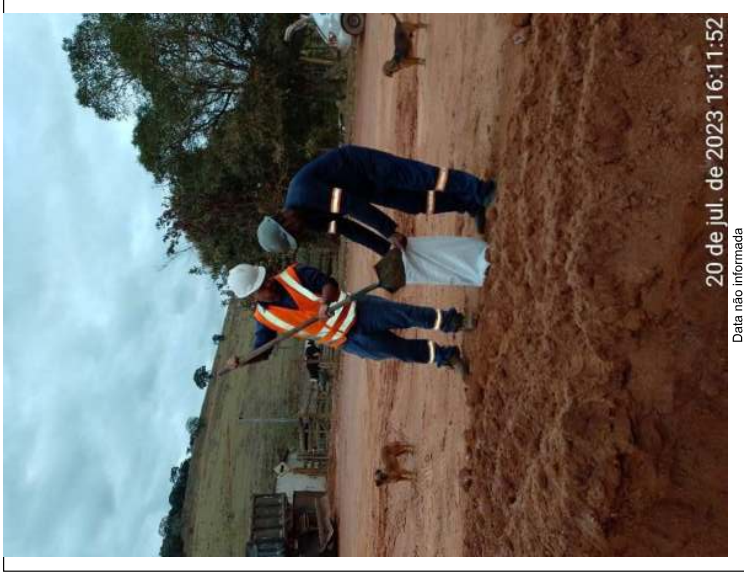

OCORRÊNCIAS	
NUMERO DE OC	TIPO DE OCORRÊNCIA
OBSERVAÇÕES	
EQUIPE E05 2007/2023	
CONFERÊNCIA	
MUNICÍPIO (Aprovado)	CONSORCIO (Reprovado)
Obs.: *Reprovado, foto inserida do dia 06 de julho.	
ASSINATURAS	
APROVADO AUTOMATICAMENTE PELO SISTEMA	
Luiz Henrique da Silva Borges Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 208579/D	PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTONIO DO GRAMA CREA 137.103/D
Luciano Xavier de Castro RT de Execução - CONSORCIO 31 - SOLOCAP-CONEPP CREA 95784/D	



CIMVALPI
CONSORCIO INTERMUNICIPAL
MULTISETORIAL DO VALE DO PIRANGA

Assinaturas do Documento



Documento Assinado Eletronicamente por **LUCIANO XAVIER DE CASTRO**, CPF: 760.22*. **6- *5 em **30/08/2023 14:06:50**, Cód. Autenticidade da Assinatura: **14Z6.3X06.050U.982H.2265**, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Documento Assinado Eletronicamente por **PEDRO MARTINO ZEFERINO**, CPF: 015.49*. **6- *9 em **29/08/2023 15:53:56**, Cód. Autenticidade da Assinatura: **1536.5H53.7569.237W.8324**, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Documento Assinado Eletronicamente por **LUIZ HENRIQUE DA SILVA BORGES**, CPF: 016.28*. **6- *7 em **29/08/2023 10:55:50**, Cód. Autenticidade da Assinatura: **10V8.4E55.3504.V109.5481**, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Informações do Documento

ID do Documento: **15.C61** - Tipo de Documento: **FORMULÁRIO DE MEDIÇÕES**

Elaborado por **GILBERTO ARAUJO GOMIDES**, CPF: 069.58*. **6- *7 , em **29/08/2023 - 10:53:10**

Código de Autenticidade deste Documento: 10U7.2Z53.410Z.124X.7130

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:

<https://zeropapel.cimvalpi.mg.gov.br/verdocumento>

