

23/10/2023, 14:33

sistemas.wayssystemas.com/cimvalpi/Blk_Medicao_Relatorio_Parcial/



FORMULÁRIO DE MEDIÇÕES

RELATÓRIO PARCIAL (SITUAÇÃO: APROVADA PELO CONSÓRCIO)

Enviado por Márcio Antônio do Carmo em 19/10/2023 - 13:52

Registro: 19/10/2023		7ª MEDIÇÃO													
Obra: CTP 229/2023 - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA		Período de 21/09/2023 a 20/10/2023													
Local: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA															
OBSERVAÇÕES															
Enviada por Márcio Antônio do Carmo (FORNECEDOR) em 19/10/2023 às 13:52															
ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	QUANTIDADE MEDIDA	VALOR PREVISTO (BDI)	VALOR PREVISTO (ADMC)	NESTA MEDIÇÃO (BDI)	NESTA MEDIÇÃO (ADMC)	ACUMULADA (BDI)	ACUMULADA (ADMC)	SALDO (BDI)	SALDO (ADMC)
01	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO														
01.01	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA - para obras que exigem a utilização de grande quantidade de equipamentos e são executadas em centros urbanos ou próximos de centros urbanos. Obs.: Não se aplica aos serviços de Tapa Buracos.	%	0,2	R\$ 81.450,179,25	R\$ 166.536,094,60	R\$ 33.307,218,92	0,2	R\$ 33.307,218,92	R\$ 43.749,032,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.002,81	R\$ 22.758,22	R\$ 33.287,216,11	R\$ 43.726,273,84
01.01.03	OBRAS DE VALOR ACIMA DE R\$ 3000.001,00 - MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA PAVIMENTAÇÃO, EXCLUSIVE PARA TAPA-BURACOS														
02.04	CONTAINER 6,00 m x 2,30 m x 2,82 m COM ISOLAMENTO TÉRMICO														
02.04.02	ESCRITORIO COM AR CONDICIONADO E SANITÁRIO	mês	72	R\$ 676,17	R\$ 858,40	R\$ 61.804,80	2	R\$ 61.804,80	R\$ 63.946,80	R\$ 1.776,30	R\$ 1.776,80	R\$ 61.804,80	R\$ 63.946,80	R\$ -0,00	R\$ -0,00
02.04.03	VESTIÁRIO	mês	64	R\$ 471,54	R\$ 598,62	R\$ 38.311,68	6	R\$ 38.311,68	R\$ 39.639,68	R\$ 3.591,72	R\$ 3.716,22	R\$ 38.311,68	R\$ 39.639,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02.04.06	DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER	un	25	R\$ 400,36	R\$ 508,26	R\$ 12.706,50	13	R\$ 12.706,50	R\$ 13.147,00	R\$ 6.607,38	R\$ 6.836,44	R\$ 12.706,50	R\$ 13.147,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02.06	SINALIZAÇÃO/SEGURANÇA														
02.06.02	PLACA 0,50 m x 0,50 m DUPLA FACE CHAPA GALVANIZADA 22 EM CAVALETE	un/mês	120	R\$ 17,95	R\$ 22,79	R\$ 2.734,80	18	R\$ 2.734,80	R\$ 2.829,60	R\$ 410,22	R\$ 424,44	R\$ 2.734,80	R\$ 2.829,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04	TRABALHOS EM TERRA														
04.05	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA														
05.16	DRENAGEM COMPLEMENTAR														
05.16.12	SARJETEA DE CONCRETO EM ATERRIO, TIPO DRA, SCAXY, LARGURA=100CM TIPO 70/30, EXECUÇÃO INCLUINDO ESCALAFÃO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)	M	5957,5	R\$ 72,58	R\$ 92,14	R\$ 548.924,05	385	R\$ 548.924,05	R\$ 567.928,48	R\$ 35.473,90	R\$ 36.702,05	R\$ 35.473,90	R\$ 36.702,05	R\$ 513.450,15	R\$ 531.226,43
05.16.13	SARJETEA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 02 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M	3450	R\$ 57,88	R\$ 73,48	R\$ 253.506,00	69,4	R\$ 253.506,00	R\$ 262.303,50	R\$ 5.099,51	R\$ 5.276,48	R\$ 5.099,51	R\$ 5.276,48	R\$ 248.406,49	R\$ 257.027,02
05.16.14	VALETA DE PROTEÇÃO DE CORTES COM REVESTIMENTO DE CONCRETO - VPC 04 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M	2352,5	R\$ 77,28	R\$ 98,11	R\$ 230.803,78	149	R\$ 230.803,78	R\$ 238.802,28	R\$ 14.618,39	R\$ 15,124,99	R\$ 34.240,39	R\$ 35.426,99	R\$ 196.563,39	R\$ 203.375,29
05.16.20	DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 04 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M	107,5	R\$ 524,26	R\$ 665,54	R\$ 71.545,55	50	R\$ 71.545,55	R\$ 74,025,58	R\$ 33,277,00	R\$ 34,430,50	R\$ 33,277,00	R\$ 34,430,50	R\$ 38,268,55	R\$ 39,595,08
05.16.24	ENTRADA PARA DESCIDA D'ÁGUA - EDA 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	UN	22	R\$ 51,04	R\$ 64,80	R\$ 1,425,60	5	R\$ 1,425,60	R\$ 1,474,88	R\$ 324,00	R\$ 335,20	R\$ 324,00	R\$ 335,20	R\$ 1,101,60	R\$ 1,139,68
06	PAVIMENTAÇÃO														
06.04	BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE														
06.04.02	COM BRITA BICA CORRIDA (AGREGADO DE PEDREIRA)	m³	10696,63	R\$ 183,12	R\$ 232,47	R\$ 2,486,645,58	4348,31	R\$ 2,486,645,58	R\$ 2,572,860,41	R\$ 1,010,851,63	R\$ 1,045,899,00	R\$ 2,486,645,58	R\$ 2,572,860,41	R\$ -0,00	R\$ 0,00
06.08.02	DMT > 10 km	t x km	496213,03	R\$ 0,83	R\$ 1,05	R\$ 521,023,68	305977,93	R\$ 521,023,68	R\$ 540,872,20	R\$ 321,276,83	R\$ 333,515,94	R\$ 521,023,68	R\$ 540,872,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06.09	IMPRIMAÇÃO														
06.09.01	IMPRIMAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE	m²	53475,53	R\$ 7,87	R\$ 9,99	R\$ 534,220,54	37020,42	R\$ 534,220,54	R\$ 552,936,98	R\$ 369,834,00	R\$ 382,791,14	R\$ 441,762,00	R\$ 457,239,14	R\$ 92,458,55	R\$ 95,697,84

23/10/2023, 14:33

sistemas.wayssystemas.com/cimvalpi/Blk_Medicao_Relatorio_Parcial/

TRANSPORTE DO MATERIAL (BETUMINOSO)													
06.10	PINTURA												
06.10.01	PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-1C	m²	54475,53	R\$ 2,39	R\$ 3,04	R\$ 165,605,61	44220,42	R\$ 171,053,16	R\$ 112,542,08	R\$ 116,244,12	R\$ 134,430,08	R\$ 138,852,12	R\$ 31,175,53
06.11	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE												
06.11.01	EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFALTICA ATÉ A PISTA	m³	2089,32	R\$ 1,370,82	R\$ 1,740,25	R\$ 3,635,939,13	1729,05	R\$ 3,761,966,91	R\$ 2,507,787,26	R\$ 2,594,711,40	R\$ 3,008,979,26	R\$ 3,113,275,56	R\$ 626,959,87
09.06	SERVIÇOS COMPLEMENTARES - CERCAMENTO												
09.06.01	CERCA DE ARAME FARPADO, TIPO OGC-CA-01 (COM 4 FIOS E MOURÃO DE MADEIRA COM ESPACAMENTO DE 2,5 METROS) (EXECUÇÃO INCLUINDO ESCAVAÇÃO, FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)	M	9365	R\$ 14,48	R\$ 18,39	R\$ 172,222,35	9365	R\$ 178,122,30	R\$ 51,583,95	R\$ 53,351,10	R\$ 172,222,35	R\$ 178,122,30	R\$ 0,00
09.06.02	REMOÇÃO DE CERCAS	M	7820	R\$ 7,34	R\$ 9,32	R\$ 72,892,40	7820	R\$ 75,463,00	R\$ 18,444,28	R\$ 19,097,35	R\$ 72,892,40	R\$ 75,463,00	R\$ 0,00
09.06.03	PORTEIRA TIPO ESCALADA INCLUINDO FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E TRANSPORTE DOS MATERIAIS	UN	4	R\$ 7,34	R\$ 1,174,98	R\$ 4,699,92	0	R\$ 4,862,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,699,92	R\$ 4,862,84
14	SERVIÇOS TÉCNICOS												
14.01	TOPOGRAFIA												
15	ADMINISTRAÇÃO LOCAL												
15.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - % BASEADA ACORDÃO 2.622/2013 DO TCU SOBRE SOMA DOS ITENS 1 A 14	%	6,55	R\$ 132,737,097,60	R\$ 168,509,745,40	R\$ 1,103,738,832,37	6,55	R\$ 1,141,993,663,94	R\$ 294,320,24	R\$ 304,590,24	R\$ 644,290,32	R\$ 674,428,96	R\$ 1,103,094,542,05
TOTAL:									R\$ 4,787,759,18	R\$ 4,954,822,92	R\$ 10,287,127,61	R\$ 10,779,393,12	

Luiz Henrique da Silva Borges
Fiscal de Obras - CIMVALPI
CREA 208579/D
Aprovação: 23/10/2023

PEDRO MARTINO ZEFERINO
Fiscal de Obras - SANTO ANTONIO DO GRAMA
CREA 137.103/D

Luciano Xavier de Castro
RT de Execução - CONSORCIO 3T-SOLOCAP-CONEP
CREA 59784/D






CIMVALPI
CONSORCIO INTERMUNICIPAL
MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº 0115		OBRA: CTP 229/2023 - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA		CONTRATO:		RESP. TÉCNICO: LUCIANO XAVIER	
ENDEREÇO: ESTRADA DE ACESSO ENTRE SANTO ANTÔNIO DO GRAMA E ABRE CAMPO		CIDDE:		INÍCIO: 01/04/2023		Nº CREA-MG: 59784/D	
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA		UF:		PRAZO: 01/10/2023		Nº DA ART:	
DATA: 20/10/2023		SOL ☀		NUBLADO ☁		CHUVA ☔	
MANHÃ						COORDENADAS:	
TARDE		✓				IMPRATICÁVEL 🚫	
QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO			QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO		
1	AUXILIAR DE ENGENHARIA			1	OPERADOR DE ESPARGIDOR		
2	ENCARREGADO DE OBRAS			1	MESISTA		
6	OPERADOR			5	MOTORISTA		
1	PEDREIRO			1	TOPOGRAFO		
2	AJUDANTE			2	GREIDISTA		
2	RASTELEIRO						
QTDE	EQUIPAMENTO						
1	ROLO LISO						
2	ESCAVADEIRA						
1	ROLO DE PNEU						
1	VIBROACABADORA						
1	ESPARGIDOR						
1	COMPACTADOR DE SOLO						
3	VEICULO DE APOIO						
1	CAMINHÃO PIPA						
17	CAMINHÃO BASCULANTE						
1	RETROESCAVADEIRA						
1	MOTONIVELADORA						
1	ROLO COMBINADO (CHAPA/PNEU)						
TAREFAS REALIZADAS							
NÚMERO DE T.R.	DESCRIÇÃO			OBSERVAÇÕES			
1	SINALIZAÇÃO						
2	UMECTAÇÃO						
3	EXECUÇÃO DE CANALETA DE CRISTA			E12			
4	LANÇAMENTO DE BICA CORRIDA			E269 A E283			
5	SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO TOPOGRÁFICO						
6	PINTURA DE LIGAÇÃO						
7	EXECUÇÃO DE ATERRO			E12			
8	REGULARIZAÇÃO DE SUB-BASE			E283 A E291			
9	APLICAÇÃO/COMPACTAÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA						
REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATORIOS)							
 19 de out. de 2023 15:52:43 Data não informada  19 de out de 2023 4:04:48 PM Data não informada							



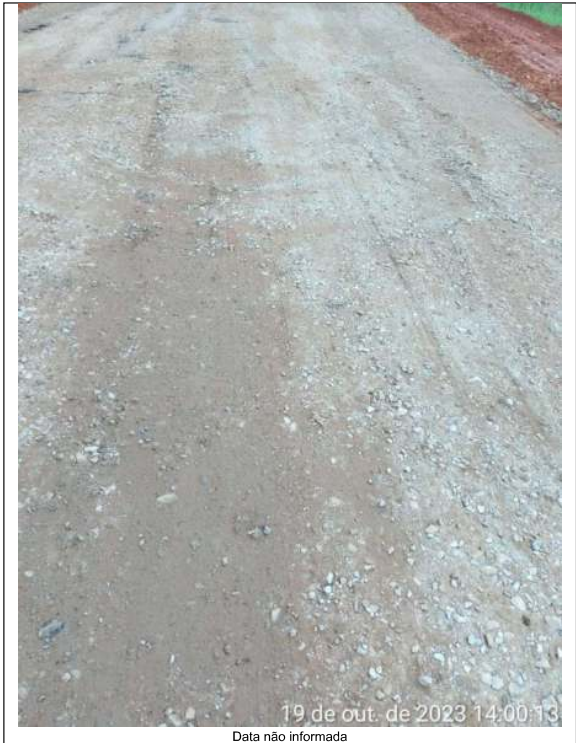



NÚMERO DE OC		TIPO DE OCORRÊNCIA	OCORRÊNCIAS	DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA
EQUIPE E04 E E05 19/10/2023			OBSERVAÇÕES	
MUNICÍPIO			CONFERÊNCIA	
Obs.:			CONSORCIO (Aprovado em 23/10/2023 - 08:48)	
			Obs.: *Drenagem: Construção de canaletas da Est. 76 até Est. 91. Sarjeta de crista na Est. 09.Assentamento de aduelas na Est. 212. *Cerca: Reparo na cerca na Est. 13 a Est. 18. (estava fora do padrão). *Asfalto: Salgamento da Est. 256 até Est. 280 e capa da	

Est. 256 até Est. 274. *Topografia: Nivelamento Est. 286 até Est. 310. *Terraplenagem: Lançamentos de BGS da Est. 276 até Est. 283. Aterro de bueiro nas Est. 210 até Est. 213. *PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA OBRA SAÍDA PARA ABRE CAMPO ATÉ O PRESENTE MOMENTO NÃO FOI INSTALADA.

ASSINATURAS

Luiz Henrique da Silva Borges
Fiscal de Obras - CIMVALPI
CREA 208579/D

PEDRO MARTINO ZEFERINO
Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA
CREA 137.103/D

Luciano Xavier de Castro
RT de Execução - CONSÓRCIO 3T - SOLOCAP-CONEP
CREA 59784/D





RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº 0114	OBRA: CTP 229/2023 - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	CONTRATO:	RESP. TÉCNICO: LUCIANO XAVIER
ENDEREÇO: ESTRADA DE ACESSO ENTRE SANTO ANTÔNIO DO GRAMA E ABRE CAMPO		INÍCIO: 01/04/2023	Nº CREA-MG: 59784/D
CIDDE:		PRAZO: 01/10/2023	Nº DA ART:
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA		UF:	COORDENADAS:
DATA: 19/10/2023	SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA ☔
MANHÃ	✓		IMPRATICÁVEL ☔
TARDE	✓		
QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
1	AUXILIAR DE ENGENHARIA	1	OPERADOR DE ESPARGIDOR
2	ENCARREGADO DE OBRAS	1	MESISTA
6	OPERADOR	5	MOTORISTA
1	PEDREIRO	1	TOPOGRAFO
2	AJUDANTE	1	GREIDISTA
2	RASTELEIRO		
QTDE	EQUIPAMENTO		
1	ROLO LISO		
2	ESCAVADEIRA		
1	ROLO DE PNEU		
1	VIBROACABADORA		
1	ESPARGIDOR		
1	COMPACTADOR DE SOLO		
3	VEÍCULO DE APOIO		
1	CAMINHÃO PIPA		
19	CAMINHÃO BASCULANTE		
1	RETROESCAVADEIRA		
1	MOTONIVELADORA		
1	ROLO COMBINADO (CHAPA/PNEU)		
	TAREFAS REALIZADAS		
NÚMERO DE T.R.	DESCRIÇÃO	OBSERVAÇÕES	
1	EXECUÇÃO DE ABERTURA DE CANALETA	E82 A E92	
2	EXECUÇÃO DE ESCALONAMENTO INCLUINDO ATERRO	E284 A E286	
3	SINALIZAÇÃO		
4	PINTURA DE LIGAÇÃO		
5	REGULARIZAÇÃO DE SUB-BASE	E278 A E283	
6	EXECUÇÃO DE CANALETA DE CRISTA	REGIÃO DA E12	
7	UMECTAÇÃO		
8	SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO TOPOGRÁFICO		
9	APLICAÇÃO/COMPACTAÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA		
10	EXECUÇÃO DE ALA DE BUEIRO	B285 LE (INCLUINDO COMPACTAÇÃO)	
	REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATORIOS)		




18 de out de 2023 5:54:31 PM

Data não informada



18 de out. de 2023 10:47:58

Data não informada

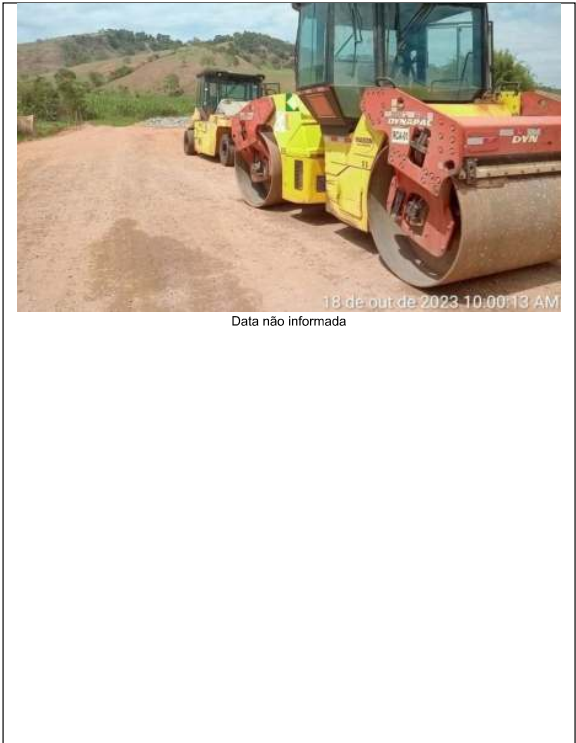





Data não informada

OCORRÊNCIAS	
NÚMERO DE OC	TIPO DE OCORRÊNCIA
OBSERVAÇÕES	
EQUIPE E04 E E05 18/10/2023	
CONFERÊNCIA	
MUNICÍPIO	CONSÓRCIO (Aprovado em 20/10/2023 - 14:04)
Obs.:	Obs.: *Drenagem: Canaleta da Est. 80 até Est. 92. Decida de agua na Est. 202. Construção de ata do bueiro Est. 286. Assentamento de aduelas bueiro Est. 212. *Cerca: Sendo construída do lado esquerdo nas Est. 226 até Est. 234. *Topografia: Locação e nivelamento para sub, base da Est. 275 até Est. 290. *Asfalto: Capa do lado esquerdo da Est. 218 até Est. 256. *Terraplenagem: Lançamento de sub base da Est. 276 até Est. 283 e lançamento BGS da Est. 263 a Est. 275. **RDO com fotos sem georreferenciamento.
ASSINATURAS	
Luiz Henrique da Silva Borges Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 208579/D	PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA CREA 137.103/D
Luciano Xavier de Castro RT de Execução - CONSÓRCIO 3T-SOLOCAP-CONEP CREA 59784/D	



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº 0113	OBRA: CTP 229/2023 - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	CONTRATO:	RESP. TÉCNICO: LUCIANO XAVIER
ENDEREÇO: ESTRADA DE ACESSO ENTRE SANTO ANTÔNIO DO GRAMA E ABRE CAMPO	INÍCIO: 01/04/2023	Nº CREA-MG: 59784/D	
CIDDE:	PRAZO: 01/10/2023	Nº DA ART:	
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA	UF:	COORDENADAS:	
DATA: 18/10/2023	SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA ☔
MANHÃ	✓		IMPRATICÁVEL ☁
TARDE	✓		
QTDE	MAO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MAO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
1	AUXILIAR DE ENGENHARIA	1	OPERADOR DE ESPARGIDOR
2	ENCARREGADO DE OBRAS	1	MESISTA
6	OPERADOR	4	MOTORISTA
1	PEDREIRO	1	TOPOGRAFO
5	AJUDANTE	1	GREIDISTA
2	RASTELEIRO		
QTDE	EQUIPAMENTO		
1	ROLO LISO		
2	ESCAVADEIRA		
1	ROLO DE PNEU		
1	VIBROACABADORA		
1	ESPARGIDOR		
3	VEICULO DE APOIO		
1	CAMINHÃO PIPA		
18	CAMINHÃO BASCULANTE		
1	RETROESCAVADEIRA		
1	MOTONIVELADORA		
1	ROLO COMBINADO (CHAPA/PNEU)		
	TAREFAS REALIZADAS		
NÚMERO DE T.R.	DESCRIÇÃO	OBSERVAÇÕES	
1	ASSENTAMENTO DE ADUELAS	REGIÃO ENTRE E213 E E214	
2	SINALIZAÇÃO		
3	UMECTAÇÃO		
4	EXECUÇÃO DE ALA DE BUEIRO	B285 LD	
5	APLICAÇÃO/COMPACTAÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA		
6	EXECUÇÃO DE ESCADA DESCIDA D'ÁGUA	E203 E E204	
7	PINTURA DE LIGAÇÃO		
8	EXECUÇÃO DE ATERRO	E278 A E285	

REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATORIOS)




Data não informada



Data não informada





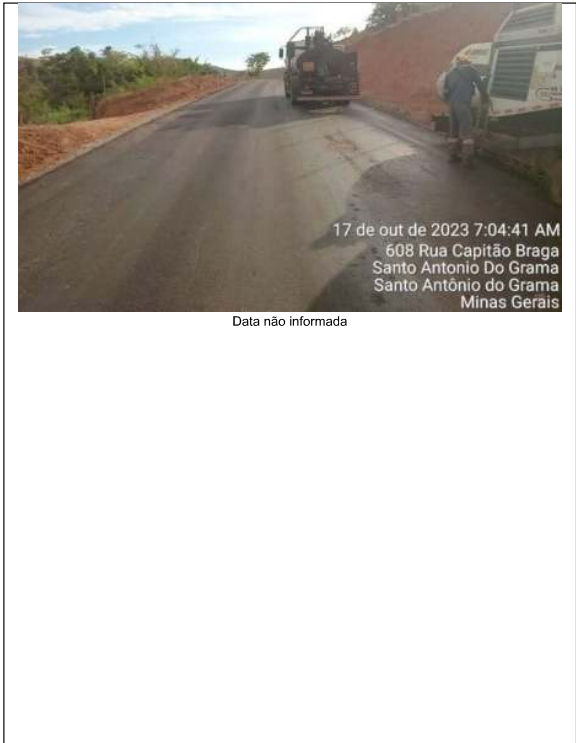



Data não informada



Data não informada

OCORRÊNCIAS	
NÚMERO DE OC	TIPO DE OCORRÊNCIA
EQUIPE E04 E E05 17/10/2023	
OBSERVAÇÕES	
CONFERÊNCIA	
MUNICÍPIO	
CONSÓRCIO (Aprovado em 19/10/2023 - 09:11)	
Obs.: *Drenagem: Assentamento de aduelas e construção de canaletas da Est. 80 até Est. 91, Decida da água Est. 202. *Asfalto: Concluído até Est. 205+10. *Cerca: Executando nas Est. 328 a Est. 334 lado esquerdo. *Terraplenagem: Altero nas Est. 278 até Est. 287.	
ASSINATURAS	
Luiz Henrique da Silva Borges Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 208579/D	PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA CREA 137.103/D
Luciano Xavier de Castro RT de Execução - CONSÓRCIO 3T-SOLOCAP-CONEP CREA 59784/D	



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº 0112	OBRA: CTP 229/2023 - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	CONTRATO:	RESP. TÉCNICO: LUCIANO XAVIER
ENDEREÇO: ESTRADA DE ACESSO ENTRE SANTO ANTÔNIO DO GRAMA E ABRE CAMPO	INÍCIO: 01/04/2023	Nº CREA-MG: 59784/D	
CIDDE:	PRAZO: 01/10/2023	Nº DA ART:	
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA	UF:	COORDENADAS:	
DATA: 17/10/2023	SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA ☔
MANHÃ	✓		IMPRATICÁVEL ☔
TARDE	✓		
QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
1	OPERADOR DE ESPARGIDOR	2	ENCARREGADO DE OBRAS
1	MESISTA	6	OPERADOR
5	MOTORISTA	1	PEDREIRO
1	TOPOGRAFO	5	AJUDANTE
2	RASTELEIRO		
QTDE	EQUIPAMENTO		
2	ROLO LISO		
2	ESCAVADEIRA		
1	ROLO DE PNEU		
1	VIBROACABADORA		
1	ESPARGIDOR		
3	VEICULO DE APOIO		
1	CAMINHÃO PIPA		
13	CAMINHÃO BASCULANTE		
1	RETROESCAVADEIRA		
1	MOTONIVELADORA		
1	ROLO COMBINADO (CHAPA/PNEU)		
	TAREFAS REALIZADAS		
NÚMERO DE T.R.	DESCRIÇÃO	OBSERVAÇÕES	
1	UMECTAÇÃO		
2	EXECUÇÃO DE ALA DE BUEIRO	B285 LD (INCLUINDO LANÇAMENTO DE MATAÇO)	
3	APLICAÇÃO/COMPACTAÇÃO DE MASSA ASFALTICA		
4	PINTURA DE LIGAÇÃO		
5	SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO TOPOGRÁFICO		
6	SINALIZAÇÃO		
7	ASSENTAMENTO DE ADUELAS	E213 A E214	
8	EXECUÇÃO DE ATERRO	E279 A E286	
	REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATORIOS)		



Data não informada



Data não informada







OCORRÊNCIAS	
NÚMERO DE OC	TIPO DE OCORRÊNCIA
EQUIPE E04 E E05 16/10/2023	
OBSERVAÇÕES	
CONFERÊNCIA	
MUNICIPIO	
CONSÓRCIO (Aprovado em 18/10/2023 - 09:03)	
Obs.:	Obs.: *Drenagem: Construção de alas de bueiro na Est. 285 e construção de bueiro com aduelas na Est. 212. *Terraplenagem: Aterro nas Est. 278 até Est. 287. Transporte de matacos da pedreira para Est. 212 a Est. 284. *Asfalto: Capa da Est. 158 até Est. 279 lado direito e capa da Est. 258 até Est. 282 lado esquerdo.
ASSINATURAS	
Luiz Henrique da Silva Borges Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 208579/D	PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA CREA 137.103/D
Luciano Xavier de Castro RT de Execução - CONSÓRCIO 3T-SOLOCAP-CONEP CREA 59784/D	







RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº 0111	OBRA: CTP 229/2023 - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	CONTRATO:	RESP. TÉCNICO: LUCIANO XAVIER
ENDEREÇO: ESTRADA DE ACESSO ENTRE SANTO ANTÔNIO DO GRAMA E ABRE CAMPO	INÍCIO: 01/04/2023	Nº CREA-MG: 59784/D	
CIDDE:	PRAZO: 01/10/2023	Nº DA ART:	
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA	UF:	COORDENADAS:	
DATA: 17/10/2023	SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA ☔
MANHÃ	✓		IMPRATICÁVEL ☔
TARDE	✓		
QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
1	AUXILIAR DE ENGENHARIA	1	ENCARREGADO DE OBRAS
5	OPERADOR	4	MOTORISTA
1	PEDREIRO	1	TOPOGRAFO
4	AJUDANTE	1	GREIDISTA
QTDE	EQUIPAMENTO		
1	ROLO LISO		
2	ESCAVADEIRA		
1	ROLO DE PNEU		
2	VEÍCULO DE APOIO		
1	CAMINHÃO PIPA		
3	CAMINHÃO BASCULANTE		
1	CARRETA BASCULANTE		
1	RETROESCAVADEIRA		
1	MOTONIVELADORA		
TAREFAS REALIZADAS			
NÚMERO DE T.R.	DESCRIÇÃO	OBSERVAÇÕES	
1	REGULARIZAÇÃO DE SUB-BASE	INCLUINDO LANÇAMENTO DE CASCALHO: E285 A E295	
2	EXECUÇÃO DE ATERRO	E300 A E322	
3	UMECTAÇÃO		
4	SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO TOPOGRÁFICO		
5	SINALIZAÇÃO		
6	ASSENTAMENTO DE ADUELAS	E213 A E214	
7	CARGA/TRANSPORTE/ARMAZENAMENTO DE BICA CORRIDA	E277	

REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATORIOS)

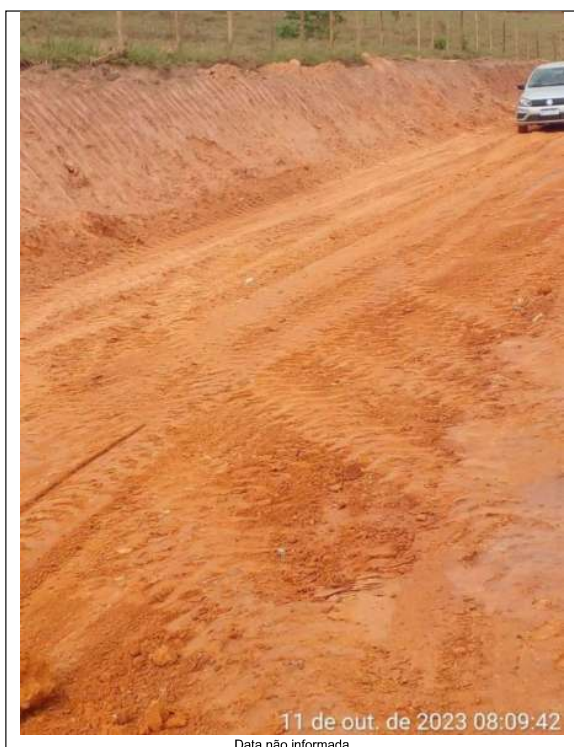

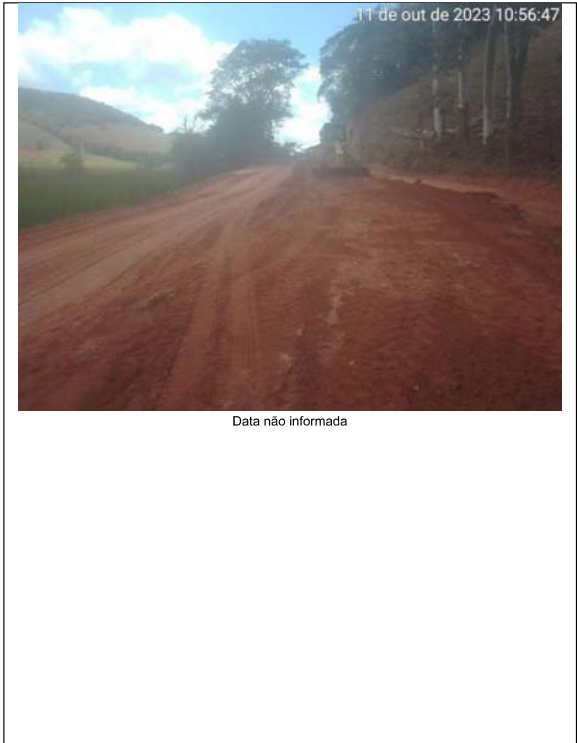

OCORRÊNCIAS	
NÚMERO DE OC	TIPO DE OCORRÊNCIA
OBSERVAÇÕES	
EQUIPE E05 11/10/2023	
CONFERÊNCIA	
MUNICÍPIO	CONSORCIO (Aprovado em 18/10/2023 - 09:05)
Obs.:	Obs.: *Cerca: Sendo construída lado esquerdo nas Est. 83 até Est. 90, *Terraplenagem: Aterro da Est. 278 até Est. 287.. Construção de ala do bueiro Est. 285, Sub base da Est. 287 a Est. 296.
ASSINATURAS	
Luiz Henrique da Silva Borges Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 208579/D	PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA CREA 137.103/D
Luciano Xavier de Castro RT de Execução - CONSORCIO 3T - SOLOCAP-CONEP CREA 59784/D	




 CIMVALPI CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO	
Nº 0110		OBRA: CTP 229/2023 - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	
ENDEREÇO: ESTRADA DE ACESSO ENTRE SANTO ANTÔNIO DO GRAMA E ABRE CAMPO		CONTRATO:	
CIDDE:		INÍCIO: 01/04/2023	
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA		PRAZO: 01/10/2023	
DATA: 11/10/2023		Nº CREA-MG: 59784/D	
MANHÃ		Nº DA ART:	
TARDE		COORDENADAS:	
QTDE		MAO DE OBRA INDIRETA	
FUNÇÃO / CARGO		FUNÇÃO / CARGO	
1		1	
AUXILIAR DE ENGENHARIA		OPERADOR DE ESPARGIDOR	




	ENCARREGADO DE OBRAS	1	MESISTA
6	OPERADOR	6	MOTORISTA
1	PEDREIRO	1	TOPOGRAFO
5	AJUDANTE	1	GREIDISTA
2	RASTELEIRO		
QTDE	EQUIPAMENTO		
2	ROLO LISO		
2	ESCAVADEIRA		
1	ROLO DE PNEU		
1	VIBROACABADORA		
1	ESPARGIDOR		
3	VEÍCULO DE APOIO		
1	CAMINHÃO PIPA		
14	CAMINHÃO BASCULANTE		
1	CARRETA BASCULANTE		
	RETROESCAVADEIRA		
1	MOTONIVELADORA		
1	ROLO COMBINADO (CHAPA/PNEU)		
TAREFAS REALIZADAS			
NÚMERO DE T.R.	DESCRIÇÃO	OBSERVAÇÕES	
1	SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO TOPOGRÁFICO		
2	REGULARIZAÇÃO DE SUB-BASE	LANÇAMENTO DE CASCALHO (E271 A E276; E278 A E284)	
3	SINALIZAÇÃO		
4	CONCRETAGEM DE BASE P/ ADUELAS	ENTRE E213 E E214	
5	APLICAÇÃO/COMPACTAÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA		
6	UMECTAÇÃO		
7	CARGA/TRANSPORTE/ARMAZENAMENTO DE MATERIAL	BICA CORRIDA E BGS (E256 A E269)	
8	PINTURA DE LIGAÇÃO		
9	EXECUÇÃO DE DRENO PROFUNDO	E316 A E322	
REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATORIOS)			





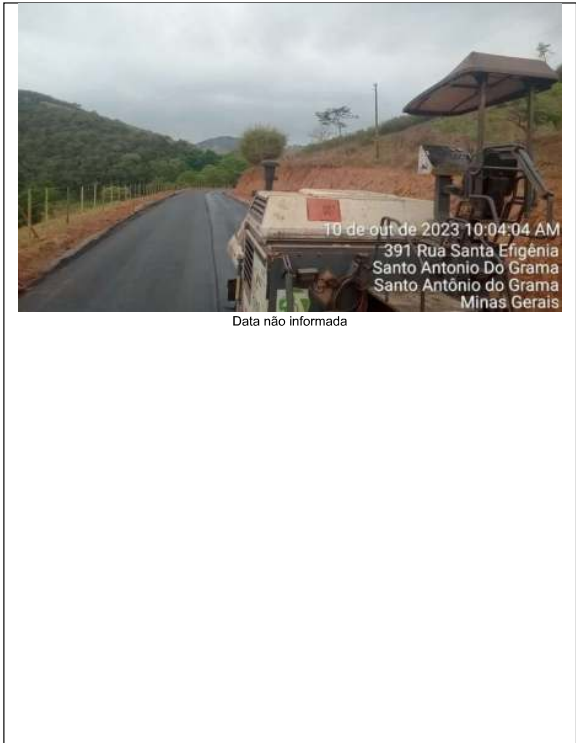

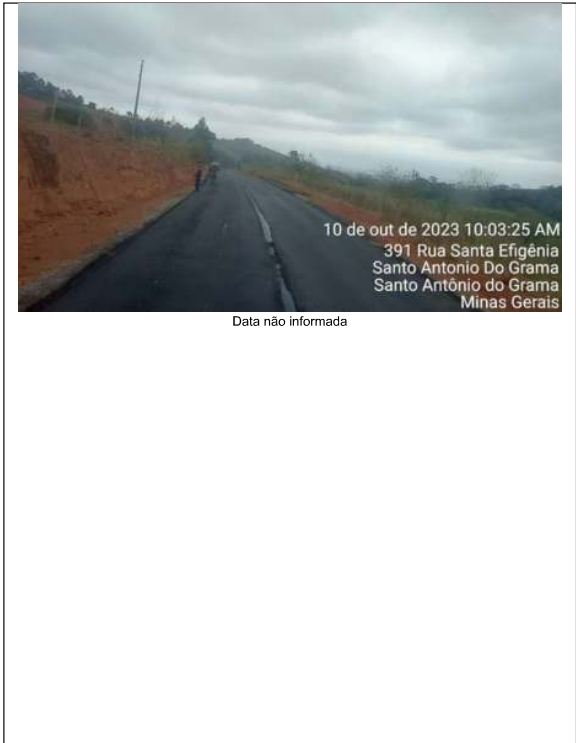

NÚMERO DE OC		TIPO DE OCORRÊNCIA	OCORRÊNCIAS
EQUIPE E04 E E05 10/10/2023			DESCRÇÃO DA OCORRÊNCIA
			OBSERVAÇÕES
			CONFERÊNCIA
MUNICÍPIO			CONSÓRCIO (Aprovado em 16/10/2023 - 09:52)
Obs.:			Obs.: *Drenos: Conclusão de drenos profundo da Est. 300 a Est. 321 + 10. *Asfalto: Capa da Est. 120 até Est. 179. Faltando lado direito Est. 158. *Topografia: Locação e nivelamento Est. 256 até Est. 269. *Cerca: Executando da Est. 082 a Est. 092. *Terraplenagem: Lançamento BGS da Est. 256 até Est. 269. Aterro da Est. 278 a Est. 290. *Concretado o berço do bueiro Est. 212.
			ASSINATURAS
Luiz Henrique da Silva Borges Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 208579/D		PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA CREA 137.103/D	Luciano Xavier de Castro RT de Execução - CONSÓRCIO 3T-SOLOCAP-CONEP CREA 59784/D


 CIMVALPI CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISETORIAL DO VALE DO PIRANGA		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO	
Nº 0109		OBRA: CTP 229/2023 - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	
CONTRATO:		RESP. TÉCNICO: LUCIANO XAVIER	
ENDEREÇO: ESTRADA DE ACESSO ENTRE SANTO ANTÔNIO DO GRAMA E ABRE CAMPO		INÍCIO: 01/04/2023	
CIDDE:		Nº CREA-MG: 59784/D	
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA		PRAZO: 01/10/2023	
UF:		Nº DA ART:	
COORDENADAS:			
DATA: 10/10/2023	SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA ☔
MANHÃ	✓		IMPRATICÁVEL 🚫
TARDE	✓		
QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
1	AUXILIAR DE ENGENHARIA	1	OPERADOR DE ESPARGIDOR
2	ENCARREGADO DE OBRAS	1	MESISTA
6	OPERADOR	6	MOTORISTA
1	PEDREIRO	5	AJUDANTE
2	RASTELEIRO		





QTDE	EQUIPAMENTO	
2	ROLO LISO	
2	ESCAVADEIRA	
1	ROLO DE PNEU	
1	VIBROACABADORA	
1	ESPARGIDOR	
3	VEICULO DE APOIO	
1	CAMINHÃO PIPA	
14	CAMINHÃO BASCULANTE	
1	CARRETA BASCULANTE	
1	RETROESCAVADEIRA	
1	MOTONIVELADORA	
1	ROLO COMBINADO (CHAPA/PNEU)	
TAREFAS REALIZADAS		
NÚMERO DE T.R.	DESCRICAÇÃO	OBSERVAÇÕES
1	EXECUÇÃO DE DRENO PROFUNDO	E314 A E316
2	CARGA/TRANSPORTE/ARMAZENAMENTO DE BICA CORRIDA	E277
3	REGULARIZAÇÃO/COMPACTAÇÃO DE SUB-BASE	APLICAÇÃO DE CASCALHO (E272 A E276; E290 A E300)
4	UMECTAÇÃO	
5	CORTE/ABERTURA DE CAIXA P/ ASSENTAMENTO DE ADUELAS	E213 E E214
6	SINALIZAÇÃO	
7	SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO TOPOGRÁFICO	
8	PINTURA DE LIGAÇÃO	
9	APLICAÇÃO/COMPACTAÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA	
REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATORIOS)		

REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATORIOS)



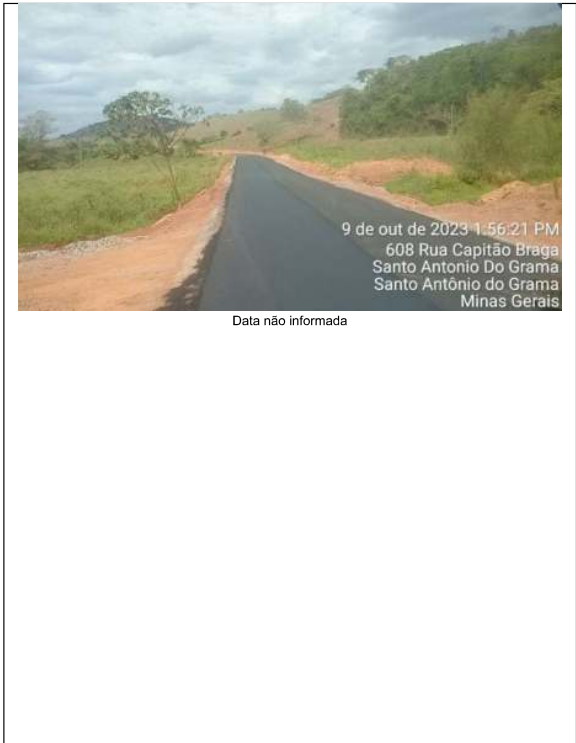

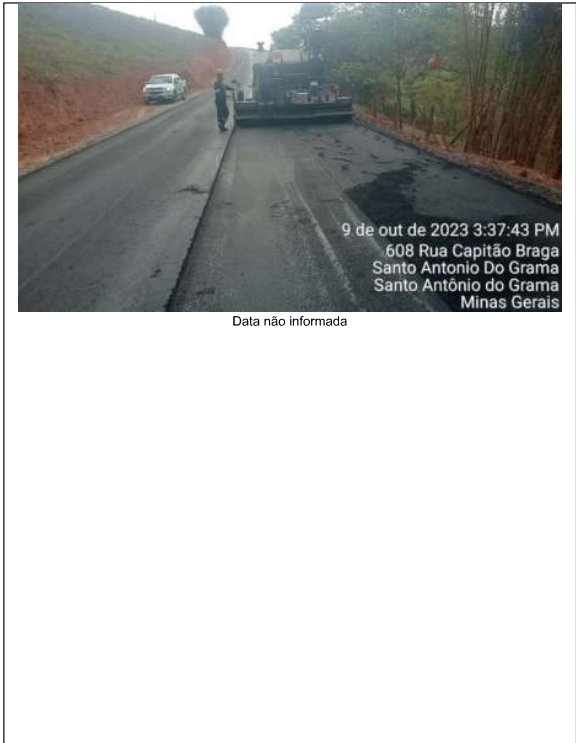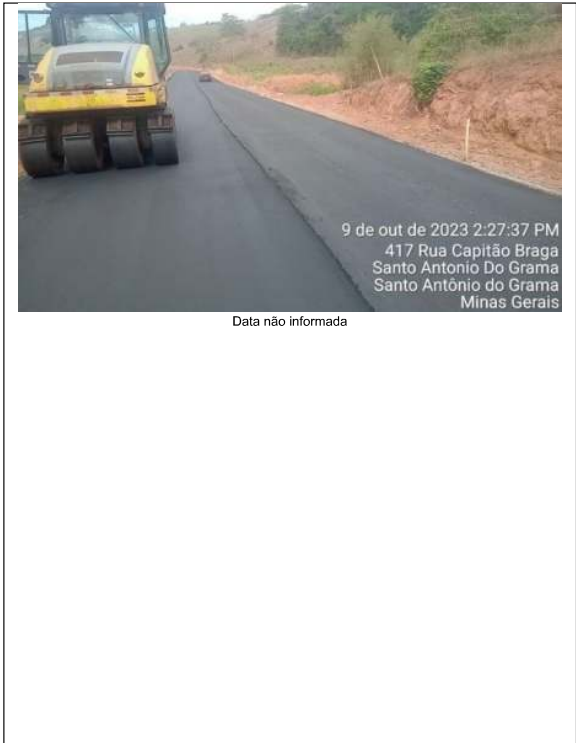



NÚMERO DE OC		OCORRÊNCIAS	DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA
EQUIPE E04 E E05 09/10/2023		OBSERVAÇÕES	
MUNICÍPIO		CONFERÊNCIA	
Obs.:		CONSÓRCIO (Aprovado em 16/10/2023 - 09:28)	Obs.: *Drenagem: Revestimento da decida de água Est. 1 +5 e na Est. 03. *Topografia: Locação de estacas para lançamento cascalho e locação de bueiros Est. 212. *Asfalto: Capa da Est. 120 a Est. 207 lado esquerdo. *Terraplenagem: Preparação de terreno com mataco e pedra de mão para construção de bueiro Est. 212. Lançamento de cascalho Est. 294 a Est. 308. Dreno profundo da Est. 300 a Até Est. 310.
		ASSINATURAS	
Luiz Henrique da Silva Borges Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 208579/D		PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA CREA 137.103/D	Luciano Xavier de Castro RT de Execução - CONSÓRCIO 3T - SOLOCAP-CONEP CREA 59784/D





 CIMVALPI CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISETORIAL DO VALE DO PIRANGA		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO			
Nº 0108	OBRA: CTP 229/2023 - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA		CONTRATO:		RESP. TÉCNICO: LUCIANO XAVIER
ENDEREÇO: ESTRADA DE ACESSO ENTRE SANTO ANTÔNIO DO GRAMA E ABRE CAMPO		INÍCIO: 01/04/2023		Nº CREA-MG: 59784/D	
CIDDE:		PRAZO: 01/10/2023		Nº DA ART:	
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA		UF:		COORDENADAS:	
DATA: 09/10/2023	SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA ☔	IMPRATICÁVEL ☔	
MANHÃ	✓				
TARDE	✓				
QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO		QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	
1	OPERADOR DE ESPARGIDOR		2	ENCARREGADO DE OBRAS	
1	MESISTA		4	OPERADOR	
5	MOTORISTA		1	GREIDISTA	
2	RASTELEIRO				
QTDE	EQUIPAMENTO				
2	ROLO LISO				
1	ESCAVADEIRA				
1	VIBROACABADORA				
1	ESPARGIDOR				
3	VEICULO DE APOIO				
1	CAMINHÃO PIPA				
11	CAMINHÃO BASCULANTE				
1	MOTONIVELADORA				
1	ROLO COMBINADO (CHAPA/PNEU)				
TAREFAS REALIZADAS					
NÚMERO DE T.R.	DESCRIÇÃO		OBSERVAÇÕES		
1	SINALIZAÇÃO				
2	PINTURA DE LIGAÇÃO				
3	LANÇAMENTO DE BICA CORRIDA E BGS		E229		
4	UMECTAÇÃO				
5	APLICAÇÃO/COMPACTAÇÃO DE MASSA ASFALTICA				
REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATORIOS)					



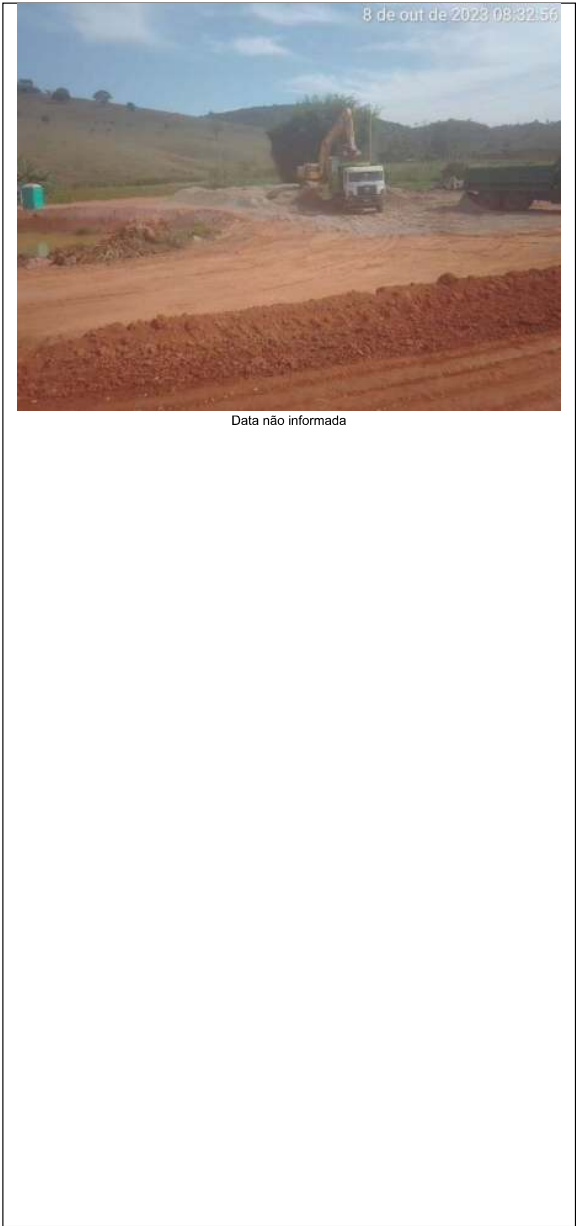

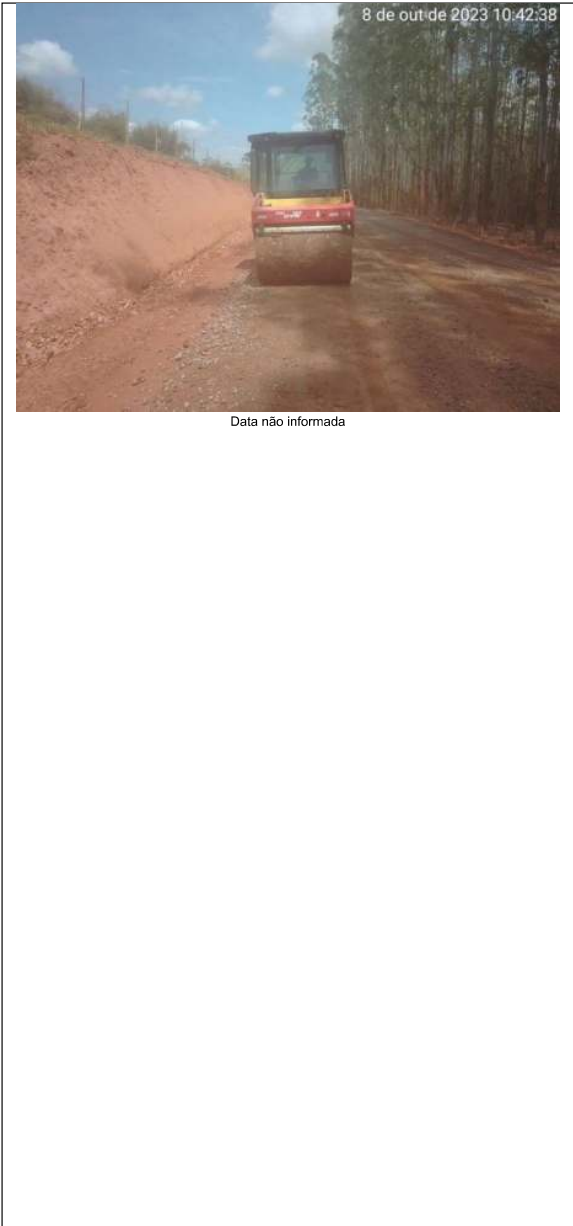


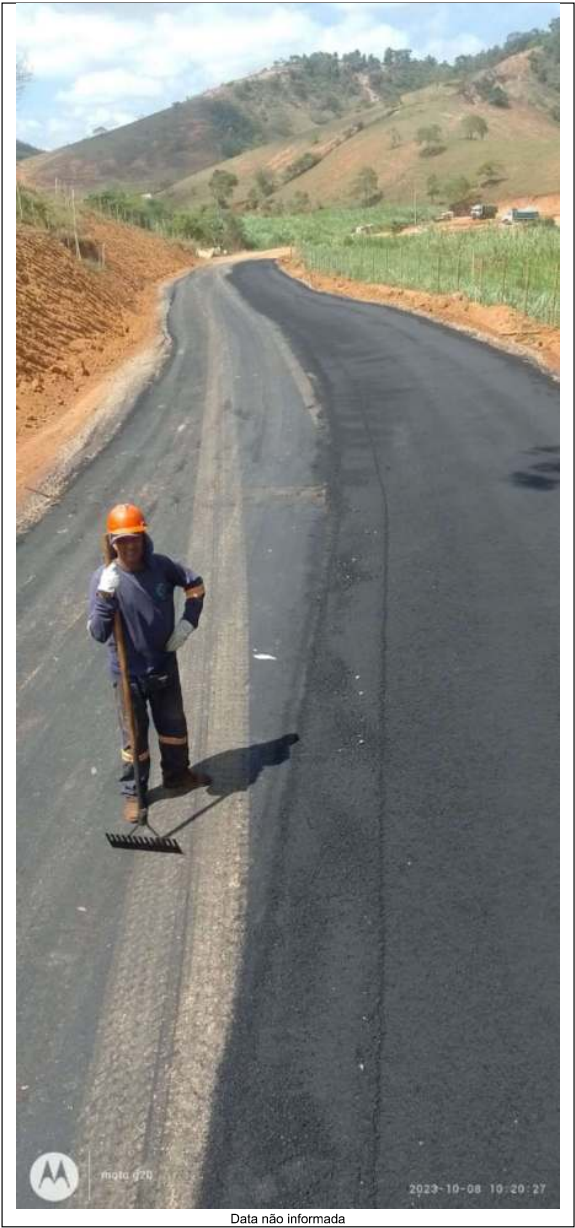


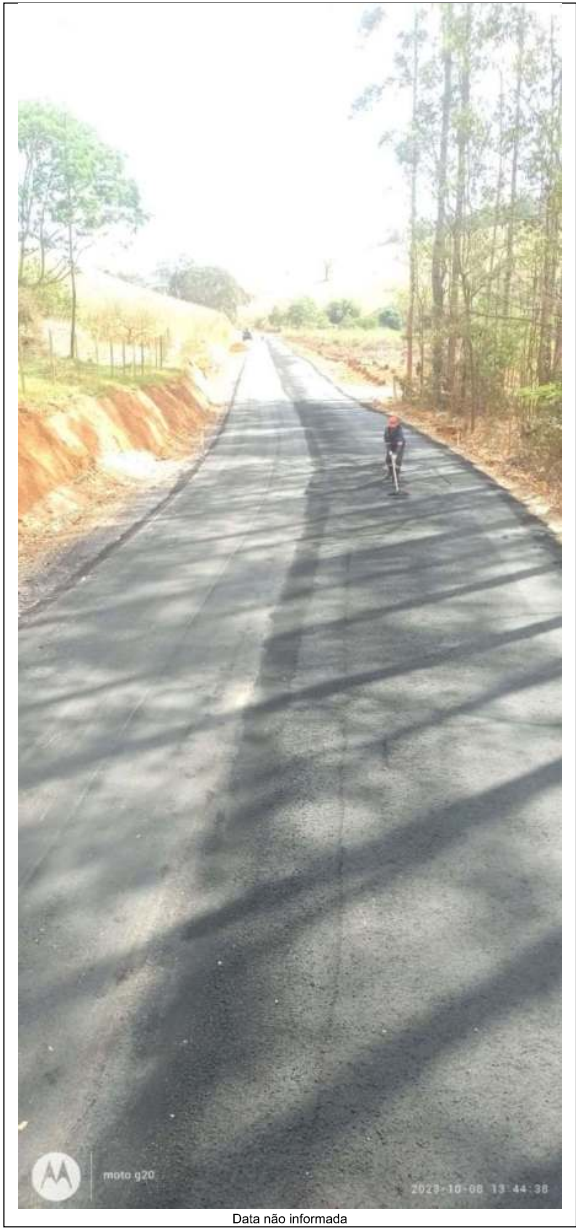

Data não informada



Data não informada

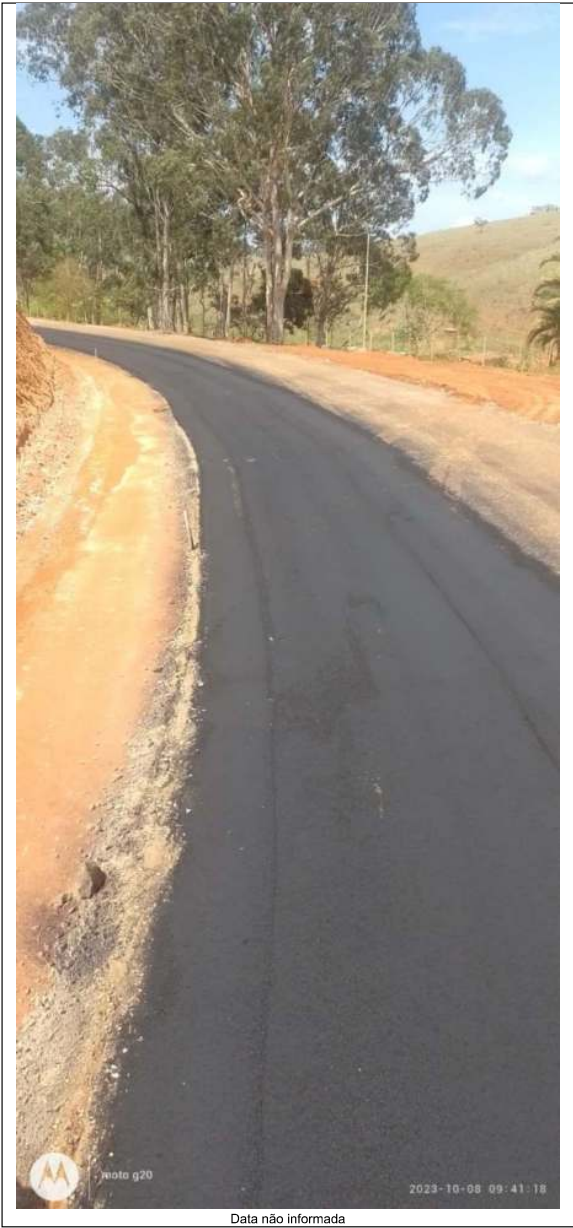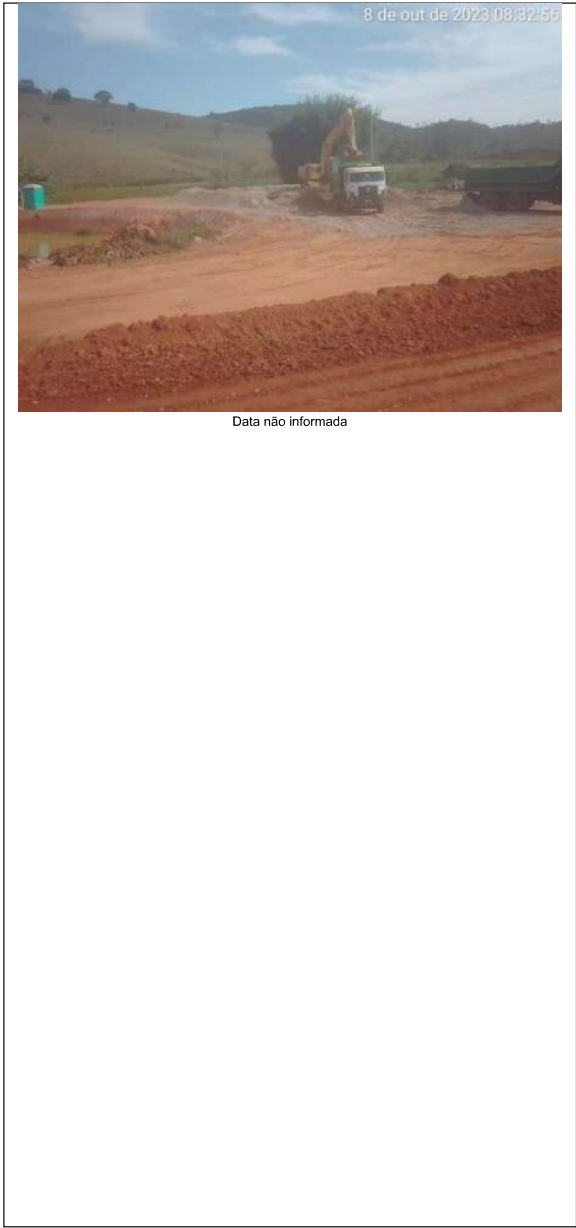

OCORRÊNCIAS		DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA
NÚMERO DE OC	TIPO DE OCORRÊNCIA	
EQUIPE E04 E E05 08/10/2023		OBSERVAÇÕES
MUNICÍPIO		CONFERÊNCIA
Obs.:		CONSÓRCIO (Aprovado em 10/10/2023 - 08:49)
		Obs.: *Conforme executado em campo. *A segunda placa da obra foi retirada e não foi instalada até o presente momento.
		ASSINATURAS
Luiz Henrique da Silva Borges Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 208579/D		PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA CREA 137.103/D
		Luciano Xavier de Castro RT de Execução - CONSÓRCIO 3T-SOLOCAP-CONEP CREA 59784/D



 CIMVALPI CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO		
Nº 0107	OBRA: CTP 229/2023 - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	CONTRATO:		RESP. TÉCNICO: LUCIANO XAVIER
ENDEREÇO: ESTRADA DE ACESSO ENTRE SANTO ANTÔNIO DO GRAMA E ABRE CAMPO		INÍCIO: 01/04/2023		Nº CREA-MG: 59784/D
CIDDE:		PRAZO: 01/10/2023		Nº DA ART:
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA		UF:		COORDENADAS:
DATA: 09/10/2023	SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA ☔	IMPRATICÁVEL 🌧
MANHÃ	✓			
TARDE	✓			
QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	
1	AUXILIAR DE ENGENHARIA	1	OPERADOR DE ESPARGIDOR	
2	ENCARREGADO DE OBRAS	1	MESISTA	
4	OPERADOR	1	AUXILIAR DE TOPOGRAFIA	
6	MOTORISTA	1	GREIDISTA	
2	RASTELEIRO			
QTDE	EQUIPAMENTO			
2	ROLO LISO			
1	ESCAVADEIRA			
1	VIBROACABADORA			
1	ESPARGIDOR			
3	VEICULO DE APOIO			
1	CAMINHÃO PIPA			
15	CAMINHÃO BASCULANTE			
1	CARRETA BASCULANTE			
1	RETROESCAVADEIRA			
1	MOTONIVELADORA			
1	ROLO COMBINADO (CHAPA/PNEU)			
TAREFAS REALIZADAS				
NÚMERO DE T.R.	DESCRIÇÃO	OBSERVAÇÕES		
1	PINTURA DE LIGAÇÃO			
2	UMECTAÇÃO			
3	SINALIZAÇÃO			
4	APLICAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA			
5	LANÇAMENTO DE BICA CORRIDA E BGS	E180 A E208; E216 A E229		
6	CARGA/TRANSPORTE/ARMAZENAMENTO DE BICA CORRIDA	E207		
7	EXECUÇÃO DE COMPLEMENTO DE BUEIRO	E285		
8	EXECUÇÃO DE DRENO PROFUNDO	E312 A 315		
9	SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO TOPOGRÁFICO			
REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATORIOS)				








Data não informada





Data não informada

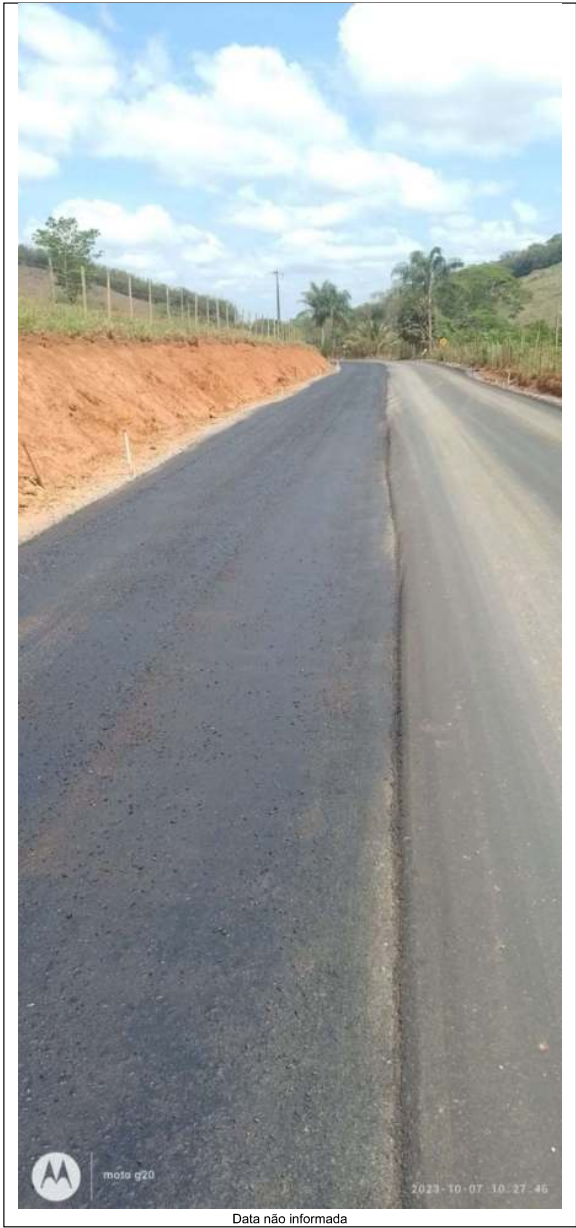



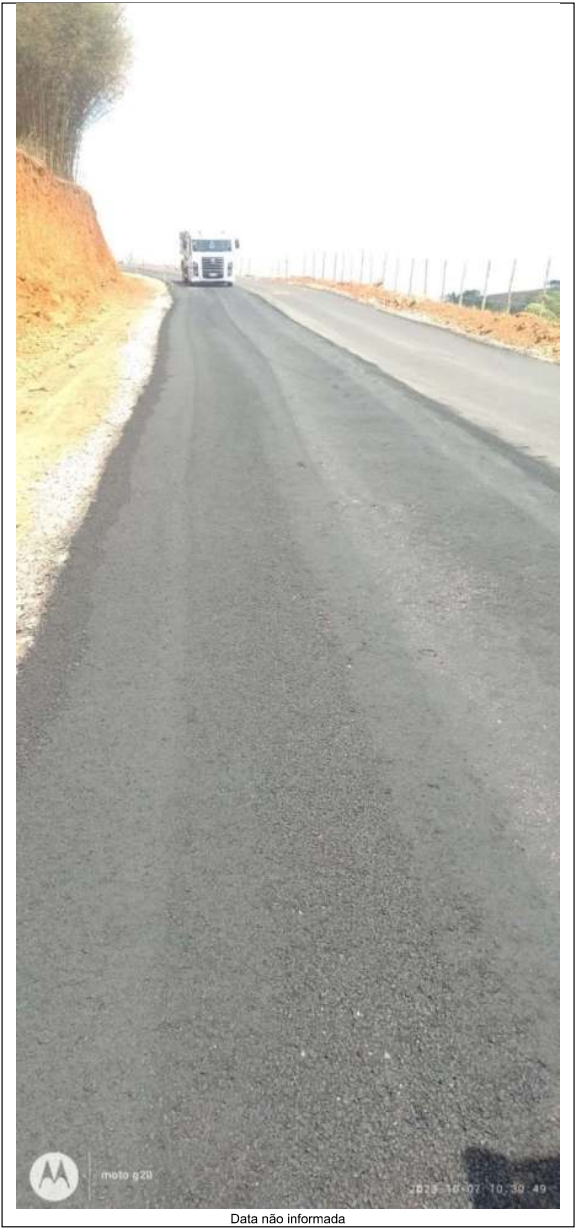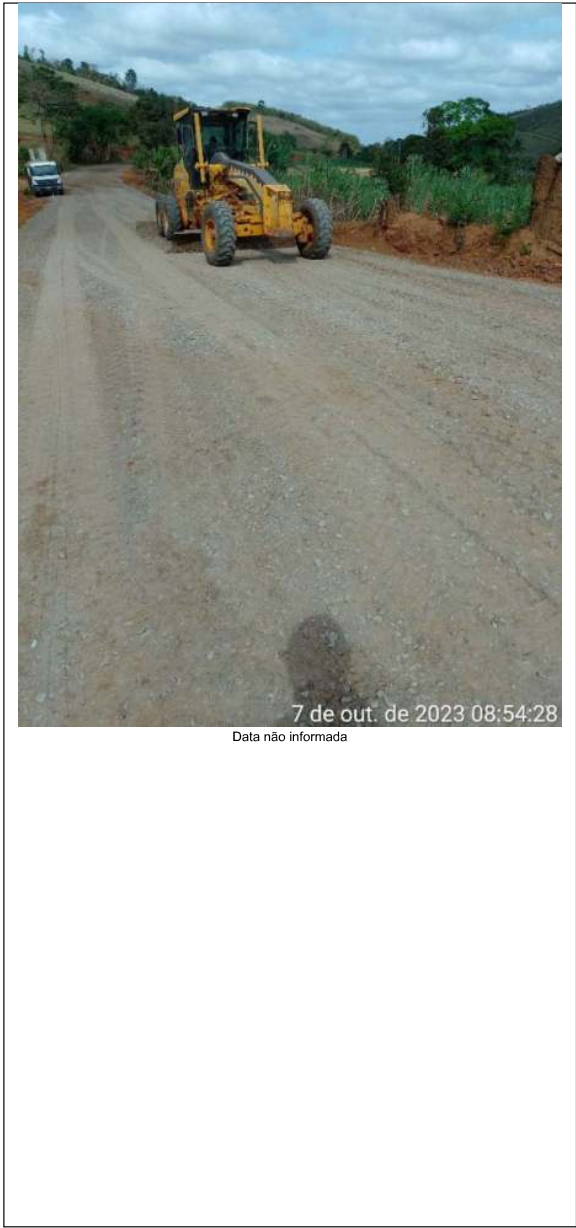

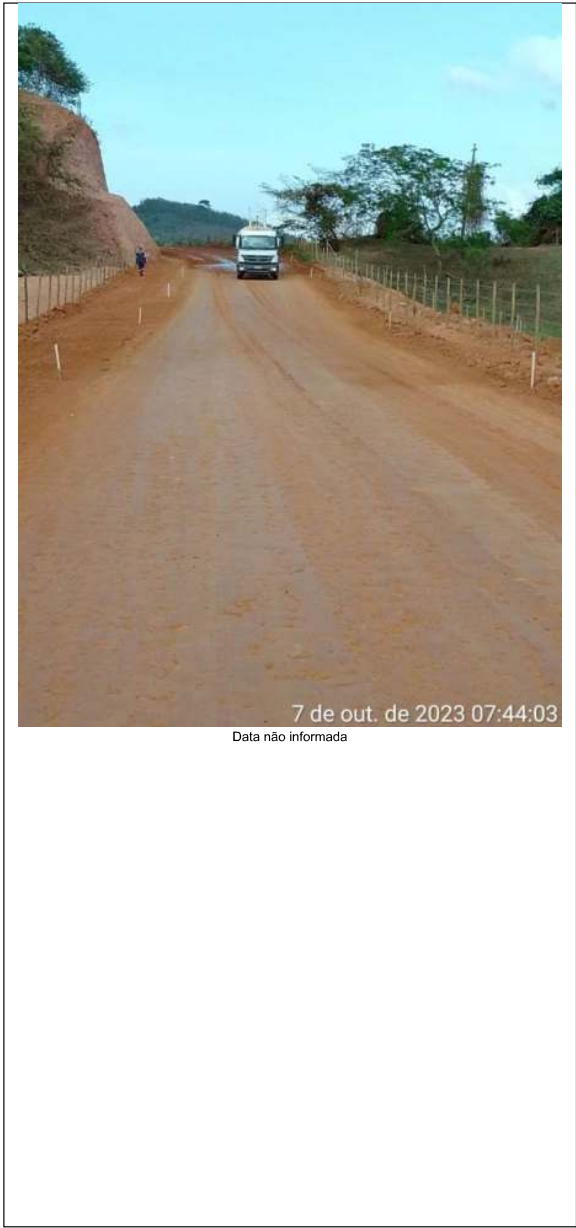

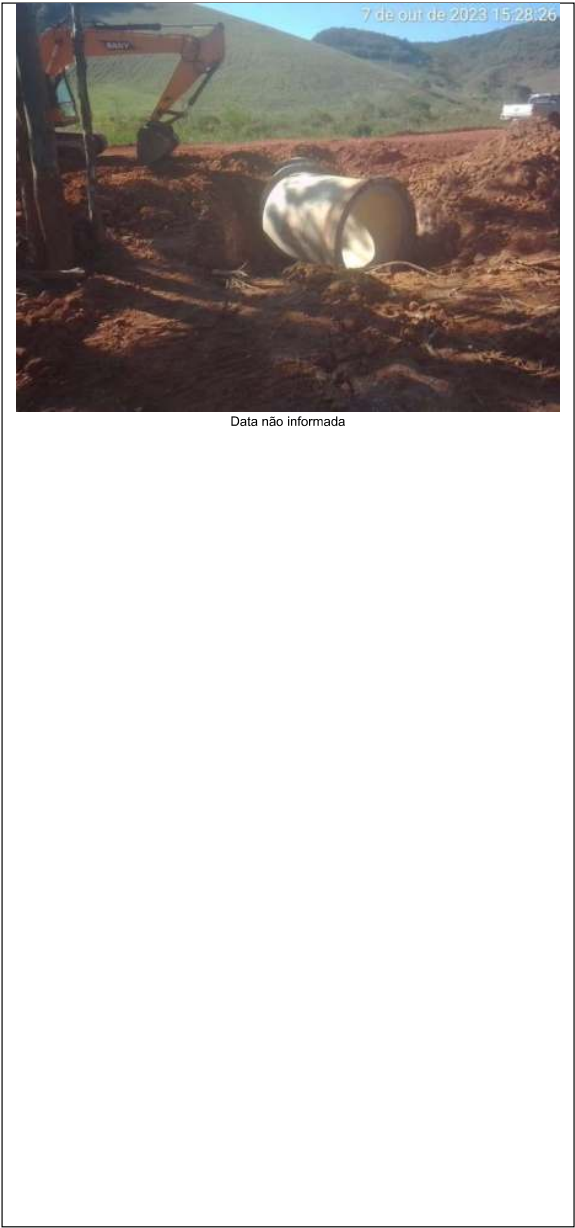



Data não informada

NÚMERO DE OC		OCORRÊNCIAS	DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA
EQUIPE E04 E E05 07/10/2023		OBSERVAÇÕES	
MUNICÍPIO		CONFERÊNCIA	
Obs.:		CONSÓRCIO (Aprovado em 09/10/2023 - 15:14) Obs.: *Topografia: Locação e nivelamento para lançamento de cascalho e BGS. *Asfalto: Salgamento da Est. 217 até Est. 256. *Terraplenagem: Lançamento de cascalho e BGS. *Terraplenagem: Lançamento cascalho e lançamento BGS. Limpeza de solo mole nas Est. 12 e Est.13. para construção de bueiro. Execução de dreno profundo Est. 300 a Est. 323.	
		ASSINATURAS	
Luiz Henrique da Silva Borges Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 208579/D		PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA CREA 137.103/D	Luciano Xavier de Castro RT de Execução - CONSÓRCIO 3T-SOLOCAP-CONEP CREA 59784/D







CIMVALPI
CONSORCIO INTERMUNICIPAL
MULTISETORIAL DO VALE DO PIRANGA



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO


Nº 0106		OBRA: CTP 229/2023 - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA		CONTRATO:		RESP. TÉCNICO: LUCIANO XAVIER	
ENDEREÇO: ESTRADA DE ACESSO ENTRE SANTO ANTÔNIO DO GRAMA E ABRE CAMPO		INÍCIO: 01/04/2023		Nº CREA-MG: 59784/D			
CIDDE:		PRAZO: 01/10/2023		Nº DA ART:			
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA		UF:		COORDENADAS:			
DATA: 09/10/2023		SOL ☀		NUBLADO ☁		CHUVA ☔	
MANHÃ		✓				IMPRATICÁVEL ☔	
TARDE		✓					
QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO			QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO		
1	AUXILIAR DE ENGENHARIA			1	OPERADOR DE ESPARGIDOR		
1	ENCARREGADO DE OBRAS			1	MESISTA		
6	OPERADOR			8	MOTORISTA		
5	AJUDANTE			1	GREIDISTA		
2	RASTELEIRO						
QTDE	EQUIPAMENTO						
2	ROLO LISO						
2	ESCAVADEIRA						
1	ROLO DE PNEU						
1	VIBROACABADORA						
1	ESPARGIDOR						
3	VEICULO DE APOIO						
1	CAMINHÃO PIPA						
12	CAMINHÃO BASCULANTE						
1	RETROESCAVADEIRA						
1	MOTONIVELADORA						
1	ROLO COMBINADO (CHAPA/PNEU)						
TAREFAS REALIZADAS							
NÚMERO DE T.R.	DESCRIÇÃO			OBSERVAÇÕES			
1	LIMPEZA DAS BODAS DA VIA			E176 A E180			
2	REGULARIZAÇÃO DE SUB-BASE			E207 A E210; E216 A E225			
3	SINALIZAÇÃO						
4	APLICAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA						
5	SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO TOPOGRÁFICO						
6	UMECTAÇÃO						
7	PINTURA DE LIGAÇÃO						
8	EXECUÇÃO DE DESVIO P/ ASSENTAMENTO DE ADUELAS			E210			
REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATORIOS)							



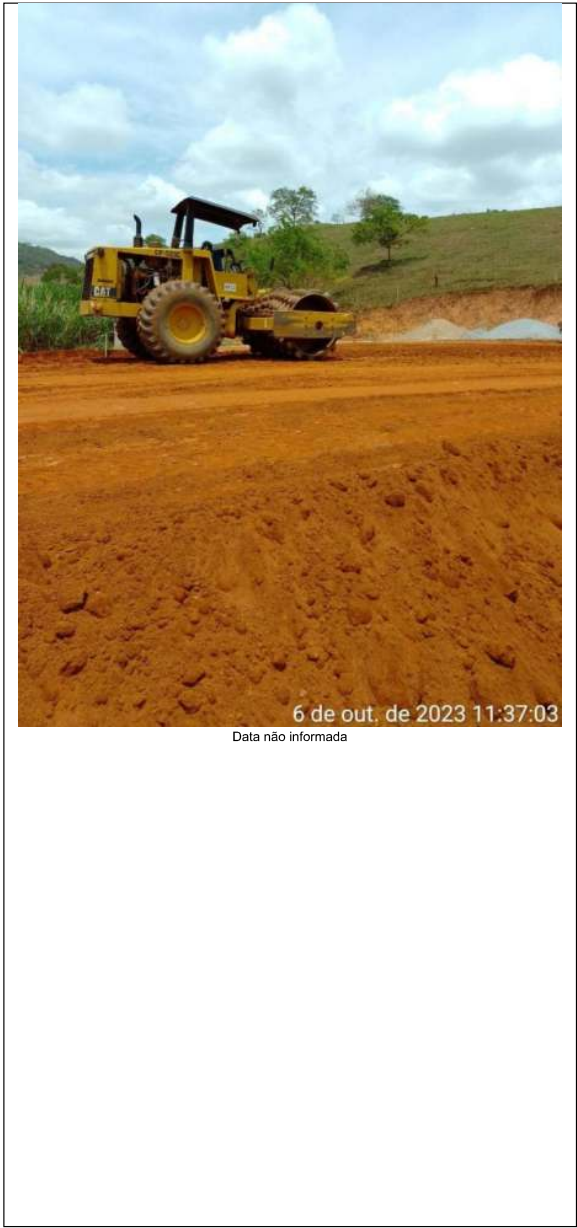

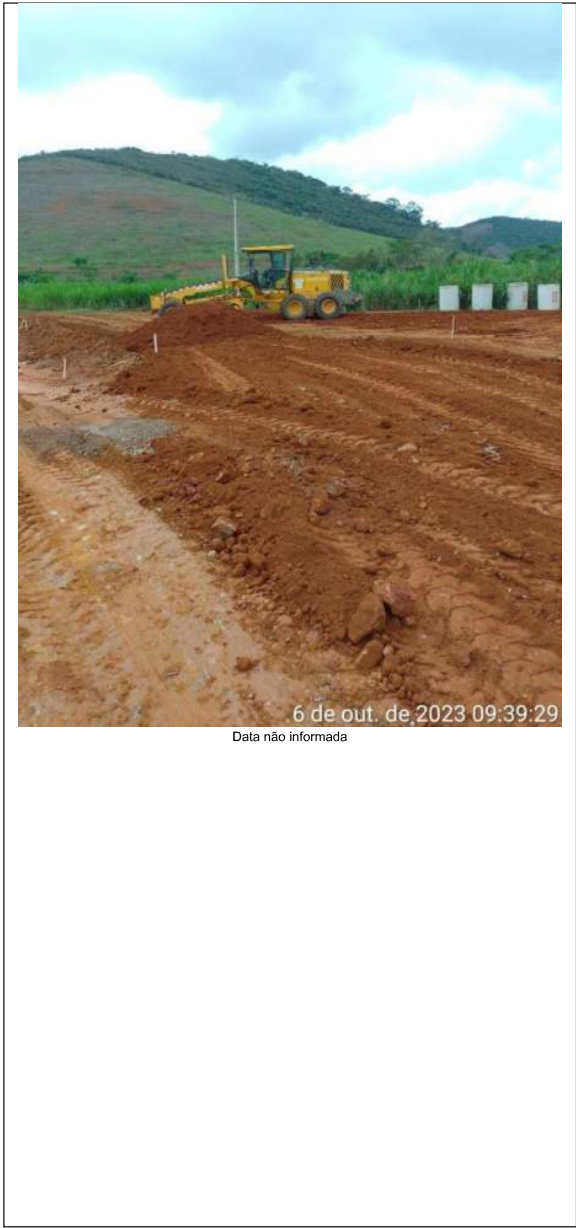

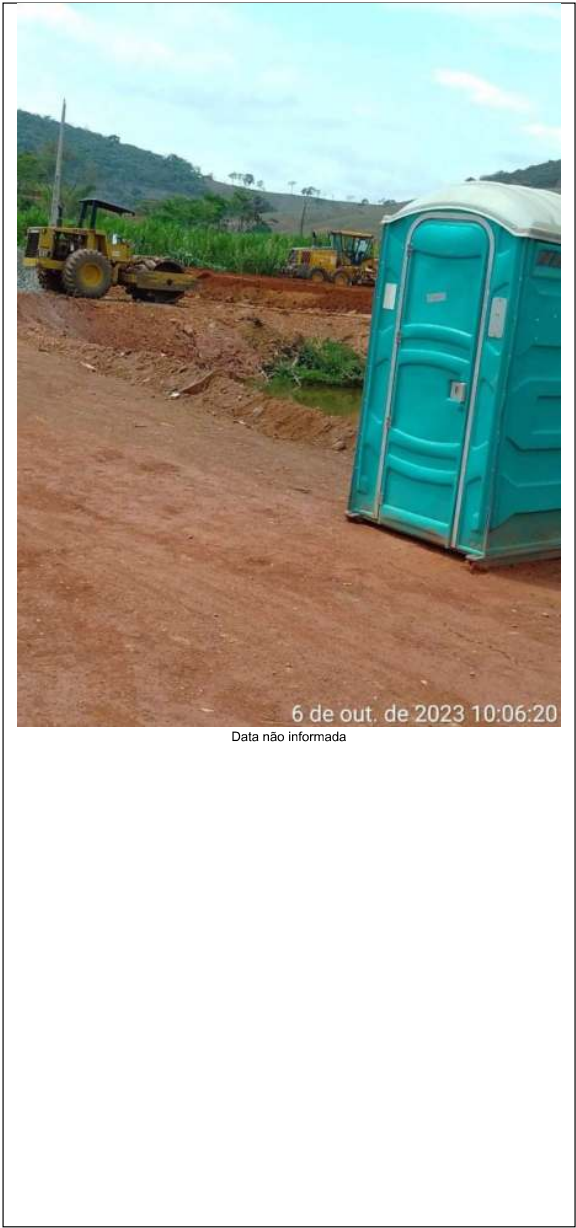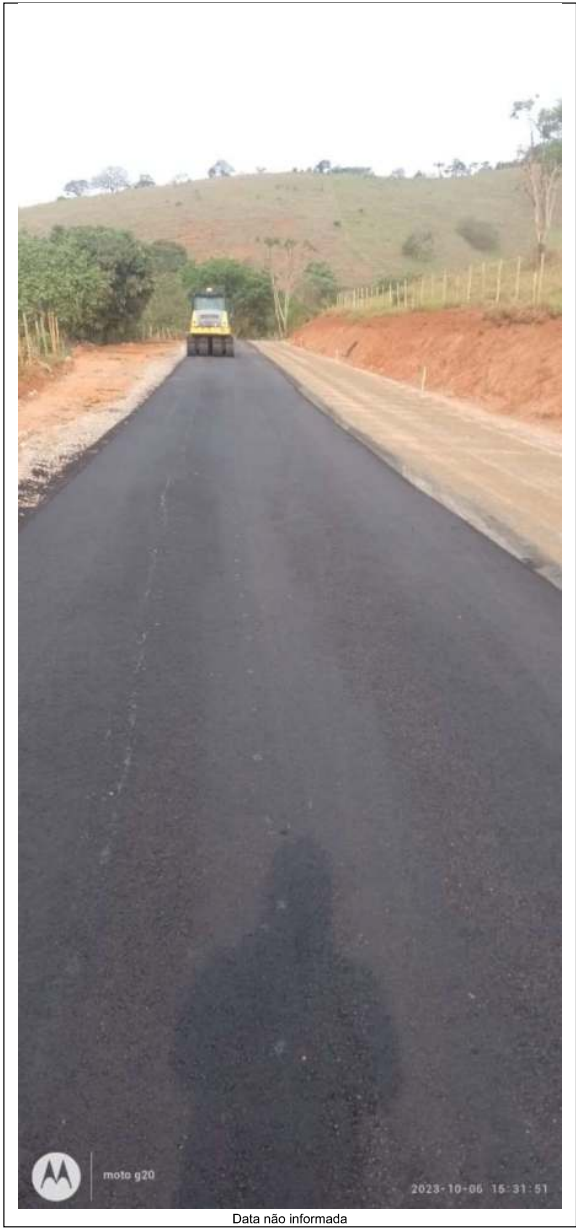

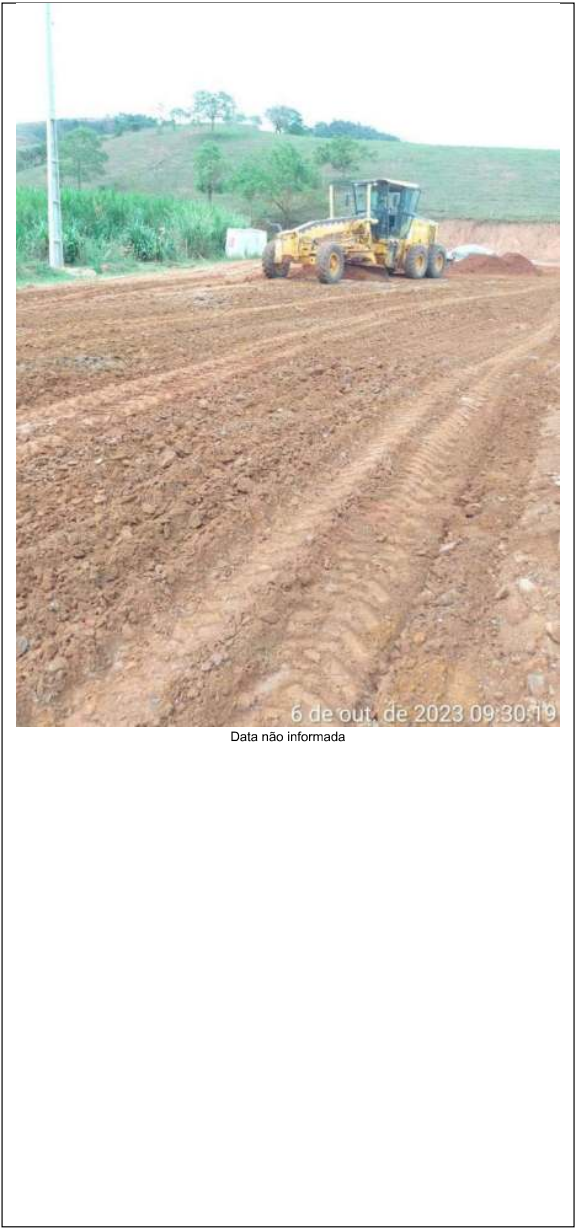





OCORRÊNCIAS	
NÚMERO DE OC	TIPO DE OCORRÊNCIA
DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA	
OBSERVAÇÕES	
EQUIPE E04 E E05 06/10/2023	
CONFERÊNCIA	
MUNICÍPIO	CONSÓRCIO (Aprovado em 09/10/2023 - 15:06)
Obs.:	Obs.: "Drenos valetas: Est. 092 até Est. 094 lado esquerdo, "Descidas de água: Est. 145 e Est. 03, "Topografia: Locação de Est. 181 a Est. 206 para lançamento de BGS, "Cerca: Execução da Est. 329 a Est. 334 lado direito, "Asfalto: Selamento da Est. 120 até Est. 206 lado direito e esquerdo, "Terraplenagem: Lançamento de BGS da Est. 181 até 206, Execução de desvio para implantação do bueiro da Est. 212 (aduelas).
ASSINATURAS	
Luiz Henrique da Silva Borges Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 208579/D	PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA CREA 137.103/D
Luciano Xavier de Castro RT de Execução - CONSÓRCIO 3T-SOLOCAP-CONEPP CREA 59784/D	





RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº 0105	OBRA: CTP 229/2023 - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	CONTRATO:	RESP. TÉCNICO: LUCIANO XAVIER
ENDEREÇO: ESTRADA DE ACESSO ENTRE SANTO ANTÔNIO DO GRAMA E ABRE CAMPO		INÍCIO: 01/04/2023	Nº CREA-MG: 59784/D
CIDDE:		PRAZO: 01/10/2023	Nº DA ART:
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA		UF:	COORDENADAS:
DATA: 06/10/2023	SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA ☔
MANHÃ	✓		
TARDE	✓		
QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
1	AUXILIAR DE ENGENHARIA	1	OPERADOR DE ESPARGIDOR
2	ENCARREGADO DE OBRAS	1	MESISTA
6	OPERADOR	6	MOTORISTA
1	PEDREIRO	1	TOPOGRAFO
5	AJUDANTE	1	GREIDISTA
2	RASTELEIRO		
QTDE	EQUIPAMENTO		
2	ROLO LISO		
3	VEÍCULO 1.0		
2	ESCAVADEIRA		
1	ROLO DE PNEU		
1	VIBROACABADORA		
1	ESPARGIDOR		
1	CAMINHÃO PIPA		
16	CAMINHÃO BASCULANTE		
1	RETROESCAVADEIRA		
1	MOTONIVELADORA		
1	ROLO COMBINADO (CHAPA/PNEU)		
TAREFAS REALIZADAS			
NÚMERO DE T.R.	DESCRIÇÃO	OBSERVAÇÕES	
1	APLICAÇÃO/COMPACTAÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA		
2	PINTURA DE LIGAÇÃO		
3	EXECUÇÃO DE ATERRO	E285 A E288	
4	EXECUÇÃO DE REBAIXAMENTO DE PISTA	E300	
5	UMECTAÇÃO		
6	SINALIZAÇÃO		
7	EXECUÇÃO DE ALA DE BUEIRO	E285 LE	
REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATORIOS)			




Data não informada








Data não informada



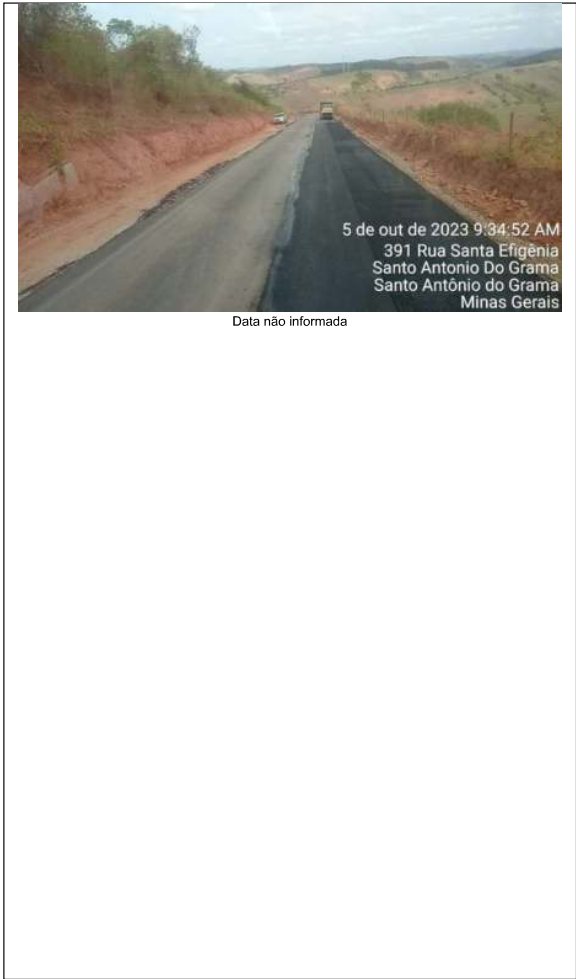




Data não informadaData não informada

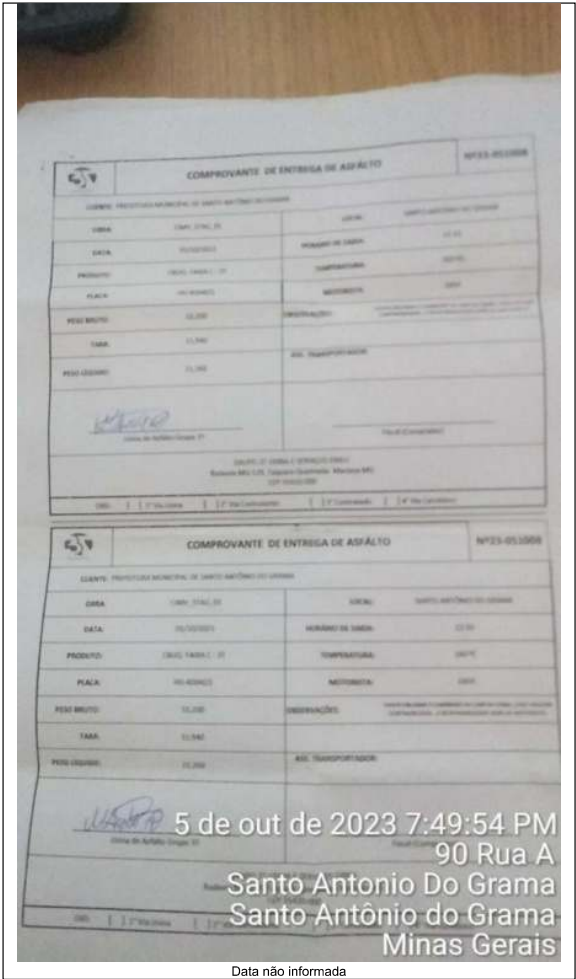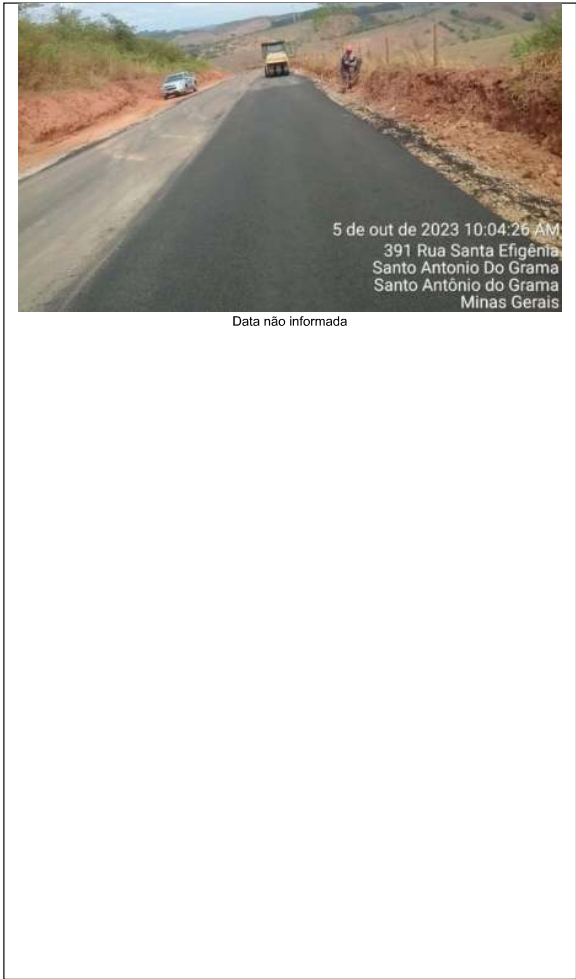

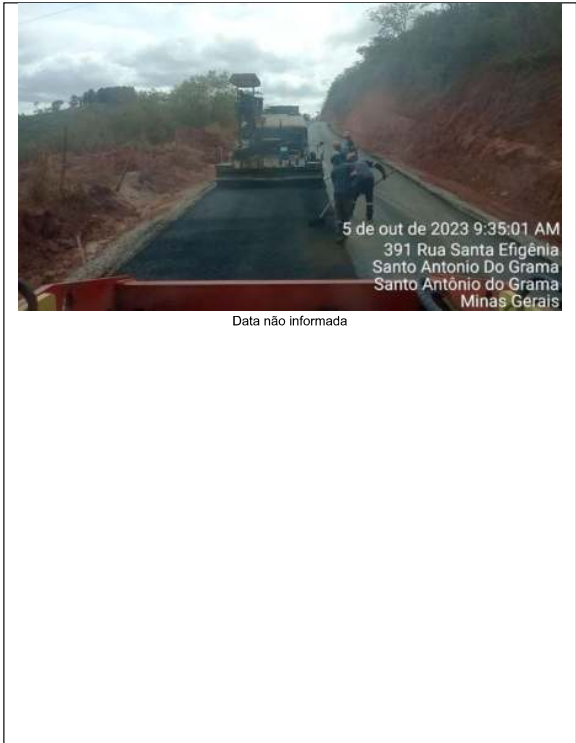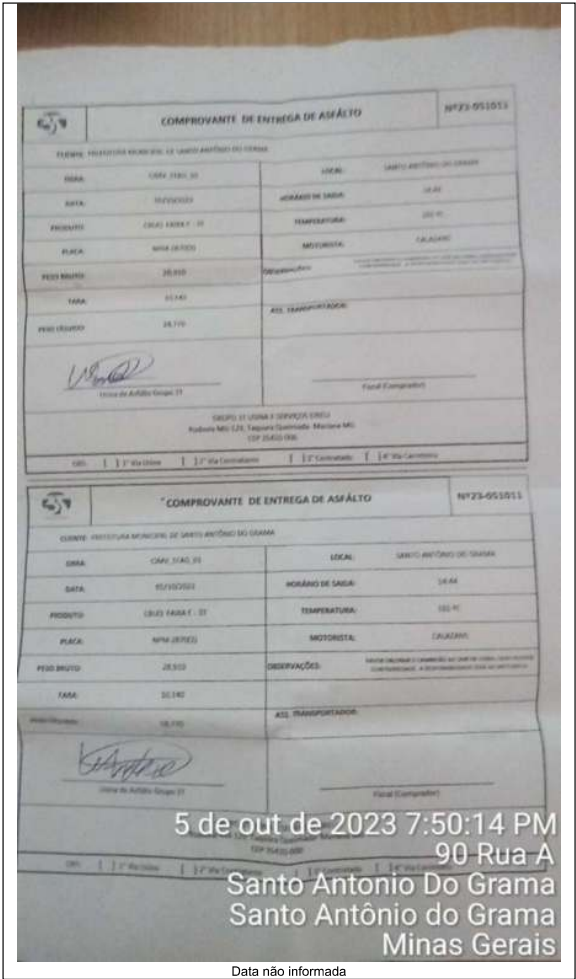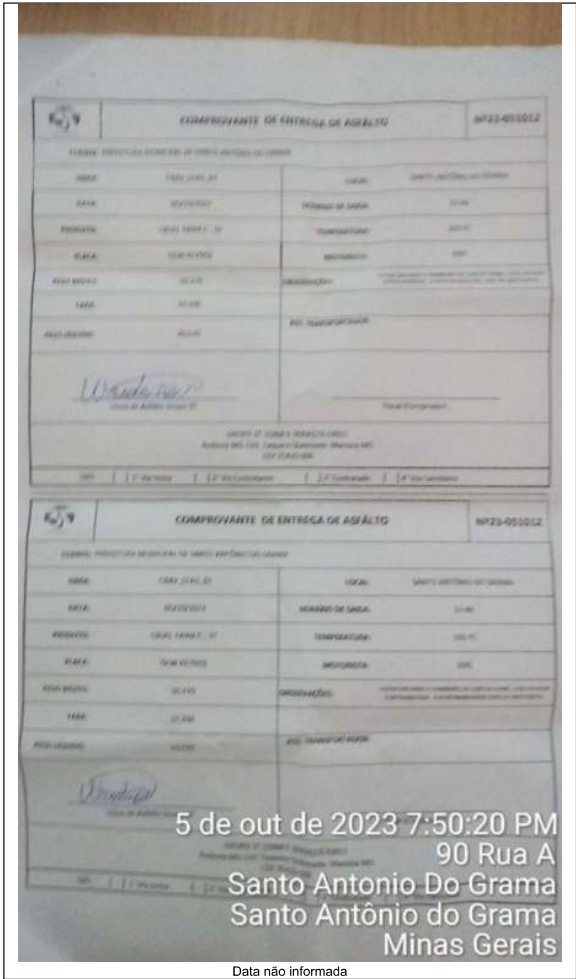






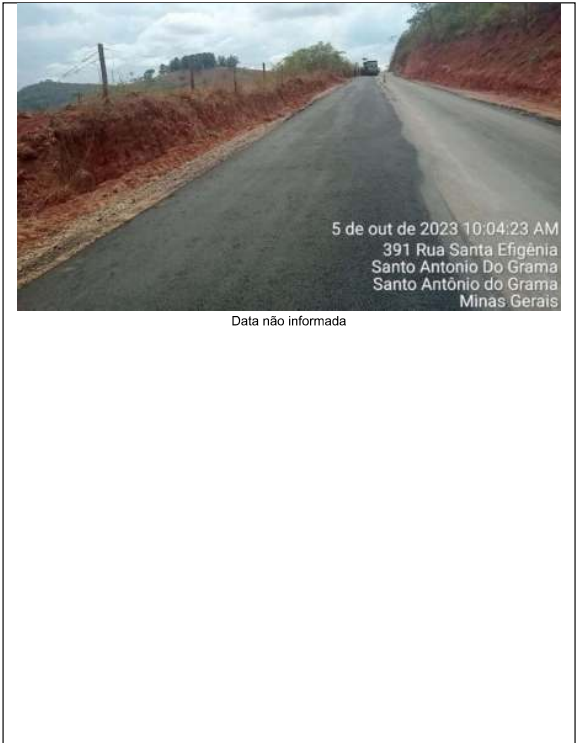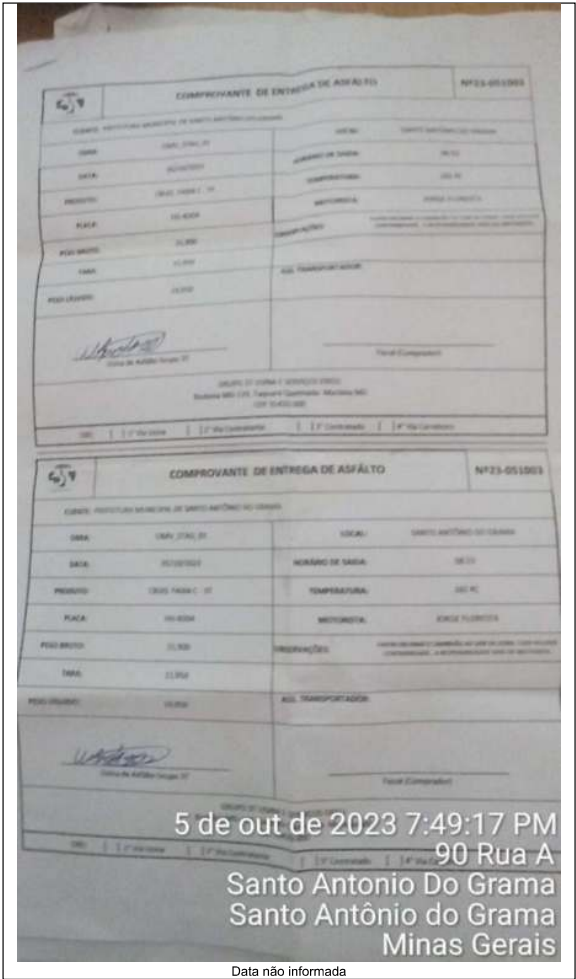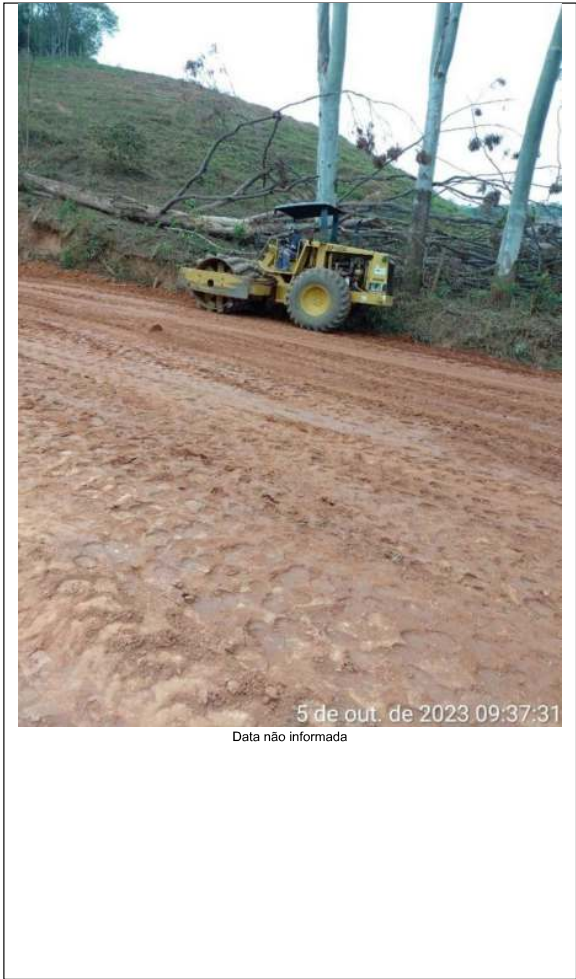

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ASFÁLTO		Nº23-051019
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO GRAMA		
OBRA: C/MAV. STAD. 01	LOCAL: SANTO ANTONIO DO GRAMA	
DATA: 05/10/2023	HORARIO DE SADA: 14:00	
PRODUTO: CRUZ FALSA C - 3T	TEMPERATURA: 240 °C	
PLACA: KKK (A332)	MOTORISTA: ANDRE FERREIRA	
PESO BRUTO: 25.000	OBSERVAÇÕES:	
TARA: 5.540	ASS. TRANSPORTADOR:	
PESO LÍQUIDO: 19.460		
GRUPO DE USUÁRIOS E SERVIÇOS: 00001 Rua 90 A, 90 Santo Antonio Do Grama Santo Antônio do Grama Minas Gerais		

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ASFÁLTO		Nº23-051019
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO GRAMA		
OBRA: C/MAV. STAD. 01	LOCAL: SANTO ANTONIO DO GRAMA	
DATA: 05/10/2023	HORARIO DE SADA: 14:00	
PRODUTO: CRUZ FALSA C - 3T	TEMPERATURA: 240 °C	
PLACA: KKK (A332)	MOTORISTA: ANDRE FERREIRA	
PESO BRUTO: 25.000	OBSERVAÇÕES:	
TARA: 5.540	ASS. TRANSPORTADOR:	
PESO LÍQUIDO: 19.460		
GRUPO DE USUÁRIOS E SERVIÇOS: 00001 Rua 90 A, 90 Santo Antonio Do Grama Santo Antônio do Grama Minas Gerais		

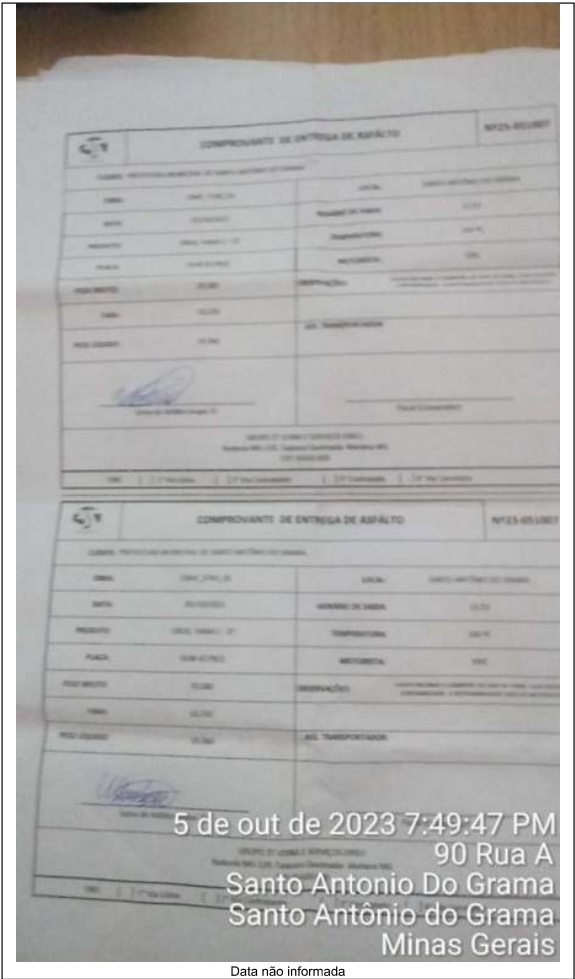

OCORRÊNCIAS			
NÚMERO DE OC	TIPO DE OCORRÊNCIA	DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA	
OBSERVAÇÕES			
EQUIPE E04 E E05 05/10/2023			
CONFERÊNCIA			
MUNICÍPIO	CONSÓRCIO (Aprovado em 09/10/2023 - 08:57)		
Obs.:	Obs.: *Drenos: Construção descida de agua na Est. 1 + 5 e dissipador na ala do bueiro nº03, *Topografia: Locação de estacas no aterro nas Est. 278 a Est. 293 e locação, Nivelamento nas Est. 169 a Est. 200 para lançamento de BGS. *Cerca: Executando nas Est. 329 a Est. 333 lado direito. *Asfalto: Capa lado esquerdo Est. 63 até Est. 95. *Terraplenagem: Lançamento de cascalho da Est. 205 a Est. 209 e aterro nas Est. 278 a Est. 293. *FOTOS DOS TICKETES DE ASFALTO ILEGÍVEIS, FAVOR APRESENTAR EM DOCUMENTOS COMPLEMENTARES NOVAMENTE OS MESMOS.		
ASSINATURAS			
Luiz Henrique da Silva Borges Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 208579/D		PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA CREA 137.103/D	
		Luciano Xavier de Castro RT de Execução - CONSÓRCIO 3T –SOLOCAP-CONEPP CREA 59784/D	



CIMVALPI
CONSORCIO INTERMUNICIPAL
MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº 0104	OBRA: CTP 229/2023 - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	CONTRATO:	RESP. TÉCNICO: LUCIANO XAVIER
ENDEREÇO: ESTRADA DE ACESSO ENTRE SANTO ANTÔNIO DO GRAMA E ABRE CAMPO		INÍCIO: 01/04/2023	Nº CREA-MG: 59784/D
CIDDE:		PRAZO: 01/10/2023	Nº DA ART:
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA		UF:	COORDENADAS:
DATA: 05/10/2023	SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA ☔
MANHÃ	✓		IMPRATICÁVEL ☔
TARDE	✓		
QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
1	AUXILIAR DE ENGENHARIA	1	OPERADOR DE ESPARGIDOR
2	ENCARREGADO DE OBRAS	1	MESISTA
6	OPERADOR	6	MOTORISTA
1	PEDREIRO	1	TOPOGRAFO
5	AJUDANTE	1	GREIDISTA
2	RASTELEIRO		
QTDE	EQUIPAMENTO		
2	ROLO LISO		
2	ESCAVADEIRA		
1	ROLO DE PNEU		
1	VIBROACABADORA		
1	ESPARGIDOR		
3	VEICULO DE APOIO		
1	CAMINHÃO PIPA		
15	CAMINHÃO BASCULANTE		
1	CARRETA BASCULANTE		
1	RETROESCAVADEIRA		
1	MOTONIVELADORA		
1	ROLO COMBINADO (CHAPA/PNEU)		
TAREFAS REALIZADAS			
NÚMERO DE T.R.	DESCRIÇÃO	OBSERVAÇÕES	
1	SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO TOPOGRÁFICO		
2	APLICAÇÃO/COMPACTAÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA		
3	CARGA/TRANSPORTE/ARMAZENAMENTO DE BICA CORRIDA	E207	
4	LIMPEZA DE CAIXA DE EMPRÉSTIMO	E285	
5	EXECUÇÃO DE COMPACTAÇÃO DE BUEIRO	E285	
6	EXECUÇÃO DE ATERRO	E285 A E288	
7	SINALIZAÇÃO		
8	PINTURA DE LIGAÇÃO		
9	UMECTAÇÃO		
REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)			
 4 de out. de 2023 10:30:42 Data não informada		 4 de out de 2023 9:07:57 AM -20°19'1,67592"S -42°36'16,95276"W 258 Rua Capitão Braga Santo Antonio Do Grama Santo Antônio do Grama Minas Gerais Data não informada	



Data não informada



258 Rua Capitão Braga
Santo Antônio Do Grama
Santo Antônio do Grama
Minas Gerais

Data não informada



Data não informada



258 Rua Capitão Braga
Santo Antônio Do Grama
Santo Antônio do Grama
Minas Gerais

Data não informada



258 Rua Capitão Braga
Santo Antônio Do Grama
Santo Antônio do Grama
Minas Gerais


Data não informada



258 Rua Capitão Braga
Santo Antônio Do Grama
Santo Antônio do Grama
Minas Gerais

Data não informada



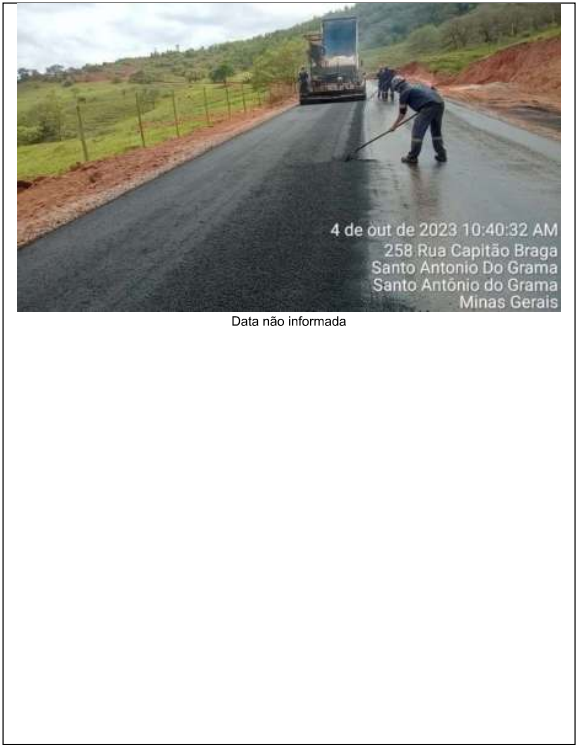

OCORRÊNCIAS		
NÚMERO DE OC	TIPO DE OCORRÊNCIA	DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA
OBSERVAÇÕES		
EQUIPE E04 E E05 04/10/2023 A EQUIPE DA CEMIG EXECUTOU A REMOÇÃO DE POSTES NA REGIÃO ENTRE ESTACAS E278 A E279		
CONFERÊNCIA		
MUNICÍPIO		
CONSÓRCIO (Aprovado em 06/10/2023 - 13:43)		
Obs.: "Drenagem: Continuação das canteletas nas Est. 111 até Est. 115 e continuação do dissipador nas Est. 01+5. "Cerca: Em execução Est. 329 até Est. 330 (lado esquerdo). "Topografia: Locação do bueiro Est. 285 e locação de aterro da EST. 286 A e ST. 292. Nivelamento para rebaixo do greide, da Est. 296 a Est. 306. "Asfalto: Capa lado esquerdo Est. 49 a Est. 62. "Terraplenagem: Limpeza na caixa de empréstimo. Aterro na Est. 286 até Est. 293. Corte de rebaixo nas Est. 296 a Est. 306. Desvio nas Est. 212 para instalação de aduelas.		
ASSINATURAS		
Luiz Henrique da Silva Borges Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 208579/D PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA CREA 137.103/D Luciano Xavier de Castro RT de Execução - CONSÓRCIO 3T-SOLOCAP-CONEPP CREA 59784/D		








CIMVALPI
CONSORCIO INTERMUNICIPAL
MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº 0103	OBRA: CTP 229/2023 - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	CONTRATO:	RESP. TÉCNICO: LUCIANO XAVIER
ENDEREÇO: ESTRADA DE ACESSO ENTRE SANTO ANTÔNIO DO GRAMA E ABRE CAMPO		INÍCIO: 01/04/2023	Nº CREA-MG: 59784/D
CIDDE:		PRAZO: 01/10/2023	Nº DA ART:
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA		UF:	COORDENADAS:
DATA: 04/10/2023	SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA ☔
MANHÃ	✓		IMPRATICÁVEL ☔
TARDE	✓		
QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
1	AUXILIAR DE ENGENHARIA	1	OPERADOR DE ESPARGIDOR
2	ENCARREGADO DE OBRAS	1	MESISTA
6	OPERADOR	6	MOTORISTA
1	PEDREIRO	1	TOPOGRAFO
5	AJUDANTE	1	GREIDISTA
2	RASTELEIRO		
QTDE	EQUIPAMENTO		
2	ROLO LISO		
2	ESCAVADEIRA		
1	ROLO DE PNEU		
1	VIBROACABADORA		
1	ESPARGIDOR		
3	VEICULO DE APOIO		
1	CAMINHÃO PIPA		
13	CAMINHÃO BASCULANTE		
1	CARRETA BASCULANTE		
1	RETROESCAVADEIRA		
1	MOTONIVELADORA		
1	ROLO COMBINADO (CHAPA/PNEU)		
TAREFAS REALIZADAS			
NÚMERO DE T.R.	DESCRIÇÃO	OBSERVAÇÕES	
1	EXECUÇÃO DE LIMPEZA E DESVIO	PREPARAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE ADUELAS	
2	EXECUÇÃO DE ATERRO	E285 A E288	
3	CARGA/TRANSPORTE/ARMAZENAMENTO DE BICA CORRIDA	E207	
4	APLICAÇÃO/COMPACTAÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA		
5	EXECUÇÃO DE RETALUDAMENTO	E296 A E300	
6	UMECTAÇÃO		
7	SINALIZAÇÃO		
8	EXECUÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE BUEIRO	E200	
9	SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO TOPOGRÁFICO		
10	PINTURA DE LIGAÇÃO		
REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATORIOS)			
 3 de out. de 2023 15:08:39 Data não informada		 3 de out. de 2023 15:09:01 Data não informada	



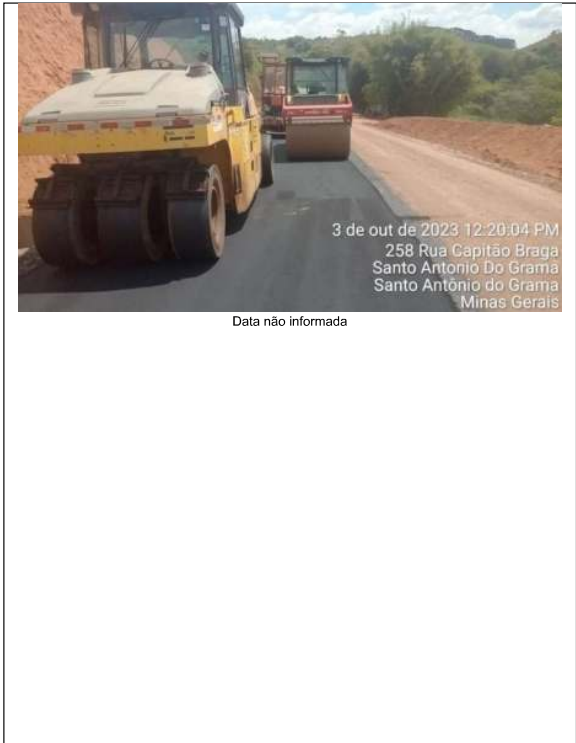

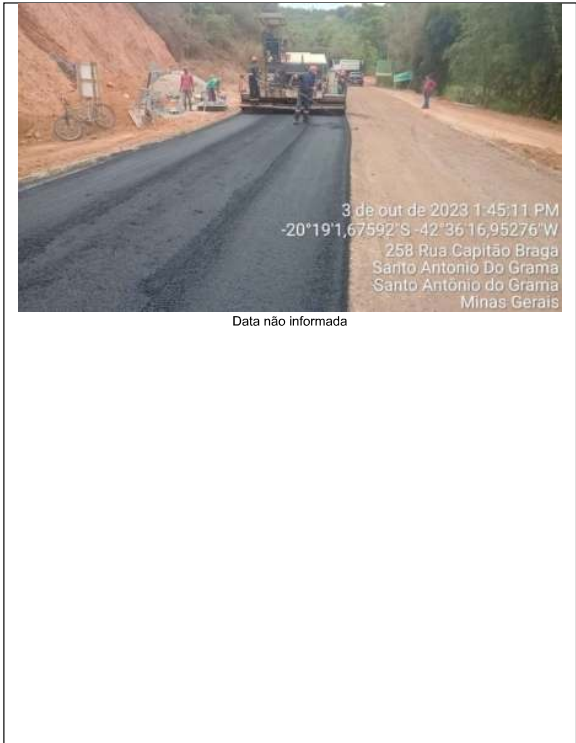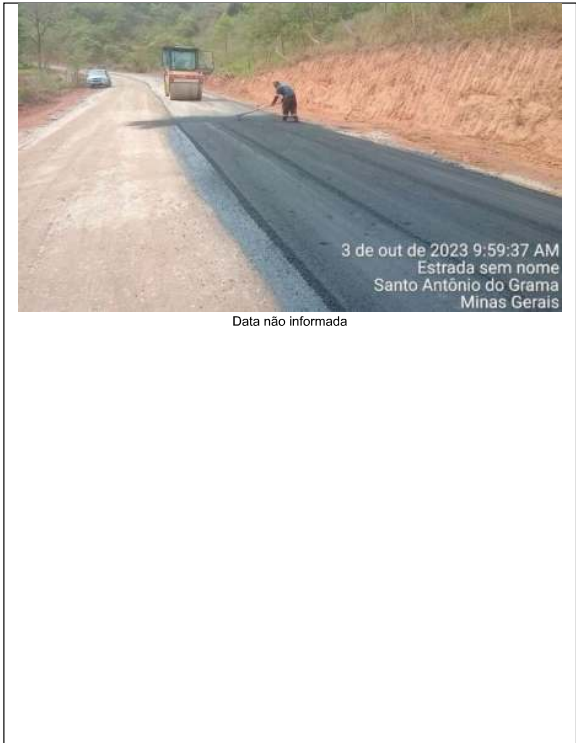



Data não informada



Data não informada


NÚMERO DE OC		TIPO DE OCORRÊNCIA	OCORRÊNCIAS	DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA
EQUIPE E04 E 05 03/10/2023			OBSERVAÇÕES	
MUNICÍPIO			CONFERÊNCIA	
Obs.:			CONSORCIO (Aprovado em 05/10/2023 - 08:40)	
			Obs.: *Drenagem: Decida de agua na Est. 1+5. Construção de canteleta da Est. 111 até Est. 115. *Cerca: Sendo executada da Est. 69 até Est. 73. *Asfalto: Capa da Est. 0 a Est. 09 e da Est.0 até Est. 18 (lado esquerdo).	
			*Terraplenagem: Retaludamento da Est. 296 até Est. 305. Transporte de BGS para deposito. Aterro nas Est. 281 a Est. 290.	
			ASSINATURAS	
Luiz Henrique da Silva Borges Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 208579/D		PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA CREA 137.103/D	Luciano Xavier de Castro RT de Execução - CONSÓRCIO 3T-SOLOCAP-CONEP CREA 59784/D	





CIMVALPI
CONSORCIO INTERMUNICIPAL
MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

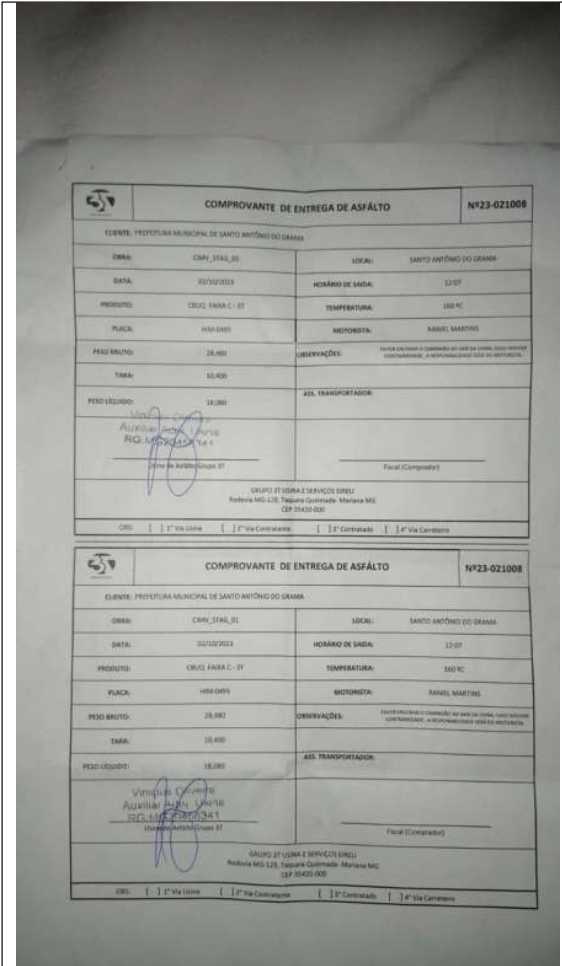Nº 0102		OBRA: CTP 229/2023 - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA		CONTRATO:		RESP. TÉCNICO: LUCIANO XAVIER	
ENDEREÇO: ESTRADA DE ACESSO ENTRE SANTO ANTÔNIO DO GRAMA E ABRE CAMPO		INÍCIO: 01/04/2023		Nº CREA-MG: 59784/D			
CIDDE:		PRAZO: 01/10/2023		Nº DA ART:			
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA		UF:		COORDENADAS:			
DATA: 03/10/2023		SOL ☀		NUBLADO ☁		CHUVA ☔	
MANHÃ		✓				IMPRATICÁVEL ☔	
TARDE		✓					
QTDE		MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO		QTDE		MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	
1	AUXILIAR DE ENGENHARIA		1	OPERADOR DE ESPARGIDOR			
2	ENCARREGADO DE OBRAS		1	MESISTA			
6	OPERADOR		6	MOTORISTA			
1	PEDREIRO		1	TOPOGRAFO			
5	AJUDANTE		1	GREIDISTA			
2	RASTELEIRO						
QTDE		EQUIPAMENTO					
2	ROLO LISO						
2	ESCAVADEIRA						
1	ROLO DE PNEU						
1	VIBROACABADORA						
1	ESPARGIDOR						
3	VEICULO DE APOIO						
1	CAMINHÃO PIPA						
7	CAMINHÃO BASCULANTE						
1	CARRETA BASCULANTE						
1	RETROESCAVADEIRA						
1	MOTONIVELADORA						
1	ROLO COMBINADO (CHAPA/PNEU)						
		TAREFAS REALIZADAS					
NÚMERO DE T.R.	DESCRIÇÃO		OBSERVAÇÕES				
1	EXECUÇÃO DE CORTE E DESVIO		PREPARAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE ADUELAS: E210				
2	SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO TOPOGRÁFICO						
3	LANÇAMENTO DE BICA CORRIDA		E174 A E181; E0 A E08				
4	SINALIZAÇÃO						
5	PINTURA DE LIGAÇÃO						
6	EXECUÇÃO DE COLCHÃO DERENANTE		E283 A E285				
7	APLICAÇÃO/COMPACTAÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA						
8	UMECTAÇÃO						
REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATORIOS)							
 2 de out. de 2023 16:09:19 Data não informada				 Data não informada			



COMPROVANTE DE ENTREGA DE ASFÁLTO		Nº23-021003
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO GRAMA		
OBRA: CRUZ, STAG, 05	LOCAL: SANTO ANTONIO DO GRAMA	
DATA: 02/10/2023	HORARIO DE SAIDA: 10:28	
PRODUTO: CRUZ, FAKA C - 3T	TEMPERATURA: 152 °C	
PLACA: 150-2642	MOTORISTA: PEDRO	
PESO BRUTO: 29.340	OBSERVAÇÕES: FAVOR EXIBIR O CONTRATO AO DAR O VALOR, COMO PROVA DE CUMPRIMENTO, A RESPOSTA DO VALOR DO CONTRATO.	
TARA: 10.400	ASS. TRANSPORTADOR:	
PESO LÍQUIDO: 18.940		
FISCAL (Comprobat):		
GRUPO 3T USINA E SERVIÇOS SIRELI Rodovia MG-129, Fazenda Quatzen - Mariana MG CEP 35420-000		
CBO: 1 3ª Via Usina 1 2ª Via Contrator 1 3ª Contrator 1 4ª Via Carretero		


COMPROVANTE DE ENTREGA DE ASFÁLTO		Nº23-021003
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO GRAMA		
OBRA: CRUZ, STAG, 05	LOCAL: SANTO ANTONIO DO GRAMA	
DATA: 02/10/2023	HORARIO DE SAIDA: 10:28	
PRODUTO: CRUZ, FAKA C - 3T	TEMPERATURA: 152 °C	
PLACA: 150-2642	MOTORISTA: PEDRO	
PESO BRUTO: 29.340	OBSERVAÇÕES: FAVOR EXIBIR O CONTRATO AO DAR O VALOR, COMO PROVA DE CUMPRIMENTO, A RESPOSTA DO VALOR DO CONTRATO.	
TARA: 10.400	ASS. TRANSPORTADOR:	
PESO LÍQUIDO: 18.940		
FISCAL (Comprobat):		
GRUPO 3T USINA E SERVIÇOS SIRELI Rodovia MG-129, Fazenda Quatzen - Mariana MG CEP 35420-000		
CBO: 1 3ª Via Usina 1 2ª Via Contrator 1 3ª Contrator 1 4ª Via Carretero		

Data não informada



COMPROVANTE DE ENTREGA DE ASFÁLTO		Nº23-021002
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO GRAMA		
OBRA: CRMP_2145_01	LOCAL: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA	
DATA: 02/10/2023	HORÁRIO DE SAÍDA: 09:06	
PRODUTO: CBUQ TÁBUA C - 37	TEMPERATURA: 158 MC	
PLACA: 02W-6079	MOTORISTA: ERIC	
PESO BRUTO: 23.180	OBSERVAÇÕES: FORAM ENTREGUES 01 CARROCEIRO AO VAL DO GRAMA, SENDO ENTREGUE 01 CARROCEIRO E 01 CARROCEIRO PARA O MOTORISTA.	
TARA: 03.230		
PESO LÍQUIDO: 19.950	ASS. TRANSPORTADOR:	
Vincício Chaves Assessoria Jurídica RG: 10.000.000-1 União do Grama - 37		Fiscal (Comprobat)
GRUPO 01 URNA E SERVIÇOS ELEI Rua MG-120, Tenda Controlada - Santana MG CEP: 35420-000		
000 : 1 1" Via Urbana 1 2" Via Comemorativa 1 3" Contrato 1 4" Via Comemorativa		

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ASFÁLTO		Nº23-021002
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO GRAMA		
OBRA: CRMP_2145_01	LOCAL: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA	
DATA: 02/10/2023	HORÁRIO DE SAÍDA: 09:06	
PRODUTO: CBUQ TÁBUA C - 37	TEMPERATURA: 158 MC	
PLACA: 02W-6079	MOTORISTA: ERIC	
PESO BRUTO: 23.180	OBSERVAÇÕES: FORAM ENTREGUES 01 CARROCEIRO AO VAL DO GRAMA, SENDO ENTREGUE 01 CARROCEIRO E 01 CARROCEIRO PARA O MOTORISTA.	
TARA: 03.230		
PESO LÍQUIDO: 19.950	ASS. TRANSPORTADOR:	
Vincício Chaves Assessoria Jurídica RG: 10.000.000-1 União do Grama - 37		Fiscal (Comprobat)
GRUPO 01 URNA E SERVIÇOS ELEI Rua MG-120, Tenda Controlada - Santana MG CEP: 35420-000		
000 : 1 1" Via Urbana 1 2" Via Comemorativa 1 3" Contrato 1 4" Via Comemorativa		

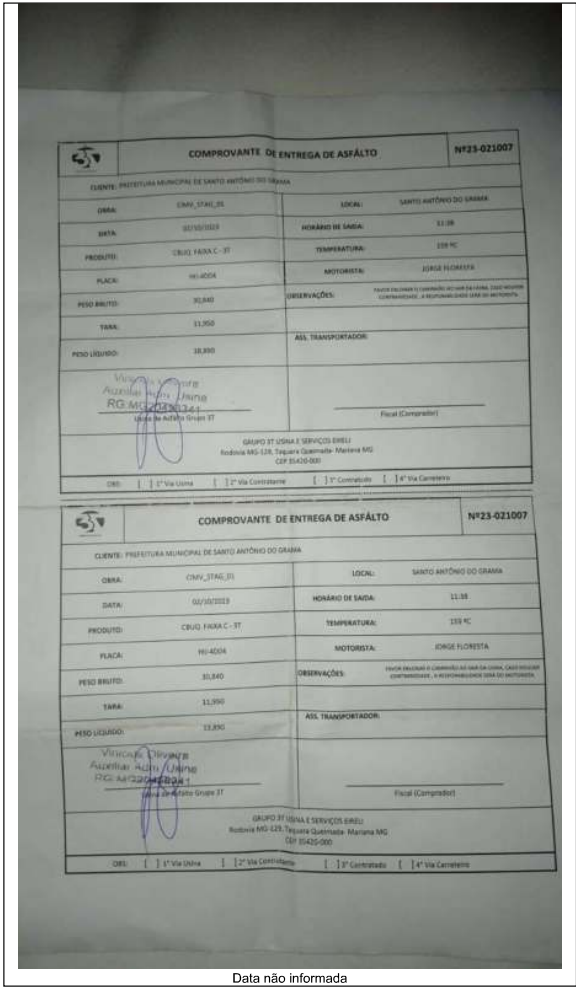

Data não informada



Data não informada



Data não informada



Data não informada






COMPROVANTE DE ENTREGA DE ASFÁLTO		Nº23-021003
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO GRAMA		
OBRA: CIMP_02AS_03	LOCAL: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA	
DATA: 02/10/2023	HORARIO DE SADA: 08:00	
PRODUTO: CBUA PARA C-37	TEMPERATURA: 200 °C	
PLACA: NPM 2870	MOTORISTA: CALADANS	
PESO BRUTO: 25.500	OBSERVAÇÕES: FICOU FALTANDO O COMBUSTÍVEL DO CARRO PARA SER ENVIADO PARA O DESTINO, A RECOMENDANDO PARA OS MOTORISTAS.	
TARA: 10.180	ASS. TRANSPORTADOR:	
PESO LÍQUIDO: 15.320		
VENDEDOR: Vitorino Gomes Auxiliar Administrativo RG: 407025584-1 Vendedor Grupo 37		
Fiscal (Comprobatório)		
GRUPO 37 URNA E SERVIÇOS ELETRIC Rodovia MG-123, Tapera Quadrado Mariana MG CEP 35420-000		
CDS: ☐ 1ª Via Única ☐ 2ª Via Comprobatório ☐ 3ª Comprobatório ☐ 4ª Via Comprobatório		

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ASFÁLTO		Nº23-021001
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO GRAMA		
OBRA: CIMP_02AS_04	LOCAL: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA	
DATA: 02/10/2023	HORARIO DE SADA: 08:25	
PRODUTO: CBUA PARA C-37	TEMPERATURA: 200 °C	
PLACA: NPM 2870	MOTORISTA: CALADANS	
PESO BRUTO: 25.500	OBSERVAÇÕES: FICOU FALTANDO O COMBUSTÍVEL DO CARRO PARA SER ENVIADO PARA O DESTINO, A RECOMENDANDO PARA OS MOTORISTAS.	
TARA: 10.180	ASS. TRANSPORTADOR:	
PESO LÍQUIDO: 15.320		
VENDEDOR: Vitorino Gomes Auxiliar Administrativo RG: 407025584-1 Vendedor Grupo 37		
Fiscal (Comprobatório)		
GRUPO 37 URNA E SERVIÇOS ELETRIC Rodovia MG-123, Tapera Quadrado Mariana MG CEP 35420-000		
CDS: ☐ 1ª Via Única ☐ 2ª Via Comprobatório ☐ 3ª Comprobatório ☐ 4ª Via Comprobatório		

Data não informada



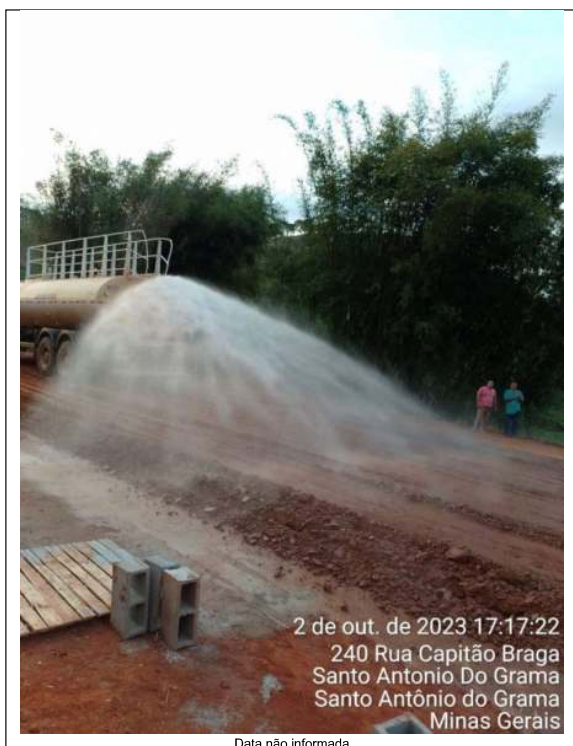

OCORRÊNCIAS		
NÚMERO DE OC	TIPO DE OCORRÊNCIA	DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA
OBSERVAÇÕES		
EQUIPE E04 E E05 02/10/2023		
CONFERÊNCIA		
MUNICÍPIO		
CONSORCIO (Aprovado em 03/10/2023 - 15:22)		
Obs.: "Drenagem descida de água na Est. 01+ 5. Construção de canaletas na Est. 111 a Est. 119. "Topografia: Locação de bueiro Est. 212 e nivelamento de trecho de cascalho da Est. 268 a Est. 278. "Asfalto: Capa da Est. 09 a Est. 021. "Terraplenagem: Lançamento cascalho da Est. 268 a Est. 278. Preparação das áreas das aduelas. Limpeza solo mole e colocação de mataco. Lançamento de BGC da Est. 0 a Est. 06.		
ASSINATURAS		
Luiz Henrique da Silva Borges Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 208579/D	PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA CREA 137.103/D	Luciano Xavier de Castro RT de Execução - CONSÓRCIO 3T-SOLOCAP-CONEP CREA 59784/D





RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº 0101	OBRA: CTP 229/2023 - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	CONTRATO:	RESP. TÉCNICO: LUCIANO XAVIER
ENDEREÇO: ESTRADA DE ACESSO ENTRE SANTO ANTÔNIO DO GRAMA E ABRE CAMPO	INÍCIO: 01/04/2023	Nº CREA-MG: 59784/D	
CIDDE:	PRAZO: 01/10/2023	Nº DA ART:	
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA	UF:	COORDENADAS:	
DATA: 02/10/2023	SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA ☔
MANHÃ	✓		IMPRATICÁVEL ☔
TARDE	✓		
QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
1	AUXILIAR DE ENGENHARIA	1	ENCARREGADO DE OBRAS
3	OPERADOR	3	MOTORISTA
1	PEDREIRO	1	GREIDISTA
QTDE	EQUIPAMENTO		
1	ROLO LISO		
1	ESCAVADEIRA		
2	VEÍCULO DE APOIO		
1	CAMINHÃO PIPA		
2	CAMINHÃO BASCULANTE		
1	MOTONIVELADORA		
	TAREFAS REALIZADAS		
NÚMERO DE T.R.	DESCRIÇÃO	OBSERVAÇÕES	
1	SINALIZAÇÃO		
2	LANÇAMENTO DE BICA CORRIDA	E153 A E174	
3	UMECTAÇÃO		
4	EXECUÇÃO DE COLCHÃO DERENANTE	E283 A E285	

REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)








30 de set. de 2023 08:49:30
Data não informada



30 de set. de 2023 08:01:11
Data não informada

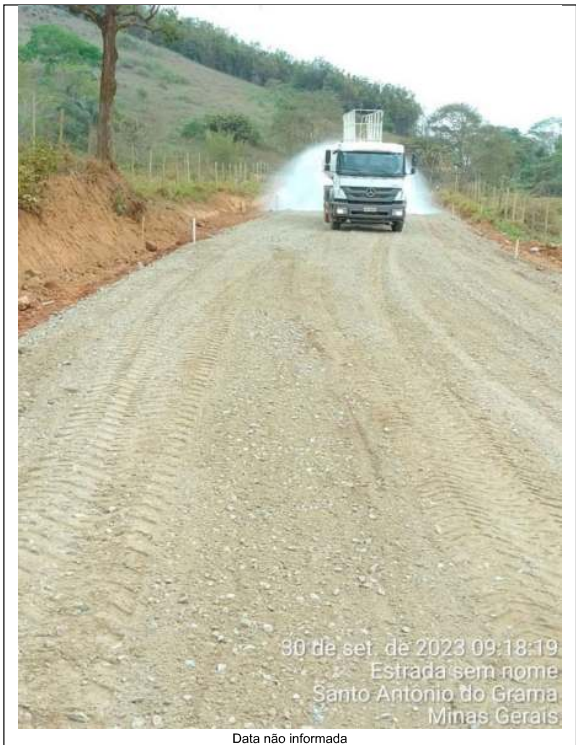

30 de set. de 2023 09:18:19
Estrada sem nome
Santo Antonio do Grama
Minas Gerais
Data não informada

NÚMERO DE OC		OCORRÊNCIAS	
TIPO DE OCORRÊNCIA		OBSERVAÇÕES	DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA
EQUIPE E05 30/09/2023			
CONFERÊNCIA			
MUNICÍPIO		CONSÓRCIO (Aprovado em 03/10/2023 - 14:21)	
Obs.:		Obs.: *Conforme executado em campo.	
ASSINATURAS			
Luiz Henrique da Silva Borges Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 208579/D		PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA CREA 137.103/D	
		Luciano Xavier de Castro RT de Execução - CONSÓRCIO 3T –SOLOCAP-CONEPP CREA 59784/D	





RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº 0100	OBRA: CTP 229/2023 - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA		CONTRATO:		RESP. TÉCNICO: LUCIANO XAVIER	
ENDEREÇO: ESTRADA DE ACESSO ENTRE SANTO ANTÔNIO DO GRAMA E ABRE CAMPO			INÍCIO: 01/04/2023		Nº CREA-MG: 59784/D	
CIDDE:			PRAZO: 01/10/2023		Nº DA ART:	
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA			UF:		COORDENADAS:	
DATA: 02/10/2023			SOL ☀		NUBLADO ☁	
MANHÃ			CHUVA ☔		IMPRATICÁVEL ☔	
TARDE						
QTDE			MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO		QTDE	
1			AUXILIAR DE ENGENHARIA		ENCARREGADO DE OBRAS	
5			OPERADOR		8	
1			PEDREIRO		1	
5			AJUDANTE		1	
QTDE			EQUIPAMENTO			
1			ROLO LISO			
2			ESCAVADEIRA			
1			ROLO DE PNEU			
2			VEÍCULO DE APOIO			
1			CAMINHÃO PIPA			
6			CAMINHÃO BASCULANTE			
1			CARRETA BASCULANTE			
1			RETROESCAVADEIRA			
1			MOTONIVELADORA			
TAREFAS REALIZADAS						
NÚMERO DE T.R.		DESCRIÇÃO		OBSERVAÇÕES		
1		CARGA/TRANSPORTE/ARMAZENAMENTO DE MATERIAL		BICA CORRIDA: 207 A E208		
2		SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO TOPOGRÁFICO				
3		LANÇAMENTO DE BICA CORRIDA		E20 A E153		
4		SINALIZAÇÃO				
5		UMECTAÇÃO				
6		EXECUÇÃO DE COLCHÃO DRENANTE		E283 A E285		
REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATORIOS)						







NÚMERO DE OC		TIPO DE OCORRÊNCIA	OCORRÊNCIAS	DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA
EQUIPE E05 29/09/2023			OBSERVAÇÕES	
MUNICÍPIO			CONFERÊNCIA	
Obs.:			CONSÓRCIO (Aprovado em 03/10/2023 - 08:54)	
			Obs.: *Drenagem: Construção de muro rip rap. Valetas de proteção da Est. 030 a Est. 039. *Topografia: Acompanhamento de locação de estacas para lançamento de BGS. *Terraplenagem: Lançamento de BGS da Est. 130 até Est. 161. *Transporte de mato da pedreira para Est. 283 a Est. 288. Enrocamento nos bueiros Est. 15+10 e Est. 179.	
			ASSINATURAS	
Luiz Henrique da Silva Borges Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 208579/D		PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA CREA 137.103/D		Luciano Xavier de Castro RT de Execução - CONSÓRCIO 3T-SOLOCAP-CONEP CREA 59784/D





RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº 0099	OBRA: CTP 229/2023 - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	CONTRATO:		RESP. TÉCNICO: LUCIANO XAVIER
ENDEREÇO: ESTRADA DE ACESSO ENTRE SANTO ANTÔNIO DO GRAMA E ABRE CAMPO		INÍCIO: 01/04/2023		Nº CREA-MG: 59784/D
CIDDE:		PRAZO: 01/10/2023		Nº DA ART:
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA		UF:		COORDENADAS:
DATA: 29/09/2023	SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA 🌧	IMPRATICÁVEL 🌫
MANHÃ	✓			
TARDE	✓			
QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	
1	AUXILIAR DE ENGENHARIA	1	OPERADOR DE ESPARGIDOR	
2	ENCARREGADO DE OBRAS	1	MESISTA	
6	OPERADOR	9	MOTORISTA	
1	PEDREIRO	1	TOPOGRAFO	
5	AJUDANTE	1	GREIDISTA	
2	RASTELEIRO			
QTDE	EQUIPAMENTO			
2	ROLO LISO			
2	ESCAVADEIRA			
1	ROLO DE PNEU			
1	VIBROACABADORA			
1	ESPARGIDOR			
3	VEÍCULO DE APOIO			
1	CAMINHÃO PIPA			
10	CAMINHÃO BASCULANTE			
1	CARRETA BASCULANTE			
1	RETROESCAVADEIRA			
1	MOTONIVELADORA			
1	ROLO COMBINADO (CHAPA/PNEU)			
TAREFAS REALIZADAS				
NÚMERO DE T.R.	DESCRIÇÃO	OBSERVAÇÕES		
1	CARGA/TRANSPORTE/ARMAZENAMENTO DE MATERIAL	CASCALHO E334; BICA CORRIDA E207 A E208		
2	SINALIZAÇÃO			
3	EXECUÇÃO DE ENROCAMENTO DE BUEIRO	E178		
4	SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO TOPOGRÁFICO			
5	REGULARIZAÇÃO/COMPACTAÇÃO DE SUB-BASE	E186 A E204		
6	APLICAÇÃO/COMPACTAÇÃO DE MASSA ASFALTICA			
7	PINTURA DE LIGAÇÃO			
8	UMECTAÇÃO			
REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATORIOS)				

REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATORIOS)

[illegible]

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ASFÁLTO		Nº23-280902
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO GRAMA		
ORDEM: CMF_2140_01	LOCAL: SANTO ANTONIO DO GRAMA	
DATA: 28/09/2023	HORARIO DE SAIDA: 08:00	
PRODUTO: CBUQ FRAIA C-3T	TEMPERATURA: 33º C	
PLACA: 0104 2070	METROLOGIA: CALADRE	
PESO BRUTO: 30.700	OBSERVAÇÕES: Pesos aferidos e aferidos no dia de entrega, sem alteração de peso. A diferença entre os pesos é de 0,000 kg.	
TARA: 00.000	ASS. TRANSPORTADOR:	
PESO LÍQUIDO: 30.700		
 Vendedor: <u>RICARDO M. L. LIMA</u> Ass. Com. V. M. L. LIMA RG M. L. LIMA 141		
Linha de Entrega: 01		Ass. Comprador:
Grupo 1º Grupo e 2º Grupo (peso) Ponderação M2 125, Ponderação Quadrado Metros M2 (COP 00000000)		
0000	1º ou 2º ou 3º ou 4º ou 5º ou 6º ou 7º ou 8º ou 9º ou 10º ou 11º ou 12º ou 13º ou 14º ou 15º ou 16º ou 17º ou 18º ou 19º ou 20º ou 21º ou 22º ou 23º ou 24º ou 25º ou 26º ou 27º ou 28º ou 29º ou 30º ou 31º ou 32º ou 33º ou 34º ou 35º ou 36º ou 37º ou 38º ou 39º ou 40º ou 41º ou 42º ou 43º ou 44º ou 45º ou 46º ou 47º ou 48º ou 49º ou 50º ou 51º ou 52º ou 53º ou 54º ou 55º ou 56º ou 57º ou 58º ou 59º ou 60º ou 61º ou 62º ou 63º ou 64º ou 65º ou 66º ou 67º ou 68º ou 69º ou 70º ou 71º ou 72º ou 73º ou 74º ou 75º ou 76º ou 77º ou 78º ou 79º ou 80º ou 81º ou 82º ou 83º ou 84º ou 85º ou 86º ou 87º ou 88º ou 89º ou 90º ou 91º ou 92º ou 93º ou 94º ou 95º ou 96º ou 97º ou 98º ou 99º ou 100º ou 101º ou 102º ou 103º ou 104º ou 105º ou 106º ou 107º ou 108º ou 109º ou 110º ou 111º ou 112º ou 113º ou 114º ou 115º ou 116º ou 117º ou 118º ou 119º ou 120º ou 121º ou 122º ou 123º ou 124º ou 125º ou 126º ou 127º ou 128º ou 129º ou 130º ou 131º ou 132º ou 133º ou 134º ou 135º ou 136º ou 137º ou 138º ou 139º ou 140º ou 141º ou 142º ou 143º ou 144º ou 145º ou 146º ou 147º ou 148º ou 149º ou 150º ou 151º ou 152º ou 153º ou 154º ou 155º ou 156º ou 157º ou 158º ou 159º ou 160º ou 161º ou 162º ou 163º ou 164º ou 165º ou 166º ou 167º ou 168º ou 169º ou 170º ou 171º ou 172º ou 173º ou 174º ou 175º ou 176º ou 177º ou 178º ou 179º ou 180º ou 181º ou 182º ou 183º ou 184º ou 185º ou 186º ou 187º ou 188º ou 189º ou 190º ou 191º ou 192º ou 193º ou 194º ou 195º ou 196º ou 197º ou 198º ou 199º ou 200º ou 201º ou 202º ou 203º ou 204º ou 205º ou 206º ou 207º ou 208º ou 209º ou 210º ou 211º ou 212º ou 213º ou 214º ou 215º ou 216º ou 217º ou 218º ou 219º ou 220º ou 221º ou 222º ou 223º ou 224º ou 225º ou 226º ou 227º ou 228º ou 229º ou 230º ou 231º ou 232º ou 233º ou 234º ou 235º ou 236º ou 237º ou 238º ou 239º ou 240º ou 241º ou 242º ou 243º ou 244º ou 245º ou 246º ou 247º ou 248º ou 249º ou 250º ou 251º ou 252º ou 253º ou 254º ou 255º ou 256º ou 257º ou 258º ou 259º ou 260º ou 261º ou 262º ou 263º ou 264º ou 265º ou 266º ou 267º ou 268º ou 269º ou 270º ou 271º ou 272º ou 273º ou 274º ou 275º ou 276º ou 277º ou 278º ou 279º ou 280º ou 281º ou 282º ou 283º ou 284º ou 285º ou 286º ou 287º ou 288º ou 289º ou 290º ou 291º ou 292º ou 293º ou 294º ou 295º ou 296º ou 297º ou 298º ou 299º ou 300º ou 301º ou 302º ou 303º ou 304º ou 305º ou 306º ou 307º ou 308º ou 309º ou 310º ou 311º ou 312º ou 313º ou 314º ou 315º ou 316º ou 317º ou 318º ou 319º ou 320º ou 321º ou 322º ou 323º ou 324º ou 325º ou 326º ou 327º ou 328º ou 329º ou 330º ou 331º ou 332º ou 333º ou 334º ou 335º ou 336º ou 337º ou 338º ou 339º ou 340º ou 341º ou 342º ou 343º ou 344º ou 345º ou 346º ou 347º ou 348º ou 349º ou 350º ou 351º ou 352º ou 353º ou 354º ou 355º ou 356º ou 357º ou 358º ou 359º ou 360º ou 361º ou 362º ou 363º ou 364º ou 365º ou 366º ou 367º ou 368º ou 369º ou 370º ou 371º ou 372º ou 373º ou 374º ou 375º ou 376º ou 377º ou 378º ou 379º ou 380º ou 381º ou 382º ou 383º ou 384º ou 385º ou 386º ou 387º ou 388º ou 389º ou 390º ou 391º ou 392º ou 393º ou 394º ou 395º ou 396º ou 397º ou 398º ou 399º ou 400º ou 401º ou 402º ou 403º ou 404º ou 405º ou 406º ou 407º ou 408º ou 409º ou 410º ou 411º ou 412º ou 413º ou 414º ou 415º ou 416º ou 417º ou 418º ou 419º ou 420º ou 421º ou 422º ou 423º ou 424º ou 425º ou 426º ou 427º ou 428º ou 429º ou 430º ou 431º ou 432º ou 433º ou 434º ou 435º ou 436º ou 437º ou 438º ou 439º ou 440º ou 441º ou 442º ou 443º ou 444º ou 445º ou 446º ou 447º ou 448º ou 449º ou 450º ou 451º ou 452º ou 453º ou 454º ou 455º ou 456º ou 457º ou 458º ou 459º ou 460º ou 461º ou 462º ou 463º ou 464º ou 465º ou 466º ou 467º ou 468º ou 469º ou 470º ou 471º ou 472º ou 473º ou 474º ou 475º ou 476º ou 477º ou 478º ou 479º ou 480º ou 481º ou 482º ou 483º ou 484º ou 485º ou 486º ou 487º ou 488º ou 489º ou 490º ou 491º ou 492º ou 493º ou 494º ou 495º ou 496º ou 497º ou 498º ou 499º ou 500º ou 501º ou 502º ou 503º ou 504º ou 505º ou 506º ou 507º ou 508º ou 509º ou 510º ou 511º ou 512º ou 513º ou 514º ou 515º ou 516º ou 517º ou 518º ou 519º ou 520º ou 521º ou 522º ou 523º ou 524º ou 525º ou 526º ou 527º ou 528º ou 529º ou 530º ou 531º ou 532º ou 533º ou 534º ou 535º ou 536º ou 537º ou 538º ou 539º ou 540º ou 541º ou 542º ou 543º ou 544º ou 545º ou 546º ou 547º ou 548º ou 549º ou 550º ou 551º ou 552º ou 553º ou 554º ou 555º ou 556º ou 557º ou 558º ou 559º ou 560º ou 561º ou 562º ou 563º ou 564º ou 565º ou 566º ou 567º ou 568º ou 569º ou 570º ou 571º ou 572º ou 573º ou 574º ou 575º ou 576º ou 577º ou 578º ou 579º ou 580º ou 581º ou 582º ou 583º ou 584º ou 585º ou 586º ou 587º ou 588	

COMPANHANTE DE ENTREGA DE ASFALTO

UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO GRAMA

DATA: 28/09/2023

PRODUTO: CRUZO FARA C. 31

PLACA: HD 4004

PESO BRUTO: 31.890

TARA: 31.890

PESO LÍQUIDO: 0,000

ASS. TRANSPORTADORA:

28 de set de 2023 2:23:20 PM

90 Rua A

Santo Antonio Do Grama

Santo Antônio do Grama

Minas Gerais

Data não informada

COMPANHANTE DE ENTREGA DE ASFALTO

UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO GRAMA

DATA: 28/09/2023

PRODUTO: CRUZO FARA C. 31

PLACA: HD 4004

PESO BRUTO: 31.890

TARA: 31.890

PESO LÍQUIDO: 0,000

ASS. TRANSPORTADORA:

28 de set de 2023 2:23:16 PM

90 Rua A




Santo Antonio Do Grama




Santo Antônio do Grama




Minas Gerais



Data não informada




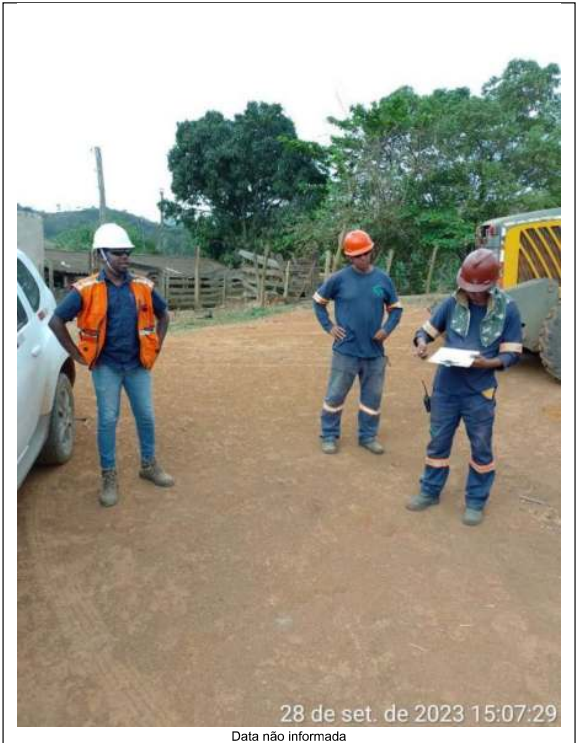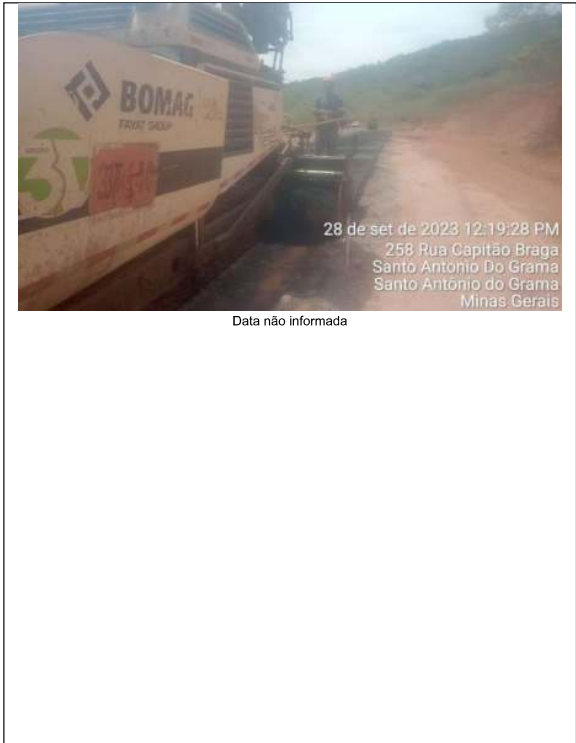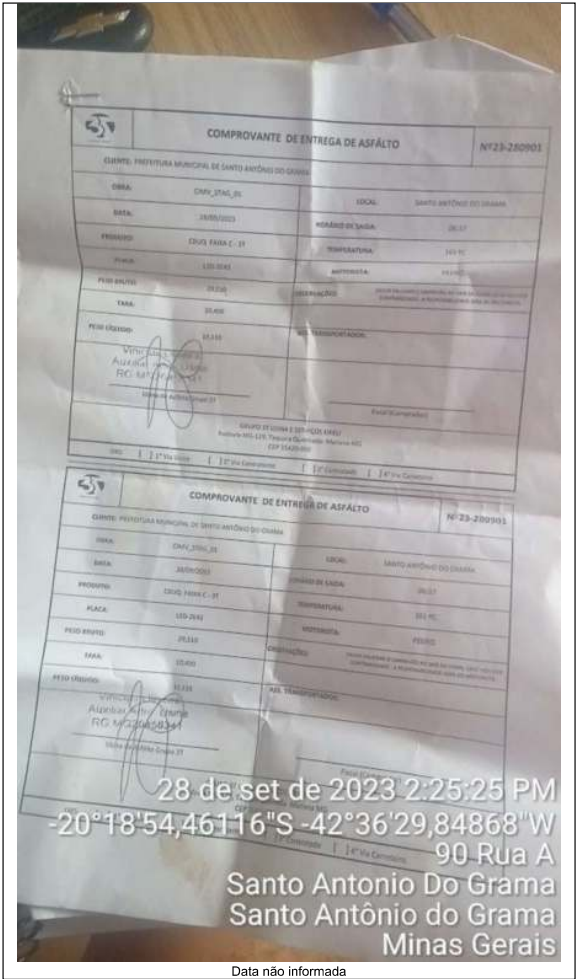

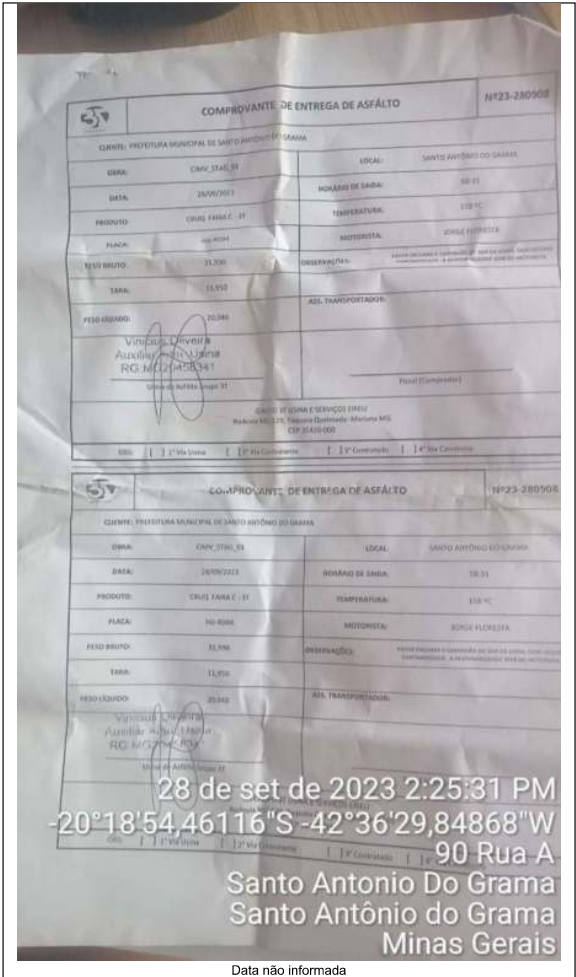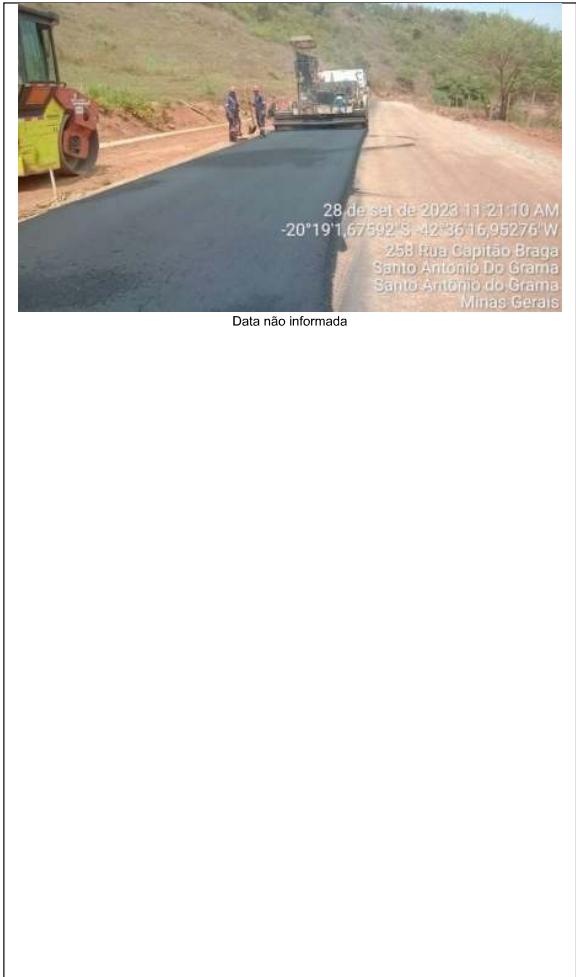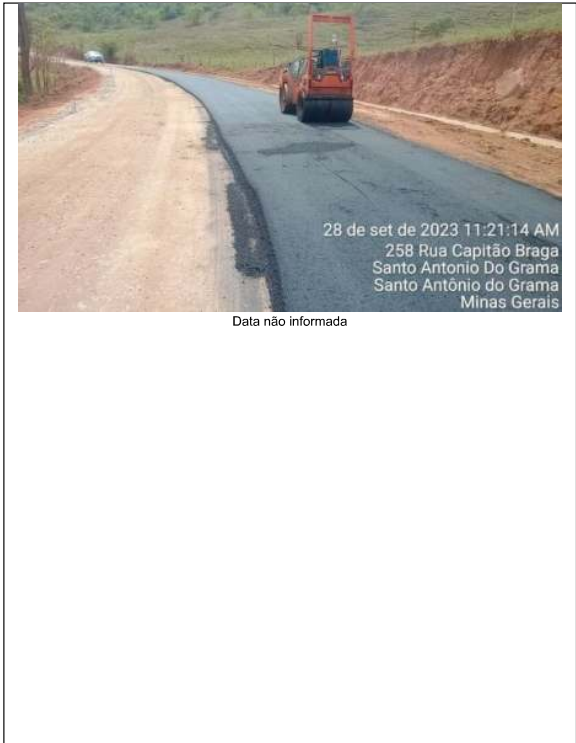

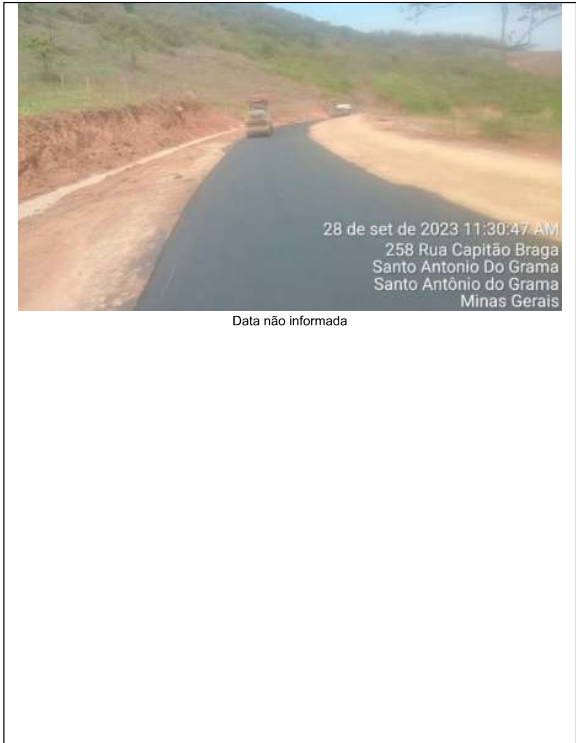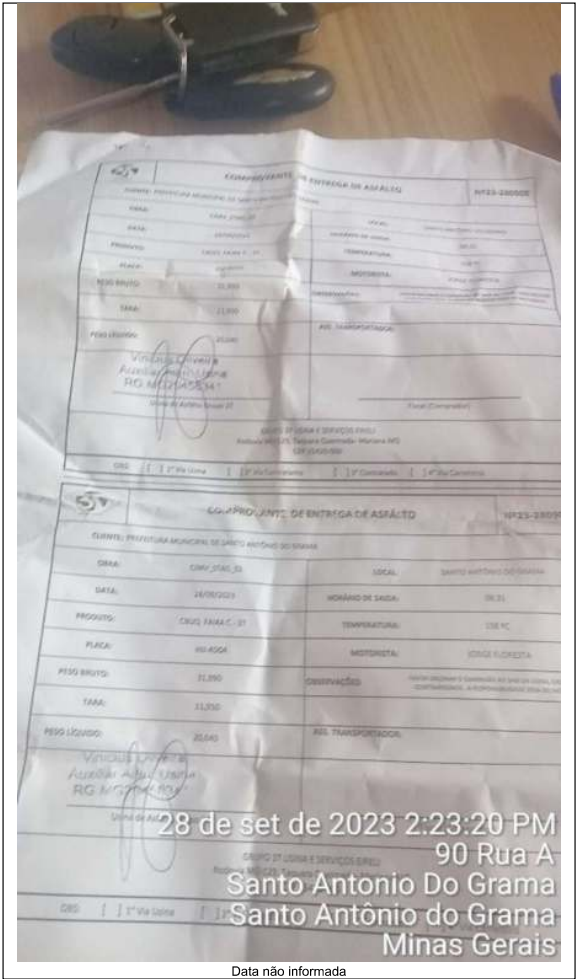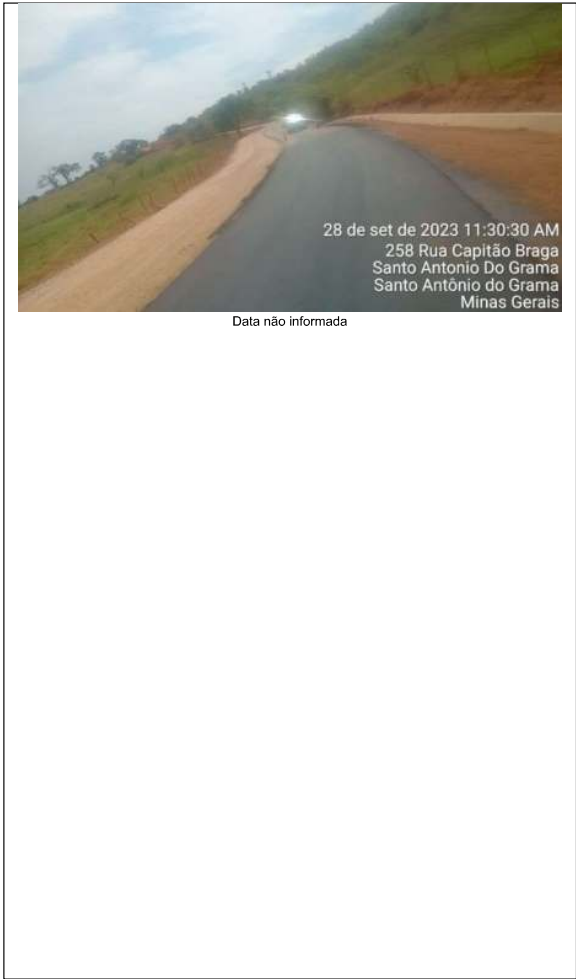

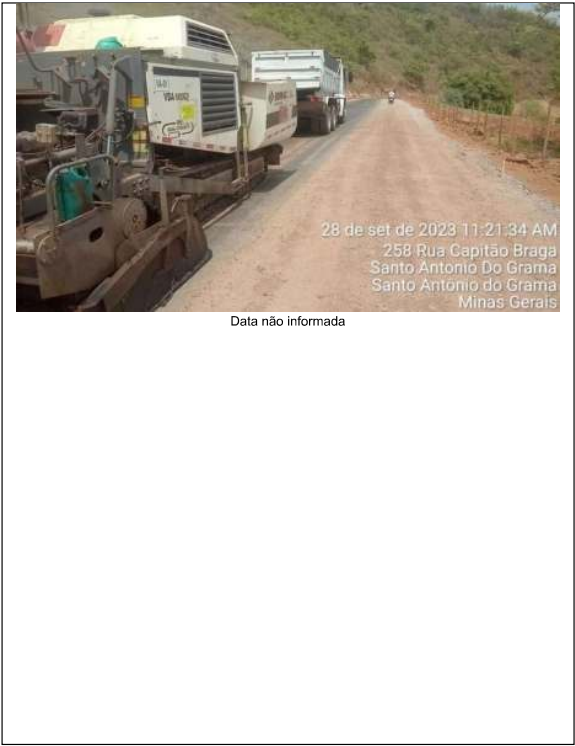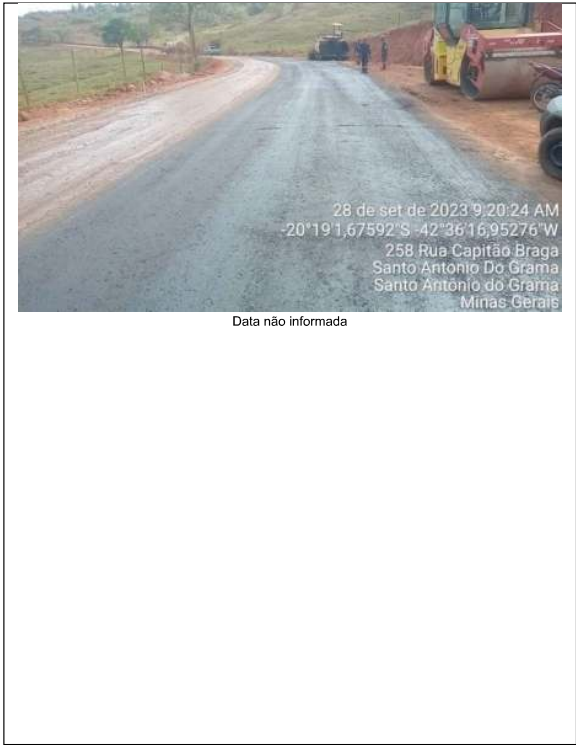

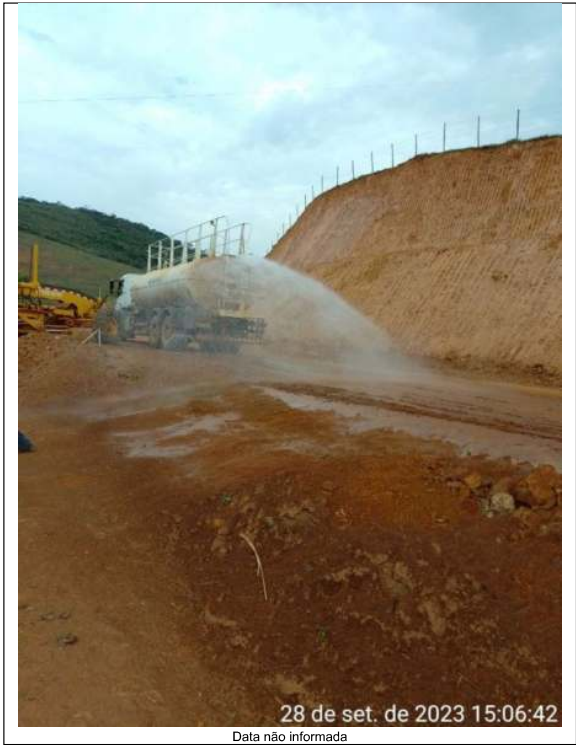

Data não informada

OCORRÊNCIAS	
NÚMERO DE OC	TIPO DE OCORRÊNCIA
EQUIPE E04 E E05 28/09/2023	
OBSERVAÇÕES	
CONFERÊNCIA	
MUNICÍPIO	
CONSORCIO (Aprovado em 03/10/2023 - 14:38)	
Obs.: *Drenagem: Construção muro Rip Rap, Est. 06 e valetas no bueiro Est. 25 a Est. 41. *Topografia: Locação de Est. 181 até Est. 205. *Asfalto: Capa da Est. 21 a Est. 28 lado direito. *Terraplenagem: Enrocamento nos bueiros Est. 181 até Est. 205.	
ASSINATURAS	
Luiz Henrique da Silva Borges Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 208579/D	PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA CREA 137.103/D
Luciano Xavier de Castro RT de Execução - CONSORCIO 3T-SOLOCAP-CONEP CREA 59784/D	





RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº 0098	OBRA: CTP 229/2023 - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	CONTRATO:	RESP. TÉCNICO: LUCIANO XAVIER
ENDEREÇO: ESTRADA DE ACESSO ENTRE SANTO ANTÔNIO DO GRAMA E ABRE CAMPO	INÍCIO: 01/04/2023	Nº CREA-MG: 59784/D	
CIDDE:	PRAZO: 01/10/2023	Nº DA ART:	
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA	UF:	COORDENADAS:	
DATA: 29/09/2023	SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA ☔
MANHÃ	✓		IMPRATICÁVEL ☔
TARDE	✓		
QTDE	MAO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MAO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
1	AUXILIAR DE ENGENHARIA	1	OPERADOR DE ESPARGIDOR
2	ENCARREGADO DE OBRAS	1	MESISTA
6	OPERADOR	9	MOTORISTA
1	PEDREIRO	1	TOPÓGRAFO
5	AJUDANTE	1	GREIDISTA
2	RASTELEIRO		
QTDE	EQUIPAMENTO		
2	ROLO LISO		
2	ESCAVADEIRA		
1	ROLO DE PNEU		
1	VIBROACABADORA		
1	ESPARGIDOR		
3	VEICULO DE APOIO		
1	CAMINHÃO PIPA		
10	CAMINHÃO BASCULANTE		
1	CARRETA BASCULANTE		
1	RETROESCAVADEIRA		
1	MOTONIVELADORA		
1	ROLO COMBINADO (CHAPA/PNEU)		
	TAREFAS REALIZADAS		
NÚMERO DE T.R.	DESCRIÇÃO	OBSERVAÇÕES	
1	EXECUÇÃO DE ENROCAMENTO DE BUEIRO	E178	
2	SINALIZAÇÃO		
3	CARGA/TRANSPORTE/ARMAZENAMENTO DE MATERIAL	CASCALHO: E334; BICA CORRIDA: E207 A E208	
4	REGULARIZAÇÃO/COMPACTAÇÃO DE SUB-BASE	E186 A E204	
5	UMECTAÇÃO		
6	SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO TOPOGRÁFICO		

REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATORIOS)






Data não informada





Data não informada





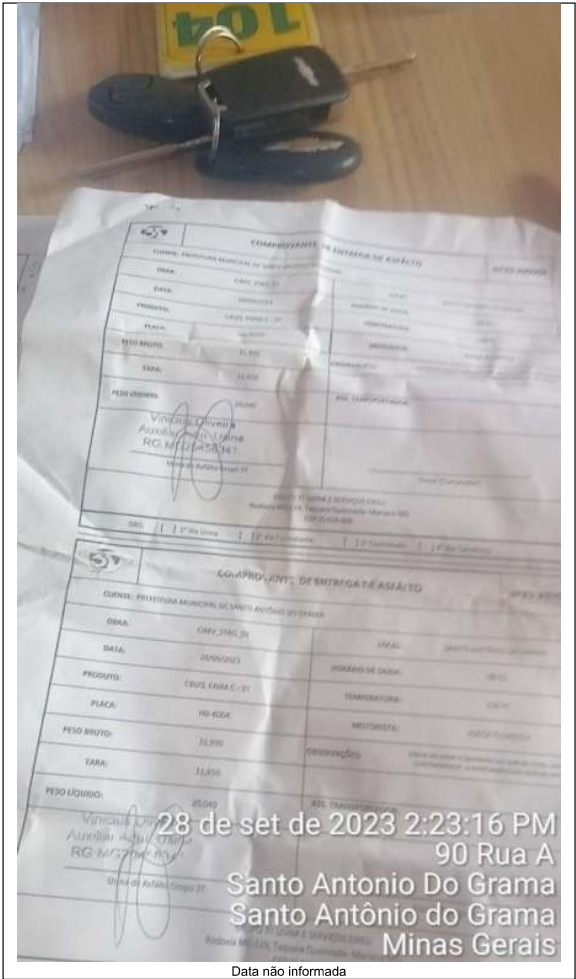

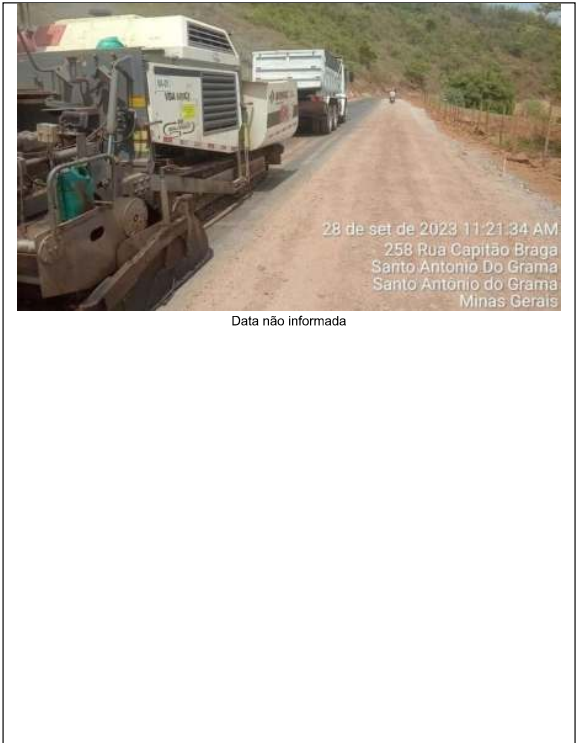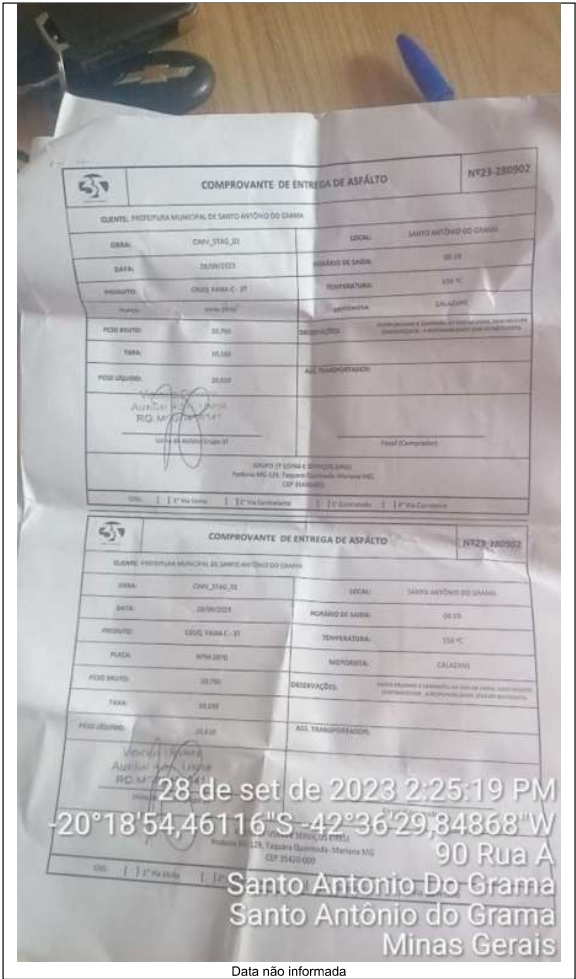

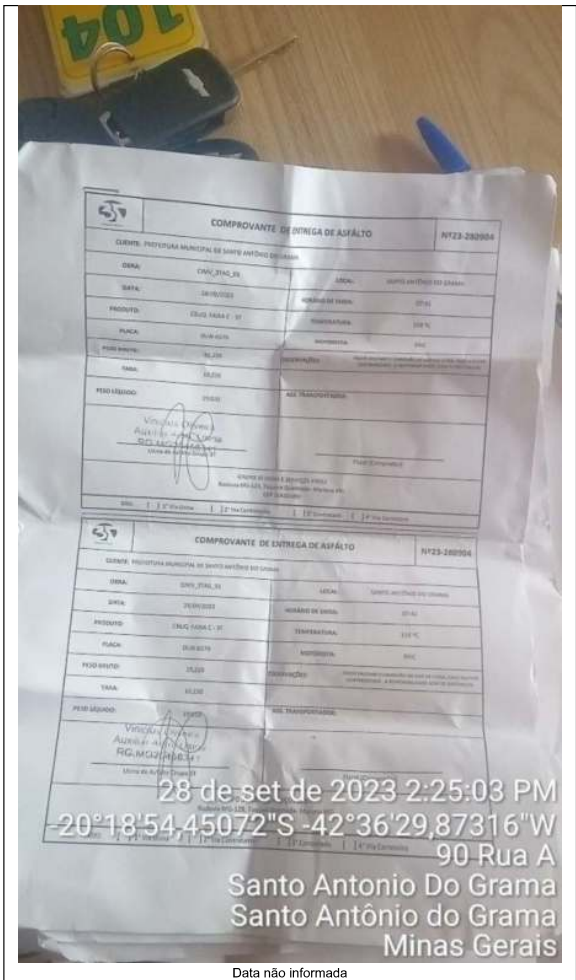

Data não informada

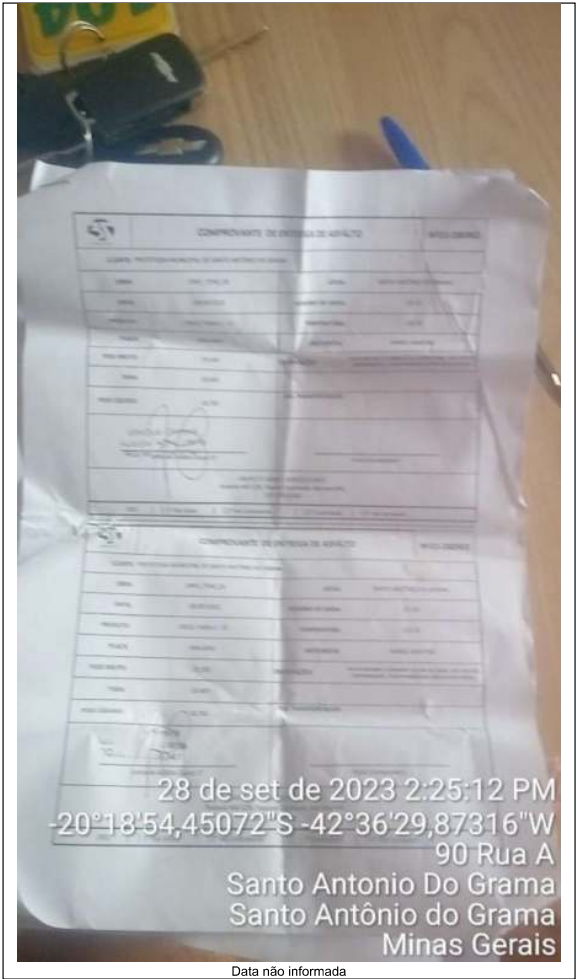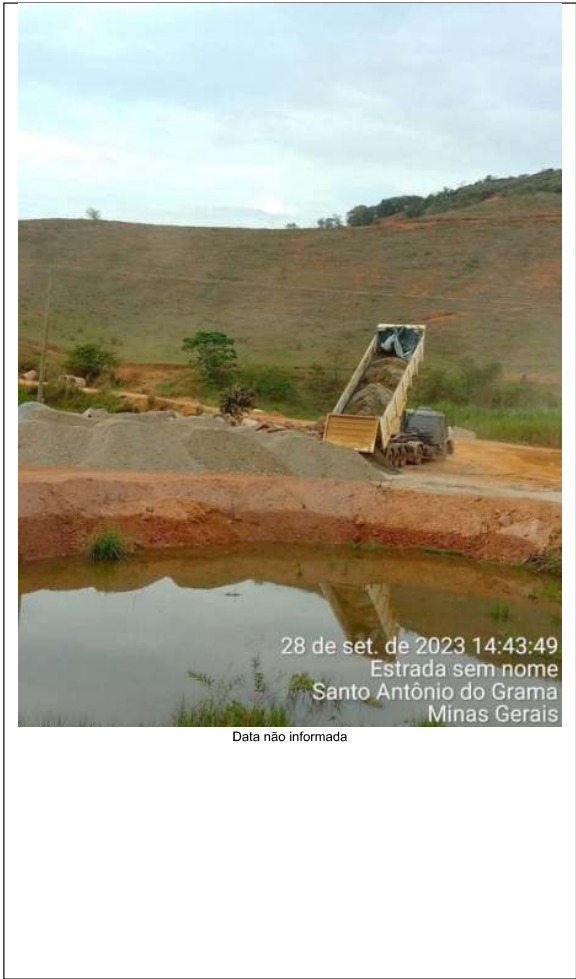



Data não informada



Data não informada

NÚMERO DE OC		TIPO DE OCORRÊNCIA	OCORRÊNCIAS	DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA
EQUIPE E04 E E05 27/09/2023			OBSERVAÇÕES	
			CONFERÊNCIA	
MUNICÍPIO			CONSÓRCIO (Reprovado)	
Obs.:			Obs.: *Ticket ilegíveis, *Data errada	
ASSINATURAS				
Luiz Henrique da Silva Borges Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 208579/D		PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA CREA 137.103/D		Luciano Xavier de Castro RT de Execução - CONSÓRCIO 3T –SOLOCAP-CONEPP CREA 59784/D





RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº 0097		OBRA: CTP 229/2023 - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA		CONTRATO:		RESP. TÉCNICO: LUCIANO XAVIER	
ENDEREÇO: ESTRADA DE ACESSO ENTRE SANTO ANTÔNIO DO GRAMA E ABRE CAMPO				INÍCIO: 01/04/2023		Nº CREA-MG: 59784/D	
CIDDE:				PRAZO: 01/10/2023		Nº DA ART:	
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA				UF:		COORDENADAS:	
DATA: 28/09/2023		SOL ☀		NUBLADO ☁		CHUVA ☔	
MANHÃ		✓					
TARDE		✓					
QTDE		MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO		QTDE		MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	
1		AUXILIAR DE ENGENHARIA		1		OPERADOR DE ESPARGIDOR	
2		ENCARREGADO DE OBRAS		1		MESISTA	
7		OPERADOR		9		MOTORISTA	
2		PEDREIRO		1		TOPOGRAFO	
5		AJUDANTE		1		GREIDISTA	
2		RASTELEIRO					
QTDE				EQUIPAMENTO			
2		ROLO LISO					
2		ESCAVADEIRA					
1		ROLO DE PNEU					
1		VIBROACABADORA					
1		PÁ CARREGADEIRA					
1		ESPARGIDOR					
3		VEÍCULO DE APOIO					
1		CAMINHÃO PIPA					
11		CAMINHÃO BASCULANTE					
1		CARRETA BASCULANTE					
1		RETROESCAVADEIRA					
1		MOTONIVELADORA					
1		ROLO COMBINADO (CHAPA/PNEU)					
TAREFAS REALIZADAS							
NÚMERO DE T.R.		DESCRICAO		OBSERVAÇÕES			
1		APLICAÇÃO/COMPACTAÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA					
2		EXECUÇÃO DE ENROCAMENTO DE BUEIRO		E178			
3		PINTURA DE LIGAÇÃO					
4		SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO TOPOGRÁFICO					
5		UMECTAÇÃO					
6		EXECUÇÃO DE COMPLEMENTO DE ALA DE BUEIRO		E92 LE			
7		CARGA/TRANSPORTE/ARMAZENAMENTO DE MATERIAL		BICA CORRIDA: E207 A E208; CASCALHO: E279 A E280			
8		REGULARIZAÇÃO/COMPACTAÇÃO DE SUB-BASE		E142 A E162; E186 A E198			
9		SINALIZAÇÃO					
REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATORIOS)							



Data não informada










Data não informada





27 de set. de 2023 11:13:54
240 Rua Capitão Braga
Santo Antonio Do Grama
Santo Antônio do Grama
Minas Gerais







Data não informada

NÚMERO DE OC		OCORRÊNCIAS
TIPO DE OCORRÊNCIA	DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA	
OBSERVAÇÕES		
EQUIPE E04 E E05 27/09/2023		
MUNICÍPIO		CONFERÊNCIA
		CONSÓRCIO (Aprovado em 29/09/2023 - 13:37)
Obs.:	Obs.: *Drenos: Fazendo de contenção Rip Rap. Executando valetas na Est. 28 a Est. 30. *Asfalto: Aplicação da Est. 31 até Est. 48. *Topografia: Acompanhamento nas Est. 151 até Est. 181. Lançamento de cascalho. *Terraplenagem: Transporte de material para depósito BGS e cascalho. *Até o presente momento está faltando 01 placa de identificação da obra, somente 1 foi instalada.	
ASSINATURAS		
Luiz Henrique da Silva Borges Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 208579/D	PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTONIO DO GRAMA CREA 137.103/D	Luciano Xavier de Castro RT de Execução - CONSÓRCIO 3T - SOLOCAP-CONEP CREA 59784/D








RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº 0096	OBRA: CTP 229/2023 - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	CONTRATO:	RESP. TÉCNICO: LUCIANO XAVIER
ENDEREÇO: ESTRADA DE ACESSO ENTRE SANTO ANTÔNIO DO GRAMA E ABRE CAMPO	INÍCIO: 01/04/2023	Nº CREA-MG: 59784/D	
CIDDE:	PRAZO: 01/10/2023	Nº DA ART:	
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA	UF:	COORDENADAS:	
DATA: 27/09/2023	SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA ☔
MANHÃ	✓		IMPRATICÁVEL ☔
TARDE	✓		
QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
1	AUXILIAR DE ENGENHARIA	1	OPERADOR DE ESPARGIDOR
2	ENCARREGADO DE OBRAS	1	MESISTA
7	OPERADOR	9	MOTORISTA
2	PEDREIRO	1	TOPOGRAFO
5	AJUDANTE	1	GREIDISTA
2	RASTELEIRO		
QTDE	EQUIPAMENTO		
2	ROLO LISO		
1	ESCAVADEIRA		
1	ROLO DE PNEU		
1	VIBROACABADORA		
1	PA CARREGADEIRA		
1	ESPARGIDOR		
3	VEICULO DE APOIO		
1	CAMINHÃO PIPA		
9	CAMINHÃO BASCULANTE		
1	CARRETA BASCULANTE		
1	RETROESCAVADEIRA		
1	MOTONIVELADORA		
1	ROLO COMBINADO (CHAPA/PNEU)		
TAREFAS REALIZADAS			
NÚMERO DE T.R.	DESCRIÇÃO	OBSERVAÇÕES	
1	UMECTAÇÃO		
2	REBAIXAMENTO EM MEIA PISTA	(RETRABALHO) PREPARAÇÃO PARA LANÇAMENTO DE CASCALHO NA REGIÃO E50	
3	SINALIZAÇÃO		
4	SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO TOPOGRÁFICO		
5	REGULARIZAÇÃO DE SUB-BASE	R121 A E151	
6	LANÇAMENTO DE MATAÇO	E283 A E285	
7	CARGA/TRANSPORTE/ARMAZENAMENTO DE MATERIAL	CASCALHO; BICA CORRIDA	

REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATORIOS)



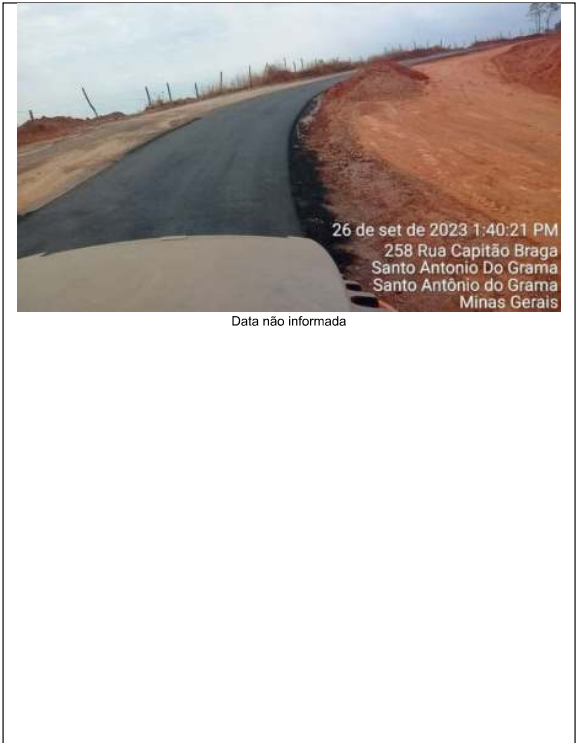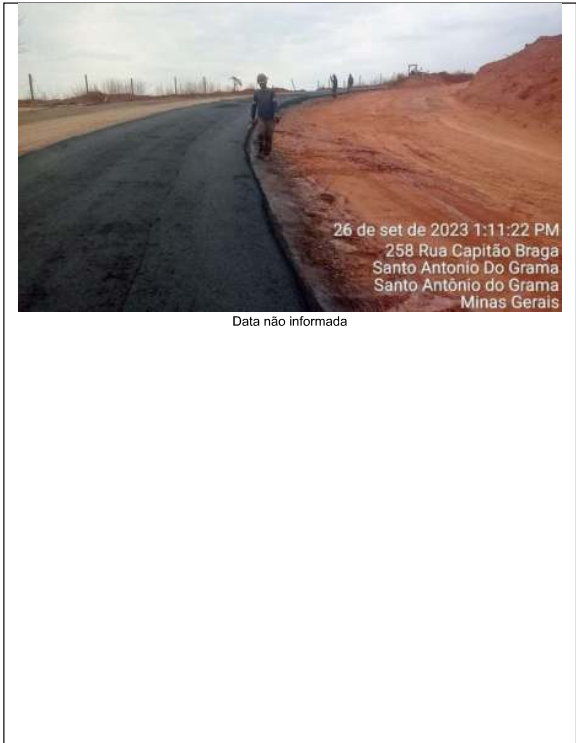

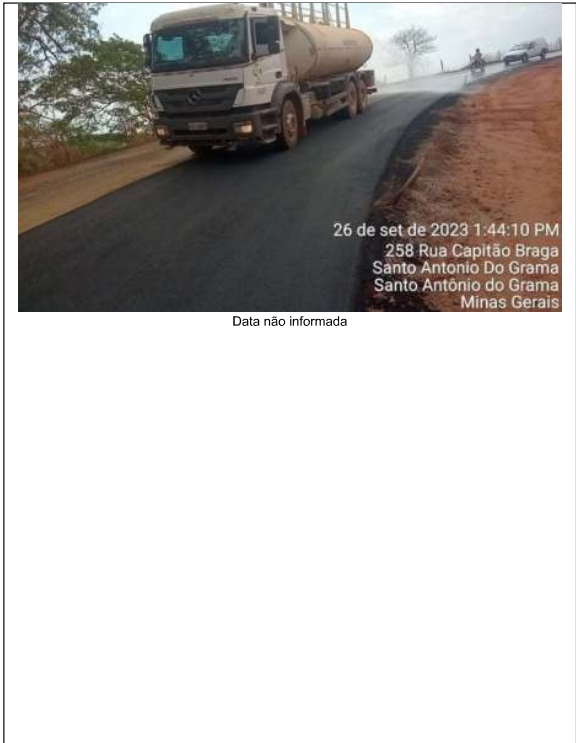



NÚMERO DE OC		TIPO DE OCORRÊNCIA	OCORRÊNCIAS	DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA
EQUIPE E04 E E05 26/09/2023			OBSERVAÇÕES	
MUNICÍPIO			CONFERÊNCIA	
Obs.:			CONSÓRCIO (Aprovado em 27/09/2023 - 16:07)	
				Obs.: *Drenos: Construção de contenção em rip rap. *Asfalto: Capa da Est. 48 a Est. 56. *Topografia: Acompanhando o lançamento de BGS. *Cerca: Sendo construída do lado esquerdo da Est. 25 até Est. 42. *Terraplenagem: Lançamento de cascalho Est. 121 até Est. 151 e transporte de mataco para Est. 280 a Est. 288. *Observação: Remoção dos postes das Est. 279 a Est. 281, prevista para até 04/10/23, segundo a Prefeitura.
			ASSINATURAS	
Luiz Henrique da Silva Borges Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 208579/D		PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA CREA 137.103/D	Luciano Xavier de Castro RT de Execução - CONSÓRCIO 3T-SOLOCAP-CONEP CREA 59784/D	





RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº 0095	OBRA: CTP 229/2023 - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	CONTRATO:	RESP. TÉCNICO: LUCIANO XAVIER
ENDEREÇO: ESTRADA DE ACESSO ENTRE SANTO ANTÔNIO DO GRAMA E ABRE CAMPO	INÍCIO: 01/04/2023	Nº CREA-MG: 59784/D	
CIDDE:	PRAZO: 01/10/2023	Nº DA ART:	
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA	UF:	COORDENADAS:	
DATA: 26/09/2023	SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA ☔
MANHÃ	✓		IMPRATICÁVEL ☔
TARDE	✓		
QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
1	AUXILIAR DE ENGENHARIA	1	OPERADOR DE ESPARGIDOR
2	ENCARREGADO DE OBRAS	1	MEIO OFICIAL
7	OPERADOR	9	MOTORISTA
1	PEDREIRO	1	TOPOGRAFO
5	AJUDANTE	1	GREIDISTA
2	RASTELEIRO		
QTDE	EQUIPAMENTO		
2	ROLO LISO		
1	ESCAVADEIRA		
1	ROLO DE PNEU		
1	VIBROACABADORA		
1	PA CARREGADEIRA		
1	ESPARGIDOR		
3	VEICULO DE APOIO		
1	CAMINHÃO PIPA		
11	CAMINHÃO BASCULANTE		
1	CARRETA BASCULANTE		
1	RETROESCAVADEIRA		
1	MOTONIVELADORA		
1	ROLO COMBINADO (CHAPA/PNEU)		
TAREFAS REALIZADAS			
NÚMERO DE T.R.	DESCRIÇÃO	OBSERVAÇÕES	
1	LANÇAMENTO DE MATAÇO	E284 E E285	
2	APLICAÇÃO/COMPACTAÇÃO DE MASSA ASFALTICA		
3	REMOÇÃO/TROCA DE POSTE	E207 E E208	
4	UMECTAÇÃO		
5	SINALIZAÇÃO		
6	PINTURA DE LIGAÇÃO		
7	REGULARIZAÇÃO DE SUB-BASE	E121 A E151	
8	SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO TOPOGRÁFICO		
9	CARGA/TRANSPORTE/ARMAZENAMENTO DE MATERIAL	CASCALHO; PEDRA DE MÃO: E282	

REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATORIOS)






Data não informada



Data não informada



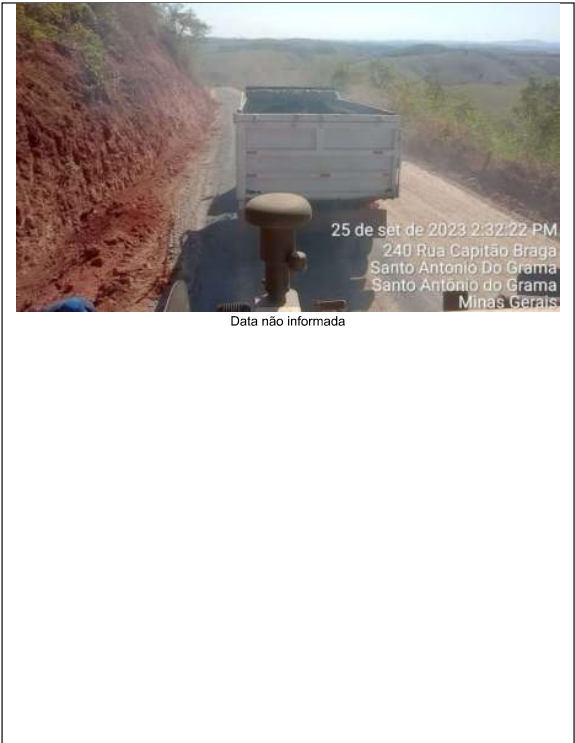

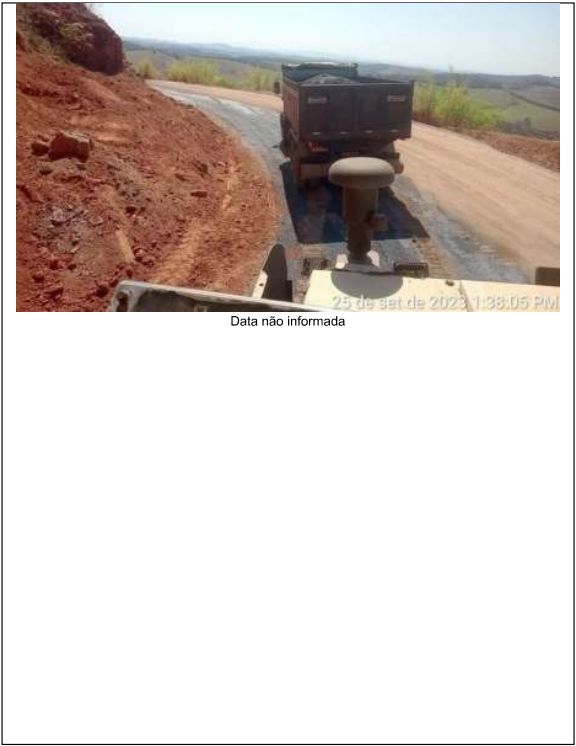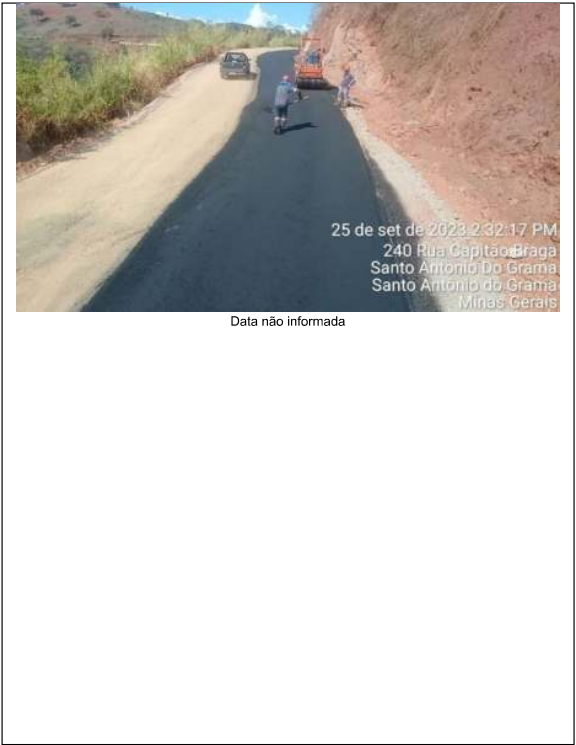

NÚMERO DE OC		TIPO DE OCORRÊNCIA	OCORRÊNCIAS		DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA
EQUIPE E04 E E05 25/09/2023			OBSERVAÇÕES		
MUNICÍPIO			CONFERÊNCIA		
Obs.:			CONSÓRCIO (Aprovado em 26/09/2023 - 17:02)		
			Obs.: *Drenagem: Construção de contenção de sacaria na rampa Est. 04, *Asfalto: Est. 58 a Est. 68 lado direito, *Terraplenagem: Complemento de sub base nas Est. 121 até 151. Transporte de maticos.		
ASSINATURAS					
Luiz Henrique da Silva Borges Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 208579/D		PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA CREA 137.103/D		Luciano Xavier de Castro RT de Execução - CONSÓRCIO 3T –SOLOCAP-CONEPP CREA 59784/D	





RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº 0094	OBRA: CTP 229/2023 - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	CONTRATO:		RESP. TÉCNICO: LUCIANO XAVIER	
ENDEREÇO: ESTRADA DE ACESSO ENTRE SANTO ANTÔNIO DO GRAMA E ABRE CAMPO		INÍCIO: 01/04/2023		Nº CREA-MG: 59784/D	
CIDDE:		PRAZO: 01/10/2023		Nº DA ART:	
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA		UF:		COORDENADAS:	
DATA: 25/09/2023	SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA ☔	IMPRATICÁVEL ☔	
MANHÃ	✓				
TARDE	✓				
QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO		QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	
1	AUXILIAR DE ENGENHARIA		3	OPERADOR	
3	MOTORISTA		1	AJUDANTE	
1	GREIDISTA				
QTDE	EQUIPAMENTO				
1	ROLO LISO				
1	PÁ CARREGADEIRA				
1	VEÍCULO DE APOIO				
1	CAMINHÃO PIPA				
2	CAMINHÃO BASCULANTE				
1	MOTONIVELADORA				
TAREFAS REALIZADAS					
NÚMERO DE T.R.	DESCRIÇÃO	OBSERVAÇÕES			
1	SINALIZAÇÃO				
2	UMECTAÇÃO				
3	LANÇAMENTO DE BICA CORRIDA	E08 A E33			
REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATORIOS)					





Data não informada



Data não informada



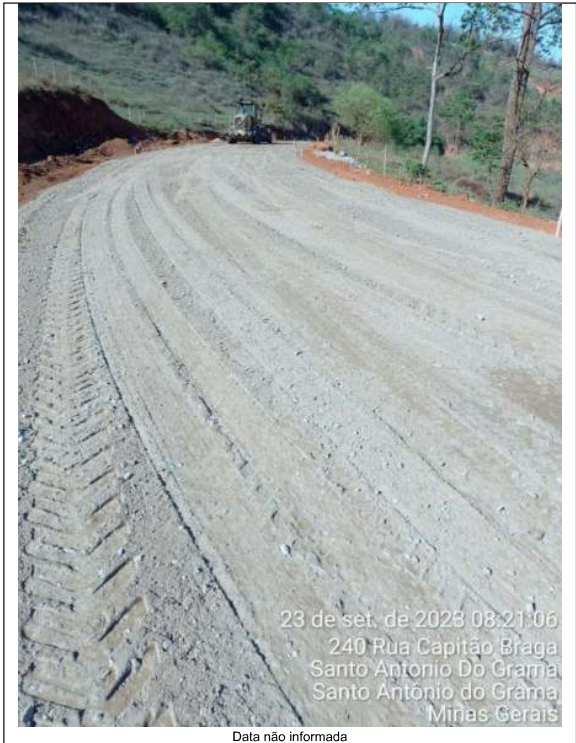

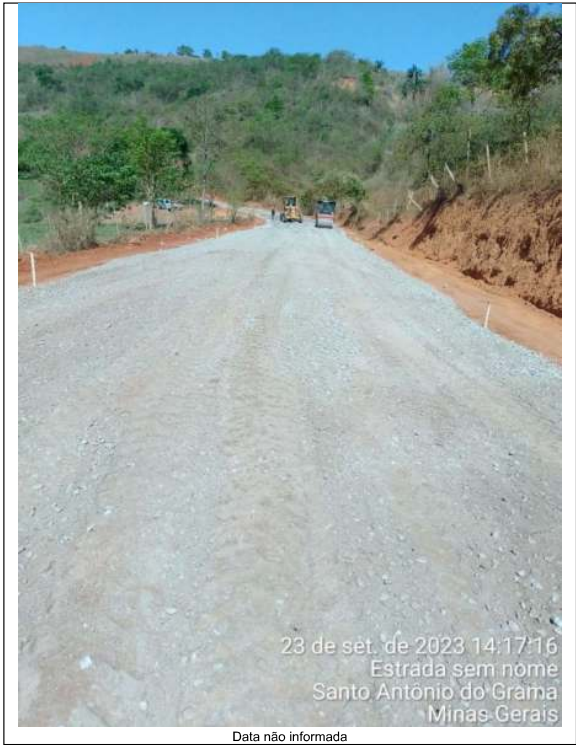

NÚMERO DE OC		TIPO DE OCORRÊNCIA	OCORRÊNCIAS	DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA
EQUIPE E05 23/09/2023			OBSERVAÇÕES	
MUNICÍPIO			CONFERÊNCIA	
Obs.:			CONSÓRCIO (Aprovado em 26/09/2023 - 08:43)	
			Obs.: *Lançamento de BGS Est. 34.	
			ASSINATURAS	
Luiz Henrique da Silva Borges Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 208579/D		PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA CREA 137.103/D		Luciano Xavier de Castro RT de Execução - CONSÓRCIO 3T - SOLOCAP-CONEP CREA 59784/D



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº 0093	OBRA: CTP 229/2023 - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	CONTRATO:	RESP. TÉCNICO: LUCIANO XAVIER
ENDEREÇO: ESTRADA DE ACESSO ENTRE SANTO ANTÔNIO DO GRAMA E ABRE CAMPO	INÍCIO: 01/04/2023	Nº CREA-MG: 59784/D	
CIDDE:	PRAZO: 01/10/2023	Nº DA ART:	
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA	UF:	COORDENADAS:	
DATA: 25/09/2023	SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA ☔
MANHÃ	✓		IMPRATICÁVEL ☔
TARDE	✓		
QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
1	AUXILIAR DE ENGENHARIA	1	OPERADOR DE ESPARGIDOR
2	ENCARREGADO DE OBRAS	1	MESISTA
6	OPERADOR	7	MOTORISTA
2	PEDREIRO	1	TOPOGRAFO
6	AJUDANTE	1	GREIDISTA
2	RASTELEIRO		
QTDE	EQUIPAMENTO		
2	ROLO LISO		
1	ESCAVADEIRA		
1	ROLO DE PNEU		
1	VIBROACABADORA		
1	PA CARREGADEIRA		
1	ESPARGIDOR		
1	COMPACTADOR DE SOLO		
3	VEÍCULO DE APOIO		
1	CAMINHÃO PIPA		
9	CAMINHÃO BASCULANTE		
1	CARRETA BASCULANTE		
1	RETROSCAVADEIRA		
1	MOTONIVELADORA		
1	ROLO COMBINADO (CHAPA/PNEU)		
TAREFAS REALIZADAS			
NÚMERO DE T.R.	DESCRIÇÃO	OBSERVAÇÕES	
1	LANÇAMENTO DE BICA CORRIDA	E34 A E47	
2	SINALIZAÇÃO		
3	CARGA/TRANSPORTE/ARMAZENAMENTO DE MATERIAL	BICA CORRIDA: E207 PEDRA DE MÃO: E282	
4	EXECUÇÃO DE SARJETA	REGIÃO DA E33	
5	REGULARIZAÇÃO DE SUB-BASE/LANÇAMENTO DE CASCALHO	E261 A E268	
6	UMECTAÇÃO		
7	SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO TOPOGRÁFICO		
REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATORIOS)			






Data não informada



Data não informada



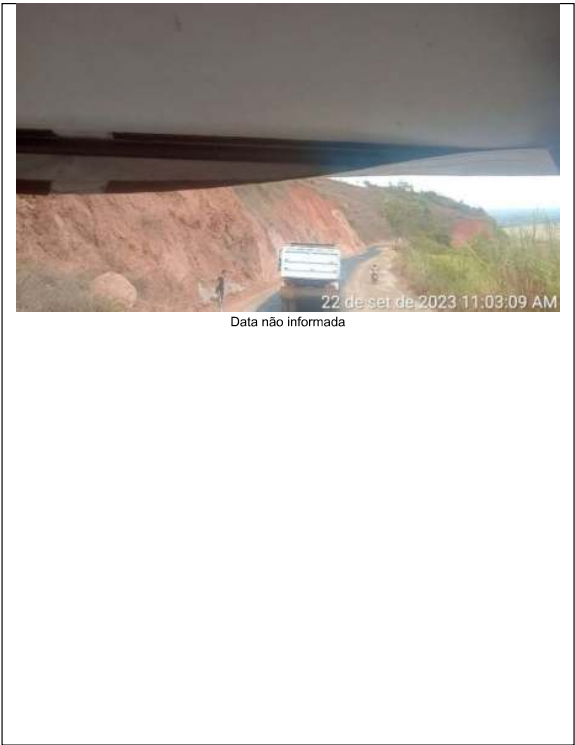

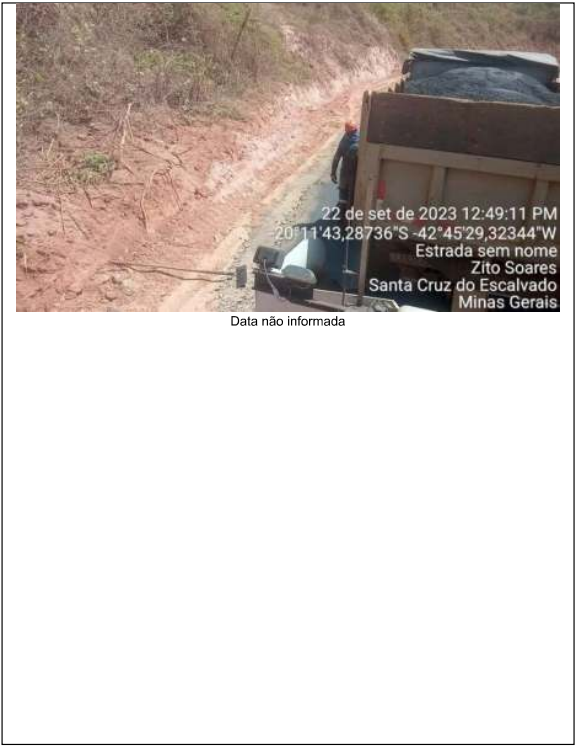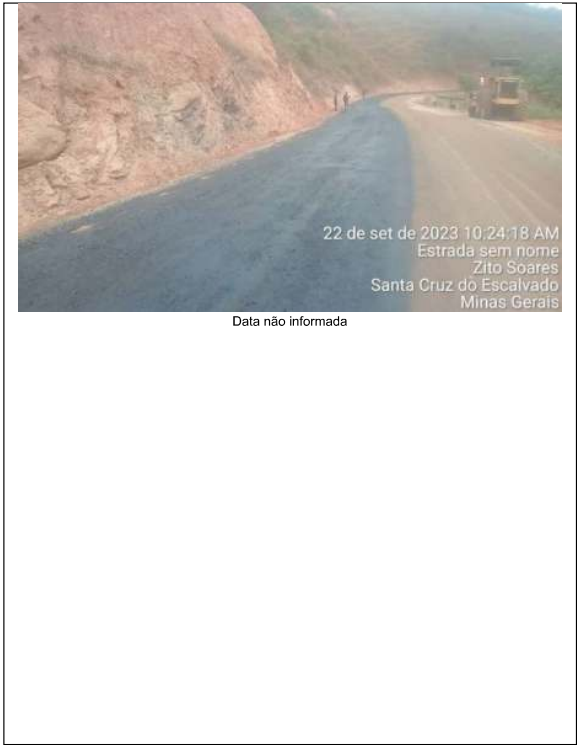

NÚMERO DE OC		OCORRÊNCIAS	DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA
TIPO DE OCORRÊNCIA		OBSERVAÇÕES	
EQUIPE E04 E E05 22/09/2023			
MUNICÍPIO		CONFERÊNCIA	
Obs.:		CONSÓRCIO (Aprovado em 26/09/2023 - 08:36) Obs.: *Drenos: Valeta de contenção da Est. 30 a Est. 39, *Asfalto: Capa da Est. 69 até Est. 89. *Topografia: Realizando lançamento de Bgs da Est. 64 até Est. 34.	
ASSINATURAS			
Luiz Henrique da Silva Borges Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 208579/D		PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA CREA 137.103/D	Luciano Xavier de Castro RT de Execução - CONSÓRCIO 3T –SOLOCAP-CONEPP CREA 59784/D










RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº 0092	OBRA: CTP 229/2023 - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	CONTRATO:	RESP. TÉCNICO: LUCIANO XAVIER
ENDEREÇO: ESTRADA DE ACESSO ENTRE SANTO ANTÔNIO DO GRAMA E ABRE CAMPO	INÍCIO: 01/04/2023	Nº CREA-MG: 59784/D	
CIDDE:	PRAZO: 01/10/2023	Nº DA ART:	
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA	UF:	COORDENADAS:	
DATA: 22/09/2023	SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA ☔
MANHÃ	✓		IMPRATICÁVEL ☔
TARDE	✓		
QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
1	AUXILIAR DE ENGENHARIA	1	OPERADOR DE ESPARGIDOR
2	ENCARREGADO DE OBRAS	1	MESISTA
6	OPERADOR	8	MOTORISTA
1	PEDREIRO	1	TOPOGRAFO
6	AJUDANTE	1	GREIDISTA
2	RASTELEIRO		
QTDE	EQUIPAMENTO		
2	ROLO LISO		
1	ESCAVADEIRA		
1	ROLO DE PNEU		
1	VIBROACABADORA		
1	PÁ CARREGADEIRA		
1	ESPARGIDOR		
1	COMPACTADOR DE SOLO		
3	VEÍCULO DE APOIO		
1	CAMINHÃO PIPA		
12	CAMINHÃO BASCULANTE		
1	CARRETA BASCULANTE		
1	RETROSCAVADEIRA		
1	MOTONIVELADORA		
1	ROLO COMBINADO (CHAPA/PNEU)		
TAREFAS REALIZADAS			
NÚMERO DE T.R.	DESCRIÇÃO	OBSERVAÇÕES	
1	LANÇAMENTO DE BICA CORRIDA	E61 A E96	
2	SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO TOPOGRÁFICO		
3	APLICAÇÃO/COMPACTAÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA		
4	SINALIZAÇÃO		
5	LANÇAMENTO DE CASCALHO: BORDAS DA PISTA	E59 A E62	
6	EXECUÇÃO DE COMPACTAÇÃO DE CAIXA DE BUEIRO	B75	
7	CARGA/TRANSPORTE/ARMAZENAMENTO DE MATERIAL	BICA CORRIDA	
8	EXECUÇÃO DE SARJETA	E30 A E32+10	
9	UMECTAÇÃO		
10	PINTURA DE LIGAÇÃO		
REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATORIOS)			



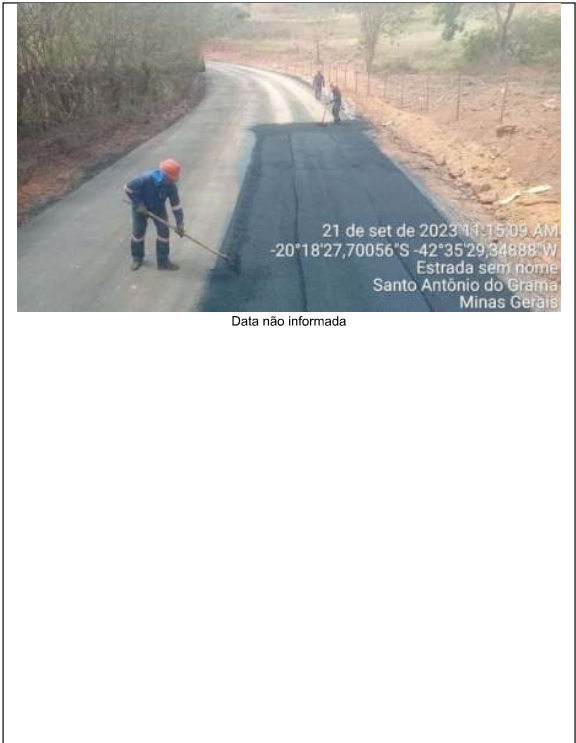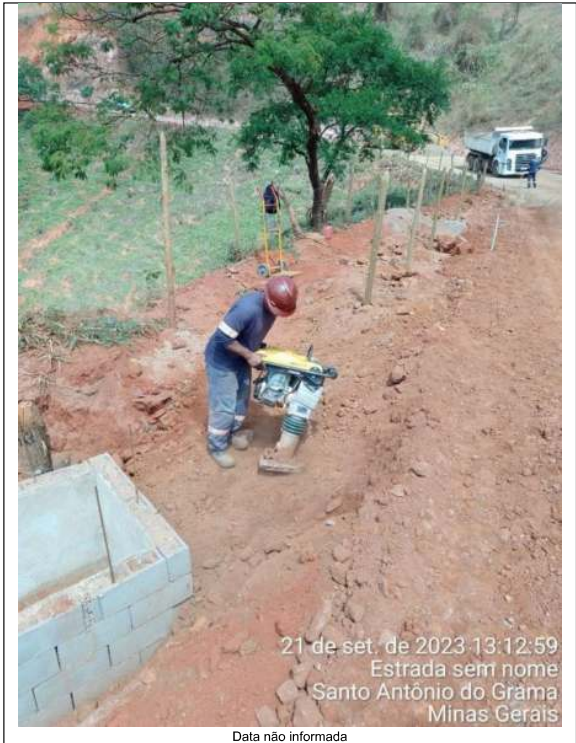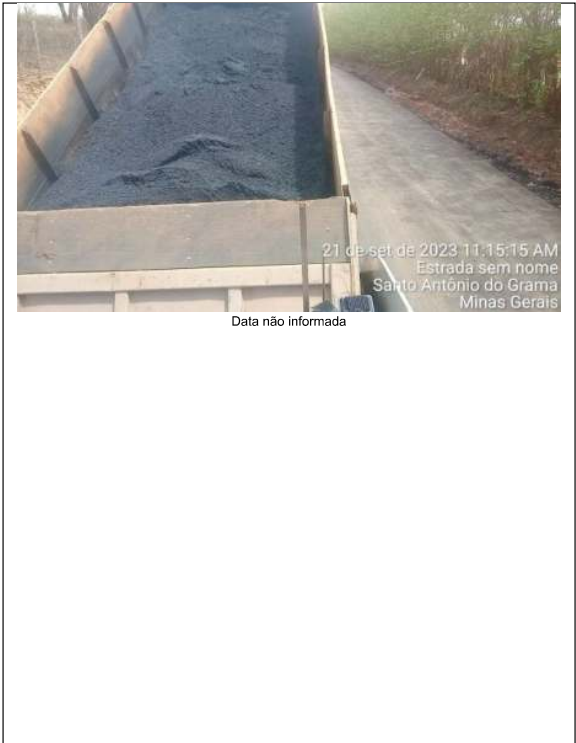

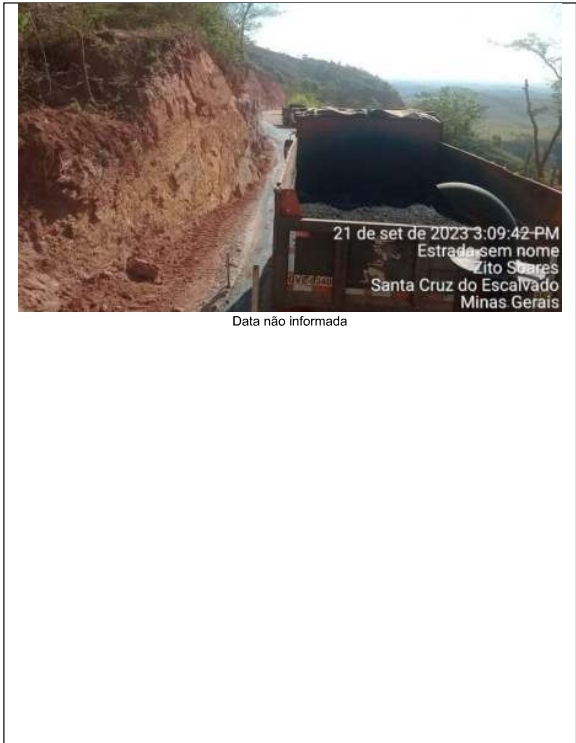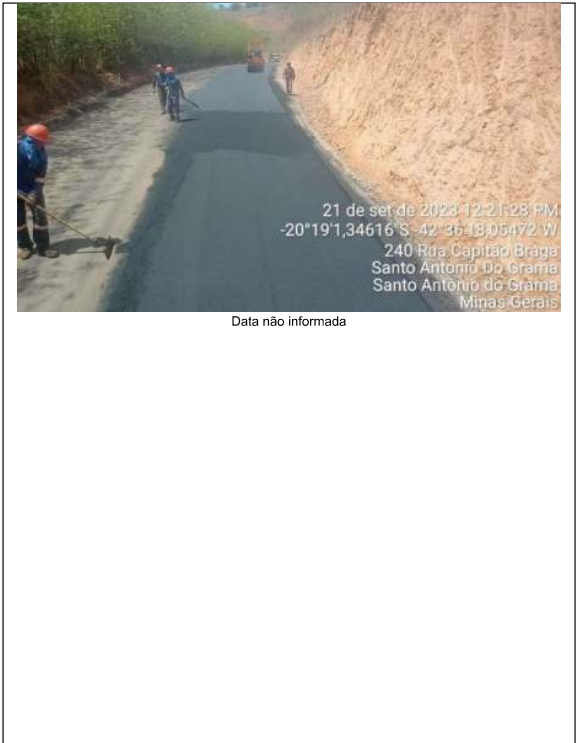



OCORRÊNCIAS			
NÚMERO DE OC	TIPO DE OCORRÊNCIA	DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA	
OBSERVAÇÕES			
EQUIPE E04 E E05 21/09/2023			
		CONFERÊNCIA	
MUNICÍPIO		CONSÓRCIO (Aprovado em 26/09/2023 - 08:34)	
Obs.:		Obs.: *Drenagem: Construção de canaleta no bordo lado direito Est. 28 a Est. 38. *Asfalto: capa do lado direito da Est. 88 a Est. 106. *Terraplenagem: Transporte de BGS do depósito para as Est. 60 a Est. 80. *Limpeza e compactação nos cantos da pista. *Topografia: Nivelamento e locação de Est. da Est. 80 até Est. 63.	
ASSINATURAS			
Luiz Henrique da Silva Borges Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 208579/D		PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA CREA 137.103/D	
		Luciano Xavier de Castro RT de Execução - CONSÓRCIO 3T –SOLOCAP-CONEPP CREA 59784/D	








RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº 0091	OBRA: CTP 229/2023 - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	CONTRATO:	RESP. TÉCNICO: LUCIANO XAVIER
ENDEREÇO: ESTRADA DE ACESSO ENTRE SANTO ANTÔNIO DO GRAMA E ABRE CAMPO	INÍCIO: 01/04/2023	Nº CREA-MG: 59784/D	
CIDDE:	PRAZO: 01/10/2023	Nº DA ART:	
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA	UF:	COORDENADAS:	
DATA: 21/09/2023	SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA ☔
MANHÃ	✓		IMPRATICÁVEL ☔
TARDE	✓		
QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MAO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
1	AUXILIAR DE ENGENHARIA	1	ENCARREGADO DE OBRAS
4	OPERADOR	7	MOTORISTA
2	PEDREIRO	1	TOPOGRAFO
6	AJUDANTE	1	GREIDISTA
QTDE	EQUIPAMENTO		
1	ESCAVADEIRA		
1	ROLO DE PNEU		
1	COMPACTADOR DE SOLO		
2	VEÍCULO DE APOIO		
1	CAMINHÃO PIPA		
5	CAMINHÃO BASCULANTE		
1	CARRETA BASCULANTE		
1	RETROESCAVADEIRA		
1	MOTONIVELADORA		
	TAREFAS REALIZADAS		
NÚMERO DE T.R.	DESCRIÇÃO	OBSERVAÇÕES	
1	REINSTALAÇÃO DA PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA OBRA		
2	CARGA/TRANSPORTE/ARMAZENAMENTO DE MATERIAL	E207: CASCALHO E120: BICA CORRIDA	
3	EXECUÇÃO DE SARJETA	E33 A E35	
4	EXECUÇÃO/REGULARIZAÇÃO DE SUB-BASE	E68 A E75 E89 A E96	
5	SINALIZAÇÃO		
6	SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO TOPOGRÁFICO		
7	EXECUÇÃO DE ABERTURA DE SARJETA	E30 A E32+10	
8	COMPACTAÇÃO DE CAIXA DE BUEIRO	E92	
9	EXECUÇÃO DE CERCA	E121 A E124	
10	UMECTAÇÃO		
	REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATORIOS)		



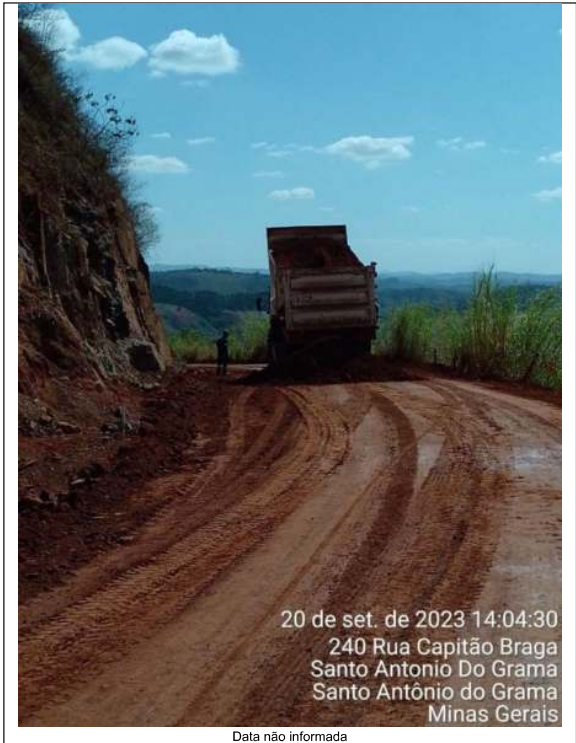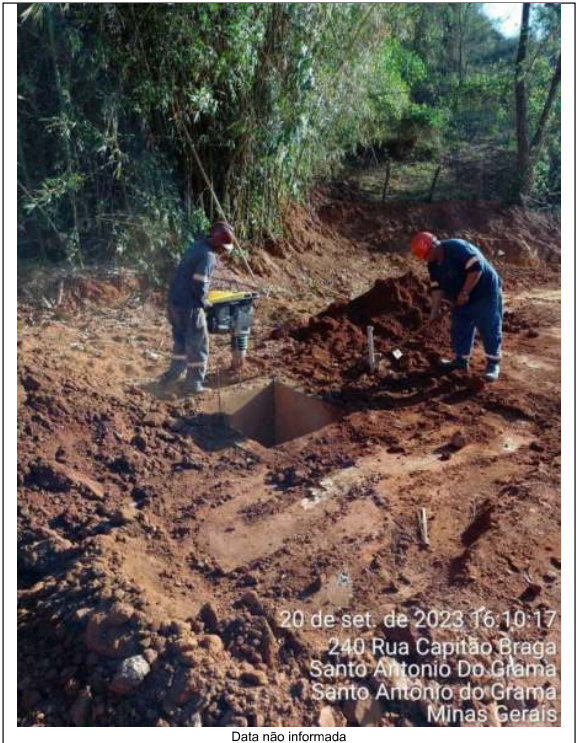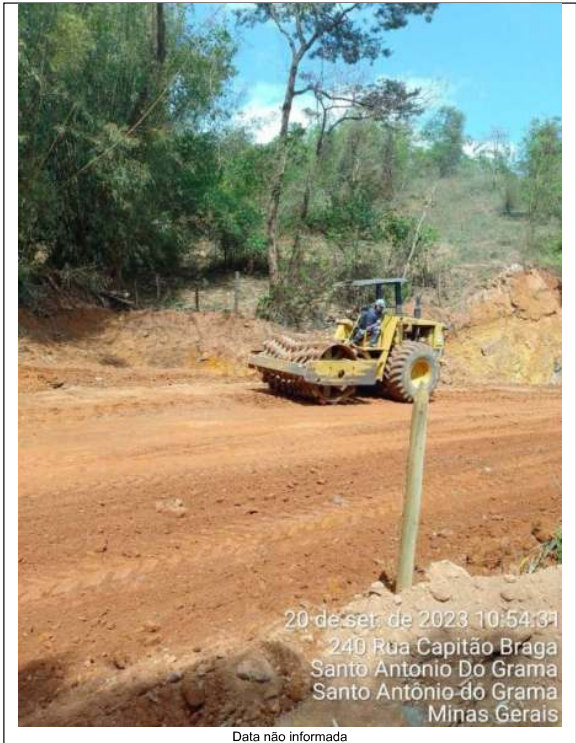



NÚMERO DE OC		TIPO DE OCORRÊNCIA	OCORRÊNCIAS	DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA
EQUIPE E05 20/09/2023			OBSERVAÇÕES	
MUNICÍPIO			CONFERÊNCIA	
Obs.:			CONSÓRCIO (Aprovado em 22/09/2023 - 09:08)	
				Obs.: *Drenagem: Valetas de proteção de taludes sendo construída nas Est. 28 a Est. 39. *Topografia: Locação de estaca e nivelamento, Est 68 até Est. 96, para lançamento de BGS. *Terraplenagem: Transporte de BGS da pedreira para depósito de material, regularização com cascalho na sub base. *Asfalto: Capa asfáltica da Est. 18 até Est. 118. *Cerca: Sendo executada nas Est. 120 até a Est. 127.
			ASSINATURAS	
Luiz Henrique da Silva Borges Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 208579/D		PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA CREA 137.103/D	Luciano Xavier de Castro RT de Execução - CONSÓRCIO 3T-SOLOCAP-CONEP	CREA 59784/D



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº 0090	OBRA: CTP 229/2023 - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	CONTRATO:	RESP. TÉCNICO: LUCIANO XAVIER
ENDEREÇO: ESTRADA DE ACESSO ENTRE SANTO ANTÔNIO DO GRAMA E ABRE CAMPO		INÍCIO: 01/04/2023	Nº CREA-MG: 59784/D
CIDDE:		PRAZO: 01/10/2023	Nº DA ART:
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA		UF:	COORDENADAS:
DATA: 21/09/2023	SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA ☔
MANHÃ	✓		IMPRATICÁVEL ☔
TARDE	✓		
QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
1	OPERADOR DE ESPARGIDOR	1	ENCARREGADO DE OBRAS
1	MESISTA	1	OPERADOR
1	MOTORISTA	2	RASTELEIRO
QTDE	EQUIPAMENTO		
1	ROLO LISO		
1	VIBROACABADORA		
1	ESPARGIDOR		
1	VEÍCULO DE APOIO		
4	CAMINHÃO BASCULANTE		
1	ROLO COMBINADO (CHAPA/PNEU)		
TAREFAS REALIZADAS			
NÚMERO DE T.R.	DESCRIÇÃO	OBSERVAÇÕES	
1	SINALIZAÇÃO		
2	PINTURA DE LIGAÇÃO		
3	APLICAÇÃO/COMPACTAÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA		
REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATORIOS)			
20 de set de 2023 10:43:04 AM 240 Rua Capitão Braga Santo Antônio Do Grama Santo Antônio do Grama Minas Gerais Data não informada		20 de set de 2023 1:32:48 PM Data não informada	
20 de set de 2023 10:48:52 AM 240 Rua Capitão Braga Santo Antônio Do Grama Santo Antônio do Grama Minas Gerais Data não informada		20 de set de 2023 10:42:55 AM 240 Rua Capitão Braga Santo Antônio Do Grama Santo Antônio do Grama Minas Gerais Data não informada	
20 de set de 2023 11:04:49 AM -20°19'1,34616"S -42°36'18,05472"W 240 Rua Capitão Braga Santo Antônio Do Grama Santo Antônio do Grama Minas Gerais Data não informada		20 de set de 2023 11:11:53 AM -20°19'1,34616"S -42°36'18,05472"W 240 Rua Capitão Braga Santo Antônio Do Grama Santo Antônio do Grama Minas Gerais Data não informada	
OCORRÊNCIAS			
NÚMERO DE OC	TIPO DE OCORRÊNCIA	OBSERVAÇÕES	DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA
EQUIPE E04 20/09/2023			
CONFERÊNCIA			
MUNICÍPIO	CONSÓRCIO (Aprovado em 22/09/2023 - 09:07)		
Obs.:	Obs.: *Drenagem: Valetas de proteção de taludes sendo construída nas Est. 28 a Est. 39. *Topografia: Locação de estaca e nivelamento, Est 68 até Est. 96, para lançamento de BGS. *Terraplenagem: Transporte de BGS da pedreira para depósito de material, regularização com cascalho na sub base. *Asfalto: Capa asfáltica da Est. 18 até Est. 118. *Cerca: Sendo executada nas Est. 120 até a Est. 127.		
ASSINATURAS			

Luiz Henrique da Silva Borges
Fiscal de Obras - CIMVALPI
CREA 208579/D

PEDRO MARTINO ZEFERINO
Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA
CREA 137.103/D

Luciano Xavier de Castro
RT de Execução - CONSÓRCIO 3T - SOLOCAP-CONEP
CREA 59784/D



Assinaturas do Documento



Documento Assinado Eletronicamente por **LUCIANO XAVIER DE CASTRO**, CPF: 760.22*. **6- *5 em **09/11/2023 14:38:28**, Cód. Autenticidade da Assinatura: **1448.4K38.4284.R11Z.3546**, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Documento Assinado Eletronicamente por **PEDRO MARTINO ZEFERINO**, CPF: 015.49*. **6- *9 em **27/10/2023 04:58:10**, Cód. Autenticidade da Assinatura: **04U2.8Z58.410E.U65A.2181**, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Documento Assinado Eletronicamente por **LUIZ HENRIQUE DA SILVA BORGES**, CPF: 016.28*. **6- *7 em **23/10/2023 16:31:05**, Cód. Autenticidade da Assinatura: **1630.1831.4052.A25X.1386**, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Informações do Documento

ID do Documento: **F7.40B** - Tipo de Documento: **FORMULÁRIO DE MEDIÇÕES**.

Elaborado por **GILBERTO ARAUJO GOMIDES**, CPF: 069.58*. **6- *7 , em **23/10/2023 - 16:29:30**

Código de Autenticidade deste Documento: 1673.5H29.630A.8889.3872

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:

<https://zeropapel.cimvalpi.mg.gov.br/verdocumento>

