

27/11/2023, 13:49

systemas.wayssystemas.com/cimvalpi/Blk_Medicao_Relatorio_Parcial/



FORMULÁRIO DE MEDIÇÕES

RELATORIO PARCIAL (SITUAÇÃO: APROVADA PELO CONSÓRCIO)

Enviado por LUCAS CARVALHO SOARES em 20/11/2023 • 15:29

Registro: 20/11/2023		8ª MEDIÇÃO													
Obra: CTP 229/2023 - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA		Período de 21/10/2023 a 20/11/2023													
Local: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA															
OBSERVAÇÕES															
Enviada por LUCAS CARVALHO SOARES (FORNECEDOR) em 20/11/2023 às 15:29															
ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	QUANTIDADE MEDIDA		VALOR PREVISTO (BDI)		NESTA MEDIÇÃO (BDI)	ACUMULADA (BDI)	ACUMULADA (ADMC)	SALDO (BDI)	SALDO (ADMC)
05.16	DRENAGEM COMPLEMENTAR														
05.16.06	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 03 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	UN	18	R\$ 1.190,02	R\$ 1.510,73	R\$ 27.193,14	5	12	R\$ 27.193,14	R\$ 28.135,62	R\$ 7.553,65	R\$ 18.128,76	R\$ 18.757,08	R\$ 9.064,38	R\$ 9.378,54
05.16.07	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 04 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS – BUEIROS Ø600MM	UN	18	R\$ 1.711,23	R\$ 2.172,41	R\$ 39.103,38	5	12	R\$ 39.103,38	R\$ 40.458,60	R\$ 10.862,05	R\$ 26.088,92	R\$ 26.972,40	R\$ 13.034,46	R\$ 13.486,20
05.16.14	VALETA DE PROTEÇÃO DE CORTES COM REVESTIMENTO DE CONCRETO - VPC 04 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M	2352,5	R\$ 77,28	R\$ 98,11	R\$ 230.803,78	1103	1452	R\$ 230.803,78	R\$ 238.802,28	R\$ 108.215,33	R\$ 142.455,72	R\$ 147.392,52	R\$ 88.348,06	R\$ 91.409,76
05.16.16	VALETA DE PROTEÇÃO DE ATERRÇOS COM REVESTIMENTO DE CONCRETO - VPA 04 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M	2267,5	R\$ 79,13	R\$ 100,45	R\$ 227.770,38	330	330	R\$ 227.770,38	R\$ 235.661,28	R\$ 33.148,50	R\$ 33.148,50	R\$ 34.296,90	R\$ 194.621,88	R\$ 201.364,38
05.16.19	DESCIDA D'ÁGUA DE ATERRÇOS EM DEGRAUS - DAD 02 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M	9,3	R\$ 230,54	R\$ 292,68	R\$ 2.721,92	9,3	9,3	R\$ 2.721,92	R\$ 2.816,23	R\$ 2.721,92	R\$ 2.721,92	R\$ 2.816,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05.16.20	DESCIDA D'ÁGUA DE ATERRÇOS EM DEGRAUS - DAD 04 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M	107,5	R\$ 524,26	R\$ 665,54	R\$ 71.545,55	10	60	R\$ 71.545,55	R\$ 74.025,58	R\$ 6.886,10	R\$ 39.932,40	R\$ 41.316,60	R\$ 31.613,15	R\$ 32.708,98
05.16.21	DESCIDA D'ÁGUA DE ATERRÇOS EM DEGRAUS - DAD 05 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M	5	R\$ 539,31	R\$ 684,66	R\$ 3.423,30	5	5	R\$ 3.423,30	R\$ 3.541,95	R\$ 3.423,30	R\$ 3.423,30	R\$ 3.541,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05.16.22	DESCIDA D'ÁGUA DE ATERRÇOS TIPO RÁPIDO - DAR 02 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M	7,5	R\$ 129,83	R\$ 164,82	R\$ 1.236,15	7,5	7,5	R\$ 1.236,15	R\$ 1.278,98	R\$ 1.236,15	R\$ 1.236,15	R\$ 1.278,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05.16.23	DESCIDA D'ÁGUA DE CORTES EM DEGRAUS - DCD 04 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M	7	R\$ 600,31	R\$ 762,09	R\$ 5.334,63	7	7	R\$ 5.334,63	R\$ 5.519,57	R\$ 5.334,63	R\$ 5.334,63	R\$ 5.519,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06	PAVIMENTAÇÃO														
06.09	IMPRIMAÇÃO														
06.09.01	IMPRIMAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)	m²	53475,53	R\$ 7,87	R\$ 9,99	R\$ 534.220,54	8000	52220,42	R\$ 534.220,54	R\$ 552.938,98	R\$ 79.920,00	R\$ 521.682,00	R\$ 539.959,14	R\$ 12.538,54	R\$ 12.977,84
06.10	PINTURA														
06.10.01	PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-1C	m²	54475,53	R\$ 2,39	R\$ 3,04	R\$ 165.605,61	8000	52220,42	R\$ 165.605,61	R\$ 171.053,16	R\$ 24.320,00	R\$ 158.750,08	R\$ 163.972,12	R\$ 6.855,53	R\$ 7.081,04
06.11	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE														
06.11.01	EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA	m³	2089,32	R\$ 1.370,82	R\$ 1.740,25	R\$ 3.635.939,13	313	2042,05	R\$ 3.635.939,13	R\$ 3.761.966,91	R\$ 544.698,25	R\$ 3.553.677,51	R\$ 3.676.853,97	R\$ 82.261,62	R\$ 85.112,94
14	SERVIÇOS TÉCNICOS														
14.01	TOPOGRAFIA														
15	ADMINISTRAÇÃO LOCAL														



27/11/2023, 13:49

sistemas.waysistemas.com/cimvalpi/Blk_Medicao_Relatorio_Parcial/

15.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - % BASEADA ACORDÃO 2.622/2013 DO TCU SOBRE SOMA DOS ITENS 1 A 14	%	6,55	R\$	132.737,097.60	R\$	168.509,745.40	R\$	1.103.738.832.37	6,55	32.750509054	R\$	1.103.738.832.37	R\$	1.141.993.663.94	R\$	54.239.84	R\$	56.118,93	R\$	458.449,76	R\$	482.076,58	R\$	1.103.280.382,61	R\$	1.141.511.587,36		
												TOTAL:												R\$ 912.896,54		R\$ 10.929.376,25		R\$ 11.443.818,34	

Luiz Henrique da Silva Borges
Fiscal de Obras - CIMVALPI
CREA 208579/D
Aprovação: 27/11/2023

PEDRO MARTINO ZEFERINO
Fiscal de Obras - SANTO ANTONIO DO GRAMA
CREA 137.103/D

Luciano Xavier de Castro
RT de Execução - CONSÓRCIO 3T –SOLOCAP-CONEPP
CREA 59784/D





RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº 0138	OBRA: CTP 229/2023 - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	CONTRATO:	RESP. TÉCNICO: LUCIANO XAVIER
ENDEREÇO: ESTRADA DE ACESSO ENTRE SANTO ANTÔNIO DO GRAMA E ABRE CAMPO	INÍCIO: 01/04/2023	Nº CREA-MG: 59784/D	
CIDDE:	PRAZO: 01/10/2023	Nº DA ART:	
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA	UF:	COORDENADAS:	
DATA: 17/11/2023	SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA ☔
MANHÃ	✓		IMPRATICÁVEL ☔
TARDE	✓		
QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
1	AUXILIAR DE ENGENHARIA	1	ENCARREGADO DE OBRAS
3	OPERADOR	1	MOTORISTA
1	PEDREIRO	1	AJUDANTE
QTDE	EQUIPAMENTO		
1	ESCAVADEIRA		
1	ROLO DE PNEU		
1	CAMINHÃO BASCULANTE		
1	RETROESCAVADEIRA		
1	MOTONIVELADORA		
TAREFAS REALIZADAS			
NUMERO DE T.R.	DESCRIÇÃO	OBSERVAÇÕES	
1	EXECUÇÃO DE CERCA	E35 A E43	
2	EXECUÇÃO DE ALA		
3	EXECUÇÃO DE ATERRO (PISTA AUXILIAR)	E279 A E285	
4	EXECUÇÃO DE SARJETA TRIANGULAR		
5	SINALIZAÇÃO		


REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATORIOS)



Data não informada



Data não informada

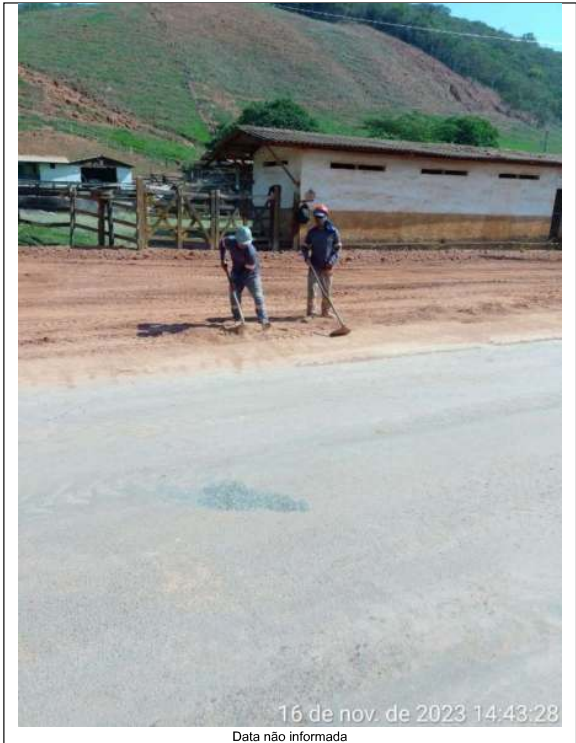



OCORRÊNCIAS	
NÚMERO DE OC	TIPO DE OCORRÊNCIA
OBSERVAÇÕES	
EQUIPE E05 16/11/2023	
CONFERÊNCIA	
MUNICÍPIO	CONSÓRCIO (Aprovado em 20/11/2023 - 08:32)
Obs.:	Obs.: *Drenos: Construção de sarjeta. Construção de descida de água. *Transporte de material, pra o trevo. Acabamento de pista auxiliar nas Est. 278 a Est. 287.
ASSINATURAS	
Luiz Henrique da Silva Borges Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 208579/D	PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA CREA 137.103/D
Luciano Xavier de Castro RT de Execução - CONSÓRCIO 3T-SOLOCAP-CONEP CREA 59784/D	



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº 0137	OBRA: CTP 229/2023 - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	CONTRATO:	RESP. TÉCNICO: LUCIANO XAVIER
ENDEREÇO: ESTRADA DE ACESSO ENTRE SANTO ANTÔNIO DO GRAMA E ABRE CAMPO	INÍCIO: 01/04/2023	Nº CREA-MG: 59784/D	
CIDDE:	PRAZO: 01/10/2023	Nº DA ART:	
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA	UF:	COORDENADAS:	
DATA: 16/11/2023	SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA ☔
MANHÃ	✓		IMPRATICÁVEL ☔
TARDE	✓		
QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
1	AUXILIAR DE ENGENHARIA	1	ENCARREGADO DE OBRAS
2	OPERADOR	2	MOTORISTA
1	PEDREIRO	1	AJUDANTE
QTDE	EQUIPAMENTO		
1	CARRETA PRANCHA		
1	ESCAVADEIRA		
1	ROLO DE PNEU		
1	CAMINHÃO BASCULANTE		
1	RETROESCAVADEIRA		
TAREFAS REALIZADAS			
NUMERO DE T.R.	DESCRIÇÃO	OBSERVAÇÕES	
1	EXECUÇÃO DE SARJETA TRIANGULAR	E43 A E45	
2	REMOÇÃO DE MANILHAS NÃO UTILIZADAS		
3	SINALIZAÇÃO		
4	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO	ROLO DE PNEU	

REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATORIOS)



Data não informada



Data não informada



NÚMERO DE OC		TIPO DE OCORRÊNCIA	OCORRÊNCIAS	DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA
EQUIPE E05 15/11/2023			OBSERVAÇÕES	
			CONFERÊNCIA	
MUNICÍPIO			CONSORCIO (Aprovado em 16/11/2023 - 16:27)	
Obs.:			Obs.: *Drenagem: Construção de sarjeta total 33mts. *Recolhimento de manilhas (sobra). *Transporte de cascalho para execução do trevo.	
ASSINATURAS				
Luiz Henrique da Silva Borges Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 208579/D			PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA CREA 137.103/D	
			Luciano Xavier de Castro RT de Execução - CONSORCIO 3T –SOLOCAP-CONEPP CREA 59784/D	

 CIMVALPI CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO			
Nº 0136 OBRA: CTP 229/2023 - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA		CONTRATO:		RESP. TÉCNICO: LUCIANO XAVIER	
ENDEREÇO: ESTRADA DE ACESSO ENTRE SANTO ANTÔNIO DO GRAMA E ABRE CAMPO		INÍCIO: 01/04/2023		Nº CREA-MG: 59784/D	
CIDDE:		PRAZO: 01/10/2023		Nº DA ART:	
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA		UF:		COORDENADAS:	
DATA: 15/11/2023	SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA ☔	IMPRATICÁVEL ☁	
MANHÃ	✓				
TARDE	✓				
QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO		QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	
1	ENCARREGADO DE OBRAS		2	OPERADOR	
2	MOTORISTA		1	PEDREIRO	
1	AJUDANTE				
QTDE	EQUIPAMENTO				
1	CARRETA PRANCHA				
1	ESCAVADEIRA				
1	CAMINHÃO BASCULANTE				
1	RETROESCAVADEIRA				
1	MOTONIVELADORA				
TAREFAS REALIZADAS					
NUMERO DE T.R.	DESCRIÇÃO	OBSERVAÇÕES			
1	EXECUÇÃO DE CAIXA DE CONTENÇÃO	E56+10			
2	EXECUÇÃO DE DESCIDA D'ÁGUA	E56 LE			
3	EXECUÇÃO DE SARJETA TRIANGULAR	E45 A E49			
4	DESOBSTRUÇÃO DE BUEIRO	TREVO DO ACESSO COM A BR262			
5	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO				
6	SINALIZAÇÃO				
7	EXECUÇÃO DE CORTE E DESVIO D'ÁGUA	EXECUÇÃO EM DIREÇÃO AO B324 LE			
REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATORIOS)					
 14 de nov. de 2023 14:20:30 Data não informada  14 de nov. de 2023 15:52:50 Estrada sem nome Santo Antônio do Grama Minas Gerais Data não informada					





NÚMERO DE OC		TIPO DE OCORRÊNCIA	OCORRÊNCIAS	DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA
EQUIPE E05 14/11/2023			OBSERVAÇÕES	
MUNICÍPIO			CONFERÊNCIA	
Obs.:			CONSÓRCIO (Aprovado em 16/11/2023 - 16:29)	
			Obs.: *Drenagem: Construção de sarjeta total 80mts. *Construção de caixa de contenção.	
			ASSINATURAS	
Luiz Henrique da Silva Borges Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 208579/D		PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA CREA 137.103/D		Luciano Xavier de Castro RT de Execução - CONSÓRCIO 3T-SOLOCAP-CONEP CREA 59784/D



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº 0135	OBRA: CTP 229/2023 - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA		CONTRATO:		RESP. TÉCNICO: LUCIANO XAVIER		
ENDEREÇO: ESTRADA DE ACESSO ENTRE SANTO ANTÔNIO DO GRAMA E ABRE CAMPO			INÍCIO: 01/04/2023		Nº CREA-MG: 59784/D		
CIDDE:			PRAZO: 01/10/2023		Nº DA ART:		
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA			UF:		COORDENADAS:		
DATA: 14/11/2023			SOL ☀		IMPRATICÁVEL ☁		
MANHÃ			✓				
TARDE			✓				
QTDE		MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO		QTDE		MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	
1		ENCARREGADO DE OBRAS		2		OPERADOR	
1		MOTORISTA		1		PEDREIRO	
2		AJUDANTE					
QTDE				EQUIPAMENTO			
1		ESCAVADEIRA					
1		CAMINHÃO BASCULANTE					
1		RETROESCAVADEIRA					
TAREFAS REALIZADAS							
NÚMERO DE T.R.		DESCRIÇÃO		OBSERVAÇÕES			
1		EXECUÇÃO DE CAIXA DE CONTENÇÃO		REGIÃO DA E56+10			
2		SINALIZAÇÃO					
3		EXECUÇÃO DE CERCA		E53 A E59			
4		EXECUÇÃO DE SARJETA TRIANGULAR		E49 A E53			
REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)							






NÚMERO DE OC		TIPO DE OCORRÊNCIA	OCORRÊNCIAS	DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA
EQUIPE E05 13/11/2023			OBSERVAÇÕES	
MUNICÍPIO			CONFERÊNCIA	
Obs.:			CONSÓRCIO (Aprovado em 16/11/2023 - 16:30)	
			Obs.: *Construção da caixa de contenção. *Construção de sarjeta *Cerca: Est. 179 a Est. 183.	
			ASSINATURAS	
Luiz Henrique da Silva Borges Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 208579/D		PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA CREA 137.103/D		Luciano Xavier de Castro RT de Execução - CONSÓRCIO 3T-SOLOCAP-CONEP CREA 59784/D



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº 0134		OBRA: CTP 229/2023 - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA		CONTRATO:		RESP. TÉCNICO: LUCIANO XAVIER		
ENDEREÇO: ESTRADA DE ACESSO ENTRE SANTO ANTÔNIO DO GRAMA E ABRE CAMPO				INÍCIO: 01/04/2023		Nº CREA-MG: 59784/D		
CIDDE:				PRAZO: 01/10/2023		Nº DA ART:		
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA				UF:		COORDENADAS:		
DATA: 13/11/2023		SOL ☀		NUBLADO ☁		CHUVA ☔		
MANHÃ		✓				IMPRATICÁVEL ☁		
TARDE		✓						
QTDE		MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO			QTDE		MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	
1		AUXILIAR DE ENGENHARIA			1		ENCARREGADO DE OBRAS	
2		OPERADOR			3		MOTORISTA	
1		PEDREIRO			2		AJUDANTE	
QTDE		EQUIPAMENTO						
1		ESCAVADEIRA						
1		VEÍCULO DE APOIO						
1		CAMINHÃO PIPA						
2		CAMINHÃO BASCULANTE						
1		RETROESCAVADEIRA						
TAREFAS REALIZADAS								
NÚMERO DE T.R.		DESCRIÇÃO			OBSERVAÇÕES			
1		EXECUÇÃO DE SARJETA						
2		EXECUÇÃO DE ATERRO (PISTA AUXILIAR)			E278 A E286			
3		SINALIZAÇÃO						
REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATORIOS)								



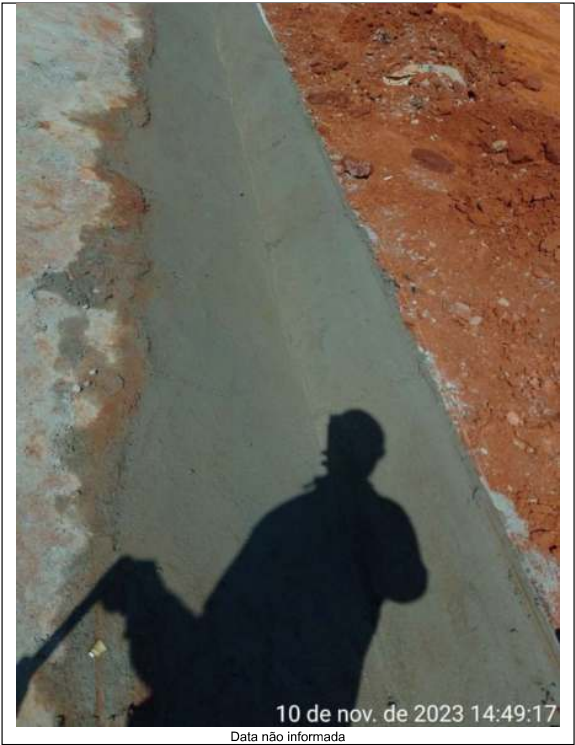

OCORRÊNCIAS	
NÚMERO DE OC	TIPO DE OCORRÊNCIA
OBSERVAÇÕES	
EQUIPE E05 10/11/2023	
CONFERÊNCIA	
MUNICÍPIO	CONSÓRCIO (Aprovado em 16/11/2023 - 16:33)
Obs.:	Obs.: *Drenos: Sarjeta nas Est. 49 até 58. *Terraplenagem: Aterro nas bordas dos aterros nas Est. 277 até Est. 286. *Trevo 262, bueiro Est. 212 e caixa de bueiros ainda não concluídas. *Necessário localização nas fotos.
ASSINATURAS	
Luiz Henrique da Silva Borges Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 208579/D	PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA CREA 137.103/D
Luciano Xavier de Castro RT de Execução - CONSÓRCIO 3T-SOLOCAP-CONEP CREA 59784/D	



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº 0133	OBRA: CTP 229/2023 - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	CONTRATO:	RESP. TÉCNICO: LUCIANO XAVIER
ENDEREÇO: ESTRADA DE ACESSO ENTRE SANTO ANTÔNIO DO GRAMA E ABRE CAMPO	INÍCIO: 01/04/2023	Nº CREA-MG: 59784/D	
CIDDE:	PRAZO: 01/10/2023	Nº DA ART:	
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA	UF:	COORDENADAS:	
DATA: 13/11/2023	SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA ☔
MANHÃ	✓		IMPRATICÁVEL ☁
TARDE	✓		
QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
1	AUXILIAR DE ENGENHARIA	1	ENCARREGADO DE OBRAS
2	OPERADOR	3	MOTORISTA
1	PEDREIRO	3	AJUDANTE
QTDE	EQUIPAMENTO		
1	ESCAVADEIRA		
1	VEÍCULO DE APOIO		
1	CAMINHÃO PIPA		
2	CAMINHÃO BASCULANTE		
1	RETROESCAVADEIRA		
TAREFAS REALIZADAS			
NUMERO DE T.R.	DESCRIÇÃO	OBSERVAÇÕES	
1	EXECUÇÃO DE ATERRO (PISTA AUXILIAR)	E278 A E286	
2	EXECUÇÃO DE SARJETA		
3	SINALIZAÇÃO		


REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATORIOS)



Data não informada



Data não informada

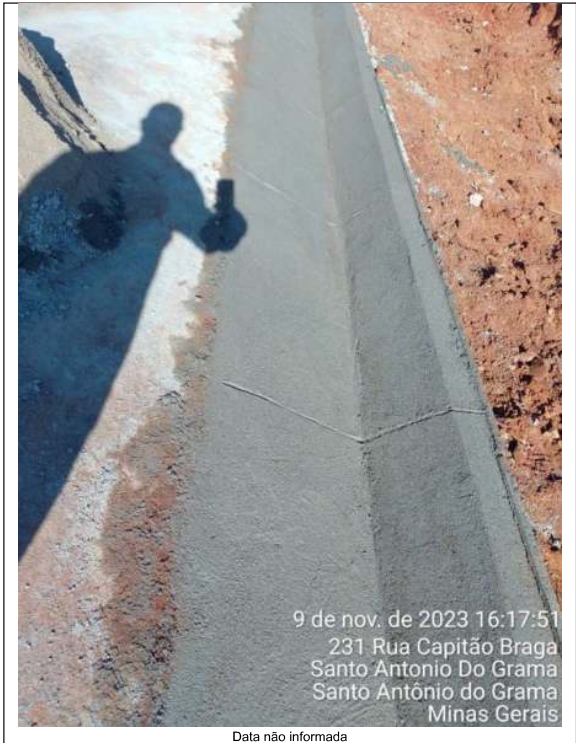

NÚMERO DE OC		OCORRÊNCIAS	DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA
EQUIPE E05 09/11/2023		OBSERVAÇÕES	
MUNICÍPIO		CONFERÊNCIA	
Obs.:		CONSÓRCIO (Aprovado em 17/11/2023 - 13:50)	
		Obs.: *Construção de sarjetas nas Est. 56 a Est. 64. *Terraplenagem: Alerto nos acessos nas entradas dos sítios.	
		ASSINATURAS	
Luiz Henrique da Silva Borges Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 208579/D		PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA CREA 137.103/D	Luciano Xavier de Castro RT de Execução - CONSÓRCIO 3T -SOLOCAP-CONEP CREA 59784/D



CIMVALPI
CONSORCIO INTERMUNICIPAL
MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº 0132		OBRA: CTP 229/2023 - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA		CONTRATO:		RESP. TÉCNICO: LUCIANO XAVIER	
ENDEREÇO: ESTRADA DE ACESSO ENTRE SANTO ANTÔNIO DO GRAMA E ABRE CAMPO		INÍCIO: 01/04/2023		Nº CREA-MG: 59784/D			
CIDDE:		PRAZO: 01/10/2023		Nº DA ART:			
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA		UF:		COORDENADAS:			
DATA: 13/11/2023	SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA ☔	IMPRATICÁVEL ☔			
MANHÃ	✓						
TARDE	✓						
QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO			QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO		
1	ENCARREGADO DE OBRAS			2	OPERADOR		
3	MOTORISTA			1	PEDREIRO		
3	AJUDANTE						
QTDE	EQUIPAMENTO						
1	ESCAVADEIRA						
1	VEÍCULO DE APOIO						
1	CAMINHÃO PIPA						
2	CAMINHÃO BASCULANTE						
1	RETROESCAVADEIRA						
TAREFAS REALIZADAS							
NUMERO DE T.R.	DESCRIÇÃO				OBSERVAÇÕES		
1	EXECUÇÃO DE ATERRO (PISTA AUXILIAR)				E278 A E286		
2	SINALIZAÇÃO						
3	EXECUÇÃO DE DESCIDA D'ÁGUA						
4	EXECUÇÃO DE VALETA/SAJETA						
REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATORIOS)							
 8 de nov. de 2023 16:04:28 Estrada sem nome Santo Antonio do Grama Minas Gerais Data não informada				 8 de nov. de 2023 16:04:07 231 Rua Capitão Braga Santo Antonio Do Grama Santo Antônio do Grama Minas Gerais Data não informada			



NÚMERO DE OC		TIPO DE OCORRÊNCIA	OCORRÊNCIAS	DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA
EQUIPE E05 08/11/2023			OBSERVAÇÕES	
MUNICÍPIO			CONFERÊNCIA	CONSÓRCIO (Aprovado em 17/11/2023 - 13:54)
Obs.:				Obs.: *Conforme executado em campo.
			ASSINATURAS	
Luiz Henrique da Silva Borges Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 208579/D		PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA CREA 137.103/D		Luciano Xavier de Castro RT de Execução - CONSÓRCIO 3T-SOLOCAP-CONEP CREA 59784/D




RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº 0131	OBRA: CTP 229/2023 - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	CONTRATO:	RESP. TÉCNICO: LUCIANO XAVIER
ENDEREÇO: ESTRADA DE ACESSO ENTRE SANTO ANTÔNIO DO GRAMA E ABRE CAMPO	INÍCIO: 01/04/2023	Nº CREA-MG: 59784/D	
CIDDE:	PRAZO: 01/10/2023	Nº DA ART:	
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA	UF:	COORDENADAS:	
DATA: 13/11/2023	SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA ☔
MANHÃ	✓		IMPRATICÁVEL ☁
TARDE	✓		
QTDE	MAO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MAO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
1	AUXILIAR DE ENGENHARIA	1	ENCARREGADO DE OBRAS
2	OPERADOR	3	MOTORISTA
1	PEDREIRO	3	AJUDANTE
QTDE	EQUIPAMENTO		
1	ESCAVADEIRA		
1	VEÍCULO DE APOIO		
1	CAMINHÃO PIPA		
2	CAMINHÃO BASCULANTE		
1	RETROESCAVADEIRA		
	TAREFAS REALIZADAS		
NUMERO DE T.R.	DESCRIÇÃO	OBSERVAÇÕES	
1	EXECUÇÃO DE VALETA/SAJETA		
2	SINALIZAÇÃO		
3	EXECUÇÃO DE ATERRO (PISTA AUXILIAR)	E278 A E286	

REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATORIOS)



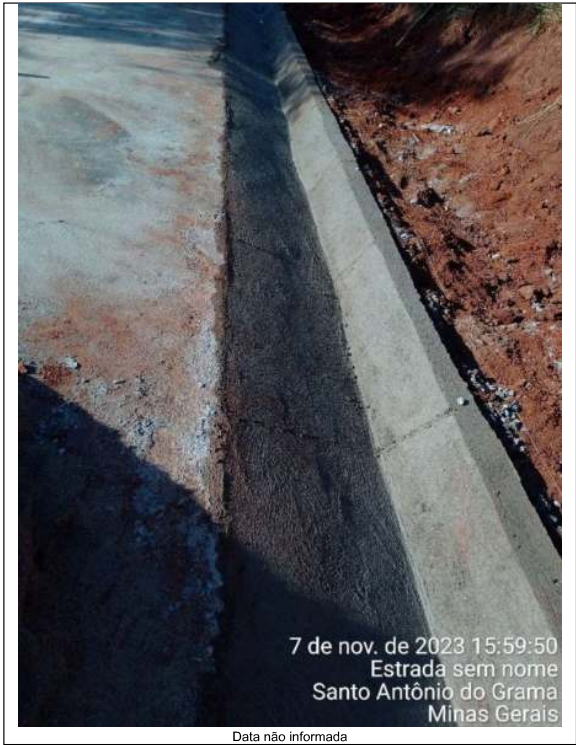

NÚMERO DE OC		OCORRÊNCIAS	
TIPO DE OCORRÊNCIA		OBSERVAÇÕES	DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA
EQUIPE E05 07/11/2023			
		CONFERÊNCIA	
MUNICÍPIO		CONSÓRCIO (Aprovado em 16/11/2023 - 16:35)	
Obs.:		Obs.: *Drenagem: Construção de sarjeta nas Est. 42 até Est. 45. *Terraplenagem: Aterro na pista nas Est. 277 até Est. 286.	
ASSINATURAS			
Luiz Henrique da Silva Borges Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 208579/D		PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA CREA 137.103/D	
		Luciano Xavier de Castro RT de Execução - CONSÓRCIO 3T –SOLOCAP-CONEPP CREA 59784/D	




RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº 0130	OBRA: CTP 229/2023 - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	CONTRATO:	RESP. TÉCNICO: LUCIANO XAVIER
ENDEREÇO: ESTRADA DE ACESSO ENTRE SANTO ANTÔNIO DO GRAMA E ABRE CAMPO	INÍCIO: 01/04/2023	Nº CREA-MG: 59784/D	
CIDDE:	PRAZO: 01/10/2023	Nº DA ART:	
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA	UF:	COORDENADAS:	
DATA: 13/11/2023	SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA ☔
MANHÃ	✓		IMPRATICÁVEL ☔
TARDE	✓		
QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
1	AUXILIAR DE ENGENHARIA	1	ENCARREGADO DE OBRAS
2	OPERADOR	3	MOTORISTA
1	PEDREIRO	3	AJUDANTE
QTDE	EQUIPAMENTO		
1	ESCAVADEIRA		
1	VEÍCULO DE APOIO		
1	CAMINHÃO PIPA		
2	CAMINHÃO BASCULANTE		
1	RETROESCAVADEIRA		
	TAREFAS REALIZADAS		
NÚMERO DE T.R.	DESCRIÇÃO	OBSERVAÇÕES	
1	EXECUÇÃO DE DESCIDA D'ÁGUA		
2	EXECUÇÃO DE ATERRO (PISTA AUXILIAR)	E278 A E286	
3	SINALIZAÇÃO		
4	EXECUÇÃO DE VALETA/SAJETA		

REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATORIOS)



Data não informada

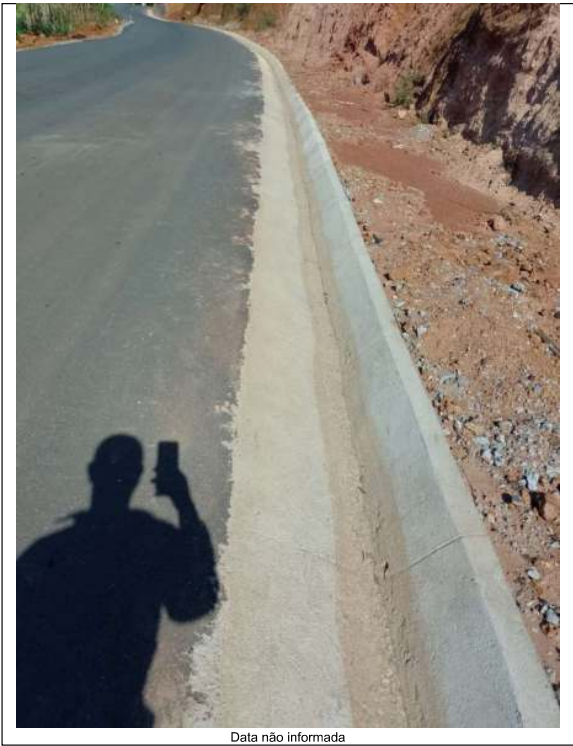

Data não informada





Data não informada

OCORRÊNCIAS		
NÚMERO DE OC	TIPO DE OCORRÊNCIA	
DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA		
OBSERVAÇÕES		
EQUIPE E05 06/11/2023 O APARELHO DISPONÍVEL PARA TIRAR AS FOTOS NESSE DIA NÃO TINHA O RECURSO DE ADICIONAR DATA E LOCALIZAÇÃO NAS FOTOS. NESSE SENTIDO, FORAM ADICIONADAS AS FOTOS SEM ESSAS INFORMAÇÕES, MESMOO CIENTE DA EXIGÊNCIA DE TAIS REGISTROSNO, INTUITO DE NÃO DEIXAR ESSE RDO SEM EVIDÊNCIAS.		
CONFERÊNCIA		
MUNICÍPIO	CONSÓRCIO (Reprovado)	
Obs.:	Obs.:	
ASSINATURAS		
Luiz Henrique da Silva Borges Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 208579/D	PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA CREA 137.103/D	Luciano Xavier de Castro RT de Execução - CONSÓRCIO 3T-SOLOCAP-CONEP CREA 59784/D

Atenção

Undefined offset: 0



CIMVALPI
CONSORCIO INTERMUNICIPAL
MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº 0129	OBRA: CTP 229/2023 - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA		CONTRATO:	RESP. TÉCNICO: LUCIANO XAVIER	
ENDEREÇO: ESTRADA DE ACESSO ENTRE SANTO ANTÔNIO DO GRAMA E ABRE CAMPO			INÍCIO: 01/04/2023		Nº CREA-MG: 59784/D
CIDDE:			PRAZO: 01/10/2023		Nº DA ART:
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA			UF:		COORDENADAS:
DATA:	SOL ☀		NUBLADO ☁	CHUVA ☔	IMPRATICÁVEL 🚧
QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO		QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	
QTDE	EQUIPAMENTO				
TAREFAS REALIZADAS					
NÚMERO DE T.R.	DESCRIÇÃO		OBSERVAÇÕES		
REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)					
OCORRÊNCIAS					
NÚMERO DE OC		TIPO DE OCORRÊNCIA		DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA	
OBSERVAÇÕES					
EQUIPE E05 03/11/2023 NÃO HOUVE ATIVIDADE DEVIDO AO RECESSO DE FERIADO					
CONFERÊNCIA					
MUNICÍPIO			CONSÓRCIO (Aprovado em 17/11/2023 - 14:01)		
Obs.:			Obs.: *SEM ATIVIDADES.		
ASSINATURAS					
Luiz Henrique da Silva Borges Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 208579/D		PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA CREA 137.103/D		Luciano Xavier de Castro RT de Execução - CONSÓRCIO 3T -SOLOCAP-CONEP CREA 59784/D	



Atenção

Undefined offset: 0



CIMVALPI
CONSORCIO INTERMUNICIPAL
MULTISETORIAL DO VALE DO PIRANGA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº 0128	OBRA: CTP 229/2023 - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA		CONTRATO:	RESP. TÉCNICO: LUCIANO XAVIER	
ENDEREÇO: ESTRADA DE ACESSO ENTRE SANTO ANTÔNIO DO GRAMA E ABRE CAMPO			INÍCIO: 01/04/2023	Nº CREA-MG: 59784/D	
CIDDE:			PRAZO: 01/10/2023	Nº DA ART:	
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA			UF:	COORDENADAS:	
DATA:	SOL ☀		NUBLADO ☁	CHUVA ☔	IMPRATICÁVEL 🚧
QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO		QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	
QTDE	EQUIPAMENTO				
TAREFAS REALIZADAS					
NÚMERO DE T.R.	DESCRIÇÃO		OBSERVAÇÕES		
REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)					
OCORRÊNCIAS					
NÚMERO DE OC	TIPO DE OCORRÊNCIA		DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA		
OBSERVAÇÕES					
EQUIPE E05 02/11/2023 NÃO HOUVE ATIVIDADE DEVIDO AO FERIADO.					
CONFERÊNCIA					
MUNICÍPIO	CONSÓRCIO (Aprovado em 17/11/2023 - 14:01)				
Obs.:	Obs.: *SEM ATIVIDADES.				
ASSINATURAS					
Luiz Henrique da Silva Borges Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 208579/D		PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA CREA 137.103/D		Luciano Xavier de Castro RT de Execução - CONSÓRCIO 3T -SOLOCAP-CONEP CREA 59784/D	





RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº 0127	OBRA: CTP 229/2023 - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	CONTRATO:	RESP. TÉCNICO: LUCIANO XAVIER
ENDEREÇO: ESTRADA DE ACESSO ENTRE SANTO ANTÔNIO DO GRAMA E ABRE CAMPO		INÍCIO: 01/04/2023	Nº CREA-MG: 59784/D
CIDDE:		PRAZO: 01/10/2023	Nº DA ART:
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA		UF:	COORDENADAS:
DATA: 13/11/2023	SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA ☔
MANHÃ	✓		IMPRATICÁVEL ☔
TARDE	✓		
QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
1	ENCARREGADO DE OBRAS	3	OPERADOR
2	MOTORISTA	1	PEDREIRO
2	AJUDANTE		
QTDE	EQUIPAMENTO		
1	ESCAVADEIRA		
1	ROLO DE PNEU		
1	VEÍCULO DE APOIO		
1	CAMINHÃO PIPA		
1	CAMINHÃO BASCULANTE		
1	RETROESCAVADEIRA		
TAREFAS REALIZADAS			
NÚMERO DE T.R.	DESCRIÇÃO	OBSERVAÇÕES	
1	EXECUÇÃO DE VALETA E SAJETA		
2	SINALIZAÇÃO		
REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATORIOS)			



NÚMERO DE OC	TIPO DE OCORRÊNCIA	OCORRÊNCIAS	DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA
EQUIPE E05 01/11/2023		OBSERVAÇÕES	
CONFERÊNCIA			
MUNICÍPIO	CONSÓRCIO (Aprovado em 17/11/2023 - 14:04)		
Obs.:	Obs.: *Conforme executado em campo.		
ASSINATURAS			



Luiz Henrique da Silva Borges Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 208579/D	PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA CREA 137.103/D	Luciano Xavier de Castro RT de Execução - CONSÓRCIO 3T –SOLOCAP-CONEP CREA 59784/D
--	--	--





CIMVALPI
CONSORCIO INTERMUNICIPAL
MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº 0126

OBRA: CTP 229/2023 - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA

ENDEREÇO: ESTRADA DE ACESSO ENTRE SANTO ANTÔNIO DO GRAMA E ABRE CAMPO

CIDDE:

DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA

DATA: 01/11/2023

MANHÃ

TARDE

CONTRATO:

INÍCIO: 01/04/2023

PRAZO: 01/10/2023

UF:

RESP. TÉCNICO: LUCIANO XAVIER

Nº CREA-MG: 59784/D

Nº DA ART:

COORDENADAS:

SOL ☀️

NUBLADO ☁️

CHUVA 🌧️

IMPRATICÁVEL 🌫️

QTDE

MÃO DE OBRA INDIRETA
FUNÇÃO / CARGO

QTDE

MÃO DE OBRA INDIRETA
FUNÇÃO / CARGO

1

ENCARREGADO DE OBRAS

3

OPERADOR

2

MOTORISTA

1

PEDREIRO

2

AJUDANTE

QTDE

EQUIPAMENTO

1

ESCAVADEIRA

1

ROLO DE PNEU

1

VEÍCULO DE APOIO

1

CAMINHÃO PIPA

1

CAMINHÃO BASCULANTE

1

RETROESCAVADEIRA

TAREFAS REALIZADAS

NÚMERO DE T.R.

DESCRIÇÃO

OBSERVAÇÕES

1

EXECUÇÃO DE ENROCAMENTO DE ALA DE BUEIRO

B212 LD

2

ABERTURA/ASSENTAMENTO DE GABARITO VALETA/SARJETA

E16 A E18

3

EXECUÇÃO DE ALA DE BUEIRO

B200 LD

4

EXECUÇÃO DE AMPLIAÇÃO DE CAIXA DE BUEIRO

B230 LD

5

UMECTAÇÃO

6

SINALIZAÇÃO

7

EXECUÇÃO DE SARJETA

E18 A E21

REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATORIOS)



31 de out. de 2023 15:34:40

Data não informada



31 de out. de 2023 16:11:49
231 Rua Capitão Braga
Santo Antonio Do Grama
Santo Antônio do Grama
Minas Gerais

Data não informada



Pag.: 27 / 63 ID. do Doc.: 1A1.318 - 27/11/2023 - 13:54:58 - ASSINADO POR(3): CPF:015.49*. **6.*9 CPF:760.22*. **6.*5 CPF:016.28*. **6.*7

https://sistemas.waysistemas.com/cimvalpi/Blk_Medicao_Relatorio_Parcial/

26/61



NÚMERO DE OC		TIPO DE OCORRÊNCIA	OCORRÊNCIAS	DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA
EQUIPE E05 31/10/2023 OS PROPRIETÁRIOS DOS IMÓVEIS PRÓXIMOS ÀS ESTACAS E180 E E202 INFORMARAM QUE NÃO QUEREM QUE SEJA CONSTRUÍDO O PASSA GADO ADENTRANDO SUAS PROPRIEDADES		OBSERVAÇÕES		
MUNICÍPIO		CONFERÊNCIA		
Obs.:		CONSORCIO (Aprovado em 07/11/2023 - 08:41)		
		Obs.: *Drenos: Construção de sarjeta nas Est. 17 a Est. 21, Saída de agua nas Est. 202 e Est. 02, *Terraplenagem: Finalizando as entradas das Est. 222 e 205.		
		ASSINATURAS		
Luiz Henrique da Silva Borges Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 208579/D		PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA CREA 137.103/D		Luciano Xavier de Castro RT de Execução - CONSÓRCIO 3T-SOLOCAP-CONEP CREA 59784/D




RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº 0125	OBRA: CTP 229/2023 - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	CONTRATO:	RESP. TÉCNICO: LUCIANO XAVIER
ENDEREÇO: ESTRADA DE ACESSO ENTRE SANTO ANTÔNIO DO GRAMA E ABRE CAMPO	INÍCIO: 01/04/2023	Nº CREA-MG: 59784/D	
CIDDE:	PRAZO: 01/10/2023	Nº DA ART:	
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA	UF:	COORDENADAS:	
DATA: 31/10/2023	SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA ☔
MANHÃ	✓		IMPRATICÁVEL ☔
TARDE	✓		
QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
1	ENCARREGADO DE OBRAS	3	OPERADOR
1	MOTORISTA	1	PEDREIRO
2	AJUDANTE		
QTDE	EQUIPAMENTO		
1	ESCAVADEIRA		
1	VEÍCULO DE APOIO		
1	CAMINHÃO PIPA		
1	RETROESCAVADEIRA		
TAREFAS REALIZADAS			
NÚMERO DE T.R.	DESCRIÇÃO	OBSERVAÇÕES	
1	SINALIZAÇÃO		
2	ABERTURA/ASSENTAMENTO DE GABARITO VALETA/SARJETA	E02 A E03; E19 A E21	
3	EXECUÇÃO DE ALA DE BUEIRO	B200 LD	
4	UMECTAÇÃO		
5	ABERTURA DE CAIXA P/ EXECUÇÃO DE PASSA GADO	E202	

REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)



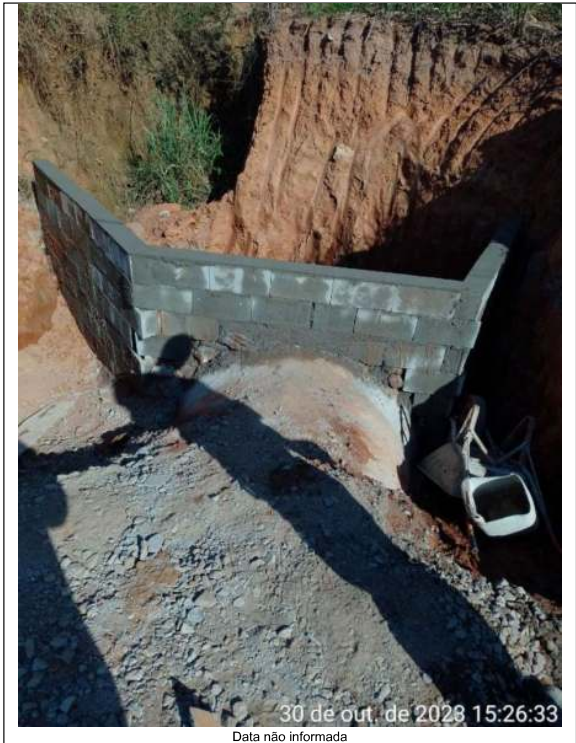

NÚMERO DE OC		OCORRÊNCIAS	DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA
TIPO DE OCORRÊNCIA		OBSERVAÇÕES	
EQUIPE E05 30/10/2023		CONFERÊNCIA	
MUNICÍPIO		CONSÓRCIO (Aprovado em 01/11/2023 - 09:36)	
Obs.:		Obs.: "Drenos - Gabaritos Est. 19 até Est. 21 e Est. 02 até Est. 03. *Início da construção dos passa gados Est. 202. Serviço não paralisado por ordem do proprietário.	
ASSINATURAS			
Luiz Henrique da Silva Borges Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 208579/D		PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA CREA 137.103/D	
		Luciano Xavier de Castro RT de Execução - CONSÓRCIO 3T –SOLOCAP-CONEPP CREA 59784/D	



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº 0124	OBRA: CTP 229/2023 - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	CONTRATO:	RESP. TÉCNICO: LUCIANO XAVIER
ENDEREÇO: ESTRADA DE ACESSO ENTRE SANTO ANTÔNIO DO GRAMA E ABRE CAMPO	INÍCIO: 01/04/2023	Nº CREA-MG: 59784/D	
CIDDE:	PRAZO: 01/10/2023	Nº DA ART:	
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA	UF:	COORDENADAS:	
DATA: 30/10/2023	SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA ☔
MANHÃ	✓		IMPRATICÁVEL ☁
TARDE	✓		
QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
1	OPERADOR DE ESPARGIDOR	1	ENCARREGADO DE OBRAS
1	MESISTA	1	OPERADOR
1	MOTORISTA	2	RASTELEIRO
QTDE	EQUIPAMENTO		
1	ROLO LISO		
1	VIBROACABADORA		
1	ESPARGIDOR		
1	VEÍCULO DE APOIO		
1	CAMINHÃO BASCULANTE		
1	ROLO COMBINADO (CHAPA/PNEU)		
TAREFAS REALIZADAS			
NÚMERO DE T.R.	DESCRIÇÃO	OBSERVAÇÕES	
1	PINTURA DE LIGAÇÃO		
2	SINALIZAÇÃO		
3	APLICAÇÃO/COMPACTAÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA		

REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATORIOS)



Data não informada



Data não informada



Data não informada




Data não informada



Data não informada



Data não informada

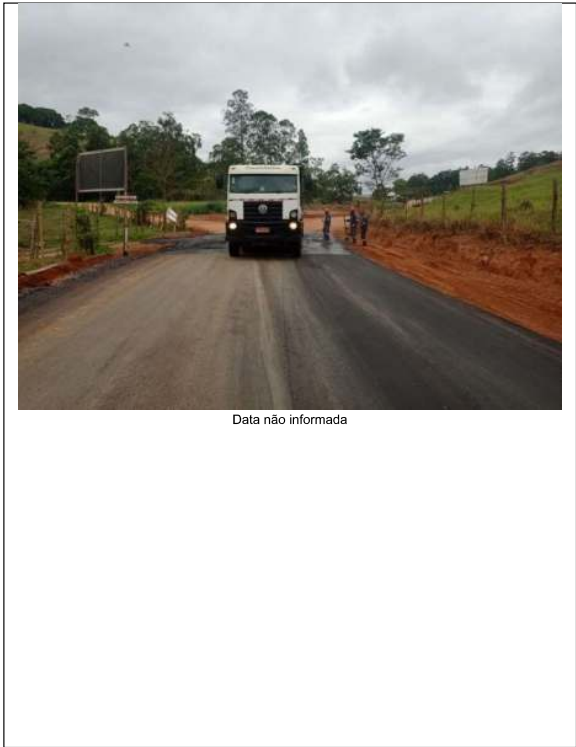

Data não informada



Data não informada

NÚMERO DE OC		OCORRÊNCIAS	
TIPO DE OCORRÊNCIA		DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA	
EQUIPE E04 29/10/2023		OBSERVAÇÕES	
		CONFERÊNCIA	
MUNICÍPIO		CONSÓRCIO (Reprovado)	
Obs.:		Obs.: *FOTOS SEM DATA, HORA E LOCALIZAÇÃO - REPROVADO	
ASSINATURAS			
Luiz Henrique da Silva Borges Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 208579/D		PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA CREA 137.103/D	
		Luciano Xavier de Castro RT de Execução - CONSÓRCIO 3T –SOLOCAP-CONEPP CREA 59784/D	




CIMVALPI
CONSORCIO INTERMUNICIPAL
MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº 0123		OBRA: CTP 229/2023 - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA		CONTRATO:		RESP. TÉCNICO: LUCIANO XAVIER	
ENDEREÇO: ESTRADA DE ACESSO ENTRE SANTO ANTÔNIO DO GRAMA E ABRE CAMPO		INÍCIO: 01/04/2023		Nº CREA-MG: 59784/D			
CIDDE:		PRAZO: 01/10/2023		Nº DA ART:			
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA		UF:		COORDENADAS:			
DATA: 30/10/2023		SOL ☀		NUBLADO ☁		CHUVA ☔	
MANHÃ		✓				IMPRATICÁVEL ☔	
TARDE		✓					
QTDE	MAO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO			QTDE	MAO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO		
1	AUXILIAR DE ENGENHARIA			1	OPERADOR DE ESPARGIDOR		
1	ENCARREGADO DE OBRAS			1	MESISTA		
4	OPERADOR			4	MOTORISTA		
1	GREIDISTA			2	RASTELEIRO		
QTDE	EQUIPAMENTO						
1	ROLO LISO						
1	ESCAVADEIRA						
1	ROLO DE PNEU						
1	VIBROACABADORA						
1	ESPARGIDOR						
2	VEICULO DE APOIO						
1	CAMINHÃO PIPA						
14	CAMINHÃO BASCULANTE						
1	MOTONIVELADORA						
1	ROLO COMBINADO (CHAPA/PNEU)						
TAREFAS REALIZADAS							
NÚMERO DE T.R.	DESCRIÇÃO				OBSERVAÇÕES		
1	UMECTAÇÃO						
2	PINTURA DE LIGAÇÃO						
3	LANÇAMENTO DE BICA CORRIDA				E207 A E216		
4	EXECUÇÃO DE SUB-BASE				E208 A E2015		
5	APLICAÇÃO/COMPACTAÇÃO DE MASSA ASFALTICA						
6	SINALIZAÇÃO						
REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATORIOS)							
 28 de out de 2023 4:36:57 PM Data não informada  28 de out. de 2023 11:18:00 Data não informada							



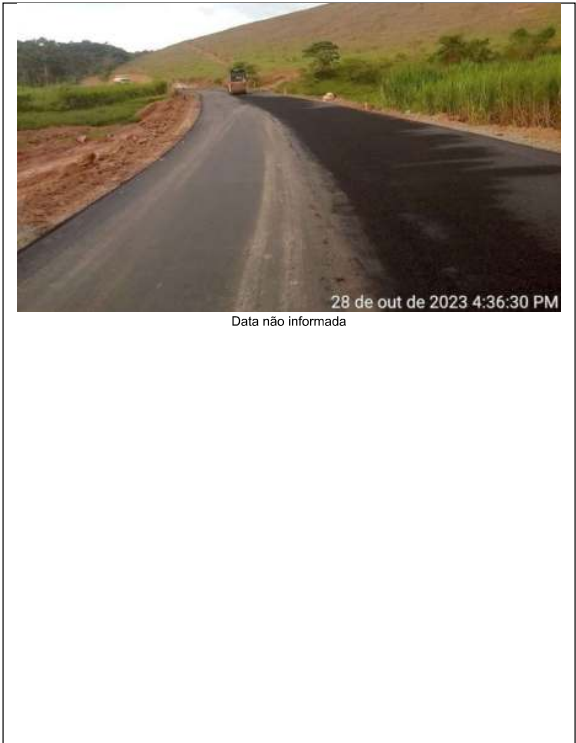





OCORRÊNCIAS	
NÚMERO DE OC	TIPO DE OCORRÊNCIA
EQUIPE E04 E E05 28/10/2023	
OBSERVAÇÕES	
CONFERÊNCIA	
MUNICÍPIO	CONSÓRCIO (Aprovado em 01/11/2023 - 09:25)
Obs.:	Obs.: *Conforme executado em campo.
ASSINATURAS	
Luiz Henrique da Silva Borges Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 208579/D	PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA CREA 137.103/D
Luciano Xavier de Castro RT de Execução - CONSÓRCIO 3T - SOLOCAP-CONEP CREA 59784/D	





RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº 0122	OBRA: CTP 229/2023 - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	CONTRATO:	RESP. TÉCNICO: LUCIANO XAVIER
ENDEREÇO: ESTRADA DE ACESSO ENTRE SANTO ANTÔNIO DO GRAMA E ABRE CAMPO	INÍCIO: 01/04/2023	Nº CREA-MG: 59784/D	
CIDDE:	PRAZO: 01/10/2023	Nº DA ART:	
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA	UF:	COORDENADAS:	
DATA: 30/10/2023	SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA ☔
MANHÃ	✓		IMPRATICÁVEL ☔
TARDE	✓		
QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
1	AUXILIAR DE ENGENHARIA	1	OPERADOR DE ESPARGIDOR
2	ENCARREGADO DE OBRAS	1	MESISTA
6	OPERADOR	5	MOTORISTA
1	PEDREIRO	2	AJUDANTE
1	GREIDISTA	2	RASTELEIRO
QTDE	EQUIPAMENTO		
1	ROLO LISO		
1	ESCAVADEIRA		
1	ROLO DE PNEU		
1	VIBROACABADORA		
1	ESPARGIDOR		
3	VEICULO DE APOIO		
1	CAMINHÃO PIPA		
18	CAMINHÃO BASCULANTE		
1	RETROESCAVADEIRA		
1	MOTONIVELADORA		
1	ROLO COMBINADO (CHAPA/PNEU)		
	TAREFAS REALIZADAS		
NÚMERO DE T.R.	DESCRIÇÃO	OBSERVAÇÕES	
1	SINALIZAÇÃO		
2	EXECUÇÃO DE ALA DE BUEIRO	B200 LD	
3	UMECTAÇÃO		
4	APLICAÇÃO/COMPACTAÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA		
5	EXECUÇÃO DE SUB-BASE	E208 A E215	
6	PINTURA DE LIGAÇÃO		
7	EXECUÇÃO DE SARJETA	E21 A E26	
	REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)		



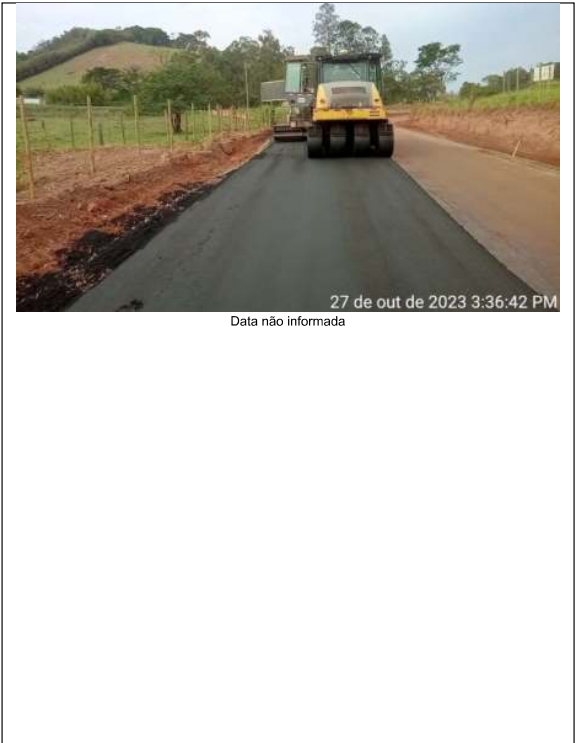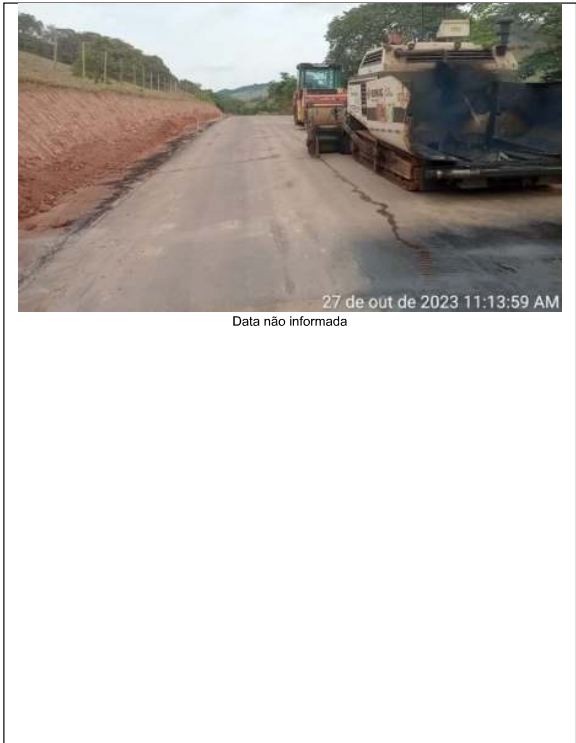

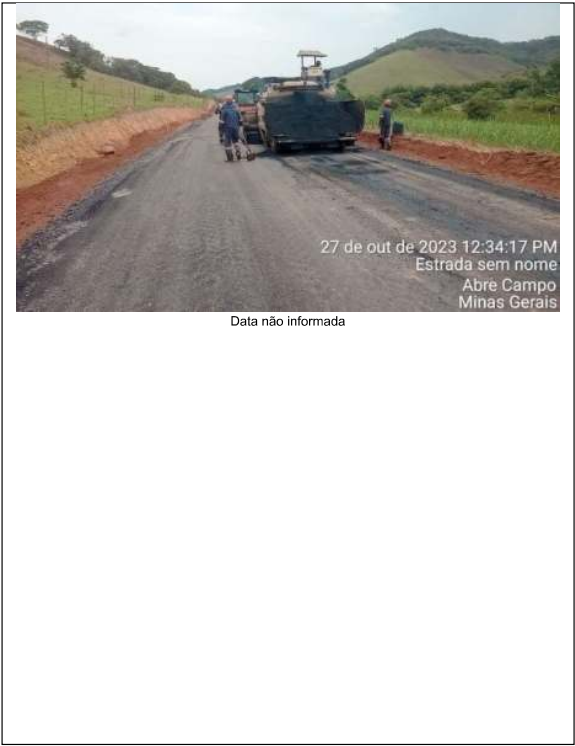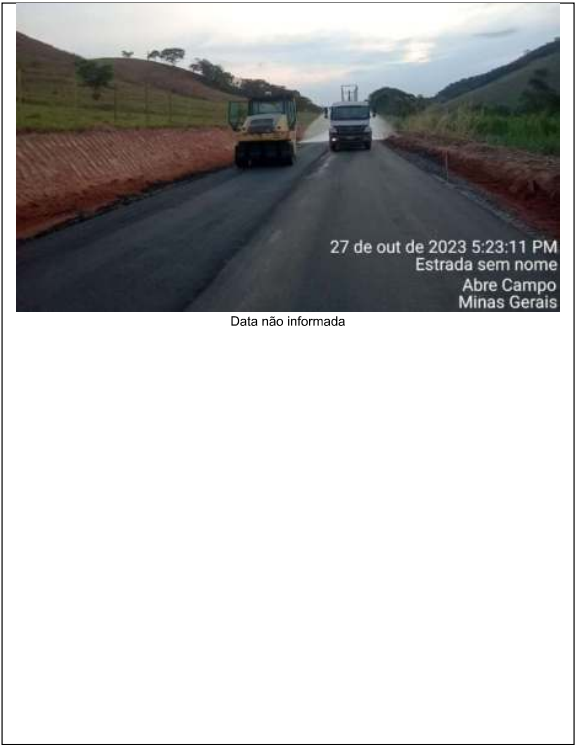



Data não informada



Data não informada

OCORRÊNCIAS	
NÚMERO DE OC	TIPO DE OCORRÊNCIA
OBSERVAÇÕES	
EQUIPE E04 E E05 27/10/2023	
CONFERÊNCIA	
MUNICÍPIO	CONSÓRCIO (Aprovado em 01/11/2023 - 09:23)
Obs.:	Obs.: *Dreno - Construção de sarjeta Est. 17 até Est. 26 (total 106,20mts). Construção de Ala lado direito bueiro Est. 212. *Asfalto - Finalização capa Est. 205 até 214. *Terraplenagem - Lançamento de sub base e BGS nas Est. 205 até Est. 214. *Pendências - Falta enrocamento bueiro Est. 212. Caixa bueiro Est. 230.
ASSINATURAS	
Luiz Henrique da Silva Borges Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 208579/D	PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA CREA 137.103/D
Luciano Xavier de Castro RT de Execução - CONSÓRCIO 3T-SOLOCAP-CONEP CREA 59784/D	







RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº 0121	OBRA: CTP 229/2023 - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	CONTRATO:	RESP. TÉCNICO: LUCIANO XAVIER
ENDEREÇO: ESTRADA DE ACESSO ENTRE SANTO ANTÔNIO DO GRAMA E ABRE CAMPO	INÍCIO: 01/04/2023	Nº CREA-MG: 59784/D	
CIDDE:	PRAZO: 01/10/2023	Nº DA ART:	
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA	UF:	COORDENADAS:	
DATA: 27/10/2023	SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA ☔
MANHÃ	✓		IMPRATICÁVEL ☔
TARDE	✓		
QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
1	AUXILIAR DE ENGENHARIA	1	OPERADOR DE ESPARGIDOR
2	ENCARREGADO DE OBRAS	1	MESISTA
6	OPERADOR	5	MOTORISTA
1	PEDREIRO	2	AJUDANTE
1	GREIDISTA	2	RASTELEIRO
QTDE	EQUIPAMENTO		
1	ROLO LISO		
2	ESCAVADEIRA		
1	ROLO DE PNEU		
1	VIBROACABADORA		
1	ESPARGIDOR		
3	VEICULO DE APOIO		
1	CAMINHÃO PIPA		
13	CAMINHÃO BASCULANTE		
1	RETROESCAVADEIRA		
1	MOTONIVELADORA		
	TAREFAS REALIZADAS		
NÚMERO DE T.R.	DESCRIÇÃO	OBSERVAÇÕES	
1	SINALIZAÇÃO		
2	EXECUÇÃO DE CANALETA/VALETA	E75 A E82	
3	INSTALAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA	REGIÃO DA ESTACA E333	
4	PINTURA DE LIGAÇÃO		
5	APLICAÇÃO/COMPACTAÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA		
6	EXECUÇÃO DE ATERRO	E210 A E212	
7	UMECTAÇÃO		
8	EXECUÇÃO DE ALA DE BUEIRO	B212 LD	
9	COMPACTAÇÃO DE ALA DE BUEIRO	B212	

REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATORIOS)



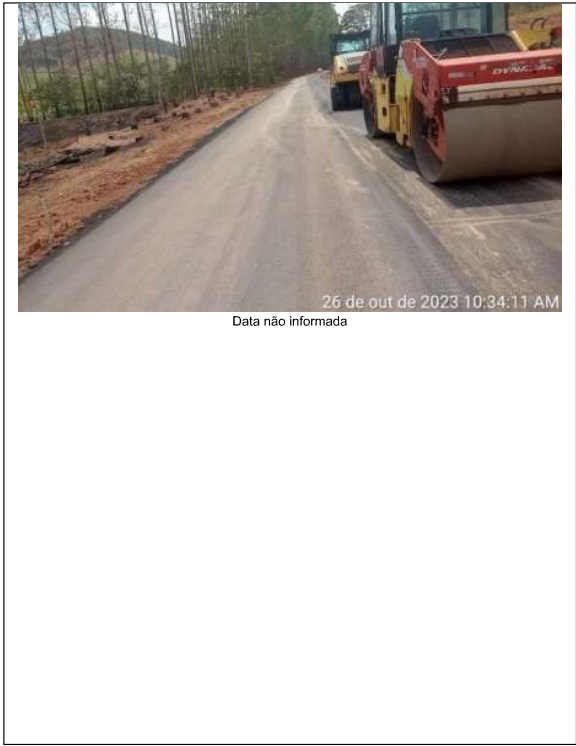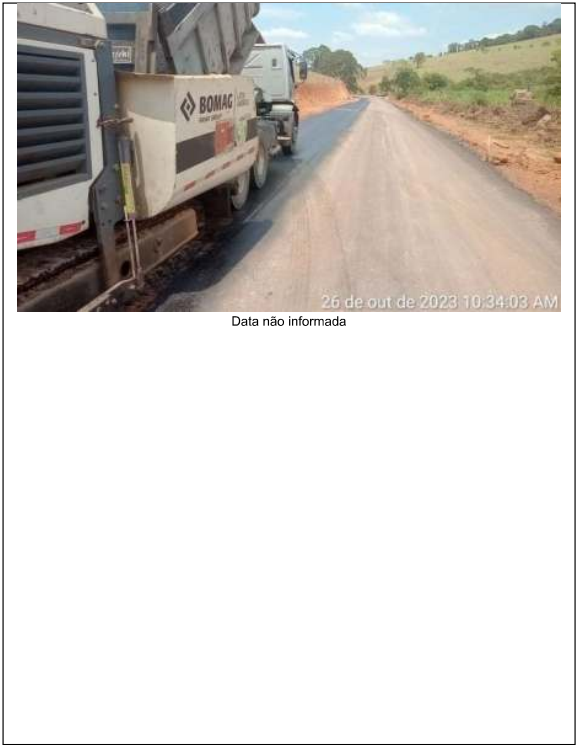

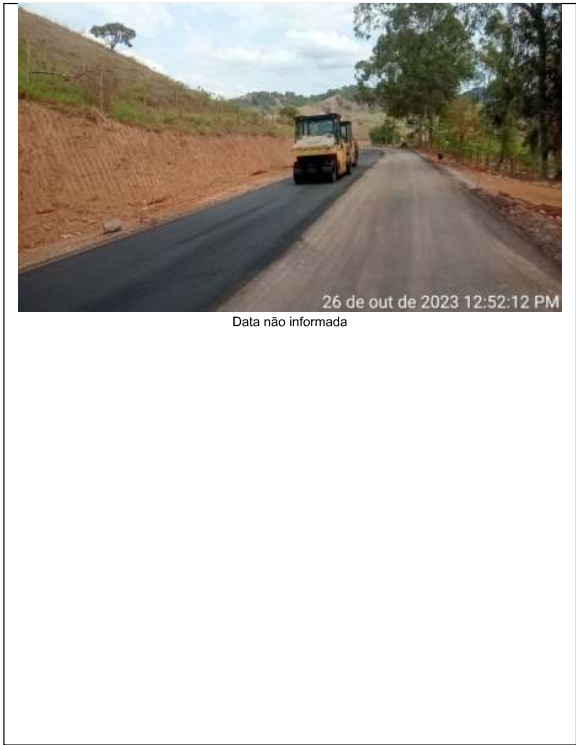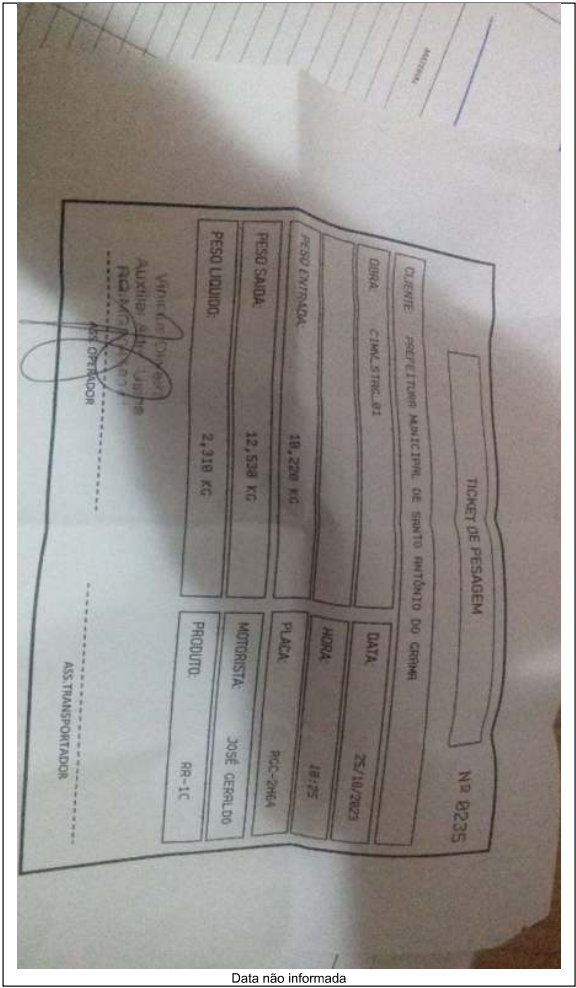



Data não informada



Data não informada



Data não informada

OCORRÊNCIAS	
NÚMERO DE OC	TIPO DE OCORRÊNCIA
EQUIPE E04 E E05 26/10/2023	
OBSERVAÇÕES	
CONFERÊNCIA	
MUNICÍPIO	
CONSÓRCIO (Aprovado em 30/10/2023 - 08:33)	
Obs.: "Drenagem: Construção de sarjeta da Est. 75 até Est. 78. Construção de alas de aduelas na Est. 212. (Total 61,50 mts). "Cerca: Início de construção de cerca da Est. 46 até Est. 64. "Asfalto: Capa conduída Est.308 e salgamento Est. 308 até Est. 333. "Terraplenagem: Aterro da Est. 205 até Est. 214. Transporte de material sub-base para depósito Est. 210.	
ASSINATURAS	
Luiz Henrique da Silva Borges Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 208579/D	PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA CREA 137.103/D
Luciano Xavier de Castro RT de Execução - CONSÓRCIO 3T-SOLOCAP-CONEP CREA 59784/D	




RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº 0120	OBRA: CTP 229/2023 - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	CONTRATO:	RESP. TÉCNICO: LUCIANO XAVIER
ENDEREÇO: ESTRADA DE ACESSO ENTRE SANTO ANTÔNIO DO GRAMA E ABRE CAMPO	INÍCIO: 01/04/2023	Nº CREA-MG: 59784/D	
CIDDE:	PRAZO: 01/10/2023	Nº DA ART:	
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA	UF:	COORDENADAS:	
DATA: 26/10/2023	SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA ☔
MANHÃ	✓	✓	IMPRATICÁVEL ☔
TARDE	✓		
QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
1	AUXILIAR DE ENGENHARIA	1	OPERADOR DE ESPARGIDOR
2	ENCARREGADO DE OBRAS	1	MESISTA
6	OPERADOR	5	MOTORISTA
1	PEDREIRO	1	TOPOGRAFO
2	AJUDANTE	1	GREIDISTA
2	RASTELEIRO		
QTDE	EQUIPAMENTO		
2	ROLO LISO		
2	ESCAVADEIRA		
1	VIBROACABADORA		
1	ESPARGIDOR		
3	VEICULO DE APOIO		
1	CAMINHÃO PIPA		
13	CAMINHÃO BASCULANTE		
1	RETROESCAVADEIRA		
1	MOTONIVELADORA		
1	ROLO COMBINADO (CHAPA/PNEU)		
	TAREFAS REALIZADAS		
NÚMERO DE T.R.	DESCRIÇÃO	OBSERVAÇÕES	
1	EXECUÇÃO DE CANALETA/VALETA	E82 A E84	
2	ABERTURA DE CANALETAS/VALETAS	E76 A E82	
3	UMECTAÇÃO		
4	COLETA DE MATERIAL P/ ENSAIOS LABORATORIAIS	AMOSTRAS COLETADAS NA REGIÃO DAS ESTACAS E314, E319 E E84 (LABORATÓRIO MARCOS MENDES CONSULTORIA)	
5	SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO TOPOGRÁFICO		
6	PINTURA DE LIGAÇÃO		
7	SINALIZAÇÃO		
8	LANÇAMENTO DE BICA CORRIDA	E308 A E333	
9	APLICAÇÃO/COMPACTAÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA		

REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATORIOS)



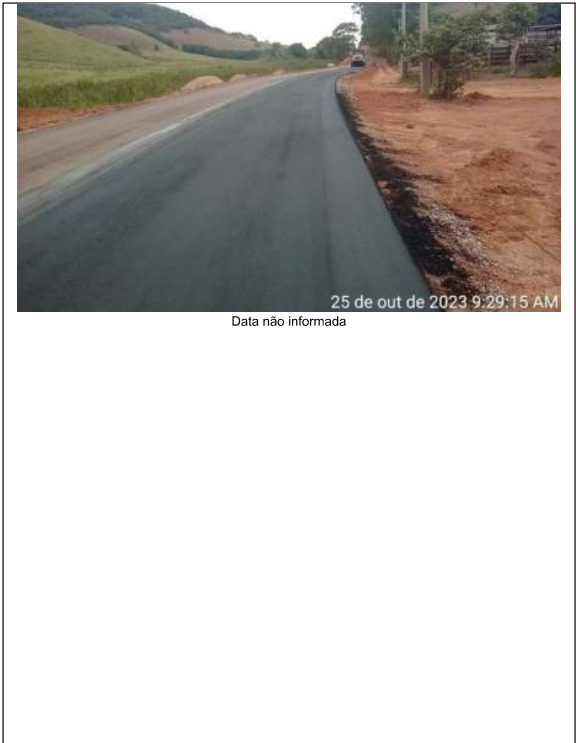



OCORRÊNCIAS		
NÚMERO DE OC	TIPO DE OCORRÊNCIA	
DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA		
OBSERVAÇÕES		
EQUIPE E04 E E05 25/10/2023		
CONFERÊNCIA		
MUNICÍPIO	CONSÓRCIO (Aprovado em 27/10/2023 - 08:28)	
Obs.:	Obs.: *Drenagem: Construção de sarjeta e valetas na Est. 77 a Est. 83 (total 45 mts). *Topografia: Marcação da Est. 308 até Est. 333 para lançamento de BGS, e locação de estacas da Est. 205 até Est. 214, para conclusão do aterro. *Asfalto: Est. 201 até Est. 231 (lado direito). *Terraplenagem: Aterro nas Est. 205 até a Est. 214, Lnaçamento de BGS da Est. 321 até Est. 333.	
ASSINATURAS		
Luiz Henrique da Silva Borges Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 208579/D	PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA CREA 137.103/D	Luciano Xavier de Castro RT de Execução - CONSÓRCIO 3T –SOLOCAP-CONEPP CREA 59784/D





RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº 0119	OBRA: CTP 229/2023 - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	CONTRATO:	RESP. TÉCNICO: LUCIANO XAVIER
ENDEREÇO: ESTRADA DE ACESSO ENTRE SANTO ANTÔNIO DO GRAMA E ABRE CAMPO	INÍCIO: 01/04/2023	Nº CREA-MG: 59784/D	
CIDDE:	PRAZO: 01/10/2023	Nº DA ART:	
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA	UF:	COORDENADAS:	
DATA: 25/10/2023	SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA ☔
MANHÃ	✓		IMPRATICÁVEL ☔
TARDE	✓		
QTDE	MAO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MAO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
1	AUXILIAR DE ENGENHARIA	1	OPERADOR DE ESPARGIDOR
2	ENCARREGADO DE OBRAS	1	MESISTA
6	OPERADOR	5	MOTORISTA
1	PEDREIRO	1	TOPOGRAFO
2	AJUDANTE	1	GREIDISTA
2	RASTELEIRO		
QTDE	EQUIPAMENTO		
1	ROLO LISO		
2	ESCAVADEIRA		
1	ROLO DE PNEU		
1	VIBROACABADORA		
1	ESPARGIDOR		
3	VEICULO DE APOIO		
1	CAMINHÃO PIPA		
14	CAMINHÃO BASCULANTE		
1	RETROESCAVADEIRA		
1	MOTONIVELADORA		
1	ROLO COMBINADO (CHAPA/PNEU)		
	TAREFAS REALIZADAS		
NÚMERO DE T.R.	DESCRIÇÃO	OBSERVAÇÕES	
1	PINTURA DE LIGAÇÃO		
2	REBAIXAMENTO DE PISTA P/ EXECUÇÃO DE GREIDE	E333	
3	APLICAÇÃO/COMPACTAÇÃO DE MASSA ASFALTICA		
4	SINALIZAÇÃO		
5	EXECUÇÃO DE CANALETA/VALETA	E84 A E87	
6	UMECTAÇÃO		
7	REGULARIZAÇÃO/COMPACTAÇÃO DE SUB-BASE	E320 E E334 (INCLUINDO LANÇAMENTO DE CASCALHO)	
8	SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO TOPOGRÁFICO		
9	EXECUÇÃO DE ALA DE BUEIRO	B212 LE	

REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATORIOS)





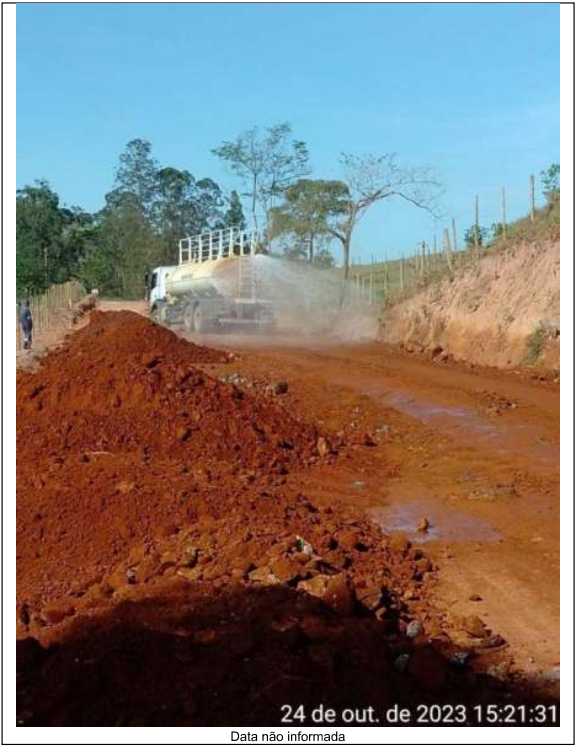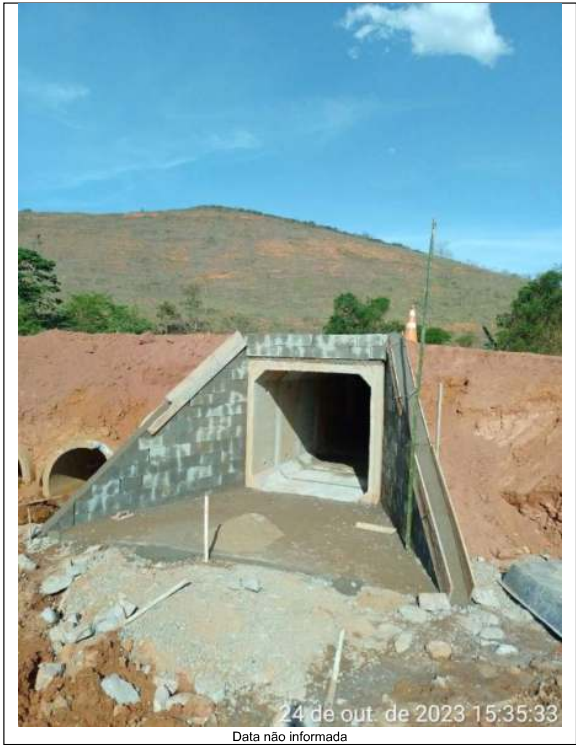

OCORRÊNCIAS	
NÚMERO DE OC	TIPO DE OCORRÊNCIA
EQUIPE E04 E E05 24/10/2023	
OBSERVAÇÕES	
CONFERÊNCIA	
MUNICÍPIO	
CONSÓRCIO (Aprovado em 25/10/2023 - 16:23)	
Obs.: *Drenagem: Construção da ala do bueiro Est.212. Acabamento descida de água Est. 203. Construção de valetas da Est. 79 a Est. 82. (Total de 61 mts). *Topografia: Locação e nivelamento Est. 321 até Est. 334, para lançamento de sub. base. Locação de estacas da Est. 308 a Est. 318 para lançamento de BGS. *Cerca: Construção lado esquerdo Est. 229 a Est. 232 (total 50 mts). *Asfalto: Capa da Est. 298 a Est. 308 lado esquerdo e Est. 308 até Est. 281 retorno. *Terraplenagem: Lançamento Sub base Est. 321 a Est. 334. *Necessário fotos com localização.	
ASSINATURAS	
Luiz Henrique da Silva Borges Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 208579/D	PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA CREA 137.103/D
Luciano Xavier de Castro RT de Execução - CONSÓRCIO 3T - SOLOCAP-CONEP CREA 59784/D	



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº 0118	OBRA: CTP 229/2023 - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA		CONTRATO:		RESP. TÉCNICO: LUCIANO XAVIER	
ENDEREÇO: ESTRADA DE ACESSO ENTRE SANTO ANTÔNIO DO GRAMA E ABRE CAMPO			INÍCIO: 01/04/2023		Nº CREA-MG: 59784/D	
CIDDE:			PRAZO: 01/10/2023		Nº DA ART:	
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA			UF:		COORDENADAS:	
DATA: 24/10/2023	SOL ☀		NUBLADO ☁	CHUVA ☔		IMPRATICÁVEL ☁
MANHÃ	✓					
TARDE	✓					
QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO			QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	
1	AUXILIAR DE ENGENHARIA			1	OPERADOR DE ESPARGIDOR	
2	ENCARREGADO DE OBRAS			1	MESISTA	
6	OPERADOR			5	MOTORISTA	
1	PEDREIRO			1	TOPOGRAFO	
2	AJUDANTE			2	RASTELEIRO	
QTDE	EQUIPAMENTO					
1	ROLO LISO					
2	ESCAVADEIRA					
1	ROLO DE PNEU					
1	VIBROACABADORA					
1	ESPARGIDOR					
3	VEÍCULO DE APOIO					
1	CAMINHÃO PIPA					
15	CAMINHÃO BASCULANTE					
1	RETROESCAVADEIRA					
1	MOTONIVELADORA					
1	ROLO COMBINADO (CHAPA/PNEU)					
TAREFAS REALIZADAS						
NÚMERO DE T.R.	DESCRIÇÃO			OBSERVAÇÕES		
1	APLICAÇÃO/COMPACTAÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA					
2	SINALIZAÇÃO					
3	REBAIXAMENTO DE PISTA P/ EXECUÇÃO DE GREIDE			E333		
4	REGULARIZAÇÃO/COMPACTAÇÃO DE SUB-BASE			E309 E322 (INCLUINDO LANÇAMENTO DE CASCALHO)		
5	EXECUÇÃO DE ALA DE BUEIRO			B212 LE		
6	UMECTAÇÃO					
7	PINTURA DE LIGAÇÃO					
8	SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO TOPOGRÁFICO					
9	EXECUÇÃO DE CANALETA			E83 A E87		
REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATORIOS)						







Data não informada



Data não informada



Data não informada



Data não informada



Data não informada

OCORRÊNCIAS	
NÚMERO DE OC	DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA

OBSERVAÇÕES	
EQUIPE E04 E E05 23/10/2023	
CONFERÊNCIA	
MUNICÍPIO	CONSÓRCIO (Aprovado em 25/10/2023 - 11:40)
Obs.:	Obs.: *Fotos sem localização, *Topografia: Locação e nivelamento das Est. 309 até Est. 334 para lançamento da sub base, *Drenagem: Construção das alas do bueiro Est. 212, Acabamento da descida de água Est. 203, Construção de canaletas da Est. 83 até EST. 91 (TOTAL DE 139 mts), *Asfalto: Capa da Est. 276 até Est. 308 lado direito esquerdo, *Terraplenagem: Lançamento da sub base nas Est. 308 até Est. 322, Regularização nas Est. 322 até 334, Arrumação nas entradas de acesso da fazenda Est. 204 a Est. 205 e arrumação acesso da entrada da granja.
ASSINATURAS	
Luiz Henrique da Silva Borges Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 208579/D	PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA CREA 137.103/D
	Luciano Xavier de Castro RT de Execução - CONSÓRCIO 3T -SOLOCAP-CONEP CREA 59784/D






CIMVALPI
CONSORCIO INTERMUNICIPAL
MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº 0117	OBRA: CTP 229/2023 - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA		CONTRATO:	RESP. TÉCNICO: LUCIANO XAVIER	
ENDEREÇO: ESTRADA DE ACESSO ENTRE SANTO ANTÔNIO DO GRAMA E ABRE CAMPO			INÍCIO: 01/04/2023	Nº CREA-MG: 59784/D	
CIDDE:			PRAZO: 01/10/2023	Nº DA ART:	
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA			UF:	COORDENADAS:	
DATA: 23/10/2023	SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA ☔	IMPRATICÁVEL ☁	
MANHÃ	✓				
TARDE	✓				
QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO		QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	
1	AUXILIAR DE ENGENHARIA		1	OPERADOR DE ESPARGIDOR	
2	ENCARREGADO DE OBRAS		1	MESISTA	
4	OPERADOR		4	MOTORISTA	
1	TOPOGRAFO		2	RASTELEIRO	
QTDE	EQUIPAMENTO				
2	ROLO LISO				
2	ESCAVADEIRA				
1	VIBROACABADORA				
1	ESPARGIDOR				
3	VEICULO DE APOIO				
1	CAMINHÃO PIPA				
16	CAMINHÃO BASCULANTE				
1	MOTONIVELADORA				
1	ROLO COMBINADO (CHAPA/PNEU)				
TAREFAS REALIZADAS					
NÚMERO DE T.R.	DESCRIÇÃO		OBSERVAÇÕES		
1	SINALIZAÇÃO				
2	APLICAÇÃO/COMPACTAÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA				
3	UMECTAÇÃO				
4	LANÇAMENTO/COMPACTAÇÃO DE BICA CORRIDA		E283 A E307		
5	ASSENTAMENTO DE ADUELAS		E212		
6	PINTURA DE LIGAÇÃO				
7	SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO TOPOGRÁFICO				
REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATORIOS)					
 20 de out de 2023 10:10:31 AM Data não informada			 21 de out. de 2023 08:17:52 Data não informada		
 20 de out de 2023 10:08:50 AM Data não informada			 20 de out de 2023 10:08:47 AM Data não informada		

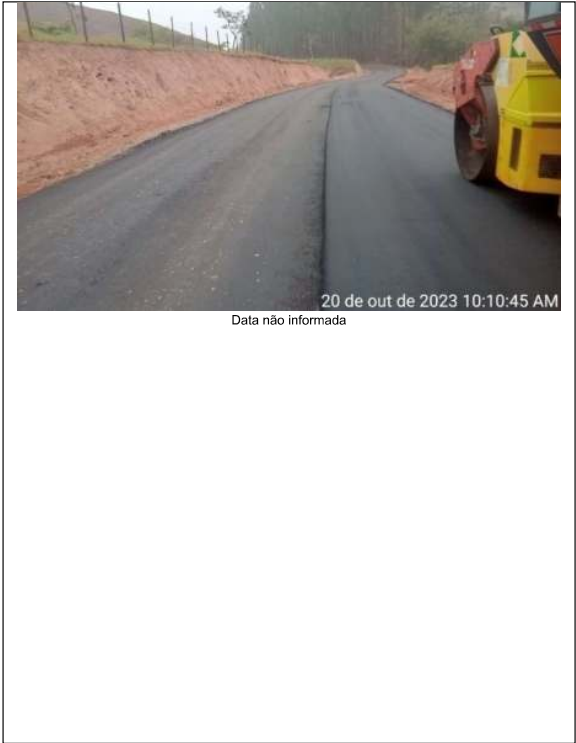




OCORRÊNCIAS	
NÚMERO DE OC	TIPO DE OCORRÊNCIA
OBSERVAÇÕES	
DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA	
EQUIPE E04 E E05 21/10/2023	
CONFERÊNCIA	
MUNICÍPIO	CONSÓRCIO (Reprovado)
Obs.:	Obs.: *Fotos sem localização. *Fotos misturadas do dia 20 e 21.
ASSINATURAS	
Luiz Henrique da Silva Borges Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 208579/D	PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA CREA 137.103/D
	Luciano Xavier de Castro RT de Execução - CONSÓRCIO 3T –SOLOCAP-CONEPP CREA 59784/D




RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº 0116	OBRA: CTP 229/2023 - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	CONTRATO:	RESP. TÉCNICO: LUCIANO XAVIER
ENDEREÇO: ESTRADA DE ACESSO ENTRE SANTO ANTÔNIO DO GRAMA E ABRE CAMPO	INÍCIO: 01/04/2023	Nº CREA-MG: 59784/D	
CIDDE:	PRAZO: 01/10/2023	Nº DA ART:	
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA	UF:	COORDENADAS:	
DATA: 23/10/2023	SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA ☔
MANHÃ		✓	IMPRATICÁVEL ☔
TARDE	✓		
QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
1	AUXILIAR DE ENGENHARIA	1	ENCARREGADO DE OBRAS
5	OPERADOR	4	MOTORISTA
1	PEDREIRO	1	TOPOGRAFO
2	AJUDANTE	1	GREIDISTA
QTDE	EQUIPAMENTO		
2	ESCAVADEIRA		
1	ROLO DE PNEU		
1	COMPACTADOR DE SOLO		
2	VEÍCULO DE APOIO		
1	CAMINHÃO PIPA		
3	CAMINHÃO BASCULANTE		
1	RETROESCAVADEIRA		
1	MOTONIVELADORA		
	TAREFAS REALIZADAS		
NÚMERO DE T.R.	DESCRIÇÃO	OBSERVAÇÕES	
1	EXECUÇÃO DE ATERRO	E317 A E320	
2	UMECTAÇÃO		
3	EXECUÇÃO DE CANALETA	E87 A E91	
4	SINALIZAÇÃO		
5	SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO TOPOGRÁFICO		
6	EXECUÇÃO DE ACABAMENTO DE ALA DE BUEIRO	B285	
7	EXECUÇÃO/REGULARIZAÇÃO DE SUB-BASE	E2291 A E313	
	REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)		



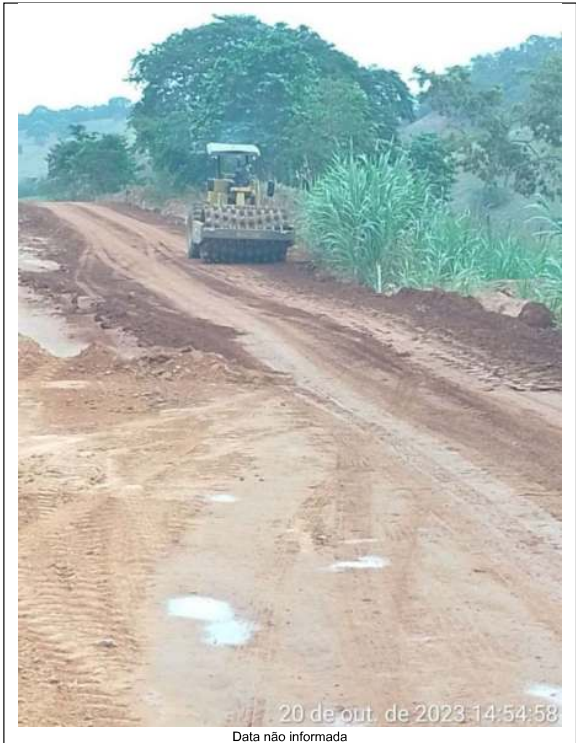

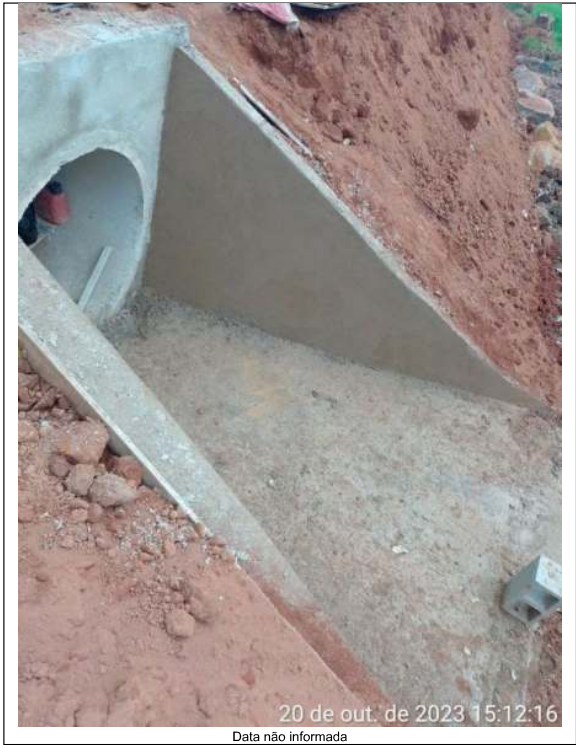

OCORRÊNCIAS	
NÚMERO DE OC	TIPO DE OCORRÊNCIA
OBSERVAÇÕES	
EQUIPE E05 20/10/2023	
CONFERÊNCIA	
MUNICÍPIO	CONSÓRCIO (Aprovado em 25/10/2023 - 11:31)
Obs.:	Obs.: *Foto faltando localização. *Topografia: Locação de estacas e nivelamento base e BGS. *Drenagem: Aduelas Est. 212 e construção de canaletas nas Est. 75 até a Est. 91. *Asfalto: Lado direito Est. 262 até Est. 278. *Terraplenagem: Lançamento sub base da Est. 291 até 308. Lançamento de bica corrida da Est. 285 até Est. 308 e altero na Est. 209 até Est. 213 lado esquerdo.
ASSINATURAS	
Luiz Henrique da Silva Borges Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 208579/D	PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA CREA 137.103/D
Luciano Xavier de Castro RT de Execução - CONSÓRCIO 3T-SOLOCAP-CONEP CREA 59784/D	





Assinaturas do Documento



Documento Assinado Eletronicamente por **PEDRO MARTINO ZEFERINO**, CPF: 015.49*. **6- *9 em **29/11/2023 12:25:15**, Cód. Autenticidade da Assinatura: **1230.7X25.715A.E802.8738**, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Documento Assinado Eletronicamente por **LUCIANO XAVIER DE CASTRO**, CPF: 760.22*. **6- *5 em **28/11/2023 09:38:10**, Cód. Autenticidade da Assinatura: **0937.5838.210R.713V.6846**, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Documento Assinado Eletronicamente por **LUIZ HENRIQUE DA SILVA BORGES**, CPF: 016.28*. **6- *7 em **27/11/2023 15:01:45**, Cód. Autenticidade da Assinatura: **1547.0W01.0452.Z384.5806**, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Informações do Documento

ID do Documento: **1A1.318** - Tipo de Documento: **FORMULÁRIO DE MEDIÇÕES**.

Elaborado por **GILBERTO ARAUJO GOMIDES**, CPF: 069.58*. **6- *7 , em **27/11/2023 - 13:54:58**

Código de Autenticidade deste Documento: 13A8.7K54.3583.6537.4063

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:

<https://zeropapel.cimvalpi.mg.gov.br/verdocumento>

