



FORMULÁRIO DE MEDIÇÕES

RELATORIO PARCIAL (SITUAÇÃO: APROVADA PELO CONSÓRCIO)

Enviado por LUCAS CARVALHO SOARES em 11/12/2023 • 17:11

Registro: 11/12/2023		9ª MEDIÇÃO														
Obra: CTP 229/2023 - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA		Período de 21/11/2023 a 20/12/2023														
Local: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA																
OBSERVAÇÕES																
Enviada por LUCAS CARVALHO SOARES (FORNECEDOR) em 11/12/2023 às 17:11																
ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	NESTA MEDIÇÃO	ACUMULADA	VALOR PREVISTO (BDI)	VALOR PREVISTO (ADMC)	NESTA MEDIÇÃO (BDI)	NESTA MEDIÇÃO (ADMC)	ACUMULADA (BDI)	ACUMULADA (ADMC)	SALDO (BDI)	SALDO (ADMC)
05.16	DRENAGEM COMPLEMENTAR															
05.16.06	DISIPADOR DE ENERGIA - DER 03 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	UN	18	R\$ 1.190,02	R\$ 1.510,73	R\$ 27.193,14	0	12	R\$ 27.193,14	R\$ 28.135,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.128,76	R\$ 18.757,08	R\$ 9.064,38	R\$ 9.378,54
05.16.07	DISIPADOR DE ENERGIA - DER 04 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS – BUEIROS Ø600MM	UN	18	R\$ 1.711,23	R\$ 2.172,41	R\$ 39.103,38	0	12	R\$ 39.103,38	R\$ 40.458,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 26.068,92	R\$ 26.972,40	R\$ 13.034,46	R\$ 13.486,20
05.16.12	SARJETA DE CONCRETO EM ATERRIO, TIPO SCA-XXI, LARGURA=100CM TIPO 70/30, EXECUÇÃO INCLUINDO ESCAVACÃO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)	M	5957,5	R\$ 72,58	R\$ 92,14	R\$ 548.924,05	2813,9	3198,9	R\$ 548.924,05	R\$ 567.928,48	R\$ 259,272,75	R\$ 268,249,09	R\$ 294,746,65	R\$ 304,951,14	R\$ 254.177,40	R\$ 262.977,34
05.16.14	VALETA DE PROTEÇÃO DE CORTES COM REVESTIMENTO DE CONCRETO - VPC 04 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M	2352,5	R\$ 77,28	R\$ 98,11	R\$ 230.803,78	320	1772	R\$ 230.803,78	R\$ 238.802,28	R\$ 31.395,20	R\$ 32,483,20	R\$ 173,850,92	R\$ 179,875,72	R\$ 56,952,86	R\$ 58,926,56
05.16.16	VALETA DE PROTEÇÃO DE ATERRÇOS COM REVESTIMENTO DE CONCRETO - VPA 04 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M	2267,5	R\$ 79,13	R\$ 100,45	R\$ 227.770,38	149,3	479,3	R\$ 227.770,38	R\$ 235,661,28	R\$ 14,997,19	R\$ 15,516,75	R\$ 48,145,69	R\$ 49,813,65	R\$ 179,624,69	R\$ 185,847,63
05.16.20	DESCIDA D'ÁGUA DE ATERRÇOS EM DEGRAUS - DAD 04 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M	107,5	R\$ 524,26	R\$ 665,54	R\$ 71.545,55	47,5	107,5	R\$ 71.545,55	R\$ 74,025,58	R\$ 31,613,15	R\$ 32,708,98	R\$ 71,545,55	R\$ 74,025,58	R\$ 0,00	R\$ -0,00
05.16.24	ENTRADA PARA DESCIDA D'ÁGUA - EDA 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	UN	22	R\$ 51,04	R\$ 64,80	R\$ 1.425,60	13	18	R\$ 1.425,60	R\$ 1,474,88	R\$ 842,40	R\$ 871,52	R\$ 1.166,40	R\$ 1.206,72	R\$ 259,20	R\$ 288,16
05.16.25	ENTRADA PARA DESCIDA D'ÁGUA - EDA 02 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	UN	7	R\$ 63,41	R\$ 80,49	R\$ 563,43	4	4	R\$ 563,43	R\$ 582,96	R\$ 321,96	R\$ 333,12	R\$ 321,96	R\$ 333,12	R\$ 241,47	R\$ 249,84
06	PAVIMENTAÇÃO															
06.09	IMPRIMAÇÃO															
06.09.01	IMPRIMAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)	m²	53475,53	R\$ 7,87	R\$ 9,99	R\$ 534.220,54	0	52220,42	R\$ 534.220,54	R\$ 552,936,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 521,682,00	R\$ 539,959,14	R\$ 12.538,54	R\$ 12.977,84
06.10	PINTURA															
06.10.01	PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-1C	m²	54475,53	R\$ 2,39	R\$ 3,04	R\$ 165.605,61	0	52220,42	R\$ 165,605,61	R\$ 171,053,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 158,750,08	R\$ 163,972,12	R\$ 6,855,53	R\$ 7.081,04
06.11	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE															
06.11.01	EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFALTICA ATÉ A PISTA	m³	2089,32	R\$ 1.370,82	R\$ 1.740,25	R\$ 3.635,939,13	0	2042,05	R\$ 3.635,939,13	R\$ 3.761,966,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.553,677,51	R\$ 3,676,853,97	R\$ 82,261,62	R\$ 85,112,94
09.06	SERVIÇOS COMPLEMENTARES - CERCAMENTO															
09.06.03	PORTEIRA TIPO OC.PT/EXECUÇÃO INCLUINDO ESCAVACÃO, FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E TRANSPORTE DOS MATERIAIS)	UN	4	R\$ 7,34	R\$ 1.174,98	R\$ 4.699,92	0	0	R\$ 4,699,92	R\$ 4,862,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,699,92	R\$ 4,862,84



10	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E PROTEÇÕES AMBIENTAIS																	
10.01	ROÇADA MANUAL LEVE (EXECUÇÃO, INCLUINDO REMOÇÃO DO MATERIAL ATÉ 5 Km)	ha	0,34	R\$ 1.352,70	R\$ 1.717,25	R\$ 583,87	0,34	0,34	R\$ 583,87	R\$ 604,10	R\$ 583,87	R\$ 604,10	R\$ 583,87	R\$ 604,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14	SERVIÇOS TÉCNICOS																	
14.01	TOPOGRAFIA																	
15	ADMINISTRAÇÃO LOCAL																	
15.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - % BASEADA ACORDAO 2.622/2013 DO TCU SOBRE SOMA DOS ITENS 1 A 14	%	6,55	R\$ 132.737.097,60	R\$ 168.509.745,40	R\$ 1.103.738.832,37	6,55	39,305090054	R\$ 1.103.738.832,37	R\$ 1.141.993.663,94	R\$ 22.206,23	R\$ 23.621,65	R\$ 480.655,99	R\$ 505.698,23	R\$ 1.103.258.176,38	R\$ 1.141.487.965,71		
TOTAL:											R\$ 361.232,74	R\$ 374.388,40	R\$ 11.290.608,97	R\$ 11.616.206,74				

Luz Henrique da Silva Borges
Fiscal de Obras - CIVIL
CREA 208579/D
Aprovação: 15/12/2023

PEDRO MARTINO ZEFERINO
Fiscal de Obras - CIVIL DO GRAMA
CREA 137.103/D

Luciano Xavier de Castro
RT de Execução - CIVIL
CREA 59704/D





CIMVALPI
CONSORCIO INTERMUNICIPAL
MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº 0154		OBRA: CTP 229/2023 - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA		CONTRATO:		RESP. TÉCNICO: LUCIANO XAVIER	
ENDEREÇO: ESTRADA DE ACESSO ENTRE SANTO ANTÔNIO DO GRAMA E ABRE CAMPO		INÍCIO: 01/04/2023		Nº CREA-MG: 59784/D			
CIDDE:		PRAZO: 01/10/2023		Nº DA ART:			
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA		UF:		COORDENADAS:			
DATA: 10/12/2023		SOL ☀		NUBLADO ☁		CHUVA ☔	
MANHÃ		✓				IMPRATICÁVEL ☔	
TARDE		✓					
QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO			QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO		
1	AUXILIAR DE ENGENHARIA			2	ENCARREGADO DE OBRAS		
1	OPERADOR			1	MOTORISTA		
6	PEDREIRO			11	AJUDANTE		
QTDE				EQUIPAMENTO			
2	VEÍCULO DE APOIO						
1	CAMINHÃO BASCULANTE						
1	RETROESCAVADEIRA						
TAREFAS REALIZADAS							
NÚMERO DE T.R.	DESCRIÇÃO			OBSERVAÇÕES			
1	EXECUÇÃO DE CERCA			REGIÃO: E275 A E278			
2	EXECUÇÃO DE SARJETA TRIANGULAR			REGIÃO: E105 A E111			
3	SINALIZAÇÃO						
4	EXECUÇÃO DE DESCIDA D'ÁGUA			REGIÃO: B135 E B11			
REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATORIOS)							



7 de dez. de 2023 13:35:59
Estrada sem nome
Santo Antônio do Grama
Minas Gerais

Data não informada



7 de dez. de 2023 13:35:08

Data não informada



Pag.: 3 / 39 ID. do Doc.: 22B.0C1 - 15/12/2023 - 10:58:14 - ASSINADO POR(3): CPF:015.49*. **6-*.9 CPF:760.22*. **6-*.5 CPF:016.28*. **6-*.7





Data não informada



Data não informada

NÚMERO DE OC		TIPO DE OCORRÊNCIA	OCORRÊNCIAS	DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA
EQUIPE E05 07/12/2023		OBSERVAÇÕES		
MUNICÍPIO		CONFERÊNCIA		
Obs.:		CONSÓRCIO (Aprovado em 11/12/2023 - 09:36)		
		Obs.: *Drenagem: Construção de sarjetas com 105,10 mts e descida d'água 9,50 mts.		
ASSINATURAS				
Luiz Henrique da Silva Borges Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 208579/D		PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA CREA 137.103/D		Luciano Xavier de Castro RT de Execução - CONSÓRCIO 3T - SOLOCAP-CONEP CREA 59784/D





CIMVALPI
CONSORCIO INTERMUNICIPAL
MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº 0153		OBRA: CTP 229/2023 - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA		CONTRATO:		RESP. TÉCNICO: LUCIANO XAVIER	
ENDEREÇO: ESTRADA DE ACESSO ENTRE SANTO ANTÔNIO DO GRAMA E ABRE CAMPO		INÍCIO: 01/04/2023		Nº CREA-MG: 59784/D			
CIDDE:		PRAZO: 01/10/2023		Nº DA ART:			
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA		UF:		COORDENADAS:			
DATA: 07/12/2023		SOL ☀		NUBLADO ☁		CHUVA ☔	
MANHÃ		✓				IMPRATICÁVEL ☔	
TARDE		✓					
QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO			QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO		
1	AUXILIAR DE ENGENHARIA			2	ENCARREGADO DE OBRAS		
1	OPERADOR			1	MOTORISTA		
6	PEDREIRO			14	AJUDANTE		
QTDE				EQUIPAMENTO			
2	VEÍCULO DE APOIO						
1	CAMINHÃO BASCULANTE						
1	RETROESCAVADEIRA						
TAREFAS REALIZADAS							
NÚMERO DE T.R.	DESCRIÇÃO			OBSERVAÇÕES			
1	EXECUÇÃO DE DESCIDA D'ÁGUA			B135			
2	SINALIZAÇÃO						
3	EXECUÇÃO DE SARJETA TRIANGULAR			REGIÃO: E69 A E74			
REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATORIOS)							




6 de dez. de 2023 15:26:49
Data não informada




6 de dez. de 2023 15:37:23
Estrada sem nome
Piedade de Ponte Nova
Minas Gerais
Data não informada



Pag.: 6 / 39 ID. do Doc.: 22B.0C1 - 15/12/2023 - 10:58:14 - ASSINADO POR(3): CPF:015.49*. **6- **9 CPF:760.22*. **6- **5 CPF:016.28*. **6- **7

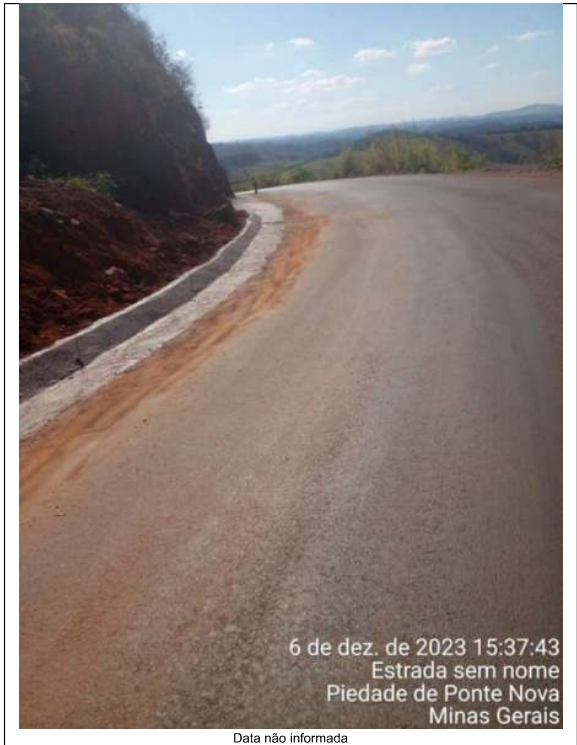

Data não informada

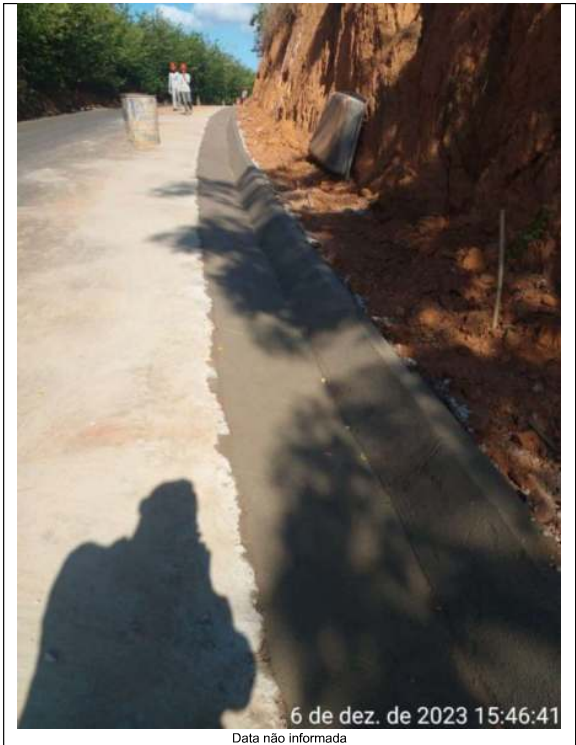

Data não informada


OCORRÊNCIAS	
NÚMERO DE OC	TIPO DE OCORRÊNCIA
OBSERVAÇÕES	
EQUIPE E05 06/12/2023	
CONFERÊNCIA	
MUNICÍPIO	CONSÓRCIO (Aprovado em 11/12/2023 - 09:35)
Obs.:	Obs.: *Drenagem: Construção de sarjetas 135,60, *Descida dagua 3 mts.
ASSINATURAS	
Luiz Henrique da Silva Borges Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 208579/D	PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA CREA 137.103/D
Luciano Xavier de Castro RT de Execução - CONSÓRCIO 3T - SOLOCAP-CONEP CREA 59784/D	





RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº 0152	OBRA: CTP 229/2023 - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	CONTRATO:	RESP. TÉCNICO: LUCIANO XAVIER
ENDEREÇO: ESTRADA DE ACESSO ENTRE SANTO ANTÔNIO DO GRAMA E ABRE CAMPO		INÍCIO: 01/04/2023	Nº CREA-MG: 59784/D
CIDDE:		PRAZO: 01/10/2023	Nº DA ART:
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA		UF:	COORDENADAS:
DATA: 06/12/2023	SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA ☔
MANHÃ	✓		IMPRATICÁVEL ☔
TARDE	✓		
QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
1	AUXILIAR DE ENGENHARIA	1	ENCARREGADO DE OBRAS
1	OPERADOR	1	MOTORISTA
6	PEDREIRO	14	AJUDANTE
QTDE	EQUIPAMENTO		
2	VEÍCULO DE APOIO		
1	CAMINHÃO BASCULANTE		
1	RETROESCAVADEIRA		
NÚMERO DE T.R.	DESCRIÇÃO	TAREFAS REALIZADAS	OBSERVAÇÕES
1	EXECUÇÃO DE SARJETA TRIANGULAR	REGIÃO: E97 A E100	
2	SINALIZAÇÃO		
3	EXECUÇÃO DE DESCIDA D'ÁGUA	B179 (DUPLO)	
REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATORIOS)			

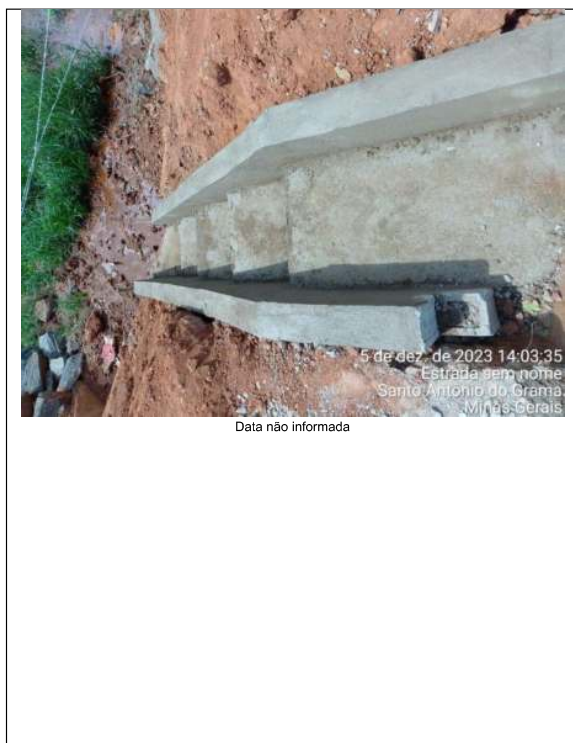







NÚMERO DE OC		TIPO DE OCORRÊNCIA	OCORRÊNCIAS	DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA
EQUIPE E05 05/12/2023		OBSERVAÇÕES		
MUNICÍPIO		CONFERÊNCIA		
Obs.:		CONSÓRCIO (Aprovado em 07/12/2023 - 16:45)		
		Obs.: *Drenagem: Construção de sarjetas com total de 144,50 mts. *Construção de descida de água com total de 13,70 mts.		
		ASSINATURAS		
Luiz Henrique da Silva Borges Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 208579/D		PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTONIO DO GRAMA CREA 137.103/D		Luciano Xavier de Castro RT de Execução - CONSÓRCIO 3T-SOLOCAP-CONEP CREA 59784/D



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº 0151		OBRA: CTP 229/2023 - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA		CONTRATO:		RESP. TÉCNICO: LUCIANO XAVIER	
ENDEREÇO: ESTRADA DE ACESSO ENTRE SANTO ANTÔNIO DO GRAMA E ABRE CAMPO				INÍCIO: 01/04/2023		Nº CREA-MG: 59784/D	
CIDDE:				PRAZO: 01/10/2023		Nº DA ART:	
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA				UF:		COORDENADAS:	
DATA: 05/12/2023		SOL ☀		NUBLADO ☁		CHUVA ☔	
MANHÃ		✓				IMPRATICÁVEL ☔	
TARDE		✓					
QTDE		MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO				QTDE	
1		ENCARREGADO DE OBRAS				2	
1		MOTORISTA				1	
1		AJUDANTE					
QTDE		EQUIPAMENTO					
1		ESCAVADEIRA					
1		VEÍCULO DE APOIO					
1		CAMINHÃO BASCULANTE					
1		RETROESCAVADEIRA					
TAREFAS REALIZADAS							
NÚMERO DE T.R.		DESCRIÇÃO				OBSERVAÇÕES	
1		SINALIZAÇÃO					
2		EXECUÇÃO DE DESCIDA D'ÁGUA				RIGIÃO: B151	
3		EXECUÇÃO DE SARJETA TRIANGULAR				REGIÃO: E112 A E117 LE	
REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)							



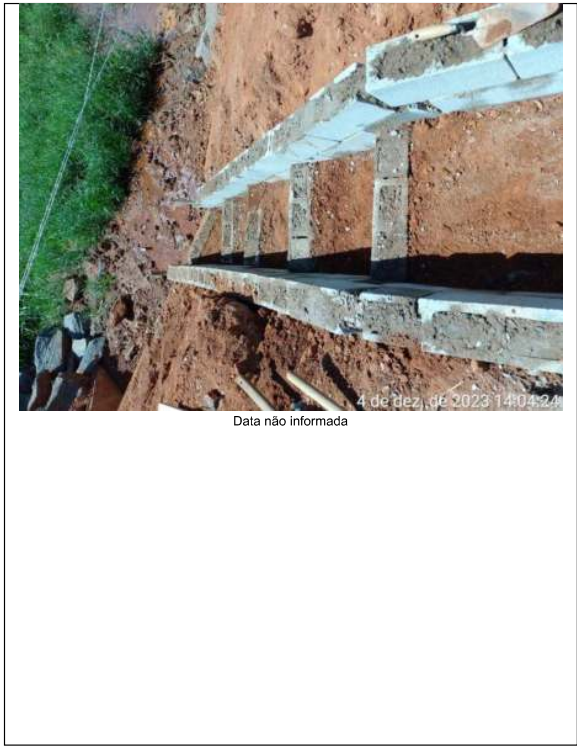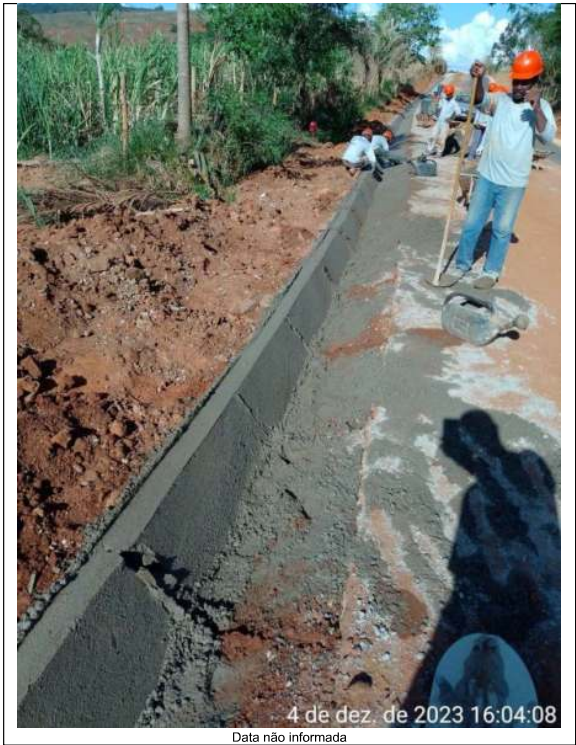



OCORRÊNCIAS	
NÚMERO DE OC	TIPO DE OCORRÊNCIA
OBSERVAÇÕES	
EQUIPE E05 04/12/2023	
CONFERÊNCIA	
MUNICÍPIO	CONSÓRCIO (Aprovado em 05/12/2023 - 16:26)
Obs.:	Obs.: *Drenagem: Construção de sarjeta Est, 112,80, *Construção de descida dagua com 3,40 mts, *Sem carro de apoio para trasnporte dos funcionarios.
ASSINATURAS	
Luiz Henrique da Silva Borges Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 208579/D	PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA CREA 137.103/D
Luciano Xavier de Castro RT de Execução - CONSÓRCIO 3T-SOLOCAP-CONEP CREA 59784/D	





RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº 0150	OBRA: CTP 229/2023 - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	CONTRATO:	RESP. TÉCNICO: LUCIANO XAVIER
ENDEREÇO: ESTRADA DE ACESSO ENTRE SANTO ANTÔNIO DO GRAMA E ABRE CAMPO	INÍCIO: 01/04/2023	Nº CREA-MG: 59784/D	
CIDDE:	PRAZO: 01/10/2023	Nº DA ART:	
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA	UF:	COORDENADAS:	
DATA: 05/12/2023	SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA ☔
MANHÃ	✓		IMPRATICÁVEL ☔
TARDE	✓		
QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
1	AUXILIAR DE ENGENHARIA	1	ENCARREGADO DE OBRAS
2	OPERADOR	1	MOTORISTA
1	PEDREIRO	1	AJUDANTE
QTDE	EQUIPAMENTO		
1	ESCAVADEIRA		
1	VEÍCULO DE APOIO		
1	CAMINHÃO BASCULANTE		
1	RETROESCAVADEIRA		
	TAREFAS REALIZADAS		
NÚMERO DE T.R.	DESCRIÇÃO	OBSERVAÇÕES	
1	ELEVAÇÃO DE CAIXA DE BUEIRO	B257 LD	
2	EXECUÇÃO DE DESCIDA D'ÁGUA		
3	SINALIZAÇÃO		
4	EXECUÇÃO DE SARJETA TRIANGULAR		

REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATORIOS)



Data não informada




Data não informada





1 de dez. de 2023 14:08:29
Data não informada

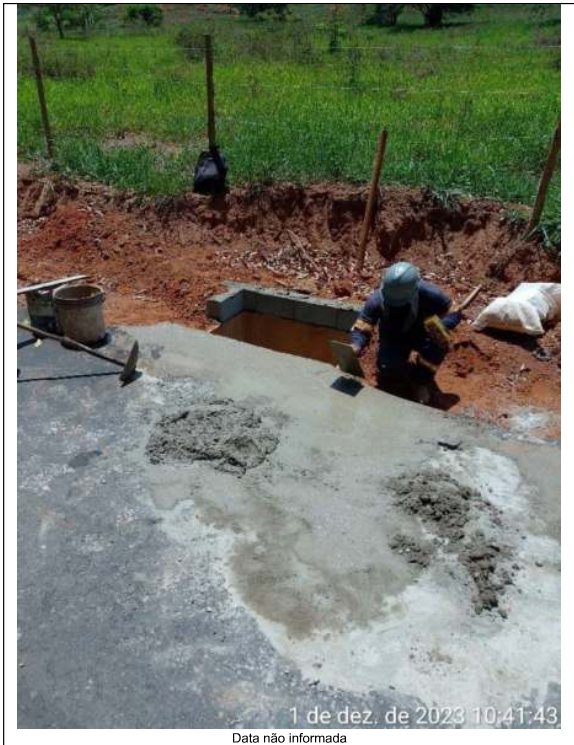

1 de dez. de 2023 10:41:43
Data não informada

NÚMERO DE OC		TIPO DE OCORRÊNCIA	OCORRÊNCIAS	DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA
EQUIPE E05 01/12/2023		OBSERVAÇÕES		
MUNICÍPIO		CONFERÊNCIA		
Obs.:		CONSÓRCIO (Aprovado em 05/12/2023 - 16:24)		
		Obs.: *Construção de sarjetas com 120 mts. *Construção de descida dagua com 3,60mts. *Ajuste no bueiro Est. 27.		
		ASSINATURAS		
Luiz Henrique da Silva Borges Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 208579/D		PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA CREA 137.103/D		Luciano Xavier de Castro RT de Execução - CONSÓRCIO 3T - SOLOCAP-CONEP CREA 59784/D





RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº 0149	OBRA: CTP 229/2023 - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	CONTRATO:	RESP. TÉCNICO: LUCIANO XAVIER
ENDEREÇO: ESTRADA DE ACESSO ENTRE SANTO ANTÔNIO DO GRAMA E ABRE CAMPO		INÍCIO: 01/04/2023	Nº CREA-MG: 59784/D
CIDDE:		PRAZO: 01/10/2023	Nº DA ART:
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA		UF:	COORDENADAS:
DATA: 05/12/2023	SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA ☔
MANHÃ	✓		IMPRATICÁVEL ☔
TARDE	✓		
QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
1	AUXILIAR DE ENGENHARIA	1	ENCARREGADO DE OBRAS
2	OPERADOR	1	MOTORISTA
1	PEDREIRO	1	AJUDANTE
QTDE	EQUIPAMENTO		
1	ESCAVADEIRA		
1	VEÍCULO DE APOIO		
1	CAMINHÃO BASCULANTE		
1	RETROESCAVADEIRA		
TAREFAS REALIZADAS			
NÚMERO DE T.R.	DESCRIÇÃO	OBSERVAÇÕES	
1	EXECUÇÃO DE DESCIDA D'ÁGUA		
2	SINALIZAÇÃO		
3	EXECUÇÃO DE SARJETA TRIANGULAR		

REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)





OCORRÊNCIAS	
NÚMERO DE OC	TIPO DE OCORRÊNCIA
EQUIPE E05 30/11/2023	
OBSERVAÇÕES	
CONFERÊNCIA	
MUNICÍPIO	
CONSORCIO (Aprovado em 05/12/2023 - 16:22)	
Obs.:	Obs.: *Drenagem: Construção de sarjeta com 134,60 mts, Construção de descida dagua com 15,60 mts, *Asfalto, concluido até o trevo (BR).
ASSINATURAS	
Luiz Henrique da Silva Borges Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 208579/D	PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTONIO DO GRAMA CREA 137.103/D
Luciano Xavier de Castro RT de Execução - CONSORCIO 3T-SOLOCAP-CONEP CREA 59784/D	



Atenção

Undefined offset: 0



CIMVALPI
CONSORCIO INTERMUNICIPAL
MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº 0148		OBRA: CTP 229/2023 - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA		CONTRATO:		RESP. TÉCNICO: LUCIANO XAVIER	
ENDEREÇO: ESTRADA DE ACESSO ENTRE SANTO ANTÔNIO DO GRAMA E ABRE CAMPO				INÍCIO: 01/04/2023		Nº CREA-MG: 59784/D	
CIDDE:				PRAZO: 01/10/2023		Nº DA ART:	
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA				UF:		COORDENADAS:	
DATA:		SOL ☀		NUBLADO ☁		CHUVA ☔	
QTDE		MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO		QTDE		IMPRATICÁVEL ☹	
1		ENCARREGADO DE OBRAS		2		OPERADOR	
1		MOTORISTA		1		PEDREIRO	
1		AJUDANTE					
QTDE		EQUIPAMENTO					
1		ESCAVADEIRA					
1		CAMINHÃO BASCULANTE					
1		RETROESCAVADEIRA					
TAREFAS REALIZADAS							
NÚMERO DE T.R.		DESCRIÇÃO			OBSERVAÇÕES		
1		SINALIZAÇÃO					
2		ELEVÇÃO DE CAIXA DE BUEIRO			B64 LD		
3		EXECUÇÃO DE SARJETA TRIANGULAR			REGIÃO: E56 A E63 LE		
REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATORIOS)							



Data não informada



Data não informada





NÚMERO DE OC		TIPO DE OCORRÊNCIA	OCORRÊNCIAS	DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA
EQUIPE E05 29/11/2023		OBSERVAÇÕES		
MUNICÍPIO		CONFERÊNCIA		
Obs.:		CONSORCIO (Aprovado em 01/12/2023 - 10:59)		
		Obs.: *Construção de sarjetas 135,80 mts. *Construção de descida dagua Est. 214. *Transporte de material para reparos nas erosões.		
		ASSINATURAS		
Luiz Henrique da Silva Borges Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 208579/D		PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTONIO DO GRAMA CREA 137.103/D		Luciano Xavier de Castro RT de Execução - CONSORCIO 3T-SOLOCAP-CONEP CREA 59784/D





CIMVALPI
CONSORCIO INTERMUNICIPAL
MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº 0147		OBRA: CTP 229/2023 - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA		CONTRATO:		RESP. TÉCNICO: LUCIANO XAVIER	
ENDEREÇO: ESTRADA DE ACESSO ENTRE SANTO ANTÔNIO DO GRAMA E ABRE CAMPO		INÍCIO: 01/04/2023		Nº CREA-MG: 59784/D			
CIDDE:		PRAZO: 01/10/2023		Nº DA ART:			
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA		UF:		COORDENADAS:			
DATA: 30/11/2023		SOL ☀		NUBLADO ☁		CHUVA ☔	
MANHÃ		✓				IMPRATICÁVEL ☔	
TARDE		✓					
QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO			QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO		
1	ENCARREGADO DE OBRAS			2	OPERADOR		
1	MOTORISTA			1	PEDREIRO		
1	AJUDANTE						
QTDE	EQUIPAMENTO						
1	ESCAVADEIRA						
1	CAMINHÃO BASCULANTE						
1	RETROESCAVADEIRA						
TAREFAS REALIZADAS							
NÚMERO DE T.R.	DESCRIÇÃO			OBSERVAÇÕES			
1	SINALIZAÇÃO						
2	EXECUÇÃO DE DESCIDA D'ÁGUA			REGIÃO E02 LD			
3	EXECUÇÃO DE CERCA			REGIÃO: E202 A E214 LE			
4	ELEVÇÃO DE CAIXA DE BUEIRO			B45 LD E B75 LD			
5	EXECUÇÃO DE SARJETA TRIANGULAR			REGIÃO E63 A E68			
REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATORIOS)							



28 de nov. de 2023 15:16:13
Estrada sem nome
Santo Antonio do Grama
Minas Gerais

Data não informada



28 de nov. de 2023 15:24:49
Estrada sem nome
Santo Antonio do Grama
Minas Gerais

Data não informada



Pag.: 20 / 39 ID. do Doc.: 22B.0C1 - 15/12/2023 - 10:58:14 - ASSINADO POR(3): CPF:015.49*. **6-9 CPF:760.22*. **6-5 CPF:016.28*. **6-7



Data não informada



Data não informada



Data não informada



Data não informada

NÚMERO DE OC		TIPO DE OCORRÊNCIA	OCORRÊNCIAS	DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA
EQUIPE E05 28/11/2023			OBSERVAÇÕES	
MUNICÍPIO			CONFERÊNCIA	
Obs.:			CONSÓRCIO (Aprovado em 30/11/2023 - 14:09)	
			Obs.: *Conforme executado em campo.	
			ASSINATURAS	
Luiz Henrique da Silva Borges Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 208579/D		PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA CREA 137.103/D		Luciano Xavier de Castro RT de Execução - CONSÓRCIO 3T-SOLOCAP-CONEP CREA 59784/D





CIMVALPI
CONSORCIO INTERMUNICIPAL
MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº 0146		OBRA: CTP 229/2023 - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA		CONTRATO:		RESP. TÉCNICO: LUCIANO XAVIER	
ENDEREÇO: ESTRADA DE ACESSO ENTRE SANTO ANTÔNIO DO GRAMA E ABRE CAMPO		INÍCIO: 01/04/2023		Nº CREA-MG: 59784/D			
CIDDE:		PRAZO: 01/10/2023		Nº DA ART:			
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA		UF:		COORDENADAS:			
DATA: 28/11/2023	SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA ☔	IMPRATICÁVEL ☁			
MANHÃ	✓						
TARDE	✓						
QTDE	MAO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO			QTDE	MAO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO		
1	ENCARREGADO DE OBRAS			2	OPERADOR		
1	MOTORISTA			1	PEDREIRO		
1	AJUDANTE						
QTDE	EQUIPAMENTO						
1	ESCAVADEIRA						
1	CAMINHÃO BASCULANTE						
1	RETROESCAVADEIRA						
TAREFAS REALIZADAS							
NÚMERO DE T.R.	DESCRIÇÃO				OBSERVAÇÕES		
1	ABERTURA DE SARJETA/EXECUÇÃO DE GABARITO				REGIÃO: E65 A E67		
2	SINALIZAÇÃO						
3	EXECUÇÃO DE ELEVÇÃO DE BUEIRO				B12 LD		
REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATORIOS)							



27 de nov. de 2023 15:06:53
Estrada sem nome
Santo Antônio do Grama
Minas Gerais

Data não informada





27 de nov. de 2023 15:06:39
Estrada sem nome
Santo Antônio do Grama
Minas Gerais

Data não informada



Pag.: 22 / 39 ID. do Doc.: 22B.0C1 - 15/12/2023 - 10:58:14 - ASSINADO POR(3): CPF:015.49*. **6.*9 CPF:760.22*. **6.*5 CPF:016.28*. **6.*7

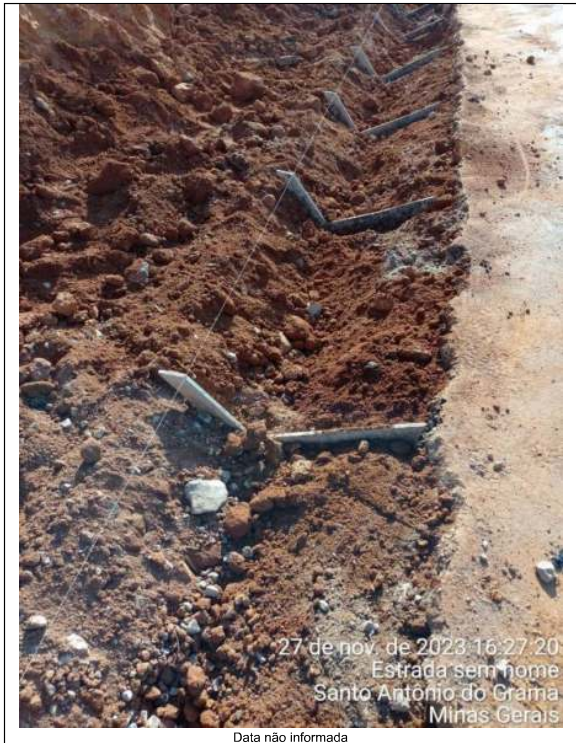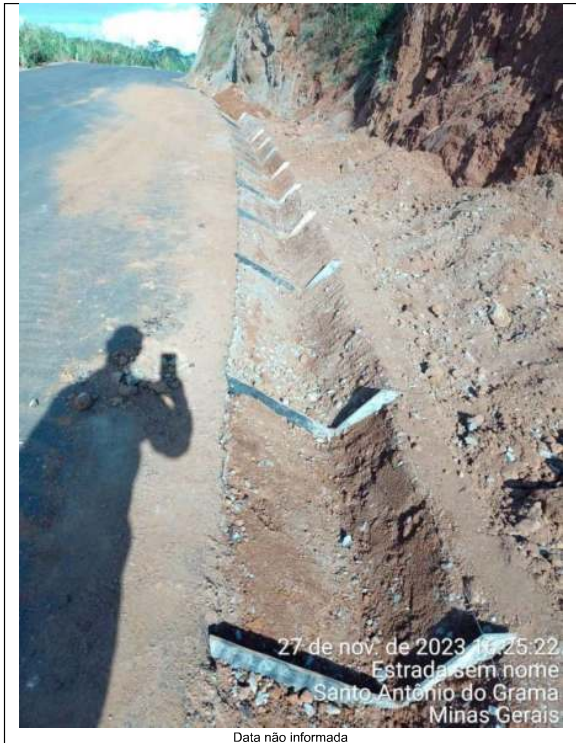

NÚMERO DE OC		OCORRÊNCIAS	
TIPO DE OCORRÊNCIA		DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA	
EQUIPE E05 27/11/2023		OBSERVAÇÕES	
MUNICÍPIO		CONFERÊNCIA	
Obs.:		CONSÓRCIO (Aprovado em 29/11/2023 - 14:43)	
		Obs.: *Construção de sarjetas, e gabaritos.	
		ASSINATURAS	
Luiz Henrique da Silva Borges Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 208579/D		PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA CREA 137.103/D	
		Luciano Xavier de Castro RT de Execução - CONSÓRCIO 3T-SOLOCAP-CONEP	
		CREA 59784/D	





RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº 0145	OBRA: CTP 229/2023 - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA		CONTRATO:		RESP. TÉCNICO: LUCIANO XAVIER	
ENDEREÇO: ESTRADA DE ACESSO ENTRE SANTO ANTÔNIO DO GRAMA E ABRE CAMPO			INÍCIO: 01/04/2023		Nº CREA-MG: 59784/D	
CIDDE:			PRAZO: 01/10/2023		Nº DA ART:	
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA			UF:		COORDENADAS:	
DATA: 27/11/2023			SOL ☀		NUBLADO ☁	
MANHÃ			✓		CHUVA ☔	
TARDE			✓		IMPRATICÁVEL ☔	
QTDE			MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO		QTDE	
1			AUXILIAR DE ENGENHARIA		1	
3			OPERADOR		1	
1			PEDREIRO		1	
QTDE			EQUIPAMENTO			
1			ESCAVADEIRA			
1			ROLO DE PNEU			
1			VEÍCULO DE APOIO			
1			CAMINHÃO BASCULANTE			
1			RETROESCAVADEIRA			
1			MOTONIVELADORA			
TAREFAS REALIZADAS						
NÚMERO DE T.R.	DESCRIÇÃO		OBSERVAÇÕES			
1	EXECUÇÃO DE SARJETA TRIANGULAR		REGIÃO: E0 A E02			
2	EXECUÇÃO DE DESCIDA D'ÁGUA		E100 LD			
3	APLICAÇÃO DE CONCRETO ESTRUTURAL		REGIÃO: E77 LE			
4	SINALIZAÇÃO					
5	LANÇAMENTO DE BICA CORRIDA		REGIÃO: E207 (ENTRADA P/ GRANJA); REGIÃO:TREVO COM A BR262			
REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATORIOS)						



Data não informada



Data não informada







OCORRÊNCIAS		
NÚMERO DE OC	TIPO DE OCORRÊNCIA	
DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA		
OBSERVAÇÕES		
EQUIPE E05 24/11/2023		
CONFERÊNCIA		
MUNICÍPIO	CONSÓRCIO (Aprovado em 28/11/2023 - 09:01)	
Obs.:	Obs.: *Drenagem: Construção de sarjeta e valetas com total de 77,20 mts, sarjeta e 28 mts de valetas, Descida dagua total 14 mts. *Preparo no asfalto (limpa roda), Pendencia do trevo da BR 262 e corrigir algumas irregularidades.	
ASSINATURAS		
Luiz Henrique da Silva Borges Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 208579/D	PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA CREA 137.103/D	Luciano Xavier de Castro RT de Execução - CONSÓRCIO 3T-SOLOCAP-CONEP CREA 59784/D





RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº 0144	OBRA: CTP 229/2023 - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	CONTRATO:	RESP. TÉCNICO: LUCIANO XAVIER
ENDEREÇO: ESTRADA DE ACESSO ENTRE SANTO ANTÔNIO DO GRAMA E ABRE CAMPO	INÍCIO: 01/04/2023	Nº CREA-MG: 59784/D	
CIDDE:	PRAZO: 01/10/2023	Nº DA ART:	
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA	UF:	COORDENADAS:	
DATA: 24/11/2023	SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA ☔
MANHÃ	✓		IMPRATICÁVEL ☁
TARDE	✓		
QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
1	AUXILIAR DE ENGENHARIA	1	ENCARREGADO DE OBRAS
3	OPERADOR	1	MOTORISTA
1	PEDREIRO	1	AJUDANTE
QTDE	EQUIPAMENTO		
1	ESCAVADEIRA		
1	VEÍCULO DE APOIO		
1	CAMINHÃO BASCULANTE		
1	RETROESCAVADEIRA		
1	MOTONIVELADORA		
TAREFAS REALIZADAS			
NÚMERO DE T.R.	DESCRIÇÃO	OBSERVAÇÕES	
1	EXECUÇÃO DE SARJETA TRIANGULAR	REGIÃO: E02 A E07	
2	EXECUÇÃO DE DESCIDA D'ÁGUA	E100 LD	
3	EXECUÇÃO DE CERCA	REGIÃO: E01, E64 E E39	
4	EXECUÇÃO DE ELEVação DE CAIXA DE BUEIRO	B64 LE	
5	EXECUÇÃO DE SUMP	REGIÃO: E97 LD (ACIMA DA CAPELA)	
6	SINALIZAÇÃO		

REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATORIOS)





Data não informada



Data não informada



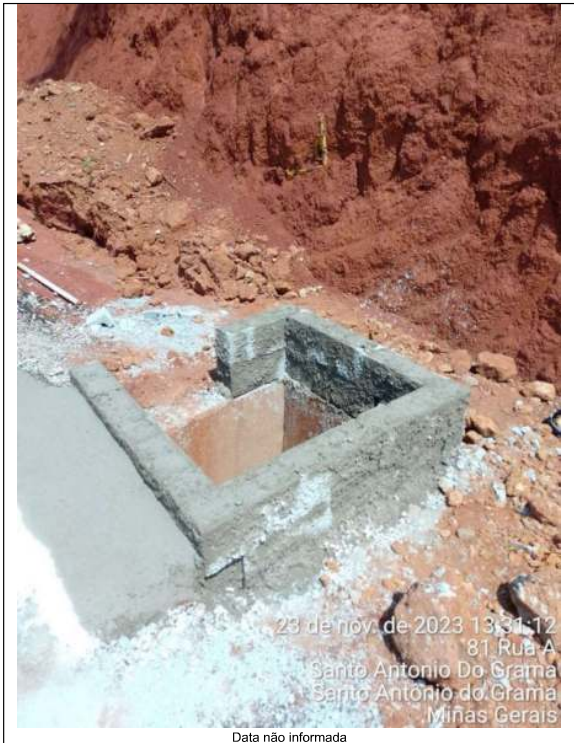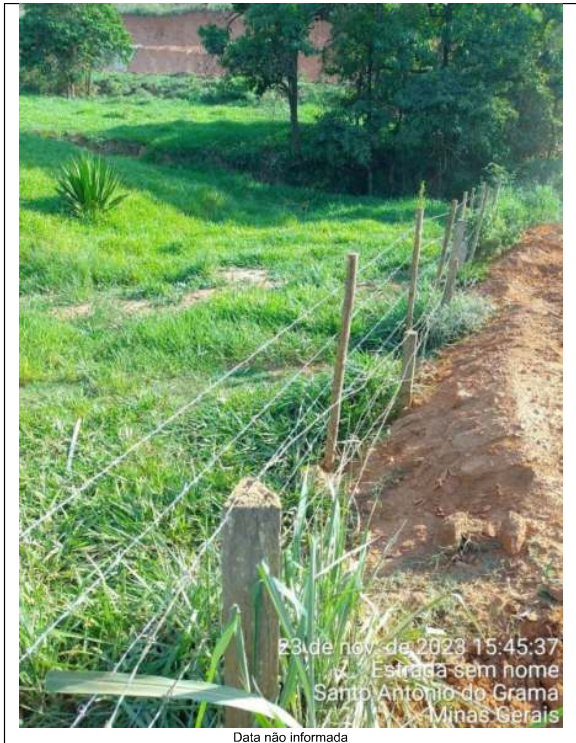


NÚMERO DE OC		TIPO DE OCORRÊNCIA	OCORRÊNCIAS	DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA
EQUIPE E05 23/11/2023			OBSERVAÇÕES	
MUNICÍPIO			CONFERÊNCIA	
Obs.:			CONSÓRCIO (Aprovado em 27/11/2023 - 08:58)	
			Obs.: "Construção de sarjetas e descida dagua, "Cerca: Execução em alguns pontos, totalizando 84,50 mis no dia,	
			ASSINATURAS	
Luiz Henrique da Silva Borges Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 208579/D		PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTONIO DO GRAMA CREA 137.103/D		Luciano Xavier de Castro RT de Execução - CONSORCIO 3T-SOLOCAP-CONEP CREA 59784/D




RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº 0143	OBRA: CTP 229/2023 - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	CONTRATO:	RESP. TÉCNICO: LUCIANO XAVIER
ENDEREÇO: ESTRADA DE ACESSO ENTRE SANTO ANTÔNIO DO GRAMA E ABRE CAMPO	INÍCIO: 01/04/2023	Nº CREA-MG: 59784/D	
CIDDE:	PRAZO: 01/10/2023	Nº DA ART:	
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA	UF:	COORDENADAS:	
DATA: 24/11/2023	SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA ☔
MANHÃ	✓		IMPRATICÁVEL ☔
TARDE	✓		
QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
1	AUXILIAR DE ENGENHARIA	1	ENCARREGADO DE OBRAS
3	OPERADOR	1	MOTORISTA
1	PEDREIRO	1	AJUDANTE
QTDE	EQUIPAMENTO		
1	ESCAVADEIRA		
1	VEÍCULO DE APOIO		
1	CAMINHÃO BASCULANTE		
1	RETROESCAVADEIRA		
1	MOTONIVELADORA		
	TAREFAS REALIZADAS		
NÚMERO DE T.R.	DESCRIÇÃO	OBSERVAÇÕES	
1	ELEVAÇÃO DE CAIXA DE BUEIRO	ELEVAÇÃO ED 43CM NO LADO DIREITO DOS BUEIROS: B12 E B43	
2	EXECUÇÃO DE NIVELAMENTO DE PISTA	REGIÃO: E207	
3	SINALIZAÇÃO		
4	EXECUÇÃO DE DESCIDA D'ÁGUA	REGIÃO: E94	
5	EXECUÇÃO E VALETA VPA	REGIÃO: E12 A E13+10	
6	EXECUÇÃO DE ATERRO	(NA BORDA DA PISTA) REGIÃO: E207 A E209	
REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATORIOS)			



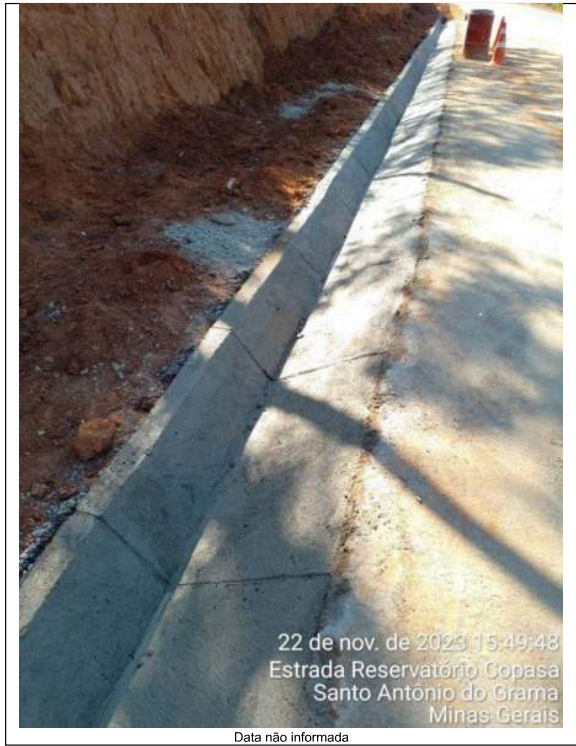

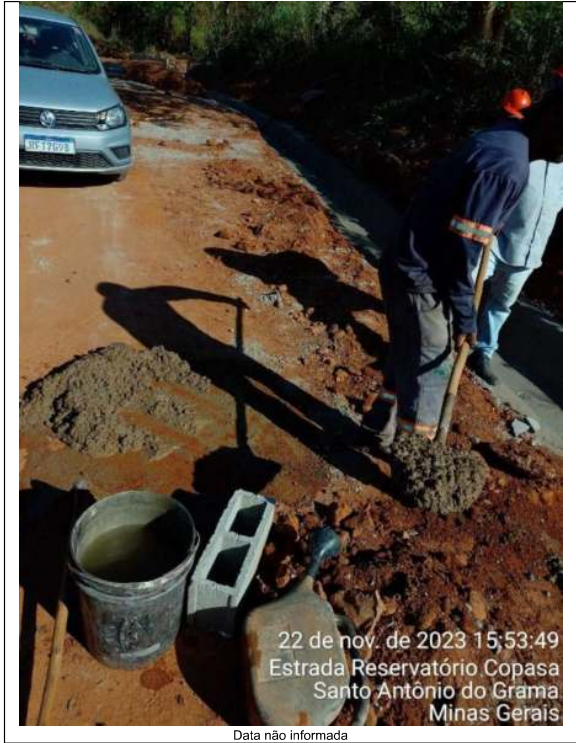

NÚMERO DE OC		TIPO DE OCORRÊNCIA	OCORRÊNCIAS	DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA
EQUIPE E05 22/11/2023		OBSERVAÇÕES		
MUNICÍPIO		CONFERÊNCIA		
Obs.:		CONSÓRCIO (Aprovado em 27/11/2023 - 08:56)		
		Obs.: *Construção de sarjetas e descida da água. *Terraplenagem: Transporte de material para arrumar o acesso dos sítios e fazendas.		
		ASSINATURAS		
Luiz Henrique da Silva Borges Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 208579/D		PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA CREA 137.103/D		Luciano Xavier de Castro RT de Execução - CONSORCIO 3T-SOLOCAP-CONEP CREA 59784/D



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº 0141		OBRA: CTP 229/2023 - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA		CONTRATO:		RESP. TÉCNICO: LUCIANO XAVIER	
ENDEREÇO: ESTRADA DE ACESSO ENTRE SANTO ANTÔNIO DO GRAMA E ABRE CAMPO				INÍCIO: 01/04/2023		Nº CREA-MG: 59784/D	
CIDDE:				PRAZO: 01/10/2023		Nº DA ART:	
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA				UF:		COORDENADAS:	
DATA: 22/11/2023		SOL ☀		NUBLADO ☁		CHUVA ☔	
MANHÃ		✓				IMPRATICÁVEL ☔	
TARDE		✓					
QTDE		MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO		QTDE		MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	
1		AUXILIAR DE ENGENHARIA		1		ENCARREGADO DE OBRAS	
3		OPERADOR		1		MOTORISTA	
1		PEDREIRO		1		AJUDANTE	
QTDE		EQUIPAMENTO					
1		ESCAVADEIRA					
1		VEÍCULO DE APOIO					
1		CAMINHÃO BASCULANTE					
1		RETROESCAVADEIRA					
TAREFAS REALIZADAS							
NÚMERO DE T.R.		DESCRIÇÃO		OBSERVAÇÕES			
1		EXECUÇÃO DE SARJETA TRIANGULAR		REGIÃO DAS ESTACAS E13 A E17			
2		SINALIZAÇÃO					
3		EXECUÇÃO DE SUMP		CONTENÇÃO E REDUÇÃO DE QUEDA D'ÁGUA: REGIÃO DAS ESTACAS E94 E E96			
REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATORIOS)							



Data não informada



Data não informada



NÚMERO DE OC		TIPO DE OCORRÊNCIA	OCORRÊNCIAS	DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA
EQUIPE E05 21/11/2023			OBSERVAÇÕES	
MUNICÍPIO			CONFERÊNCIA	
Obs.:			CONSÓRCIO (Aprovado em 24/11/2023 - 16:11)	
			Obs.: *Drenagem: construção de sarjeta, *Terraplenagem: Execução de samp no estacionamento por cima da igreja.	
			ASSINATURAS	
Luiz Henrique da Silva Borges Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 208579/D		PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA CREA 137.103/D		Luciano Xavier de Castro RT de Execução - CONSÓRCIO 3T-SOLOCAP-CONEP CREA 59784/D





RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº 0140	OBRA: CTP 229/2023 - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA		CONTRATO:		RESP. TÉCNICO: LUCIANO XAVIER	
ENDEREÇO: ESTRADA DE ACESSO ENTRE SANTO ANTÔNIO DO GRAMA E ABRE CAMPO			INÍCIO: 01/04/2023		Nº CREA-MG: 59784/D	
CIDDE:			PRAZO: 01/10/2023		Nº DA ART:	
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA			UF:		COORDENADAS:	
DATA: 21/11/2023	SOL ☀		NUBLADO ☁		CHUVA ☔	
MANHÃ	✓				IMPRATICÁVEL ☔	
TARDE	✓					
QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO			QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	
1	OPERADOR			1	MOTORISTA	
1	ENCARREGADO GERAL			1	PEDREIRO	
1	AJUDANTE					
QTDE	EQUIPAMENTO					
1	CAMINHÃO BASCULANTE					
1	RETROESCAVADEIRA					
TAREFAS REALIZADAS						
NÚMERO DE T.R.	DESCRIÇÃO			OBSERVAÇÕES		
1	SINALIZAÇÃO					
2	LIMPEZA MANUAL E MECÂNICA			REGIÃO DA E94		
REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)						



Data não informada



Data não informada





OCORRÊNCIAS			
NÚMERO DE OC	TIPO DE OCORRÊNCIA	DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA	
1	DEVIDO CHUVA AS CONDIÇÕES NA FRENTE DE SERVIÇO NÃO IMPOSSIBILITARAM A EXECUÇÃO DA ATIVIDADE DE DRENAGEM	CHUVA DURANTE A NOITE ANTERIOR	
OBSERVAÇÕES			
EQUIPE E05 20/11/2023			
CONFERÊNCIA			
MUNICÍPIO	CONSÓRCIO (Aprovado em 24/11/2023 - 16:08)		
Obs.:	Obs.: Atividade somente de limpeza, devido a chuva.		
ASSINATURAS			
Luiz Henrique da Silva Borges Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 208579/D		PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA CREA 137.103/D	
		Luciano Xavier de Castro RT de Execução - CONSÓRCIO 3T – SOLOCAP-CONEPP CREA 59784/D	






RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº 0139	OBRA: CTP 229/2023 - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	CONTRATO:	RESP. TÉCNICO: LUCIANO XAVIER
ENDEREÇO: ESTRADA DE ACESSO ENTRE SANTO ANTÔNIO DO GRAMA E ABRE CAMPO	INÍCIO: 01/04/2023	Nº CREA-MG: 59784/D	
CIDDE:	PRAZO: 01/10/2023	Nº DA ART:	
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA	UF:	COORDENADAS:	
DATA: 21/11/2023	SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA ☔
MANHÃ	✓		IMPRATICÁVEL ☔
TARDE	✓		
QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
1	AUXILIAR DE ENGENHARIA	1	ENCARREGADO DE OBRAS
3	OPERADOR	1	MOTORISTA
1	PEDREIRO	1	AJUDANTE
QTDE	EQUIPAMENTO		
1	ESCAVADEIRA		
1	ROLO DE PNEU		
1	CAMINHÃO BASCULANTE		
1	RETROESCAVADEIRA		
1	MOTONIVELADORA		
TAREFAS REALIZADAS			
NÚMERO DE T.R.	DESCRIÇÃO	OBSERVAÇÕES	
1	SINALIZAÇÃO		
2	EXECUÇÃO DE DESCIDA D'ÁGUA	B28 LE	
3	EXECUÇÃO DE SARJETA TRIANGULAR		
4	LIMPEZA MANUAL DE CAIXA DE BUEIRO	B258 LD	
5	REGULARIZAÇÃO/COMPACTAÇÃO DE SUB-BASE	(INCLUINDO LANÇAMENTO DE CASCALHO) TREVO SENTIDO ABRE CAMPO E TREVO SENTIDO REIO CASCA	

REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATORIOS)

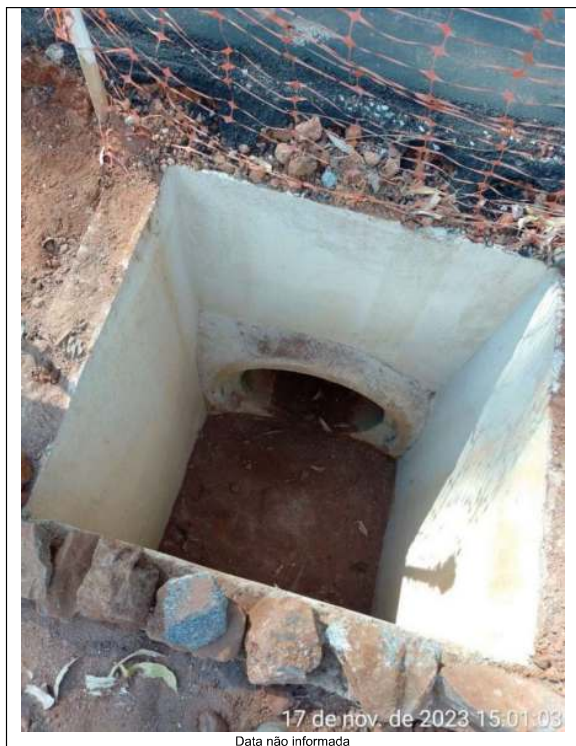

Data não informada



Data não informada






Data não informada



Data não informada



Data não informada

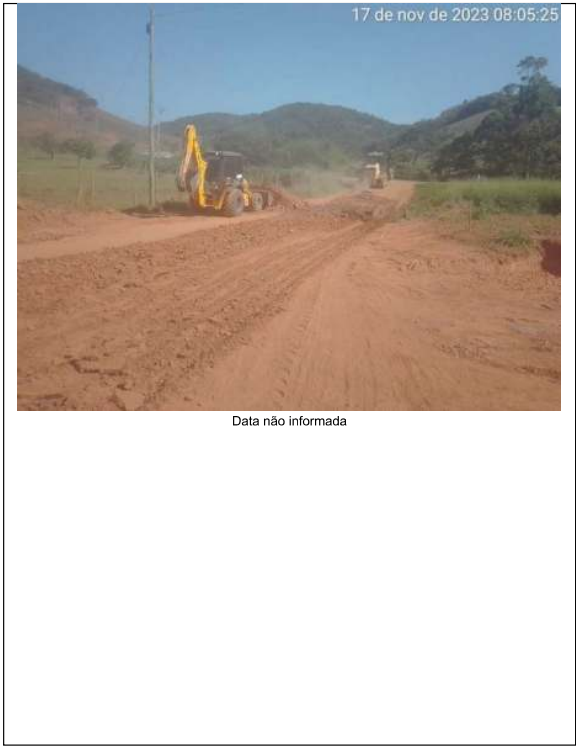

Data não informada





Data não informada

OCORRÊNCIAS	
NÚMERO DE OC	TIPO DE OCORRÊNCIA
OBSERVAÇÕES	
EQUIPE E05 17/11/2023	
CONFERÊNCIA	
MUNICÍPIO	CONSÓRCIO (Aprovado em 22/11/2023 - 16:51)
Obs.:	Obs.: *Construção de sarjeta. *Construção de descida de água. *Terraplenagem no trevo da BR262.
ASSINATURAS	
Luiz Henrique da Silva Borges Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 208579/D	PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA CREA 137.103/D
Luciano Xavier de Castro RT de Execução - CONSÓRCIO 3T –SOLOCAP-CONEPP CREA 59784/D	





Assinaturas do Documento



Documento Assinado Eletronicamente por **PEDRO MARTINO ZEFERINO**, CPF: 015.49*. **6- *9 em **19/12/2023 10:58:46**, Cód. Autenticidade da Assinatura: **10H4.8358.146W.357R.5610**, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Documento Assinado Eletronicamente por **LUCIANO XAVIER DE CASTRO**, CPF: 760.22*. **6- *5 em **19/12/2023 10:25:21**, Cód. Autenticidade da Assinatura: **1092.5E25.621A.Z64W.5270**, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Documento Assinado Eletronicamente por **LUIZ HENRIQUE DA SILVA BORGES**, CPF: 016.28*. **6- *7 em **15/12/2023 11:09:15**, Cód. Autenticidade da Assinatura: **1191.8209.3158.405R.3021**, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Informações do Documento

ID do Documento: **22B.0C1** - Tipo de Documento: **FORMULÁRIO DE MEDIÇÕES.**

Elaborado por **GILBERTO ARAUJO GOMIDES**, CPF: 069.58*. **6- *7 , em **15/12/2023 - 10:58:14**

Código de Autenticidade deste Documento: 1074.6758.814W.288U.0008

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:

<https://zeropapel.cimvalpi.mg.gov.br/verdocumento>

