



FORMULÁRIO DE MEDIÇÕES

RELATÓRIO PARCIAL (SITUAÇÃO: APROVADA PELO CONSÓRCIO)

Enviado por LUCAS CARVALHO SOARES em 19/03/2024 - 16:25

Registro: 19/03/2024	12ª MEDIÇÃO
Obra: CTP 229/2023 - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	Período de 21/02/2024 a 20/03/2024
Local: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA	
OBSERVAÇÕES	

Enviada por LUCAS CARVALHO SOARES (FORNECEDOR) em 19/03/2024 às 16:25

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	QUANTIDADE MEDIDA		VALOR MEDIDO						SALDO (BDI)	SALDO (ADMC)
							NESTA MEDIÇÃO	ACUMULADA	VALOR PREVISTO (BDI)	VALOR PREVISTO (ADMC)	NESTA MEDIÇÃO (BDI)	NESTA MEDIÇÃO (ADMC)	ACUMULADA (BDI)	ACUMULADA (ADMC)		
01	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO															
01.01	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA - para obras que exigem a utilização de grande quantidade de equipamentos e são executadas em centros urbanos ou próximos de centros urbanos. Obs.: Não se aplica aos serviços de tapa buracos.															
01.01.03	OBRAS DE VALOR ACIMA DE R\$ 3000.001,00 - MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA PAVIMENTAÇÃO, EXCLUSIVE PARA TAPA-BURACOS	%	0.2	R\$ 81.450,179,25	R\$ 166.536,094,60	R\$ 33.307,218,92	0.2	1,20003931964	R\$ 33.307,218,92	R\$ 43.749,032,06	R\$ 532,52	R\$ 21.221,18	R\$ 24.018,50	R\$ 33.265,997,74	R\$ 43.725,013,56	
05	DRENAGEM URBANA															
05.08	BUEIRO TUBULAR	M³	5,65	R\$ 16,35	R\$ 20,76	R\$ 117,29	5,65	5,65	R\$ 117,29	R\$ 121,36	R\$ 117,29	R\$ 121,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
05.09.04	LIMPEZA DE BUEIRO	M³	5,65	R\$ 16,35	R\$ 20,76	R\$ 117,29	5,65	5,65	R\$ 117,29	R\$ 121,36	R\$ 117,29	R\$ 121,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
05.16	DRENAGEM COMPLEMENTAR															
05.16.01	CAIXA COLETORA DE SARJETÁ - CGS 02 - COM GRELHA DE CONCRETO - TCC 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	UN	21	R\$ 3.012,81	R\$ 3.824,76	R\$ 80.319,96	1		R\$ 80.319,96	R\$ 83.103,72	R\$ 3.824,76	R\$ 68.845,68	R\$ 71.231,76	R\$ 11.474,28	R\$ 11.871,96	
05.16.05	DISPENSADOR DE ENERGIA - DES 03 - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	UN	8	R\$ 272,02	R\$ 345,33	R\$ 2.762,64	2		R\$ 2.762,64	R\$ 2.869,32	R\$ 690,66	R\$ 714,58	R\$ 714,58	R\$ 2.071,98	R\$ 2.143,74	
05.16.13	SARJETÁ TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 02 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M	3450	R\$ 57,88	R\$ 73,48	R\$ 253.506,00	2146,91	2404,31	R\$ 253.506,00	R\$ 262.303,50	R\$ 157.754,95	R\$ 176.668,70	R\$ 182.799,69	R\$ 76.837,30	R\$ 79.503,81	
05.16.14	VALETA DE PROTEÇÃO DE CORTES COM REVESTIMENTO DE CONCRETO - VPC 04 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M	2352,5	R\$ 77,28	R\$ 98,11	R\$ 230.803,78	398	2170	R\$ 230.803,78	R\$ 238.802,28	R\$ 39.047,78	R\$ 212.898,70	R\$ 220.276,70	R\$ 17.905,08	R\$ 18.525,58	
05.16.16	VALETA DE PROTEÇÃO DE ATÉRSOS COM REVESTIMENTO DE CONCRETO - VPA 04 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M	2267,5	R\$ 79,13	R\$ 100,45	R\$ 227.770,38	80	1305,3	R\$ 227.770,38	R\$ 235.861,28	R\$ 8.036,00	R\$ 6.314,40	R\$ 131.117,39	R\$ 96.652,99	R\$ 100.001,45	
10	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E PROTEÇÕES AMBIENTAIS															
10.14	REVESTIMENTO VEGETAL COM SEMEADURA MANUAL (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)	m²	20494,02	R\$ 1,73	R\$ 2,20	R\$ 45.086,84	20494,02	20494,02	R\$ 45.086,84	R\$ 46.521,43	R\$ 45.086,84	R\$ 45.086,84	R\$ 46.521,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
13	SINALIZAÇÃO VERTICAL / HORIZONTAL															
13.02	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL															
13.02.02	LINHAS DE RESINA ACRILICA DE 0,6MM DE ESPESURA E LARGURA = 0,10M (EXECUÇÃO, INCLUINDO PRÉ-MARCAÇÃO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)	m	29693	R\$ 2,15	R\$ 2,73	R\$ 81.061,89	4000	4000	R\$ 81.061,89	R\$ 83.734,26	R\$ 10.920,00	R\$ 10.920,00	R\$ 11.280,00	R\$ 70.141,89	R\$ 72.454,26	
13.02.04	PRÉ-MARCAÇÃO PARA LINHAS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL POR ALINHAMENTO (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, BORDO ESQUERDO E BORDO DIREITO)	km	6,74	R\$ 91,42	R\$ 116,06	R\$ 782,24	6,74	6,74	R\$ 782,24	R\$ 809,34	R\$ 782,24	R\$ 782,24	R\$ 809,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	





RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº 0209	OBRA: CTP 229/2023 - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	CONTRATO:	RESP. TÉCNICO: LUCIANO XAVIER
ENDEREÇO: ESTRADA DE ACESSO ENTRE SANTO ANTÔNIO DO GRAMA E ABRE CAMPO		INÍCIO: 01/04/2023	Nº CREA-MG: 59784/D
CIDDE:		PRAZO: 01/10/2023	Nº DA ART:
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA		UF:	COORDENADAS:
DATA: 18/03/2024	SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA ☔
MANHÃ	✓		IMPRATICÁVEL ☔
TARDE	✓		
QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
3	ENCARREGADO DE OBRAS	1	OPERADOR
2	MOTORISTA	4	PEDREIRO
12	AJUDANTE		
QTDE	EQUIPAMENTO		
1	AIRLESS (PINTURA DE VIA)		
4	VEÍCULO DE APOIO		
1	SERRA CLIPPER		
1	CAMINHÃO BASCULANTE		
1	SOPRADOR		
1	BETONEIRA		
TAREFAS REALIZADAS			
NÚMERO DE T.R.	DESCRIÇÃO	OBSERVAÇÕES	
1	EXECUÇÃO DE SARJETA		
2	EXECUÇÃO DE DESCIDA D'ÁGUA		
3	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA P/ SARJETA		
4	SINALIZAÇÃO		
REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATORIOS)			



Data não informada

OCORRÊNCIAS

NÚMERO DE OC	TIPO DE OCORRÊNCIA	DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA
1	A EQUIPE DE PINTURA NÃO PODE EXECUTAR SUAS ATIVIDADES POIS OS INSUMOS NÃO FORAM ENTREGUES	AGUARDANDO ENRTEGA DE INSUMOS P/ PINTURA



2	O APARELHO UTILIZADO PARA REGISTRO DAS FOTOS DESCARREGOU E FOI UTILIZADO OUTRO COMO SUPORTE.	APARELHO DESCARREGADO
OBSERVAÇÕES		
EQUIPE E05 E E20 15/03/2024		
CONFERÊNCIA		
MUNICÍPIO	CONSÓRCIO (Aprovado em 19/03/2024 - 09:17)	
Obs.:	Obs.: *Construção de sarjetas nas Est.313 a 318 com 103,80mts.	
ASSINATURAS		
<hr/> Luiz Henrique da Silva Borges Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 208579/D	<hr/> PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA CREA 137.103/D	<hr/> Luciano Xavier de Castro RT de Execução - CONSÓRCIO 3T -SOLOCAP-CONEP CREA 59784/D



Nº 0208	OBRA: CTP 229/2023 - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	CONTRATO:	RESP. TÉCNICO: LUCIANO XAVIER
ENDEREÇO: ESTRADA DE ACESSO ENTRE SANTO ANTÔNIO DO GRAMA E ABRE CAMPO		INÍCIO: 01/04/2023	Nº CREA-MG: 59784/D
CIDDE:		PRAZO: 01/10/2023	Nº DA ART:
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA		UF:	COORDENADAS:
DATA: 15/03/2024	SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA ☔
MANHÃ	✓		IMPRATICÁVEL ☔
TARDE	✓		

QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
3	ENCARREGADO DE OBRAS	1	OPERADOR
2	MOTORISTA	4	PEDREIRO
12	AJUDANTE		

QTDE	EQUIPAMENTO
1	AIRLESS (PINTURA DE VIA)
4	VEÍCULO DE APOIO
1	SERRA CLIPPER
1	CAMINHÃO BASCULANTE
1	SOPRADOR
1	BETONEIRA

TAREFAS REALIZADAS		
NÚMERO DE T.R.	DESCRIÇÃO	OBSERVAÇÕES
1	EXECUÇÃO DE DESCIDA D'ÁGUA	
2	EXECUÇÃO DE SARJETA	
3	SINALIZAÇÃO	
4	EXECUÇÃO DE VALA P/ SARJETA	

REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATORIOS)



OCORRÊNCIAS		
NÚMERO DE OC	TIPO DE OCORRÊNCIA	DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA
1	A EQUIPE DE PINTURA NÃO PODE EXECUTAR SUAS ATIVIDADES POIS OS INSUMOS NÃO FORAM ENTREGUES	AGUARDANDO ENRTEGA DE INSUMOS P/ PINTURA




OBSERVAÇÕES		
EQUIPE E05 E E20 14/03/2024		

CONFERÊNCIA



MUNICÍPIO	CONSÓRCIO (Aprovado em 18/03/2024 - 08:32)	
Obs.:	Obs.: *Construção de sarjetas da Est. 308 até 313 com total 96,80 e 4,40 mts.	
ASSINATURAS		
Luiz Henrique da Silva Borges Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 208579/D	PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA CREA 137.103/D	Luciano Xavier de Castro RT de Execução - CONSÓRCIO 3T - SOLOCAP- CONEPP CREA 59784/D



Nº 0207	OBRA: CTP 229/2023 - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	CONTRATO:	RESP. TÉCNICO: LUCIANO XAVIER
ENDEREÇO: ESTRADA DE ACESSO ENTRE SANTO ANTÔNIO DO GRAMA E ABRE CAMPO		INÍCIO: 01/04/2023	Nº CREA-MG: 59784/D
CIDDE:		PRAZO: 01/10/2023	Nº DA ART:
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA		UF:	COORDENADAS:
DATA: 14/03/2024	SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA ☔
MANHÃ	✓		IMPRATICÁVEL ☔
TARDE	✓		
QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
3	ENCARREGADO DE OBRAS	1	OPERADOR
2	MOTORISTA	4	PEDREIRO
12	AJUDANTE		
QTDE	EQUIPAMENTO		
1	AIRLESS (PINTURA DE VIA)		
4	VEÍCULO DE APOIO		
1	SERRA CLIPPER		
1	CAMINHÃO BASCULANTE		
1	SOPRADOR		
1	BETONEIRA		
TAREFAS REALIZADAS			
NÚMERO DE T.R.	DESCRIÇÃO	OBSERVAÇÕES	
1	EXECUÇÃO DE DESCIDA D'ÁGUA		
2	SINALIZAÇÃO		
3	EXECUÇÃO DE VALA P/ SARJETA		
4	EXECUÇÃO DE SARJETA		
REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATORIOS)			
 <p>13 de mar de 2024, 16:00:50 S 20° 17' 39" W 42° 33' 43" Altitude: 638.0meter Rapidez: 0.0km/h</p> <p>Data não informada</p>		 <p>13 de mar de 2024, 16:00:47 S 20° 17' 39" W 42° 33' 43" Altitude: 638.0meter Rapidez: 0.0km/h</p> <p>Data não informada</p>	
 <p>13 de mar de 2024, 16:00:42 S 20° 17' 39" W 42° 33' 44" Altitude: 633.0meter Rapidez: 15.8km/h</p> <p>Data não informada</p>			
OCORRÊNCIAS			
NÚMERO DE OC	TIPO DE OCORRÊNCIA	DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA	
1	A EQUIPE DE PINTURA NÃO PODE EXECUTAR SUAS ATIVIDADES POIS OS INSUMOS NÃO FORAM ENTREGUES	AGUARDANDO ENRTEGA DE INSUMOS P/ PINTURA	
OBSERVAÇÕES			
EQUIPE E05 E E20 13/03/2024			
CONFERÊNCIA			

MUNICÍPIO	CONSÓRCIO (Aprovado em 15/03/2024 - 14:24)
Obs.:	Obs.: *Construção de sarjetas e descida de água nas Est. 290 a Est.296 - Total de 110 mts e 4,70 de descida de água. *Equipe de pintura não trabalhou devido a falta de insumos.
ASSINATURAS	
<p>_____ Luiz Henrique da Silva Borges Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 208579/D</p>	<p>_____ PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA CREA 137.103/D</p>
	<p>_____ Luciano Xavier de Castro RT de Execução - CONSÓRCIO 3T –SOLOCAP-CONEPP CREA 59784/D</p>



Nº 0206	OBRA: CTP 229/2023 - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	CONTRATO:	RESP. TÉCNICO: LUCIANO XAVIER
ENDEREÇO: ESTRADA DE ACESSO ENTRE SANTO ANTÔNIO DO GRAMA E ABRE CAMPO		INÍCIO: 01/04/2023	Nº CREA-MG: 59784/D
CIDDE:		PRAZO: 01/10/2023	Nº DA ART:
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA		UF:	COORDENADAS:
DATA: 13/03/2024	SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA ☔
MANHÃ	✓		IMPRATICÁVEL ☔
TARDE	✓		
QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
3	ENCARREGADO DE OBRAS	1	OPERADOR
2	MOTORISTA	4	PEDREIRO
7	AJUDANTE		
QTDE	EQUIPAMENTO		
1	AIRLESS (PINTURA DE VIA)		
4	VEÍCULO DE APOIO		
1	SERRA CLIPPER		
1	CAMINHÃO BASCULANTE		
1	SOPRADOR		
1	BETONEIRA		
TAREFAS REALIZADAS			
NÚMERO DE T.R.	DESCRICAÇÃO	OBSERVAÇÕES	
1	EXECUÇÃO DE VALA P/ SARJETA		
2	SINALIZAÇÃO		
3	EXECUÇÃO DE SARJETA		

REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATORIOS)






OCORRÊNCIAS		
NÚMERO DE OC	TIPO DE OCORRÊNCIA	DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA
1	A EQUIPE DE PINTURA NÃO PODE EXECUTAR SUAS ATIVIDADES POIS OS INSUMOS NÃO FORAM ENTREGUES	AGUARDANDO ENRTEGA DE INSUMOS P/ PINTURA
OBSERVAÇÕES		
EQUIPE E05 12/03/2024		
CONFERÊNCIA		
MUNICÍPIO	CONSÓRCIO (Aprovado em 14/03/2024 - 09:31)	
Obs.:	Obs.: *Execução de sarjetas, nas Est. 318 a Est. 322. Conforme executado em campo.	
ASSINATURAS		
Luiz Henrique da Silva Borges Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 208579/D	PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA CREA 137.103/D	Luciano Xavier de Castro RT de Execução - CONSÓRCIO 3T –SOLOCAP-CONEPP CREA 59784/D




RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº 0205	OBRA: CTP 229/2023 - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	CONTRATO:	RESP. TÉCNICO: LUCIANO XAVIER
ENDEREÇO: ESTRADA DE ACESSO ENTRE SANTO ANTÔNIO DO GRAMA E ABRE CAMPO		INÍCIO: 01/04/2023	Nº CREA-MG: 59784/D
CIDDE:		PRAZO: 01/10/2023	Nº DA ART:
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA		UF:	COORDENADAS:
DATA: 12/03/2024	SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA ☔
MANHÃ	✓		IMPRATICÁVEL ☔
TARDE	✓		
QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
3	ENCARREGADO DE OBRAS	1	OPERADOR
3	MOTORISTA	4	PEDREIRO
7	AJUDANTE		
QTDE	EQUIPAMENTO		
1	AIRLESS (PINTURA DE VIA)		
4	VEÍCULO DE APOIO		
1	SERRA CLIPPER		
2	CAMINHÃO BASCULANTE		
1	SOPRADOR		
1	RETROESCAVADEIRA		
1	BETONEIRA		
TAREFAS REALIZADAS			
NÚMERO DE T.R.	DESCRICAÇÃO	OBSERVAÇÕES	
1	EXECUÇÃO DE VALA P/ SARJETA		
2	EXECUÇÃO DE SARJETA		
3	PINTURA DE PISTA: SINALIZAÇÃO HORIZONTAL		
4	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE MATERIAL P/ ATERRO	BORDO DE PISTA	
5	EXECUÇÃO DE ATERRO	BORDO DE PISTA	
6	SINALIZAÇÃO		
7	CARGA/TRANSPORTE DE MATERIAL P/ ATERRO	BORDO DE PISTA	


REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATORIOS)

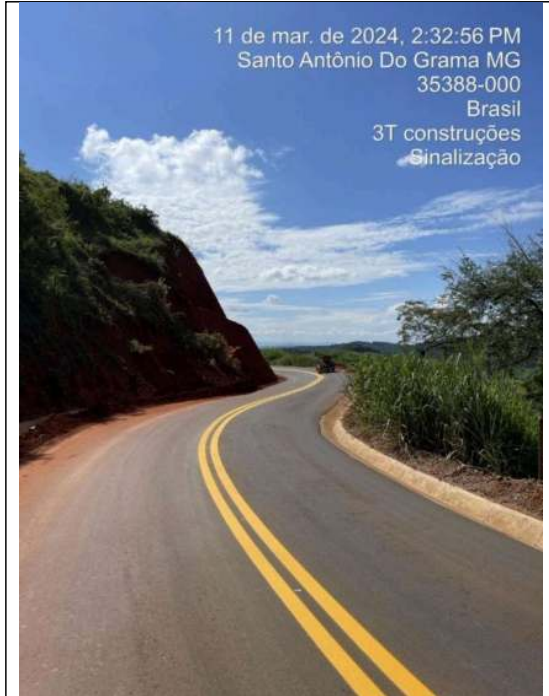


Data não informada

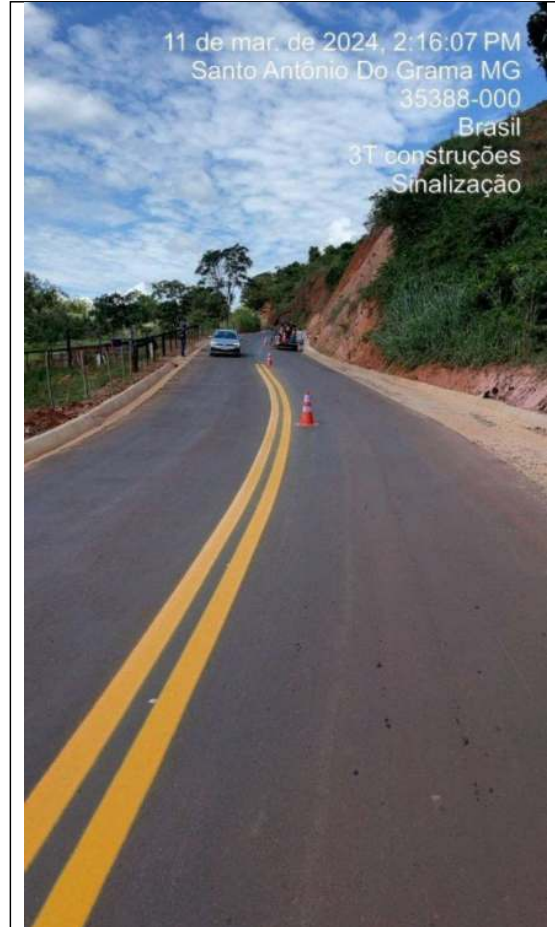

Data não informada

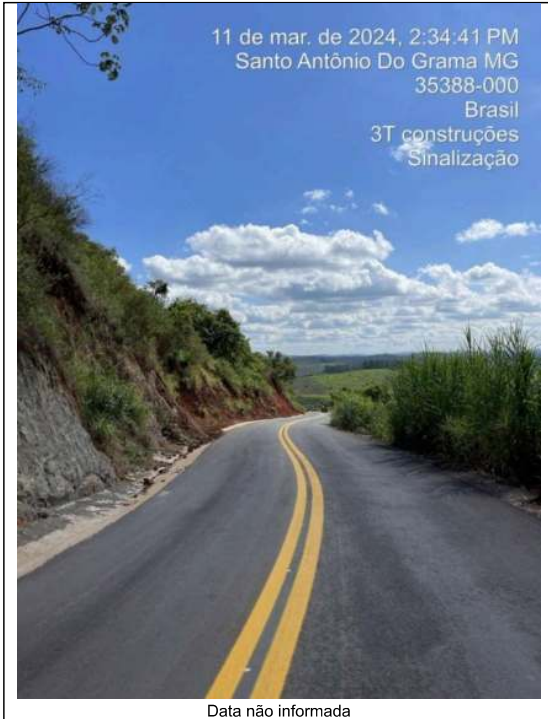


Data não informada

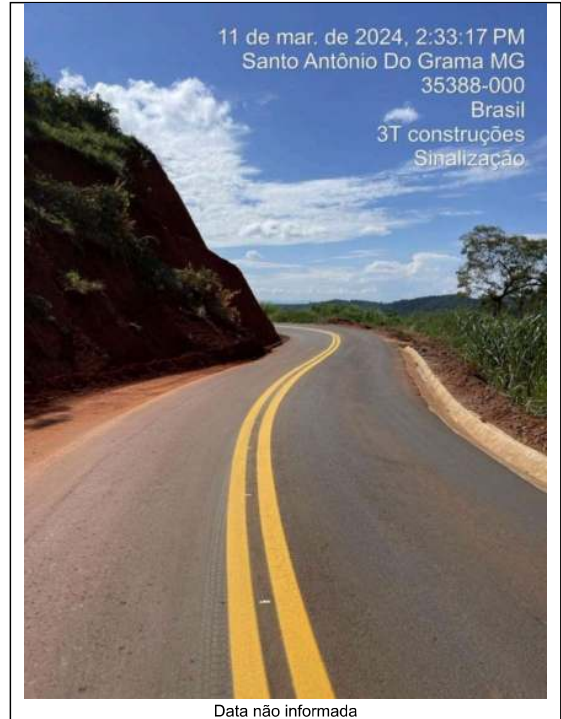

Data não informada



Data não informada

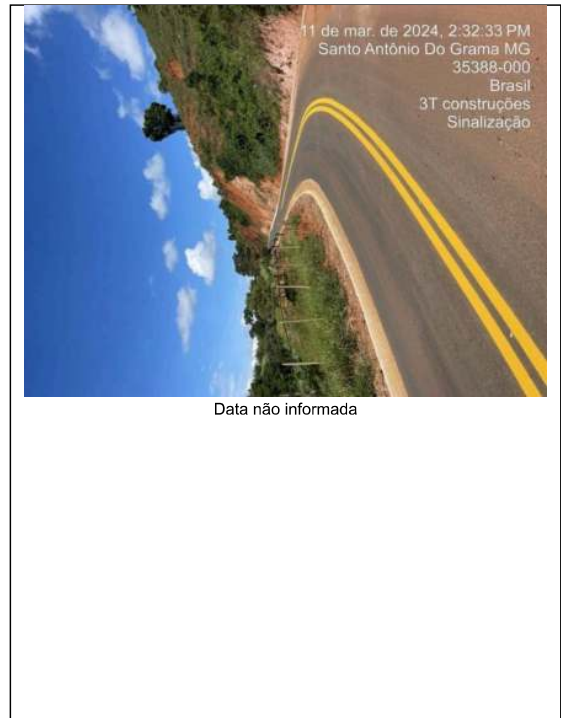


Data não informada





Data não informada

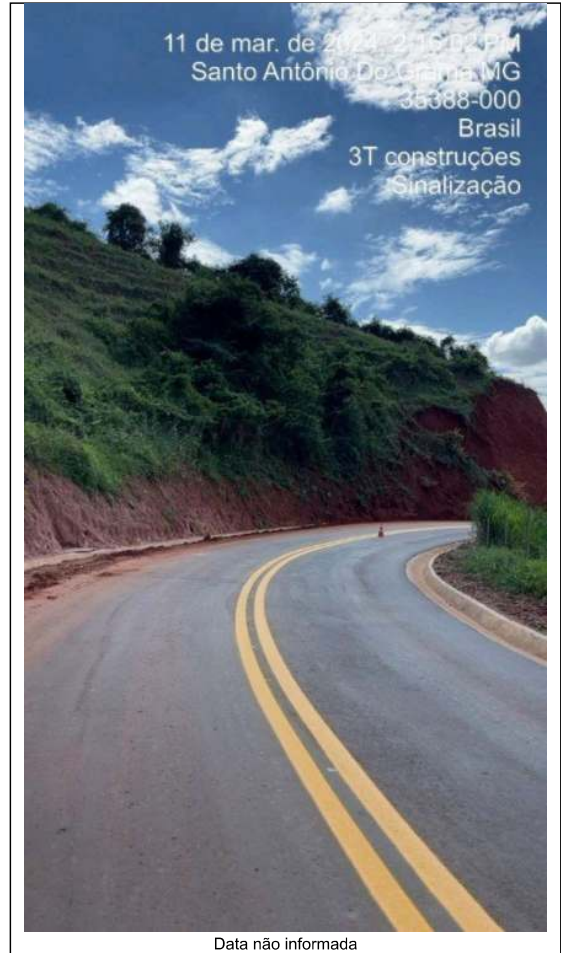

Data não informada

OCORRÊNCIAS	
NÚMERO DE OC	TIPO DE OCORRÊNCIA
EQUIPE E05 E E20 11/03/2024	
OBSERVAÇÕES	
CONFERÊNCIA	
MUNICÍPIO	CONSORCIO (Aprovado em 13/03/2024 - 11:44)
Obs.:	Obs.: Construção de sarjetas nas Est. 309 a Est. 313 - Total 103,20mts.
ASSINATURAS	
_____ Luiz Henrique da Silva Borges Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 208579/D	_____ PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA CREA 137.103/D
_____ Luciano Xavier de Castro RT de Execução - CONSÓRCIO 3T –SOLOCAP-CONEPP CREA 59784/D	





RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº 0204	OBRA: CTP 229/2023 - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	CONTRATO:	RESP. TÉCNICO: LUCIANO XAVIER	
ENDEREÇO: ESTRADA DE ACESSO ENTRE SANTO ANTÔNIO DO GRAMA E ABRE CAMPO		INÍCIO: 01/04/2023	Nº CREA-MG: 59784/D	
CIDDE:		PRAZO: 01/10/2023	Nº DA ART:	
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA		UF:	COORDENADAS:	
DATA: 12/03/2024	SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA ☔	IMPRATICÁVEL ☔
MANHÃ	✓			
TARDE	✓			
QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	
7	AJUDANTE			
QTDE	EQUIPAMENTO			
1	CAMINHÃO BASCULANTE			
TAREFAS REALIZADAS				
NÚMERO DE T.R.	DESCRICAÇÃO	OBSERVAÇÕES		
1	CARGA/TRANSPORTE DE MATERIAL P/ ATERRO	BORDO DE PISTA		
2	PINTURA DE PISTA: SINALIZAÇÃO HORIZONTAL			
3	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE MATERIAL P/ ATERRO	BORDO DE PISTA		
4	EXECUÇÃO DE SARJETA			
5	SINALIZAÇÃO			
6	EXECUÇÃO DE ATERRO	BORDO DE PISTA		
7	EXECUÇÃO DE VALA P/ SARJETA			
REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATORIOS)				
OCORRÊNCIAS				
NÚMERO DE OC	TIPO DE OCORRÊNCIA	DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA		
OBSERVAÇÕES				
EQUIPE E05 E E20 11/03/2024				
CONFERÊNCIA				
MUNICÍPIO	CONSÓRCIO (Reprovado)			
Obs.:	Obs.:			
ASSINATURAS				
Luiz Henrique da Silva Borges Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 208579/D	PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA CREA 137.103/D	Luciano Xavier de Castro RT de Execução - CONSÓRCIO 3T - SOLOCAP-CONEPP CREA 59784/D		

Nº 0203	OBRA: CTP 229/2023 - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	CONTRATO:	RESP. TÉCNICO: LUCIANO XAVIER
ENDEREÇO: ESTRADA DE ACESSO ENTRE SANTO ANTÔNIO DO GRAMA E ABRE CAMPO		INÍCIO: 01/04/2023	Nº CREA-MG: 59784/D
CIDDE:		PRAZO: 01/10/2023	Nº DA ART:
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA		UF:	COORDENADAS:
DATA: 11/03/2024	SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA ☔
MANHÃ	✓		IMPRATICÁVEL ☔
TARDE	✓		
QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
3	ENCARREGADO DE OBRAS	1	OPERADOR
3	MOTORISTA	4	PEDREIRO
7	AJUDANTE		
QTDE	EQUIPAMENTO		
1	AIRLESS (PINTURA DE VIA)		
4	VEÍCULO DE APOIO		
1	SERRA CLIPPER		
2	CAMINHÃO BASCULANTE		
1	SOPRADOR		
1	RETROESCAVADEIRA		
1	BETONEIRA		
TAREFAS REALIZADAS			
NÚMERO DE T.R.	DESCRIÇÃO	OBSERVAÇÕES	
1	EXECUÇÃO DE ATERRAMENTO	BORDO DE PISTA	
2	EXECUÇÃO DE VALA P/ SARJETA		
3	SINALIZAÇÃO		
4	EXECUÇÃO DE SARJETA		
5	EXECUÇÃO DE DESCIDA D'ÁGUA		
6	CARGA/TRANSPORTE DE MATERIAL P/ ATERRAMENTO	BORDO DE PISTA	
7	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE MATERIAL	MATERIAL PARA ATERRAMENTO DO BORDO DE PISTA	

REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATORIOS)





Data não informada




Data não informada

OCORRÊNCIAS	
NÚMERO DE OC	TIPO DE OCORRÊNCIA
OBSERVAÇÕES	
EQUIPE E05 E E20 08/03/2024	
CONFERÊNCIA	
MUNICÍPIO	CONSÓRCIO (Reprovado)
Obs.:	Obs.: *RDO LANÇADO FORA DO PERIODO - REPROVADO
ASSINATURAS	
_____ Luiz Henrique da Silva Borges Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 208579/D	_____ PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA CREA 137.103/D
_____ Luciano Xavier de Castro RT de Execução - CONSÓRCIO 3T -SOLOCAP-CONEPP CREA 59784/D	




Nº 0202	OBRA: CTP 229/2023 - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	CONTRATO:	RESP. TÉCNICO: LUCIANO XAVIER
ENDEREÇO: ESTRADA DE ACESSO ENTRE SANTO ANTÔNIO DO GRAMA E ABRE CAMPO		INÍCIO: 01/04/2023	Nº CREA-MG: 59784/D
CIDDE:		PRAZO: 01/10/2023	Nº DA ART:
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA		UF:	COORDENADAS:
DATA: 08/03/2024	SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA ☔
MANHÃ		✓	IMPRATICÁVEL ☁
TARDE	✓		
QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
3	ENCARREGADO DE OBRAS	1	OPERADOR
3	MOTORISTA	4	PEDREIRO
7	AJUDANTE		
QTDE	EQUIPAMENTO		
1	AIRLESS (PINTURA DE VIA)		
4	VEÍCULO DE APOIO		
1	SERRA CLIPPER		
2	CAMINHÃO BASCULANTE		
1	SOPRADOR		
1	RETROESCAVADEIRA		
1	BETONEIRA		
TAREFAS REALIZADAS			
NÚMERO DE T.R.	DESCRICAÇÃO	OBSERVAÇÕES	
1	SINALIZAÇÃO		
2	EXECUÇÃO DE VALA P/ SARJTA		
3	EXECUÇÃO DE DESCIDA D'ÁGUA		
4	EXECUÇÃO DE SARJETA		

REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATORIOS)

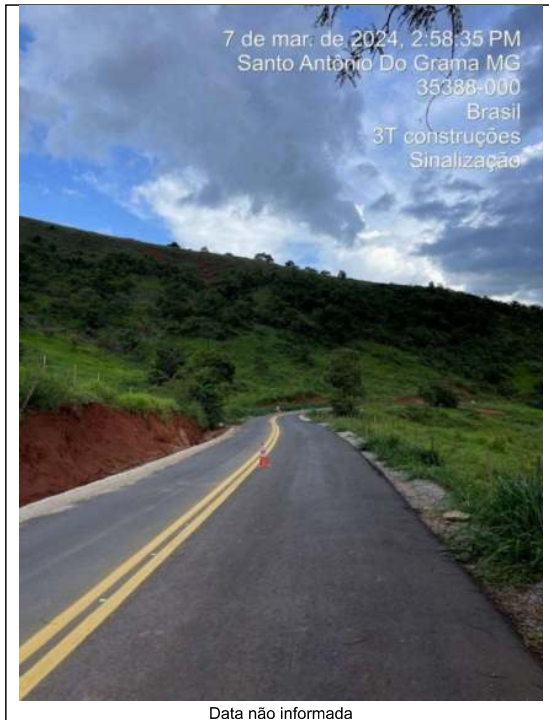


Data não informada

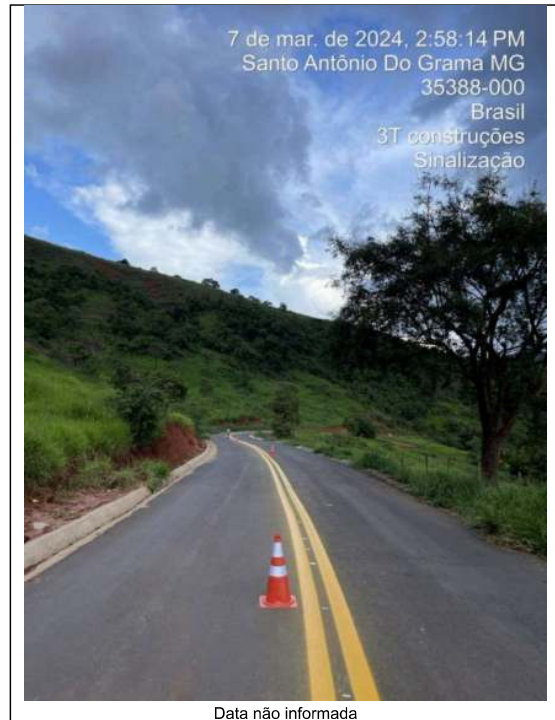


Data não informada



Data não informada

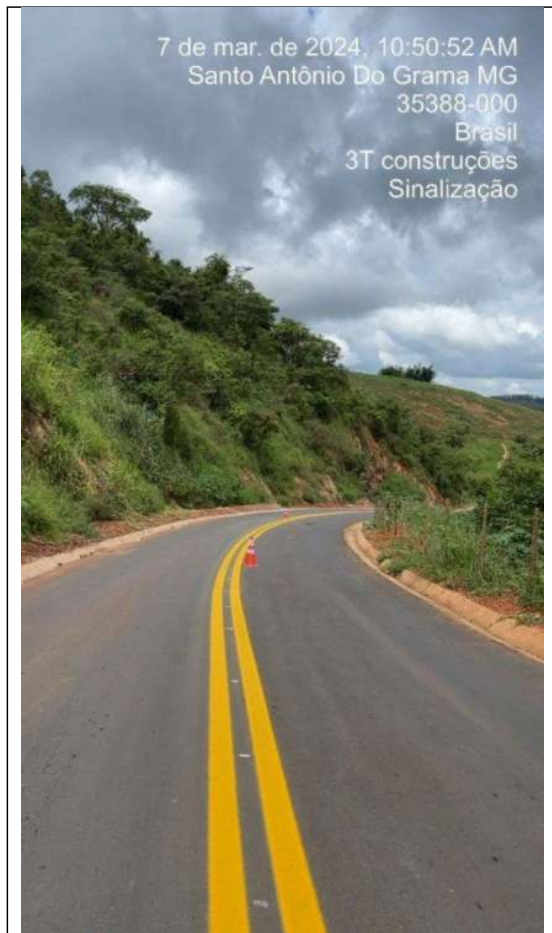

Data não informada

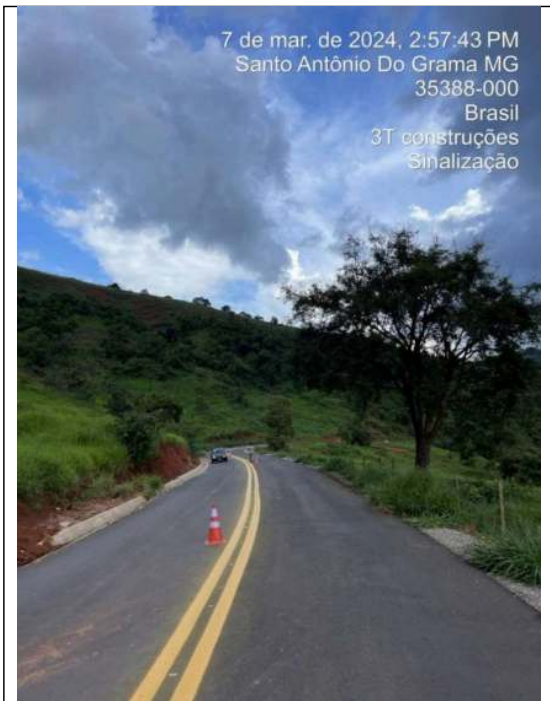

Data não informada



Data não informada

OCORRÊNCIAS		
NÚMERO DE OC	TIPO DE OCORRÊNCIA	DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA
OBSERVAÇÕES		
EQUIPE E05 E E20 07/03/2024		
CONFERÊNCIA		
MUNICÍPIO		
CONSÓRCIO (Aprovado em 11/03/2024 - 15:28)		
Obs.:	Obs.: *Pintura da faixa central. Necessário ajustar o equipamento, pois esta espirrando nas laterais quando executa a pintura. *Construção de canaletas.	



ASSINATURAS

Luiz Henrique da Silva Borges
Fiscal de Obras - CIMVALPI
CREA 208579/D

PEDRO MARTINO ZEFERINO
Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA
CREA 137.103/D

Luciano Xavier de Castro
RT de Execução - CONSÓRCIO 3T - SOLOCAP- CONEPP
CREA 59784/D




Nº 0201	OBRA: CTP 229/2023 - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	CONTRATO:	RESP. TÉCNICO: LUCIANO XAVIER
ENDEREÇO: ESTRADA DE ACESSO ENTRE SANTO ANTÔNIO DO GRAMA E ABRE CAMPO		INÍCIO: 01/04/2023	Nº CREA-MG: 59784/D
CIDDE:		PRAZO: 01/10/2023	Nº DA ART:
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA		UF:	COORDENADAS:
DATA: 07/03/2024	SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA ☔
MANHÃ	✓		IMPRATICÁVEL ☁
TARDE	✓		
QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
3	ENCARREGADO DE OBRAS	1	OPERADOR
2	MOTORISTA	4	PEDREIRO
7	AJUDANTE		
QTDE	EQUIPAMENTO		
1	AIRLESS (PINTURA DE VIA)		
4	VEÍCULO DE APOIO		
1	SERRA CLIPPER		
1	CAMINHÃO BASCULANTE		
1	SOPRADOR		
1	RETROESCAVADEIRA		
1	BETONEIRA		
TAREFAS REALIZADAS			
NÚMERO DE T.R.	DESCRICAÇÃO	OBSERVAÇÕES	
1	EXECUÇÃO DE SARJETA		
2	EXECUÇÃO DE VALA P/ SARJETA		
3	SINALIZAÇÃO		
4	EXECUÇÃO DE PINTURA DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL		
5	EXECUÇÃO DE DESCIDA D'ÁGUA		

REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATORIOS)



Data não informada

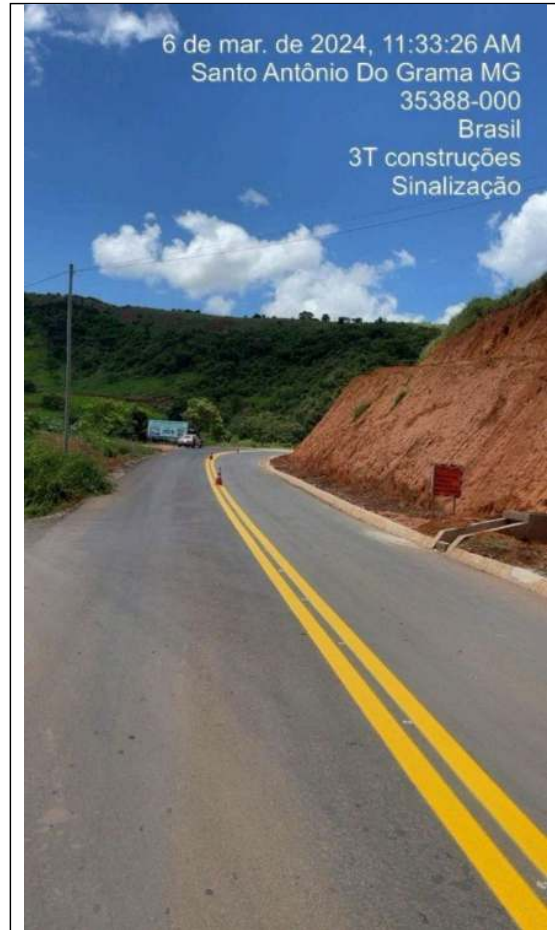


Data não informada







Data não informada

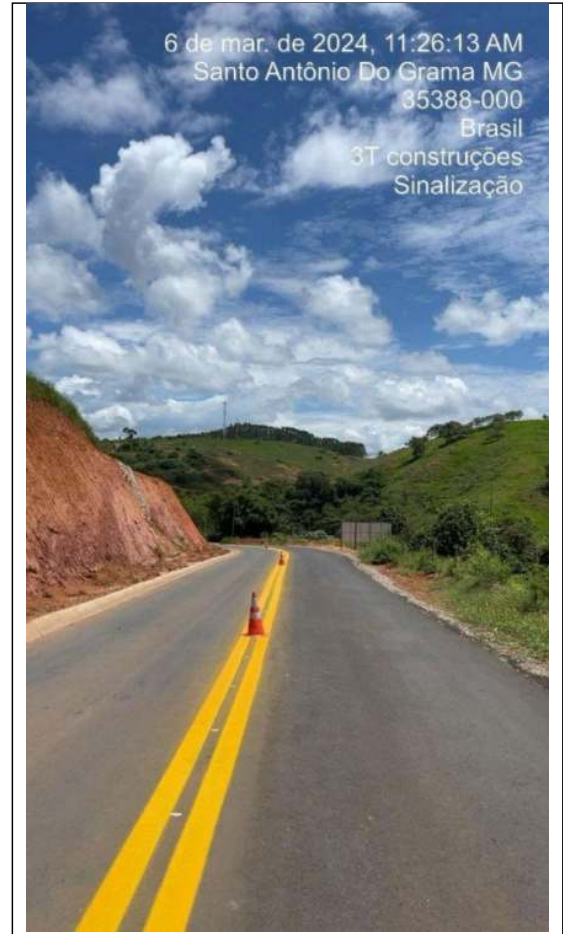





Data não informada

OCORRÊNCIAS	
NÚMERO DE OC	TIPO DE OCORRÊNCIA
EQUIPE E05 E E20 06/03/2024	
OBSERVAÇÕES	
CONFERÊNCIA	
MUNICÍPIO	CONSÓRCIO (Aprovado em 08/03/2024 - 09:03)
Obs.:	Obs.: *Construção de sarjetas nas Est. 230 até Est. 236 com total de 94,70mts e descida da água na Est. 239 lado direito com total de 3,20mts.
ASSINATURAS	
<p>Luiz Henrique da Silva Borges Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 208579/D</p>	<p>PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA CREA 137.103/D</p>
<p>Luciano Xavier de Castro RT de Execução - CONSÓRCIO 3T - SOLOCAP-CONEP CREA 59784/D</p>	



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº 0200	OBRA: CTP 229/2023 - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	CONTRATO:	RESP. TÉCNICO: LUCIANO XAVIER
ENDEREÇO: ESTRADA DE ACESSO ENTRE SANTO ANTÔNIO DO GRAMA E ABRE CAMPO		INÍCIO: 01/04/2023	Nº CREA-MG: 59784/D
CIDDE:		PRAZO: 01/10/2023	Nº DA ART:
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA		UF:	COORDENADAS:
DATA: 06/03/2024	SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA ☔
MANHÃ	✓		IMPRATICÁVEL ☔
TARDE	✓		
QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
3	ENCARREGADO DE OBRAS	1	OPERADOR
2	MOTORISTA	4	PEDREIRO
7	AJUDANTE		
QTDE	EQUIPAMENTO		
1	AIRLESS (PINTURA DE VIA)		
4	VEÍCULO DE APOIO		
1	SERRA CLIPPER		
1	CAMINHÃO BASCULANTE		
1	SOPRADOR		
1	RETROESCAVADEIRA		
1	BETONEIRA		
TAREFAS REALIZADAS			
NÚMERO DE T.R.	DESCRICAÇÃO	OBSERVAÇÕES	
1	EXECUÇÃO DE VALA P/ SARJETA		
2	REALIZAÇÃO DE TESTE P/ INÍCIO DE PINTURA		
3	EXECUÇÃO DE SARJETA		
4	SINALIZAÇÃO		
REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATORIOS)			
 <p>Data não informada</p>		 <p>Data não informada</p>	
 <p>Data não informada</p>		 <p>Data não informada</p>	
OCORRÊNCIAS			
NÚMERO DE OC	TIPO DE OCORRÊNCIA	DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA	
OBSERVAÇÕES			
EQUIPE E05 E E20 05/03/2024			
CONFERÊNCIA			
MUNICÍPIO		CONSÓRCIO (Aprovado em 07/03/2024 - 08:39)	



Obs.:

Obs.: *Construção de sarjetas nas Est. 243 a Est. 248 com total de 109,60mts.

ASSINATURAS

Luiz Henrique da Silva Borges
Fiscal de Obras - CIMVALPI
CREA 208579/D

PEDRO MARTINO ZEFERINO
Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA
CREA 137.103/D

Luciano Xavier de Castro
RT de Execução - CONSÓRCIO 3T -SOLOCAP-CONEPP
CREA 59784/D



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº 0199	OBRA: CTP 229/2023 - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	CONTRATO:	RESP. TÉCNICO: LUCIANO XAVIER
ENDEREÇO: ESTRADA DE ACESSO ENTRE SANTO ANTÔNIO DO GRAMA E ABRE CAMPO		INÍCIO: 01/04/2023	Nº CREA-MG: 59784/D
CIDDE:		PRAZO: 01/10/2023	Nº DA ART:
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA		UF:	COORDENADAS:
DATA: 05/03/2024	SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA ☔
MANHÃ	✓		IMPRATICÁVEL ☔
TARDE	✓		
QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
3	ENCARREGADO DE OBRAS	1	OPERADOR
2	MOTORISTA	4	PEDREIRO
9	AJUDANTE		
QTDE	EQUIPAMENTO		
1	AIRLESS (PINTURA DE VIA)		
3	VEÍCULO DE APOIO		
1	SERRA CLIPPER		
1	CAMINHÃO BASCULANTE		
1	SOPRADOR		
1	RETROESCAVADEIRA		
1	BETONEIRA		
TAREFAS REALIZADAS			
NÚMERO DE T.R.	DESCRIÇÃO	OBSERVAÇÕES	
1	EXECUÇÃO DE VALA P/ SARJETA		
2	EXECUÇÃO DE SARJETA		
3	REALIZAÇÃO DE TESTES P/ INÍCIO DE PINTURA		
4	EXECUÇÃO DE DESCIDA D'ÁGUA		
5	SINALIZAÇÃO		

REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATORIOS)





Data não informada



Data não informada



Data não informada



Data não informada






Data não informada


OCORRÊNCIAS	
NÚMERO DE OC	TIPO DE OCORRÊNCIA
DESCRÇÃO DA OCORRÊNCIA	
OBSERVAÇÕES	
EQUIPE E05 E E20 04/03/2024	
CONFERÊNCIA	
MUNICÍPIO	CONSÓRCIO (Aprovado em 06/03/2024 - 08:20)
Obs.:	Obs.: *Construção de sarjetas nas Est. 323 a Est. 329 com 109,60 mts e descida dagua com total de 2,50 mts na Est. 324.
ASSINATURAS	
Luiz Henrique da Silva Borges Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 208579/D	PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA CREA 137.103/D
Luciano Xavier de Castro RT de Execução - CONSÓRCIO 3T –SOLOCAP-CONEPP CREA 59784/D	

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO


Nº 0198	OBRA: CTP 229/2023 - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	CONTRATO:	RESP. TÉCNICO: LUCIANO XAVIER
ENDEREÇO: ESTRADA DE ACESSO ENTRE SANTO ANTÔNIO DO GRAMA E ABRE CAMPO		INÍCIO: 01/04/2023	Nº CREA-MG: 59784/D
CIDDE:		PRAZO: 01/10/2023	Nº DA ART:
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA		UF:	COORDENADAS:
DATA: 04/03/2024	SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA ☔
MANHÃ	✓		IMPRATICÁVEL ☔
TARDE	✓		
QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
2	ENCARREGADO DE OBRAS	1	OPERADOR
1	MOTORISTA	4	PEDREIRO
8	AJUDANTE		
QTDE	EQUIPAMENTO		
2	VEÍCULO DE APOIO		
1	SERRA CLIPPER		
1	CAMINHÃO BASCULANTE		
1	RETROESCAVADEIRA		
1	BETONEIRA		
TAREFAS REALIZADAS			
NÚMERO DE T.R.	DESCRICO	OBSERVAÇÕES	
1	EXECUÇÃO DE VALA P/ SARJTA		
2	EXECUÇÃO DE SARJETA		
3	SINALIZAÇÃO		
4	EXECUÇÃO DE DESCIDA D'ÁGUA		
REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)			
 <p style="text-align: center;">Data não informada</p>		 <p style="text-align: center;">Data não informada</p>	
OCORRÊNCIAS			
NÚMERO DE OC	TIPO DE OCORRÊNCIA	DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA	
OBSERVAÇÕES			
EQUIPE E05 01/03/2024			
CONFERÊNCIA			
MUNICÍPIO	CONSÓRCIO (Aprovado em 05/03/2024 - 08:59)		
Obs.:	Obs.: *Construção de sarjetas 56,30mts e decida dagua 4,30mts.		
ASSINATURAS			
Luiz Henrique da Silva Borges Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 208579/D	PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA CREA 137.103/D	Luciano Xavier de Castro RT de Execução - CONSÓRCIO 3T -SOLOCAP-CONEP CREA 59784/D	

Nº 0197	OBRA: CTP 229/2023 - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	CONTRATO:	RESP. TÉCNICO: LUCIANO XAVIER
ENDEREÇO: ESTRADA DE ACESSO ENTRE SANTO ANTÔNIO DO GRAMA E ABRE CAMPO		INÍCIO: 01/04/2023	Nº CREA-MG: 59784/D
CIDDE:		PRAZO: 01/10/2023	Nº DA ART:
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA		UF:	COORDENADAS:
DATA: 01/03/2024	SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA ☔
MANHÃ	✓		IMPRATICÁVEL ☔
TARDE	✓		
QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
1	ENCARREGADO DE OBRAS	1	MOTORISTA
1	AJUDANTE		
QTDE	EQUIPAMENTO		
1	AIRLESS (PINTURA DE VIA)		
2	VEÍCULO DE APOIO		
1	SOPRADOR		
TAREFAS REALIZADAS			
NÚMERO DE T.R.	DESCRICAÇÃO	OBSERVAÇÕES	
1	PREPARAÇÃO/TESTES PARA INÍCIO DE PINTURA		
2	SINALIZAÇÃO		
3	LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA FRENTE DE SERVIÇO		

REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATORIOS)

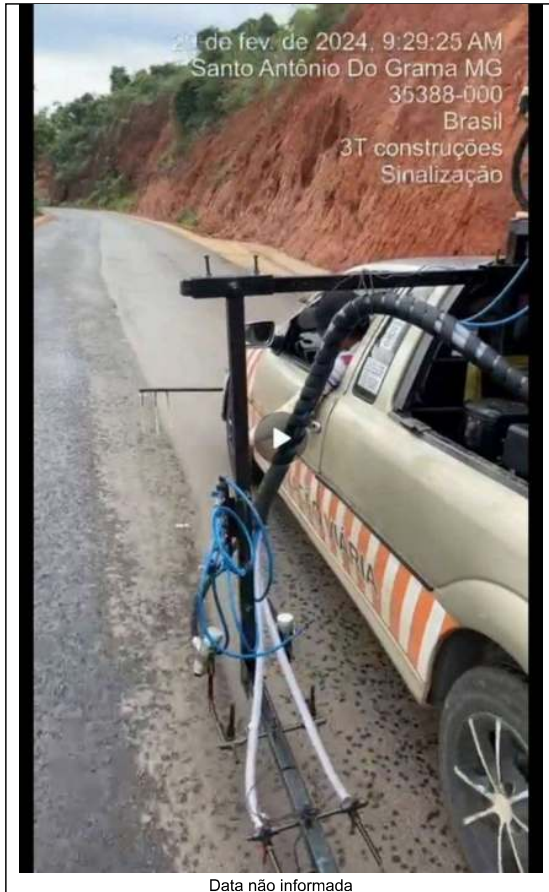

Data não informada

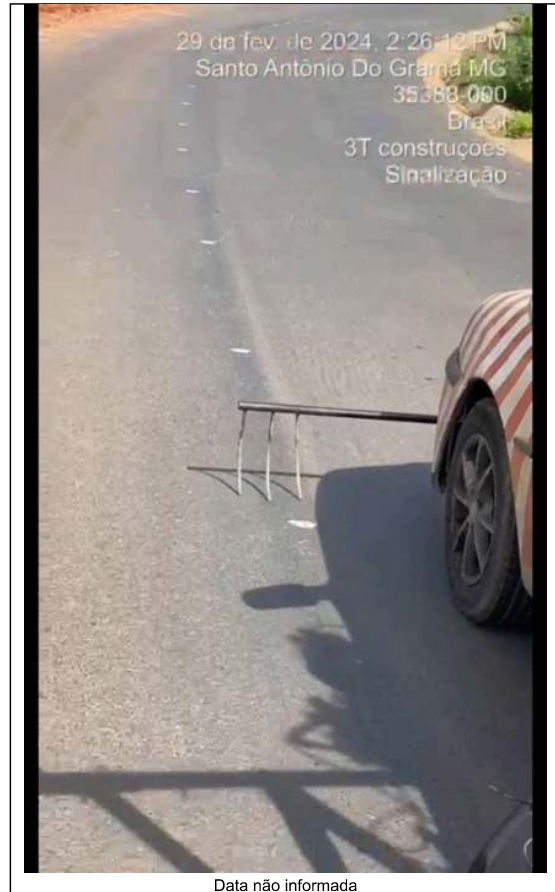

Data não informada






Data não informada



Data não informada

OCORRÊNCIAS		
NÚMERO DE OC	TIPO DE OCORRÊNCIA	DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA
OBSERVAÇÕES		
EQUIPE E20 29/02/2024		
CONFERÊNCIA		
MUNICÍPIO	CONSÓRCIO (Aprovado em 05/03/2024 - 08:58)	
Obs.:	Obs.: *Conforme executado em campo.	
ASSINATURAS		
_____ Luiz Henrique da Silva Borges Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 208579/D	_____ PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA CREA 137.103/D	_____ Luciano Xavier de Castro RT de Execução - CONSÓRCIO 3T -SOLOCAP-CONEPP CREA 59784/D



Nº 0196	OBRA: CTP 229/2023 - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	CONTRATO:	RESP. TÉCNICO: LUCIANO XAVIER
ENDEREÇO: ESTRADA DE ACESSO ENTRE SANTO ANTÔNIO DO GRAMA E ABRE CAMPO		INÍCIO: 01/04/2023	Nº CREA-MG: 59784/D
CIDDE:		PRAZO: 01/10/2023	Nº DA ART:
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA		UF:	COORDENADAS:
DATA: 01/03/2024	SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA ☔
MANHÃ	✓		IMPRATICÁVEL ☔
TARDE	✓		
QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
2	ENCARREGADO DE OBRAS	1	OPERADOR
1	MOTORISTA	4	PEDREIRO
10	AJUDANTE		
QTDE	EQUIPAMENTO		
2	VEÍCULO DE APOIO		
1	SERRA CLIPPER		
1	CAMINHÃO BASCULANTE		
1	RETROESCAVADEIRA		
1	BETONEIRA		
TAREFAS REALIZADAS			
NÚMERO DE T.R.	DESCRICO	OBSERVAÇÕES	
1	EXECUÇÃO DE SARJETA		
2	SINALIZAÇÃO		
3	ABERTURA/ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA P/ SAJETA		
4	EXECUÇÃO DE DESCIDA D'ÁGUA		
REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATORIOS)			
 <p style="text-align: center;">Data não informada</p>			
 <p style="text-align: center;">Data não informada</p>			
 <p style="text-align: center;">Data não informada</p>			
OCORRÊNCIAS			
NÚMERO DE OC	TIPO DE OCORRÊNCIA	DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA	
OBSERVAÇÕES			
EQUIPE E05 29/02/2024			
CONFERÊNCIA			
MUNICÍPIO	CONSÓRCIO (Aprovado em 05/03/2024 - 08:56)		
Obs.:	Obs.: *Construção de sarjeta nas Est. 309 a Est. 325 com 109,30mts. *Construção de decida dagua 2,50 mts.		







ASSINATURAS


Luiz Henrique da Silva Borges
Fiscal de Obras - CIMVALPI
CREA 208579/D

PEDRO MARTINO ZEFERINO
Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA
CREA 137.103/D

Luciano Xavier de Castro
RT de Execução - CONSÓRCIO 3T - SOLOCAP- CONEPP
CREA 59784/D



Nº 0195	OBRA: CTP 229/2023 - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	CONTRATO:	RESP. TÉCNICO: LUCIANO XAVIER
ENDEREÇO: ESTRADA DE ACESSO ENTRE SANTO ANTÔNIO DO GRAMA E ABRE CAMPO		INÍCIO: 01/04/2023	Nº CREA-MG: 59784/D
CIDDE:		PRAZO: 01/10/2023	Nº DA ART:
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA		UF:	COORDENADAS:
DATA: 29/02/2024	SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA ☔
MANHÃ	✓		IMPRATICÁVEL ☔
TARDE	✓		
QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
2	ENCARREGADO DE OBRAS	1	OPERADOR
1	MOTORISTA	4	PEDREIRO
10	AJUDANTE		
QTDE	EQUIPAMENTO		
2	VEÍCULO DE APOIO		
1	SERRA CLIPPER		
1	CAMINHÃO BASCULANTE		
1	RETROESCAVADEIRA		
1	BETONEIRA		
TAREFAS REALIZADAS			
NÚMERO DE T.R.	DESCRICO	OBSERVAÇÕES	
1	EXECUÇÃO DE SARJETA		
2	SINALIZAÇÃO		
3	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA P/ SARJETA		
4	PREPARAÇÃO DE TERRENO PARA EXECUÇÃO DE SARJETA		
REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATORIOS)			
 <p>28 de fev. de 2024, 09:30:31 S 20° 17' 34", W 42° 33' 35" Altitude: 631.7meter Rapidez: 0.0km/h</p> <p>Data não informada</p>		 <p>28 de fev. de 2024, 14:49:10 S 20° 17' 36", W 42° 33' 38" Altitude: 628.0meter Rapidez: 0.0km/h</p> <p>Data não informada</p>	
 <p>28 de fev. de 2024, 09:42:52 S 20° 17' 35", W 42° 33' 35" Altitude: 626.7meter Rapidez: 0.0km/h</p> <p>Data não informada</p>		 <p>28 de fev. de 2024, 09:43:56 S 20° 17' 35", W 42° 33' 35" Altitude: 626.0meter Rapidez: 0.2km/h</p> <p>Data não informada</p>	
OCORRÊNCIAS			
NÚMERO DE OC	TIPO DE OCORRÊNCIA	DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA	
OBSERVAÇÕES			
EQUIPE E05 28/02/2024			
CONFERÊNCIA			
MUNICÍPIO	CONSÓRCIO (Aprovado em 05/03/2024 - 08:47)		
Obs.:	Obs.: *Construção de sarjetas nas Est. 300 a Est. 324 e Est.314 a Est. 321 com 105,30mts.		



ASSINATURAS

Luiz Henrique da Silva Borges
Fiscal de Obras - CIMVALPI
CREA 208579/D

PEDRO MARTINO ZEFERINO
Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA
CREA 137.103/D

Luciano Xavier de Castro
RT de Execução - CONSÓRCIO 3T - SOLOCAP-CONEPP
CREA 59784/D



Nº 0194	OBRA: CTP 229/2023 - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	CONTRATO:	RESP. TÉCNICO: LUCIANO XAVIER
ENDEREÇO: ESTRADA DE ACESSO ENTRE SANTO ANTÔNIO DO GRAMA E ABRE CAMPO		INÍCIO: 01/04/2023	Nº CREA-MG: 59784/D
CIDDE:		PRAZO: 01/10/2023	Nº DA ART:
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA		UF:	COORDENADAS:
DATA: 29/02/2024	SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA ☔
MANHÃ	✓		IMPRATICÁVEL ☔
TARDE	✓		
QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
2	ENCARREGADO DE OBRAS	1	OPERADOR
1	MOTORISTA	4	PEDREIRO
10	AJUDANTE		
QTDE	EQUIPAMENTO		
2	VEÍCULO DE APOIO		
1	SERRA CLIPPER		
1	CAMINHÃO BASCULANTE		
1	RETROESCAVADEIRA		
1	BETONEIRA		
TAREFAS REALIZADAS			
NÚMERO DE T.R.	DESCRICO	OBSERVAÇÕES	
1	EXECUÇÃO DE SARJETA		
2	SINALIZAÇÃO		

REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)



OCORRÊNCIAS		
NÚMERO DE OC	TIPO DE OCORRÊNCIA	DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA
OBSERVAÇÕES		
EQUIPE E05 27/02/2024		
CONFERÊNCIA		
MUNICÍPIO	CONSORCIO (Aprovado em 05/03/2024 - 08:44)	
Obs.:	Obs.: *Construção de sarjeta 151mts nas Est. 212 a 221 e Est. 205 a Est. 308.	
ASSINATURAS		

Luiz Henrique da Silva Borges

PEDRO MARTINO ZEFERINO

Luciano Xavier de Castro



Fiscal de Obras - CIMVALPI
CREA 208579/D

Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA
CREA 137.103/D

RT de Execução - CONSÓRCIO 3T - SOLOCAP- CONEPP
CREA 59784/D



Nº 0193	OBRA: CTP 229/2023 - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	CONTRATO:	RESP. TÉCNICO: LUCIANO XAVIER
ENDEREÇO: ESTRADA DE ACESSO ENTRE SANTO ANTÔNIO DO GRAMA E ABRE CAMPO		INÍCIO: 01/04/2023	Nº CREA-MG: 59784/D
CIDDE:		PRAZO: 01/10/2023	Nº DA ART:
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA		UF:	COORDENADAS:
DATA: 22/02/2024	SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA ☔
MANHÃ		✓	IMPRATICÁVEL ☁
TARDE		✓	
QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
2	ENCARREGADO DE OBRAS	1	MOTORISTA
4	PEDREIRO	10	AJUDANTE
QTDE	EQUIPAMENTO		
2	VEÍCULO DE APOIO		
1	SERRA CLIPPER		
1	CAMINHÃO BASCULANTE		
1	BETONEIRA		
TAREFAS REALIZADAS			
NÚMERO DE T.R.	DESCRIÇÃO	OBSERVAÇÕES	
1	EXECUÇÃO DE SARJETA		
2	EXECUÇÃO DE DESCIDA D'ÁGUA		
3	EXECUÇÃO DE CORTE E ATERRO	LATERAL DA PISTA	
4	SINALIZAÇÃO		

REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)



Data não informada

OCORRÊNCIAS		
NÚMERO DE OC	TIPO DE OCORRÊNCIA	DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA
OBSERVAÇÕES		
EQUIPE E05 21/02/2024		
CONFERÊNCIA		
MUNICÍPIO		
CONSÓRCIO (Aprovado em 23/02/2024 - 14:31)		
Obs.:	Obs.: *RDO com pouca foto. *Não tem serra clipper na obra. *Serviço apresentado na foto precisa ser refeito o aterro.	

ASSINATURAS

Luiz Henrique da Silva Borges
Fiscal de Obras - CIMVALPI
CREA 208579/D

PEDRO MARTINO ZEFERINO
Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA
CREA 137.103/D

Luciano Xavier de Castro
RT de Execução - CONSÓRCIO 3T - SOLOCAP- CONEPP
CREA 59784/D





Nº 0192	OBRA: CTP 229/2023 - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	CONTRATO:	RESP. TÉCNICO: LUCIANO XAVIER
ENDEREÇO: ESTRADA DE ACESSO ENTRE SANTO ANTÔNIO DO GRAMA E ABRE CAMPO		INÍCIO: 01/04/2023	Nº CREA-MG: 59784/D
CIDDE:		PRAZO: 01/10/2023	Nº DA ART:
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA		UF:	COORDENADAS:
DATA: 21/02/2024	SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA ☔
MANHÃ		✓	IMPRATICÁVEL ☔
TARDE		✓	
QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
2	ENCARREGADO DE OBRAS	1	MOTORISTA
4	PEDREIRO	10	AJUDANTE
QTDE	EQUIPAMENTO		
2	VEÍCULO DE APOIO		
1	SERRA CLIPPER		
1	CAMINHÃO BASCULANTE		
1	BETONEIRA		
TAREFAS REALIZADAS			
NÚMERO DE T.R.	DESCRICAÇÃO	OBSERVAÇÕES	
1	EXECUÇÃO DE SARJETA		
2	EXECUÇÃO DE CORTE E ATERRO	LATERAL DA PISTA	
3	SINALIZAÇÃO		
4	EXECUÇÃO DE DESCIDA D'ÁGUA		

REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATORIOS)



OCORRÊNCIAS		
NÚMERO DE OC	TIPO DE OCORRÊNCIA	DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA
OBSERVAÇÕES		
EQUIPE E05 20/02/2024		
CONFERÊNCIA		
MUNICÍPIO	CONSÓRCIO (Aprovado em 22/02/2024 - 11:54)	
Obs.:	Obs.: *Conforme executado em campo.	
ASSINATURAS		

Luiz Henrique da Silva Borges
Fiscal de Obras - CIMVALPI
CREA 208579/D

PEDRO MARTINO ZEFERINO
Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA
CREA 137.103/D

Luciano Xavier de Castro
RT de Execução - CONSÓRCIO 3T - SOLOCAP- CONEPP
CREA 59784/D



CIMVALPI

CONSORCIO INTERMUNICIPAL
MULTISETORIAL DO VALE DO PIRANGA

Assinaturas do Documento



Documento Assinado Eletronicamente por **LUCIANO XAVIER DE CASTRO**, CPF: 760.22*. **6- *5 em **21/03/2024 17:46:47**, Cód. Autenticidade da Assinatura: **17H7.2Z46.347A.7677.5403**, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Documento Assinado Eletronicamente por **PEDRO MARTINO ZEFERINO**, CPF: 015.49*. **6- *9 em **21/03/2024 16:16:09**, Cód. Autenticidade da Assinatura: **16W1.8W16.7094.6263.5601**, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Documento Assinado Eletronicamente por **LUIZ HENRIQUE DA SILVA BORGES**, CPF: 016.28*. **6- *7 em **20/03/2024 13:57:02**, Cód. Autenticidade da Assinatura: **13V5.0957.802E.H84W.0864**, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Informações do Documento

ID do Documento: **49E.B11** - Tipo de Documento: **FORMULÁRIO DE MEDIÇÕES.**

Elaborado por **GILBERTO ARAUJO GOMIDES**, CPF: 069.58*. **6- *7 , em **20/03/2024 - 13:46:31**

Código de Autenticidade deste Documento: 13U2.3446.231K.4683.5206

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:

<https://zeropapel.cimvalpi.mg.gov.br/verdocumento>

