



FORMULÁRIO DE MEDIÇÕES

RELATÓRIO PARCIAL (SITUAÇÃO: APROVADA PELO CONSÓRCIO)
Enviado por LUCAS CARVALHO SOARES em 19/04/2024 - 08:01

13ª MEDIÇÃO																	
Período de 21/03/2024 a 20/04/2024																	
Local: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA																	
OBSERVAÇÕES																	
Enviado por LUCAS CARVALHO SOARES (FORNECEDOR) em 19/04/2024 às 08:01																	
ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	QUANTIDADE MEDIDA		VALOR PREVISTO (BDI)	VALOR PREVISTO (ADIMC)	VALOR MEDIDO				SALDO (BDI)	SALDO (ADIMC)	
							NESTA MEDIÇÃO	ACUMULADA			NESTA MEDIÇÃO (ADIMC)	ACUMULADA (BDI)	ACUMULADA (ADIMC)				
01	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO																
01.01	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA - para obras que exigem a utilização de grande quantidade de equipamentos e são executadas em centros urbanos ou próximos de centros urbanos. Obs.: Não se aplica aos serviços de Tapa Buracos.																
01.01.03	MOBRAS DE VALOR ACIMA DE R\$ 3000,001,00 - MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA PAVIMENTAÇÃO, EXCLUSIVE PARA TAPA-BURACOS	%	0.2	R\$ 81.450,179.25	R\$ 166.536,094.60	R\$ 33.307,218.92	0.2	1.40003931964	R\$ 33.307,218.92	R\$ 43.749,032.06	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 21.221,18	R\$ 24.018,50	R\$ 33.285,997.74	R\$ 43.725,013.56	
05.16	DRENAGEM COMPLEMENTAR																
05.16.13	SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 02 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M	3450	R\$ 57.88	R\$ 73.48	R\$ 253.506,00	429.7	2834.01	R\$ 253.506,00	R\$ 262.303,50	R\$ 32.781,81	R\$ 33.916,22	R\$ 209.450,51	R\$ 216.715,91	R\$ 44.055,49	R\$ 45.587.59	
05.16.16	VALETA DE PROTEÇÃO DE ATERRÇOS COM REVESTIMENTO DE CONCRETO - VPA 04 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M	2267.5	R\$ 79.13	R\$ 100.45	R\$ 227.770,38	272.9	1578.2	R\$ 227.770,38	R\$ 235.661,28	R\$ 28.460,74	R\$ 29.445,91	R\$ 159.578,13	R\$ 165.105,74	R\$ 68.192,25	R\$ 70.555,54	
13	SINALIZAÇÃO VERTICAL / HORIZONTAL																
13.02	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL																
13.02.02	LINHAS DE RESINA ACRILICA DE 0.8MM DE ESPESSURA E LARGURA = 0,10M (EXECUÇÃO, INCLUINDO PRÉ-MARCAÇÃO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)	m	29693	R\$ 2.15	R\$ 2.73	R\$ 81.061.89	10846.5	14846.5	R\$ 81.061,89	R\$ 83.734.26	R\$ 30.695,60	R\$ 31.780,25	R\$ 41.615,60	R\$ 43.060,25	R\$ 39.446,30	R\$ 40.674.02	
13.02.03	SETAS, SÍMBOLOS E DIZERES DE RESINA ACRILICA 0.8MMI DE ESPESSURA (EXECUÇÃO, INCLUINDO PRÉ-MARCAÇÃO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)	m²	148.27	R\$ 31.05	R\$ 39.42	R\$ 5.844.80	50	50	R\$ 5.844.80	R\$ 6.047.93	R\$ 2.046,50	R\$ 2.117.50	R\$ 2.046.50	R\$ 2.117.50	R\$ 3.798.30	R\$ 3.930.43	
14	SERVIÇOS TÉCNICOS																
14.01	TOPOGRAFIA																
15	ADMINISTRAÇÃO LOCAL																
15.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - % BASEADA ACORDÃO 2.622/2013 DO TCU SOBRE SOMA DOS ITENS 1 A 14	%	6.55	R\$ 132.737.097.60	R\$ 168.509.745.40	R\$ 1.103.738.832.37	6.55	65.500509064	R\$ 1.103.738.832.37	R\$ 1.141.993.663.94	R\$ 6.155,99	R\$ 6.370.52	R\$ 526.793,58	R\$ 553.426,22	R\$ 1.103.212.038,79	R\$ 1.141.440.237.72	
TOTAL:										R\$ 100.140,64		R\$ 103.630,40		R\$ 12.041,137,45		R\$ 12.594.606,62	

Luiz Henrique da Silva Borges
Fiscal de Obras - CIMVALPI
CREA 208579/D
Aprovação: 23/04/2024

PEDRO MARTINO ZEFERINO
Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA
CREA 137.103/O

Luciano Xavier de Castro
RT de Execução - CONSÓRCIO 3T - SOLOCAP-CONEP
CREA 59784/D





CIMVALPI
CONSORCIO INTERMUNICIPAL
MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº 0221		OBRA: CTP 229/2023 - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA		CONTRATO:		RESP. TÉCNICO: LUCIANO XAVIER	
ENDEREÇO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA		CIDDE:		INÍCIO: 01/04/2023		Nº CREA-MG: 59784/D	
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA		UF:		PRAZO: 01/10/2023		Nº DA ART:	
DATA: 18/04/2024		SOL ☀		NUBLADO ☁		CHUVA ☔	
COORDENADAS:						IMPRATICÁVEL 🚧	
QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO			QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO		
1	ENCARREGADO DE OBRAS			1	MOTORISTA		
1	AJUDANTE						
QTDE				EQUIPAMENTO			
1	AIRLESS (PINTURA DE VIA)						
2	VEÍCULO DE APOIO						
1	SOPRADOR						
TAREFAS REALIZADAS							
NÚMERO DE T.R.	DESCRIÇÃO			OBSERVAÇÕES			
REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)							
OCORRÊNCIAS							
NÚMERO DE OC	TIPO DE OCORRÊNCIA			DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA			
OBSERVAÇÕES							
EQUIPE E20 17/04/2024 NÃO HOUE ATIVIDADE DE PINTURA POIS A EQUIPE ESTÁ AGUARDANDO OS DEVIDOS AJUSTES NO IMPLMENTO DE PINTURA							
CONFERÊNCIA							
MUNICÍPIO				CONSÓRCIO (Aprovado em 23/04/2024 - 11:06)			
Obs.:				Obs.: *Conforme relatado no RDO, sem atividades.			
ASSINATURAS							
Luiz Henrique da Silva Borges Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 208579/D		PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA CREA 137,103/D		Luciano Xavier de Castro RT de Execução - CONSÓRCIO 3T - SOLOCAP-CONEP CREA 59784/D			





CIMVALPI
CONSORCIO INTERMUNICIPAL
MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº 0220		OBRA: CTP 229/2023 - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA		CONTRATO:		RESP. TÉCNICO: LUCIANO XAVIER	
ENDEREÇO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA		CIDDE:		INÍCIO: 01/04/2023		Nº CREA-MG: 59784/D	
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA		UF:		PRAZO: 01/10/2023		Nº DA ART:	
DATA: 09/04/2024		SOL ☀		NUBLADO ☁		CHUVA ☔	
MANHÃ		✓				IMPRATICÁVEL ☔	
TARDE		✓					
QTDE		MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO		QTDE		MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	
1		ENCARREGADO DE OBRAS		1		MOTORISTA	
1		AJUDANTE					
QTDE				EQUIPAMENTO			
1		AIRLESS (PINTURA DE VIA)					
2		VEÍCULO DE APOIO					
1		SOPRADOR					
		TAREFAS REALIZADAS					
NÚMERO DE T.R.		DESCRICAO		OBSERVAÇÕES			
		REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)					
		OCORRÊNCIAS					
NÚMERO DE OC		TIPO DE OCORRÊNCIA		OBSERVAÇÕES		DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA	
				EQUIPE E20 08/04/2024 NÃO HOUE ATIVIDADE DE PINTURA POIS A EQUIPE DESTINADA À MESMA ESTÁ AGUARDANDO OS DEVIDOS AJUSTES NO IMPLEMENTO DE PINTURA			
		CONFERÊNCIA					
MUNICÍPIO				CONSÓRCIO (Aprovado em 16/04/2024 - 09:11)			
Obs.:				Obs.: Aprovado por Eduardo Pereira Real			
		ASSINATURAS					
		Luiz Henrique da Silva Borges Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 208579/D		PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA CREA 137.103/D		Luciano Xavier de Castro RT de Execução - CONSÓRCIO 3T - SOLOCAP-CONEP CREA 59784/D	





CIMVALPI
CONSORCIO INTERMUNICIPAL
MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº 0219		OBRA: CTP 229/2023 - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA		CONTRATO:		RESP. TÉCNICO: LUCIANO XAVIER	
ENDEREÇO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA		CIDDE:		INÍCIO: 01/04/2023		Nº CREA-MG: 59784/D	
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA		UF:		PRAZO: 01/10/2023		Nº DA ART:	
DATA: 01/04/2024		SOL ☀		NUBLADO ☁		CHUVA ☔	
MANHÃ				✓		IMPRATICÁVEL ☔	
TARDE				✓			
QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO			QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO		
3	ENCARREGADO DE OBRAS			1	OPERADOR		
2	MOTORISTA			4	PEDREIRO		
12	AJUDANTE						
QTDE	EQUIPAMENTO						
1	AIRLESS (PINTURA DE VIA)						
4	VEÍCULO DE APOIO						
1	SERRA CLIPPER						
1	CAMINHÃO BASCULANTE						
1	SOPRADOR						
1	BETONEIRA						
TAREFAS REALIZADAS							
NÚMERO DE T.R.	DESCRIÇÃO				OBSERVAÇÕES		
1	EXECUÇÃO DE VALA P/ SARJETA E DESCIDA D'ÁGUA						
2	EXECUÇÃO DE SARJETA						
3	ESTABILIZAÇÃO DE TALUDE				PLANTAÇÃO DE VEGETAÇÃO		
4	SINALIZAÇÃO						
5	EXECUÇÃO DE DESCIDA D'ÁGUA						
REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)							
 26 de mar. de 2024, 14:39:09 S 20° 18' 29", W 42° 35' 37" Santo Antônio Do Grama MG 35388-000 Brasil Altitude: 572.5meter Rapidez: 0.0km/h Data não informada							
OCORRÊNCIAS							
NÚMERO DE OC	TIPO DE OCORRÊNCIA			DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA			
1	NÃO HOUE ATIVIDADE DE PINTURA POIS A EQUIPE DESTINADA À MESMA ESTÁ AGUARDANDO OS DEVIDOS AJUSTES			AJUSTE DE IMPLEMENTO DE PINTURA			
OBSERVAÇÕES							
EQUIPE E05 E E20 28/03/2024							
CONFERÊNCIA							
MUNICÍPIO				CONSÓRCIO (Aprovado em 16/04/2024 - 09:11)			
Obs.:				Obs.: Aprovado por Eduardo Pereira Real			
ASSINATURAS							
Luiz Henrique da Silva Borges Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 208579/D		PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA CREA 137.103/D		Luciano Xavier de Castro RT de Execução - CONSÓRCIO 3T - SOLOCAP-CONEP CREA 59784/D			





CIMVALPI
CONSORCIO INTERMUNICIPAL
MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº 0218		OBRA: CTP 229/2023 - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA		CONTRATO:		RESP. TÉCNICO: LUCIANO XAVIER	
ENDEREÇO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA		CIDDE:		INÍCIO: 01/04/2023		Nº CREA-MG: 59784/D	
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA				PRAZO: 01/10/2023		Nº DA ART:	
DATA: 01/04/2024		SOL ☀		UF:		COORDENADAS:	
MANHÃ				NUBLADO ☁		CHUVA ☔	
TARDE				✓		IMPRATICÁVEL ☔	
QTDE		MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO		QTDE		MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	
3		ENCARREGADO DE OBRAS		1		OPERADOR	
1		MOTORISTA		4		PEDREIRO	
12		AJUDANTE					
QTDE		EQUIPAMENTO					
1		AIRLESS (PINTURA DE VIA)					
4		VEÍCULO DE APOIO					
1		SERRA CLIPPER					
1		CAMINHÃO BASCULANTE					
1		SOPRADOR					
1		BETONEIRA					
		TAREFAS REALIZADAS					
NÚMERO DE T.R.		DESCRIÇÃO		OBSERVAÇÕES			
1		EXECUÇÃO DE SARJETA					
2		EXECUÇÃO DE VALA P/ SARJETA E DESCIDA D'ÁGUA					
3		ESTABILIZAÇÃO DE TALUDE		PLATAÇÃO DE VEGETAÇÃO			
4		SINALIZAÇÃO					
5		EXECUÇÃO DE DESCIDA D'ÁGUA					
		REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)					
							
		Data não informada		Data não informada			
							
		Data não informada					
		OCORRÊNCIAS					
NÚMERO DE OC		TIPO DE OCORRÊNCIA		DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA			
1		NÃO HOUVE ATIVIDADE DE PINTURA POIS A EQUIPE ESTÁ AGUARDANDO OS AJUSTES NECESSÁRIOS NO IMPLEMENTO PARA PINTURA		AJUSTE DE IMPLEMENTO DE EQUIPAMENTO			
		OBSERVAÇÕES					
EQUIPE E05 E E20 27/03/2024		CONFERÊNCIA					
MUNICÍPIO		CONSÓRCIO (Aprovado em 16/04/2024 - 09:10)					
Obs.:		Obs.: Aprovado por Eduardo Pereira Real					
		ASSINATURAS					
		Luiz Henrique da Silva Borges Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 208579/D		PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA CREA 137.103/D		Luciano Xavier de Castro RT de Execução - CONSÓRCIO 3T - SOLOCAP-CONEPP CREA 59784/D	





CIMVALPI
CONSORCIO INTERMUNICIPAL
MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº 0217		OBRA: CTP 229/2023 - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA		CONTRATO:		RESP. TÉCNICO: LUCIANO XAVIER	
ENDEREÇO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA		CIDDE:		INÍCIO: 01/04/2023		Nº CREA-MG: 59784/D	
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA		UF:		PRAZO: 01/10/2023		Nº DA ART:	
DATA: 27/03/2024		SOL ☀		NUBLADO ☁		CHUVA ☔	
MANHÃ						IMPRATICÁVEL ☔	
TARDE						✓	
QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO			QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO		
3	ENCARREGADO DE OBRAS			1	OPERADOR		
2	MOTORISTA			4	PEDREIRO		
12	AJUDANTE						
QTDE	EQUIPAMENTO						
1	AIRLESS (PINTURA DE VIA)						
4	VEÍCULO DE APOIO						
1	SERRA CLIPPER						
1	CAMINHÃO BASCULANTE						
1	SOPRADOR						
1	BETONEIRA						
TAREFAS REALIZADAS							
NÚMERO DE T.R.	DESCRICAO			OBSERVAÇÕES			
REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)							
OCORRÊNCIAS							
NÚMERO DE OC	TIPO DE OCORRÊNCIA			DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA			
1	AGUARDANDO AJUSTE DE IMPLEMENTO			AJUSTE DE IMPLEMENTO PARA PINTURA			
2	CONDIÇÃO IMPRATICÁVEL PARA ATIVIDADES			CHUVA			
OBSERVAÇÕES							
EQUIPE E05 E E20 26/03/2024 NÃO HOUE ATIVIDADES DEVIDO À CHUVA, ALIADO A ISSO A EQUIPE DE PINTURA NÃO PODE EXECUTAR SUAS ATIVIDADES TAMBÉM POIS O IMPLEMENTO DE PINTURA NECESSITA AJUSTE							
CONFERÊNCIA							
MUNICÍPIO				CONSÓRCIO (Aprovado em 16/04/2024 - 09:09)			
Obs.:				Obs.: Aprovado por Eduardo Pereira Real			
ASSINATURAS							
Luiz Henrique da Silva Borges Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 208579/D		PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA CREA 137.103/D		Luciano Xavier de Castro RT de Execução - CONSÓRCIO 3T - SOLOCAP-CONEP CREA 59784/D			





CIMVALPI
CONSORCIO INTERMUNICIPAL
MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO



Nº 0216		OBRA: CTP 229/2023 - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA		CONTRATO:		RESP. TÉCNICO: LUCIANO XAVIER	
ENDEREÇO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA		CIDDE:		INÍCIO: 01/04/2023		Nº CREA-MG: 59784/D	
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA		UF:		PRAZO: 01/10/2023		Nº DA ART:	
DATA: 27/03/2024		SOL ☀		NUBLADO ☁		CHUVA ☔	
MANHÃ						IMPRATICÁVEL ☔	
TARDE						✓	
QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO			QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO		
3	ENCARREGADO DE OBRAS			1	OPERADOR		
2	MOTORISTA			4	PEDREIRO		
12	AJUDANTE						
QTDE	EQUIPAMENTO						
1	AIRLESS (PINTURA DE VIA)						
4	VEÍCULO DE APOIO						
1	SERRA CLIPPER						
1	CAMINHÃO BASCULANTE						
1	SOPRADOR						
1	BETONEIRA						
TAREFAS REALIZADAS							
NÚMERO DE T.R.	DESCRIÇÃO			OBSERVAÇÕES			
REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)							
OCORRÊNCIAS							
NÚMERO DE OC	TIPO DE OCORRÊNCIA			DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA			
1	AGARDANDO AJUSTE DE IMPLEMENTO			AJUSTE DE IMPLEMENTO PARA PINTURA			
2	CONDIÇÃO IMPRATICÁVEL PARA ATIVIDADES			CHUVA			
OBSERVAÇÕES							
EQUIPE E05 E E20 25/03/2024 BÃO HOUVE ATIVIDADES DEVIDO À CHUVA, ALIADO A ISSO A EQUIPE DE PINTURA NÃO PODE EXECUTAR SUAS ATIVIDADES TAMBÉM POIS O IMPLEMENTO DE PINTURA NECESSITA AJUSTE							
CONFERÊNCIA							
MUNICÍPIO				CONSÓRCIO (Aprovado em 16/04/2024 - 09:09)			
Obs.:				Obs.: Aprovado por Eduardo Pereira Real			
ASSINATURAS							
Luiz Henrique da Silva Borges Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 208579/D		PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA CREA 137.103/D		Luciano Xavier de Castro RT de Execução - CONSÓRCIO 3T - SOLOCAP-CONEP CREA 59784/D			






CIMVALPI
CONSORCIO INTERMUNICIPAL
MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA


RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

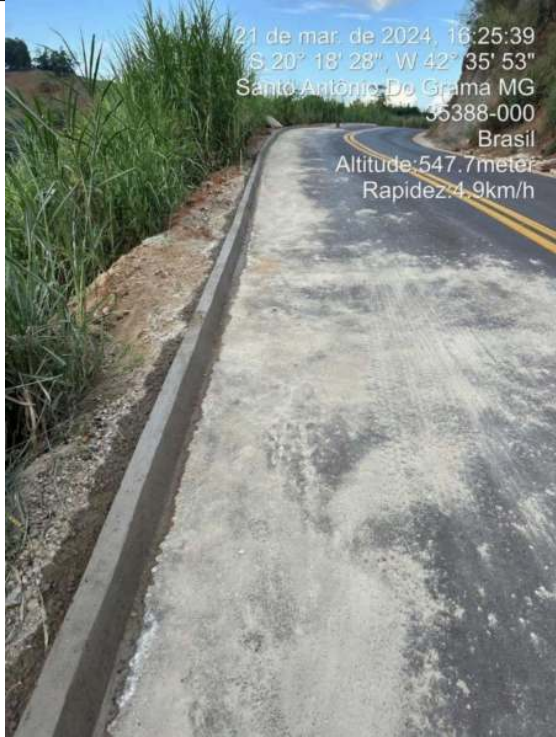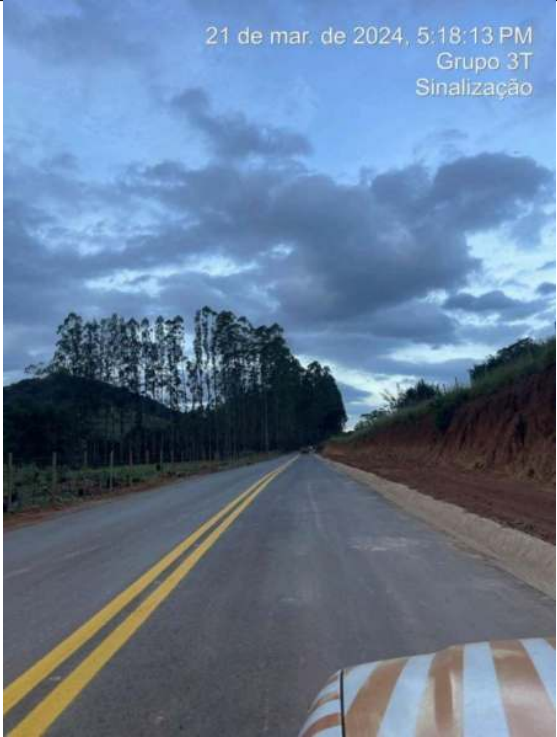Nº 0215		OBRA: CTP 229/2023 - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA		CONTRATO:		RESP. TÉCNICO: LUCIANO XAVIER	
ENDEREÇO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA		CIDDE:		INÍCIO: 01/04/2023		Nº CREA-MG: 59784/D	
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA		UF:		PRAZO: 01/10/2023		Nº DA ART:	
DATA: 26/03/2024		SOL ☀		NUBLADO ☁		CHUVA ☔	
MANHÃ		✓				IMPRATICÁVEL ☔	
TARDE		✓					
QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO			QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO		
3	ENCARREGADO DE OBRAS			1	OPERADOR		
2	MOTORISTA			4	PEDREIRO		
12	AJUDANTE						
QTDE	EQUIPAMENTO						
1	AIRLESS (PINTURA DE VIA)						
4	VEÍCULO DE APOIO						
1	SERRA CLIPPER						
1	CAMINHÃO BASCULANTE						
1	SOPRADOR						
1	BETONEIRA						
TAREFAS REALIZADAS							
NÚMERO DE T.R.	DESCRIÇÃO				OBSERVAÇÕES		
1	EXECUÇÃO DE PINTURA DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL						
2	EXECUÇÃO DE VALA P/ SARJETA E DESCIDA D'ÁGUA						
3	EXECUÇÃO DE SARJETA						
4	ESTABILIZAÇÃO DE TALUDE				PLANTAÇÃO DE VEGETAÇÃO		
5	EXECUÇÃO DE DESCIDA D'ÁGUA						
6	SINALIZAÇÃO						
REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)							
 21 de mar. de 2024, 16:25:39 S 20° 18' 28", W 42° 35' 53" Santo Antônio Do Grama MG 35388-000 Brasil Altitude: 547.7meter Rapidez: 4.9km/h Data não informada  21 de mar. de 2024, 5:18:13 PM Grupo 3T Sinalização Data não informada							




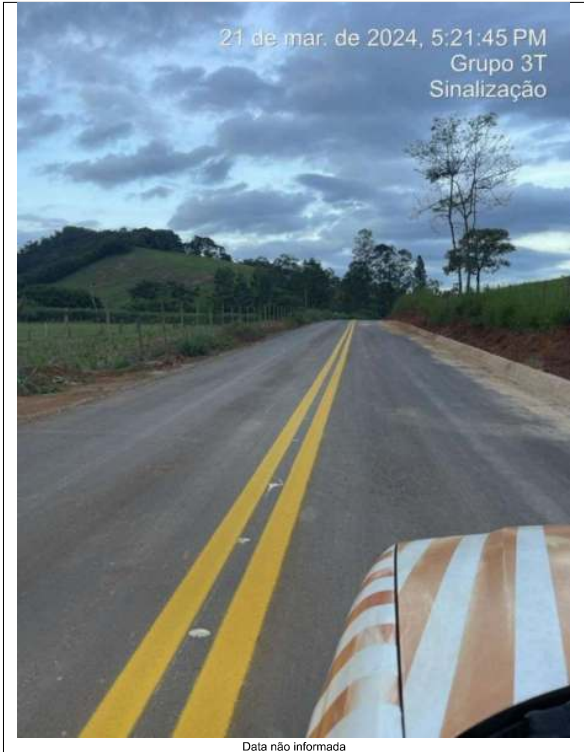


Data não informada

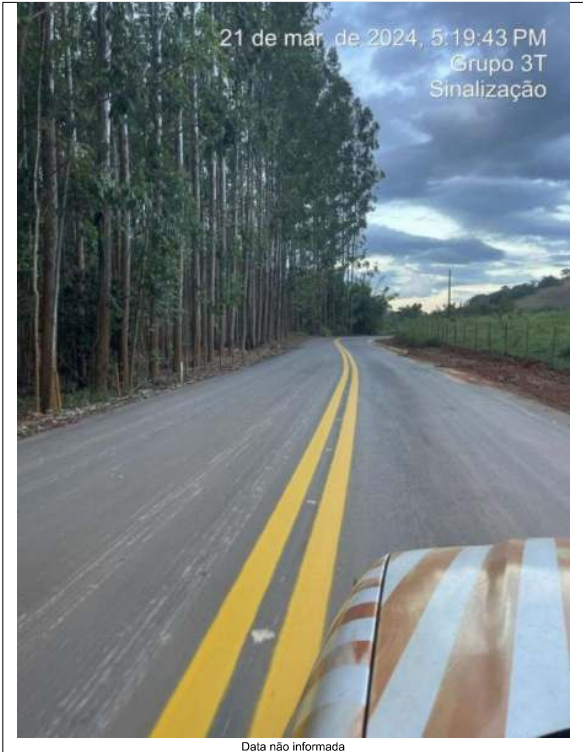

Data não informada

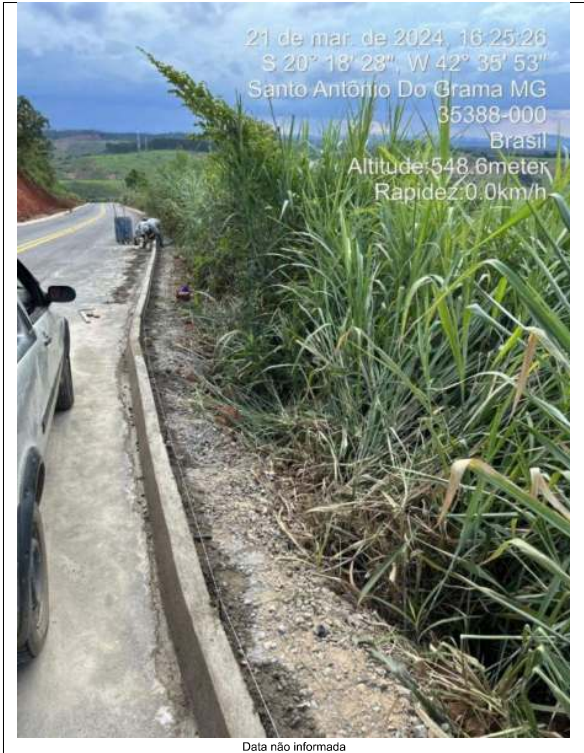

Data não informada

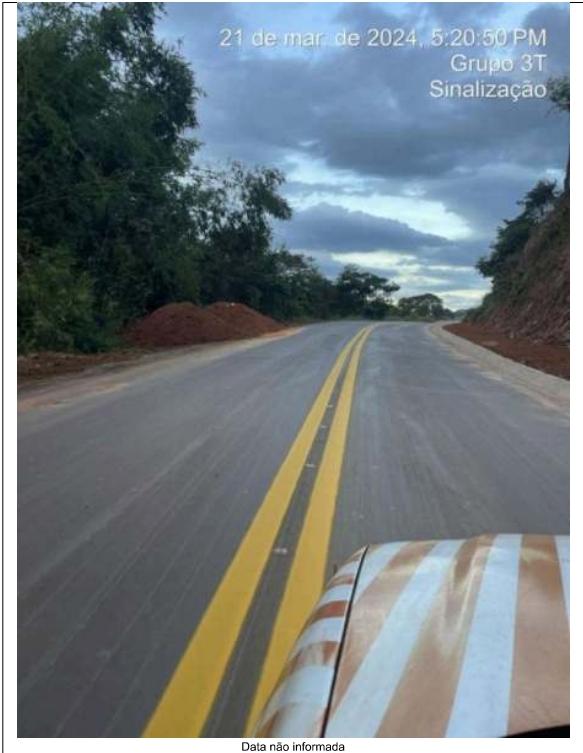

Data não informada

NÚMERO DE OC		TIPO DE OCORRÊNCIA		OCORRÊNCIAS		DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA	
EQUIPE E05 E E20 21/03/2024				OBSERVAÇÕES			
				CONFERÊNCIA			
MUNICÍPIO				CONSÓRCIO (Aprovado em 16/04/2024 - 09:08)			
Obs.:				Obs.: Aprovado por Eduardo Pereira Real			
ASSINATURAS							
Luiz Henrique da Silva Borges Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 208579/D		PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA CREA 137.103/D		Luciano Xavier de Castro RT de Execução - CONSÓRCIO 3T – SOLOCAP-CONEPP CREA 59784/D			





CIMVALPI
CONSORCIO INTERMUNICIPAL
MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº 0214		OBRA: CTP 229/2023 - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA		CONTRATO:		RESP. TÉCNICO: LUCIANO XAVIER	
ENDEREÇO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA		CIDDE:		INÍCIO: 01/04/2023		Nº CREA-MG: 59784/D	
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA				PRAZO: 01/10/2023		Nº DA ART:	
DATA: 25/03/2024		SOL ☀		NUBLADO ☁		CHUVA ☔	
MANHÃ		✓				IMPRATICÁVEL ☔	
TARDE		✓					
QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO			QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO		
2	ENCARREGADO DE OBRAS			1	OPERADOR		
1	MOTORISTA			4	PEDREIRO		
11	AJUDANTE						
QTDE	EQUIPAMENTO						
2	VEÍCULO DE APOIO						
1	SERRA CLIPPER						
1	CAMINHÃO BASCULANTE						
1	BETONEIRA						
TAREFAS REALIZADAS							
NÚMERO DE T.R.	DESCRIÇÃO			OBSERVAÇÕES			
1	EXECUÇÃO DE VALA P/ SARJETA E DESCIDA D'ÁGUA						
2	EXECUÇÃO DE SARJETA						
3	ESTABILIZAÇÃO DE TALUDE			PLANTAÇÃO DE VEGETAÇÃO			
4	SINALIZAÇÃO						
5	EXECUÇÃO DE DESCIDA D'ÁGUA						
REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)							
 22 de mar. de 2024 10:04:28 Data não informada				 22 de mar. de 2024 10:03:59 Data não informada			
NÚMERO DE OC		TIPO DE OCORRÊNCIA		OCORRÊNCIAS		DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA	
EQUIPE E05 E E20 22/03/2024		NÃO HOUVE ATIVIDADE DE PINTURA POIS A EQUIPE E20 FOI SOLICITADA PARA ATENDIMENTO DE DEMANDA NA SEDE		OBSERVAÇÕES			
MUNICÍPIO		CONSÓRCIO (Aprovado em 26/03/2024 - 09:53)		CONFERÊNCIA			
Obs.:		Obs.: *Execução de meio fio nas Est. 84 a Est. 91 com total de 71,60mts. *Execução de sarjetas com total de 16,60mts. *Execução sementeira. *RDO deve ser lançado no dia.					
ASSINATURAS							
Luiz Henrique da Silva Borges Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 208579/D		PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA CREA 137.103/D		Luciano Xavier de Castro RT de Execução - CONSÓRCIO 3T - SOLOCAP-CONEP CREA 59784/D			





CIMVALPI
CONSORCIO INTERMUNICIPAL
MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO


Nº 0212		OBRA: CTP 229/2023 - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA		CONTRATO:		RESP. TÉCNICO: LUCIANO XAVIER	
ENDEREÇO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA		CIDDE:		INÍCIO: 01/04/2023		Nº CREA-MG: 59784/D	
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA		UF:		PRAZO: 01/10/2023		Nº DA ART:	
DATA: 21/03/2024		SOL ☀		NUBLADO ☁		CHUVA ☔	
MANHÃ		✓				IMPRATICÁVEL ☔	
TARDE		✓					
QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO			QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO		
3	ENCARREGADO DE OBRAS			1	OPERADOR		
2	MOTORISTA			4	PEDREIRO		
12	AJUDANTE						
QTDE	EQUIPAMENTO						
1	AIRLESS (PINTURA DE VIA)						
4	VEÍCULO DE APOIO						
1	SERRA CLIPPER						
1	CAMINHÃO BASCULANTE						
1	SOPRADOR						
1	BETONEIRA						
TAREFAS REALIZADAS							
NÚMERO DE T.R.	DESCRIÇÃO			OBSERVAÇÕES			
1	SINALIZAÇÃO						
2	EXECUÇÃO DE SARJETA						
3	ESTABILIZAÇÃO DE TALUDE			PLANTANDO DE VEGETAÇÃO			
4	EXECUÇÃO DE PINTURA DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL						
5	EXECUÇÃO DE DESCIDA D'ÁGUA						
6	EXECUÇÃO DE VALA P/ SARJETA E DESCIDA D'ÁGUA						
REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATORIOS)							
 20 de mar. de 2024, 09:43:05 S 20° 18' 24", W 42° 35' 9" Santo Antônio Do Grama MG 35388-000 Brasil Altitude: 584.1meter Rapidez: 0.0km/h Data não informada  20 de mar. de 2024, 09:32:06 S 20° 18' 47", W 42° 36' 11" Santo Antônio Do Grama MG 35388-000 Brasil Altitude: 434.5meter Rapidez: 9.5km/h Data não informada							



Pag.: 11 / 14 ID. do Doc.: 5A2.8FA - 26/04/2024 - 11:51:40 - ASSINADO POR(3): CPF:015.49*. **6.*9 CPF:760.22*. **6.*5 CPF:016.28*. **6.*7




Data não informada

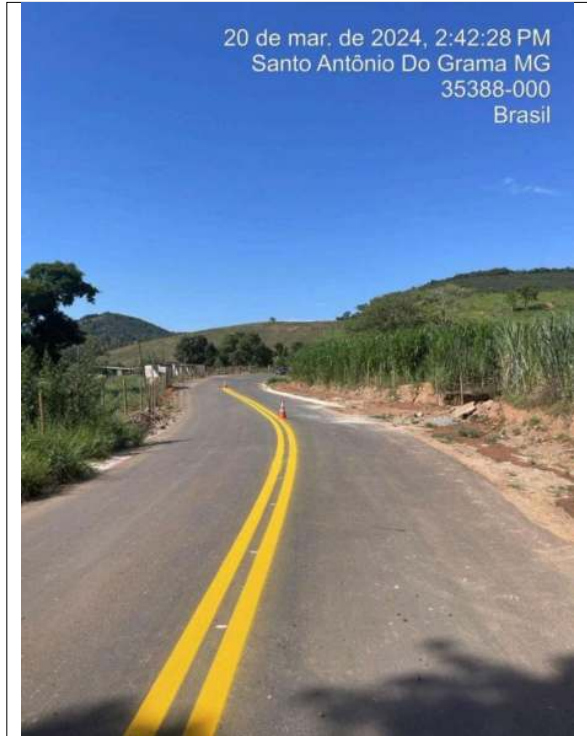

Data não informada




Data não informada

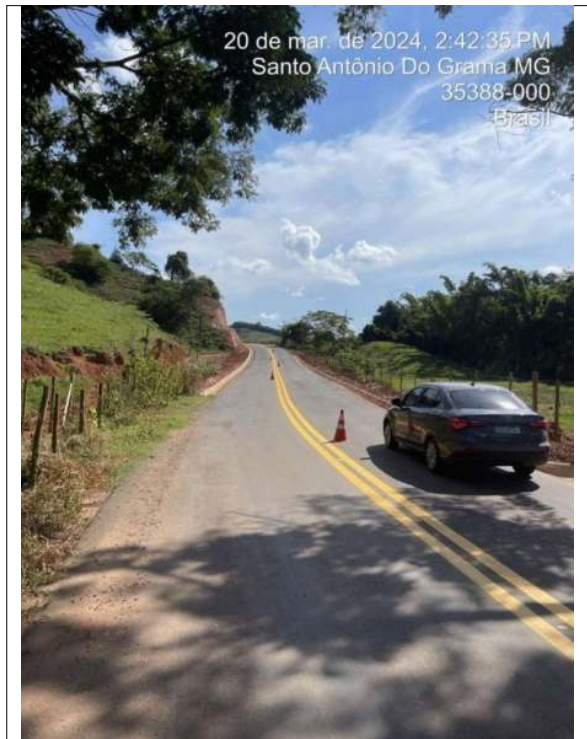

Data não informada



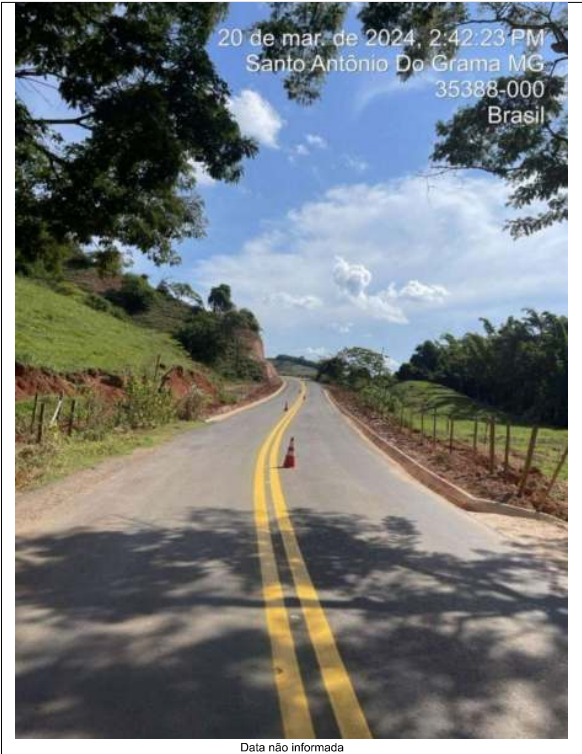

Data não informada

NÚMERO DE OC		TIPO DE OCORRÊNCIA	OCORRÊNCIAS	DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA
EQUIPE E05 E E20 20/03/2024			OBSERVAÇÕES	
			CONFERÊNCIA	
MUNICÍPIO			CONSÓRCIO (Aprovado em 22/03/2024 - 09:44)	
Obs.:			Obs.: *Construção de meio fio 28,30mts, *Construção de valetas 6mts, *Construção de descida d'agua 10,40mts, *Plantação de sementeira.	
ASSINATURAS				
Luiz Henrique da Silva Borges Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 208579/D		PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA CREA 137,103/D		Luciano Xavier de Castro RT de Execução - CONSÓRCIO 3T –SOLOCAP-CONEPP CREA 59784/D





Assinaturas do Documento



Documento Assinado Eletronicamente por **PEDRO MARTINO ZEFERINO**, CPF: 015.49*. **6- *9 em **02/05/2024 07:59:21**, Cód. Autenticidade da Assinatura: **07W1.8X59.4214.U21X.3672**, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Documento Assinado Eletronicamente por **LUCIANO XAVIER DE CASTRO**, CPF: 760.22*. **6- *5 em **26/04/2024 13:11:20**, Cód. Autenticidade da Assinatura: **13E6.6H11.120Z.737Z.4323**, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Documento Assinado Eletronicamente por **LUIZ HENRIQUE DA SILVA BORGES**, CPF: 016.28*. **6- *7 em **26/04/2024 13:09:39**, Cód. Autenticidade da Assinatura: **13E5.6609.539K.323R.7587**, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Informações do Documento

ID do Documento: **5A2.8FA** - Tipo de Documento: **FORMULÁRIO DE MEDIÇÕES.**

Elaborado por **GILBERTO ARAUJO GOMIDES**, CPF: 069.58*. **6- *7 , em **26/04/2024 - 11:51:40**

Código de Autenticidade deste Documento: 1172.3351.739W.745H.7701

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:

<https://zeropapel.cimvalpi.mg.gov.br/verdocumento>

